



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2177

L.: 161,037.67

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1682

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA

Id/RTN: 1606198700048

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Cuarta Estimación por valor de Lps.201,297.09(deducción de Lps.40,259.42 del Anticipo, Lps.10,064.85 garantía de Calidad y Lps.2,516.21 Impuesto sobre La renta valor neto a pagar Lps.148,456.61) del Contrato No.013-2020 por valor de Lps.912,120.85 para la prestación de Servicios Profesionales para el Proyecto de Construcción de dos aulas y un modulo de baños, en el Centro de Educación Básica Pablo Perez Murillo de la comunidad de La Unión, T.S.B. el cual incluye compra de materiales y suministro de mano de obra con fondos de Transferencia Condicionada a través de La Secretaria de Gobernación, del segundo desembolso del 40 que equivale a Lps.364,848.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 001 000 23100 11-011-03	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	161,037.67

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,516.21
207	RETENCIONES VARIAS	10,064.85
Total de retenciones:		12,581.06

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Transferencia del Gobierno Central para apoyo Sector Educación para Construcción de Aulas y Módulos de Baños	161,037.67
Monto Total:		161,037.67



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora : 11:01 a.m.

USUARIO:
YESENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	161,037.67
- RETENCIONES	12,581.06
TOTAL	148,456.61

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]

INGENIERO CIVIL
29-01-15
06-02-18
C.H. No. 8482

1606-1987-00040

0s+js/j9JmckbhbMB+IgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjzGx9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmciLcWXHM5rc91 QjDjep1LBcGNo2yB+Bhd8+KW2dojnFFBitH3C74hAMcAFTC3 jw==

RECIBO

Por Lps. 148,456.61

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, la cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con 61/100 (**Lps. 148,456.61**) por concepto de Cuarto Pago de Avance De Obra de **“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO DE BAÑOS, EN EL CEB PABLO PEREZ MURILLO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, EL CUAL INCLUYE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA”**, contratados, para tal efecto se adjuntan documentos de respaldo.

Trinidad, Santa Bárbara 3 de mayo del 2021.



Jose Edgardo Leiva Rivera
Contratista
Ident. # 1606-1987-00048

Resumen Financiero	
Cuarto Pago.....	Lps. 201,297.09
Menos:	
Retención ISR.....	Lps. 2,516.21
Amortización Anticipo.....	Lps. 40,259.42
Retención Calidad De Obra.....	Lps. 10,064.85
Monto a Pagar.....	Lps. 148,456.61

ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA # 4

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y MODULO DE BAÑOS



UBICACIÓN: COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

N°	ACTIVIDAD	CONTRATADO				AVANCE ANTERIOR			AVANCE DEL PERIODO			AVANCE TOTAL			PENDIENTE DE PAGAR		
		UND	CANT.	P. UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%
2 AULAS DE CLASE																	
1	Limpieza de terreno	M2	480,00	8,50	4.080,00	480,00	4.080,00	0,45	0,00	0,00	0,00	480,00	4.080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Trazado y marcado	ML	162,64	18,20	2.960,05	162,64	2.960,05	0,32	0,00	0,00	0,00	162,64	2.960,05	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	50,72	305,00	15.469,60	50,72	15.469,60	1,70	0,00	0,00	0,00	50,72	15.469,60	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Relleno con material selecto	M3	47,16	690,00	32.540,40	47,16	32.540,40	3,57	0,00	0,00	0,00	47,16	32.540,40	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Cimientos de mampostería (0.70x0.50)m, (0.30x0.50)m. en corredor,(0.30x0.20)m en acera	M3	7,56	1.520,00	11.491,20	0,00	0,00	0,00	7,56	11.491,20	100,00	7,56	11.491,20	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Zapata corrida de 0.60x0.20m de concreto 1:2:2, 5 #3, #3@0.20m	ML	60,00	575,00	34.500,00	60,00	34.500,00	3,78	0,00	0,00	0,00	60,00	34.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Sobre-elevación de bloque 8", #3@orificio, #3@3 hiladas	M2	48,00	792,00	38.016,00	48,00	38.016,00	4,17	0,00	0,00	0,00	48,00	38.016,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	60,00	250,00	15.000,00	60,00	15.000,00	1,64	0,00	0,00	0,00	60,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	41,40	428,00	17.719,20	41,40	17.719,20	1,94	0,00	0,00	0,00	41,40	17.719,20	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	24,70	250,00	6.175,00	24,70	6.175,00	0,68	0,00	0,00	0,00	24,70	6.175,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Bordillo de concreto 1:2:4 e=10 cms	ML	27,90	123,00	3.431,70	0,00	0,00	0,00	27,90	3.431,70	100,00	27,90	3.431,70	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Solera superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	28,00	245,00	6.860,00	28,00	6.860,00	0,75	0,00	0,00	0,00	28,00	6.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Solera superior (S-3) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	40,96	375,00	15.360,00	40,96	15.360,00	1,68	0,00	0,00	0,00	40,96	15.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Solera voladizo (S-6) 20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 2#5, 2#3, anillos #2@20cms.	ML	4,56	550,00	2.508,00	4,56	2.508,00	0,27	0,00	0,00	0,00	4,56	2.508,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Batiente liso bajo ventanas (B-1) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	ML	10,50	190,00	1.995,00	10,50	1.995,00	0,22	0,00	0,00	0,00	10,50	1.995,00	100,00	0,00	0,00	0,00

16	Bañiente con pestañía bajo ventanas (B-2) (10x15) cms con 2#3 con alacranes #2 @ 20 cms	ML	13,20	290,00	3.828,00	13,20	3.828,00	0,42	0,00	0,00	0,00	13,20	3.828,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Cargador (17x15) de concreto 1:2:2 reforzado con 3 #3 y anillos #2@0.20m	ML	2,40	236,00	566,40	2,40	566,40	0,06	0,00	0,00	0,00	2,40	566,40	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	M2	143,30	315,00	45.139,50	143,30	45.139,50	4,95	0,00	0,00	0,00	143,30	45.139,50	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera	M2	50,62	380,00	19.235,60	0,00	0,00	0,00	50,62	19.235,60	100,00	50,62	19.235,60	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Pared reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	131,20	425,00	55.760,00	131,20	55.760,00	6,11	0,00	0,00	0,00	131,20	55.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Entabicado de bloque 6" h=22cms, mortero 1:5, incluye repello y pulido	ML	28,00	140,00	3.920,00	28,00	3.920,00	0,43	0,00	0,00	0,00	28,00	3.920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	325,68	155,00	50.480,40	325,68	50.480,40	5,53	0,00	0,00	0,00	325,68	50.480,40	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Repello de elementos de L=0.25m mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	86,00	50,00	4.300,00	86,00	4.300,00	0,47	0,00	0,00	0,00	86,00	4.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Repello de elementos de L=0.20m, mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 1:1 e=0.25 cms.	ML	82,80	48,00	3.974,40	82,80	3.974,40	0,44	0,00	0,00	0,00	82,80	3.974,40	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Repello de elementos de L=0.15m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	175,38	30,00	5.261,40	175,38	5.261,40	0,58	0,00	0,00	0,00	175,38	5.261,40	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Repello de elementos de H=0.17m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	4,80	45,00	216,00	4,80	216,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4,80	216,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Repello de elementos de L=0.10m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	48,40	25,00	1.210,00	48,40	1.210,00	0,13	0,00	0,00	0,00	48,40	1.210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Viga aérea metálica de tubo estructural de 4"x4" L=11.50m con anticorrosivo a dos manos	UNIDAD	2,00	6.800,00	13.600,00	2,00	13.600,00	1,49	0,00	0,00	0,00	2,00	13.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Techo de canaleta de 2x4"con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	192,94	445,00	85.858,30	192,94	85.858,30	9,41	0,00	0,00	0,00	192,94	85.858,30	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Capote para aluzinc color rojo	ML	16,40	115,00	1.886,00	16,40	1.886,00	0,21	0,00	0,00	0,00	16,40	1.886,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Aislante térmico de espuma de polietileno, e=3mm	M2	113,12	110,00	12.443,20	113,12	12.443,20	1,36	0,00	0,00	0,00	113,12	12.443,20	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Cielo falso de lámina fibra mineral de 2'x4' e=5mm con fleje metálico	M2	140,00	365,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	140,00	51.100,00	100,00	140,00	51.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color gris perla en interiores, incluye fraguado.	M2	107,54	485,00	52.156,90	0,00	0,00	0,00	107,54	52.156,90	100,00	107,54	52.156,90	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Moldura de piso terrazo original en interior color gris perla de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	55,90	180,00	10.062,00	0,00	0,00	0,00	55,90	10.062,00	100,00	55,90	10.062,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color rojo en exteriores, incluye fraguado.	M2	33,86	510,00	17.268,60	0,00	0,00	0,00	33,86	17.268,60	100,00	33,86	17.268,60	100,00	0,00	0,00	0,00

36	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	10,80	180,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	10,80	1.944,00	100,00	10,80	1.944,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40).	ML	87,02	65,00	5.656,30	0,00	0,00	0,00	87,02	5.656,30	100,00	87,02	5.656,30	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).	ML	41,76	90,00	3.758,40	0,00	0,00	0,00	41,76	3.758,40	100,00	41,76	3.758,40	100,00	0,00	0,00	0,00
39	Suministro e instalación de Interruptor sencillo bajo repello	UND	4,00	125,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4,00	500,00	100,00	4,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40	Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello	UND	6,00	110,00	660,00	0,00	0,00	0,00	6,00	660,00	100,00	6,00	660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2 x 40 watts	UND	12,00	698,00	8.376,00	0,00	0,00	0,00	12,00	8.376,00	100,00	12,00	8.376,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1 x 40 watts	UND	2,00	590,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.180,00	100,00	2,00	1.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Centro de carga de 6 espacios	UND	2,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.000,00	100,00	2,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Mufa de 2"	UND	2,00	900,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.800,00	100,00
45	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	UND	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2,00	500,00	100,00	2,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46	Puerta metálica troquelada de 1.20 x 2.10m	UND	2,00	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	2,00	9.600,00	100,00	2,00	9.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
47	Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica	M2	36,84	1.700,00	62.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	62.628,00	100,00
48	Balcones metálicos de ángulo y varilla lisa de 1/2"	M2	36,84	1.200,00	44.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	44.208,00	100,00
49	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	396,80	58,00	23.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,80	23.014,40	100,00
50	Limpieza final de áreas interiores	M2	107,54	3,50	376,39	0,00	0,00	0,00	107,54	376,39	100,00	107,54	376,39	100,00	0,00	0,00	0,00
51	Limpieza final de áreas exteriores	M2	172,00	3,35	576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	576,20	100,00
52	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	30,00	300,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	9.000,00	100,00
MODULO DE BAÑOS																	
53	Limpieza de terreno	M2	36,90	8,50	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	313,65	100,00
54	Trazado y marcado	ML	46,35	18,20	843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	843,57	100,00
55	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	3,61	305,00	1.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	1.101,05	100,00

56	Relleno con material selecto	M3	2,71	690,00	1.869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	1.869,90	100,00
57	Cimientos de mampostería (0.30x0.50)m. en corredor,(0.30x0.20)m en acera	M3	0,93	1.380,00	1.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1.283,40	100,00
58	Zapata corrida de 0.40x0.20m de concreto 1:2:2, 3 #3, #3@0.20m	ML	10,30	410,00	4.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	4.223,00	100,00
59	Sobre-elevación de bloque 6", #3@0.40m, #3@3 hiladas	M2	4,64	510,00	2.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	2.366,40	100,00
60	Solera inferior (S-1) de15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	14,95	245,00	3.662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	3.662,75	100,00
61	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	10,80	420,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	4.536,00	100,00
62	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	12,60	235,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	2.961,00	100,00
63	Solera superior (S-2)15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	9,08	230,00	2.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	2.088,40	100,00
64	Solera de remate (15x10)m. de concreto 1:2:2 reforzado con 2 #3 y anillos #2@0.20m	ML	9,25	230,00	2.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	2.127,50	100,00
65	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@20 cms en ambas direcciones	M2	3,37	510,00	1.718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	1.718,70	100,00
66	Piso de concreto 1:2:4 reforzada e=10cm #2@ 20 cm para acera	M2	8,70	450,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	3.915,00	100,00
67	Pared reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5	M2	13,59	389,00	5.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	5.286,51	100,00
68	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	27,17	110,00	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17	2.988,70	100,00
69	Tallado de elementos de L=0.20m	ML	21,60	65,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	1.404,00	100,00
70	Tallado de elementos de L=0.15m	ML	57,31	65,00	3.725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	3.725,15	100,00
71	Tallado de elementos de L=0.10m	ML	18,50	65,00	1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	1.202,50	100,00

72	Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lamina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	10,44	445,00	4.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	4.645,80	100,00
73	Capote para aluzinc color rojo	ML	3,00	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	345,00	100,00
74	Puerta de lámina metálica de 0.85 x 1.70mts	UND	1,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.100,00	100,00
75	Puerta de lámina metálica de 0.90 x 1.70mts	UND	2,00	3.200,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6.400,00	100,00
76	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	12,09	58,00	701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	701,22	100,00
77	Caja de lodos de 0.80x 1.05 x 0.90 mts	UND	1,00	1.537,21	1.537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.537,21	100,00
78	Pozo de absorcion 4.00 x 1.90 m	UND	1,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13.500,00	100,00
79	Limpieza final de áreas exteriores	M2	8,70	8,50	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	73,95	100,00
80	Excavacion de material tipo II	M3	22,59	305,00	6.889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	6.889,95	100,00
81	Relleno y compactado suelo cemento	M2	1,84	1.500,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	2.760,00	100,00
82	Relleno y compacto de material selecto en tuberias	M3	0,80	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	400,00	100,00
GRAN TOTAL.....LPS.					912.120,85	0,00	481.626,85	52,80		201.297,09	22,07		682.923,94	74,87		229.196,91	25,13

RESUMEN DE LA CUARTA ESTIMACION DE PAGO SEGÚN AVANCE DE OBRA

1°) MONTO EJECUTADO SEGÚN ESTIMADO EN CAMPO.....LPS.	201.297,09
2°) DEDUCCION DEL ANTICIPO 20% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	40.259,42
3°) DEDUCCION DEL CALIDAD DE OBRA 5% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	10.064,85
4°) DEDUCCION DEL ISR (12.5% DEL 10% CONSIDERADO COMO UTILIDAD) DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	2.516,21
5°) NETO A PAGAR EN CUARTA ESTIMACION.....LPS.	148.456,61

CUADRO DE DEDUCCION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		CUADRO DE DEDUCCION			
TOTAL DEL ANTICIPO (20%)	L 182.424,17	AMORTIZACION DE ANTICIPO			
		ANTERIOR	ESTA EST.	ACUMULADO	PENDIENTE DE AMPORTIZAR
		96325,37	40.259,42	136.584,79	L 45.839,38


 ING. JOSE EDGARDO LEIVA
 CONTRATISTA




 MANUEL LEOPOLDO REGALADO
 ALCALDE MUNICIPAL




 ALMA SARAI PAZ
 TESORERA



INFORME TECNICO N° 4

NOMBRE:

Construcción de dos Aulas y un Módulo de Baños, en el CEB Pablo Pérez Murillo de la Comunidad de la Unión, Municipio de Trinidad, Santa Bárbara.

UBICACIÓN:

El Proyecto se encuentra ubicado en las Instalaciones del CEB Pablo Pérez Murillo de la Comunidad de la Unión, del Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, anexo al Parque de recreación y cancha de futbolito, contiguo a la carretera pavimentada que conduce hacia San Pedro Sula.

FECHA DE INFORME: Lunes 3 de Mayo del 2021.

ALCANCE Y DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El objetivo principal del proyecto es alcanzar y proporcionar el área requerida para suplir la necesidad de espacio para la impartición de clases en el centro Básico, esto debido al incremento de la población estudiantil, así mismo dotar de un módulo de baños con las mejor condiciones de higiene y comodidad para ser utilizados por alumnado y docentes.

Por lo cual se realiza la ejecución del proyecto de construcción de 2 Aulas de clase y 1 Modulo de Baño, se presentan las actividades que se han desarrollado hasta el momento según la primera estimación de avance de obra.



ACTIVIDADES EJECUTADAS

2 AULAS DE CLASE			
5	Cimientos de mampostería (0.70x0.50)m, (0.30x0.50)m. en corredor,(0.30x0.20)m en acera	M3	7,56
11	Bordillo de concreto 1:2:4 e=10 cms	ML	27,90
32	Cielo falso de lámina fibra mineral de 2'x4' e=5mm con fleje metálico	M2	140,00
33	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color gris perla en interiores, incluye fraguado.	M2	107,54
34	Moldura de piso terrazo original en interior color gris perla de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	55,90
35	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color rojo en exteriores, incluye fraguado.	M2	33,86
36	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	10,80
37	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40).	ML	87,02
38	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).	ML	41,76



39	Suministro e instalación de Interruptor sencillo bajo repello	UND	4,00
40	Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello	UND	6,00
41	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2 x 40 watts	UND	12,00
42	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1 x 40 watts	UND	2,00
43	Centro de carga de 6 espacios	UND	2,00
32	Cielo falso de lámina fibra mineral de 2'x4' e=5mm con fleje metálico	M2	140,00
33	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color gris perla en interiores, incluye fraguado.	M2	107,54
45	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	UND	2,00
46	Puerta metálica troquelada de 1.20 x 2.10m	UND	2,00
50	Limpieza final de áreas interiores	M2	107,54

74.87% Ejecutado del total del Proyecto.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

- El contratista fue el responsable de la compra de materiales de buena calidad y herramientas necesarias para la ejecución del proyecto, tal y como lo contempla el respectivo contrato.
- El contratista fue el responsable de la contratación de la mano de obra calificada y no calificada, el cual responde por reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por los mismos, así como proporcionar todos los insumos de Bioseguridad requeridos por las autoridades de salud.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

IMÁGENES TRABAJO REALIZAD



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

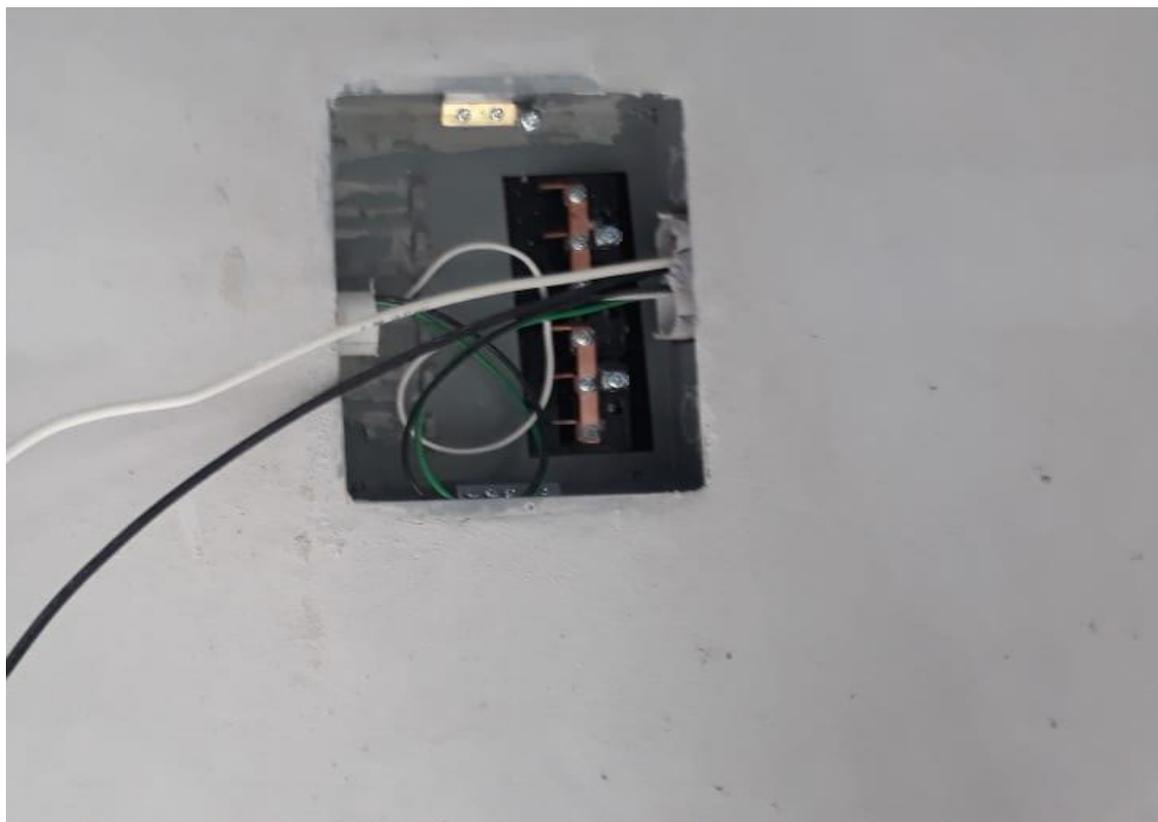

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
DESPACHO MUNICIPAL

