



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

### NOTIFICACION DEL PROYECTO

En respuesta a la solicitud No OIP-005-01-03-2021 enviada el día 01 de Marzo del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de "Reparación y Balastado en las diferentes Calles del casco urbano del municipio de Cane."

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	Colindres constructora S DE R.L.
Sector	Casco urbano.
Nombre del proyecto	"Reparación y Balastado en las diferentes Calles del casco urbano del municipio de Cane".
Ubicación del proyecto	Casco urbano del municipio
Descripción del proyecto	Este proyecto consiste en mejorar 4.91 km de calle con material selecto, utilizando patrol, volquetas vibro, para realizar un trabajo de calidad y así beneficiar a toda la comunidad de cane.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto( principal de proyecto)	Este proyecto se priorizo en el plan de inversión municipal para mejorar el bienestar de las familias por medio del mejoramiento de calles en cuestión de enfermedades respiratorias en tiempo de verano y virus de zancudo en tiempo de invierno.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Colindres constructora S DE R.L.
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 1,956,069.84
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2020
Estado actual del proyecto	Ejecutado en un 23.45%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA
Fecha de finalización	07 Abril 2021
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	






LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 02 días del mes de Marzo del año 2021



  
Luis Fernando Martínez Ávila  
Desarrollo comunitario/proyectos







Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2021

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13046

L.: 346,703.82

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9335

Fecha de Emisión: 17/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: COLINDRES CONSTRUCTORA S DE RL

Id/RTN: 12049010308614

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago a de la segunda estimación del Proyecto Reparación y Balastado de las diferentes calles del Municipio de Cane como ser del Barrio El Porvenir, La Violeta, San Francisco, Colonias Villa Linda I y II y la Jose Rosario Tejada

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento y Reparación de Calles de Tierra Barrio El Porvenir, San Francisco, La Violeta, Colonia Jose Rosario Tejada y la Colonia Villa Linda Etapa I Y II	346,703.82

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	346,703.82
<b>Monto Total:</b>		<b>346,703.82</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	346,703.82
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>346,703.82</b>

Firma y Sello de Contador Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Receptor: Hector Samuel Colindres García  
 Identidad No: 0611-1969-00031

0s+js/9DmcyTQzMdGUq2Wlgy2A99QNh3+EWZbt1yPBDJSTJTNihLqtX/e7rg6v7BaxqUNU8S96hAc6Cksp5CO63wTpClZYRTUbf06yWLRWUXY0zf+FGqF31  
 NvzqinGPjK54N1AjtMqkCBNsqFmTAZQj

ESTIMACION No 2  
 MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ  
 PROYECTO: "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE."  
 UBICACION: CASCO URBANO, CANE, LA PAZ  
 EJECUTOR: COINDRES CONSTRUCTORA  
 PERIODO DEL: 12 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2021

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE			CUMULADO ANTERIO		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD		TOTAL
1	conformacion tipo II	KM	4.91	17,600.00	86,384.32	4.91	86,384.32			4.91	86,384.32	100.00
2	Conformacion Tipo I	KM	0.06	17710.200	1,094.49			0.00				
3	Balastado de 10cm	M3	1,247.65	221.20	275,980.18							
4	Balastado E=15CM	M3	2,979.93	221.20	659,160.85							
5	Acarreo de Material					997.50	220,647.00			997.50	220,647.00	33.47
6	Acarreo de Agua	M3-KM	45,823.89	20.00	916,477.80	7,299.75	145,995.00	7,299.75	145,995.00	145,995.00	15.93	
	TOTAL	GL-KM	80,820.00	0.21	16,972.20	26,940.00	5,657.40	26,940.00	5,657.40	5,657.40	33.33	
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO					1956,069.84			372,299.40		458,683.72	23.45	

ESTIMACION 2	372,299.40
RETENCION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA	18,614.97
RETENCION DEL 12.5%	6,980.61
TOTAL A PAGAR	346,703.82

*[Handwritten Signature]*  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 COORDINANTE



*[Handwritten Signature]*  
 SUPERVISOR



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2021
-----------------------	--	-----------

INFORME DE SUPERVICION DE OBRA  
AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE."

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Nombre del contratista: Colindres constructora

Nombre del supervisor: Ing. Nahúm Ortega "MANSUCOPA"

Fecha de presentación del informe: 12/01/2021- 15/02/2021

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación Estimación:  
A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio
2. Días no trabajados por fuerza mayor:  
Todos los días se trabajaron.
3. Contratista/ Colindres constructora  
Responsable de obra: Colindres Constructora

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo .....19.03%

Porcentaje acumulado ejecutado.....23.45%

Estos porcentajes deberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....	19.03%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....	19.03%
Porcentaje acumulado ejecutado.....	23.45%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados se han realizado siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor. Los trabajos realizados por la maquinaria que la empresa tiene para la ejecución de los trabajos son las indicadas esto nos garantiza la calidad de la obra.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión a este proyecto se hace constante por lo menos una vez durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por la empresa antes mencionadas, que provoquen daños a las personas que transitan la calle. En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

- Balastrado de 15cm
- Acarreo de material selecto
- Acarreo de agua

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace durante los días lunes o viernes, en un horario entre las 8am hasta las 5 pm.

Los trabajos hasta que finalizan aproximadamente a las de la tarde.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:

No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor: \_\_\_\_\_

Lugar (municipio de cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación: 15 de febrero del año 2021



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

AVANCE FINANCIERO  
INFORME DE SUPERVISION

Proyecto: "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.".

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

---

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 07/01/2021- 11/01/2021 en base a la primera estimación.

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	<b>1,956,069.84</b>	100.00%
Deducción del 5% de calidad	18,614.97	19.03%
Estimación 2	372,299.40	19.03%
Deducción del 12.5%	6,980.61	19.03%
AVANCE FINANCIERA		19.03%

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	18,614.97	19.03%
DEDUCCION DEL 12.5%	6,980.61	19.03%
ESTIMACION 2	372,299.40	19.03%



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

**RETENCIONES**

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	22,935.77
DEDUCCION DEL 12.5%	8,600.32



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE." Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ


# FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

"PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE." Ubicación del proyecto: CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ


UBICACIÓN MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

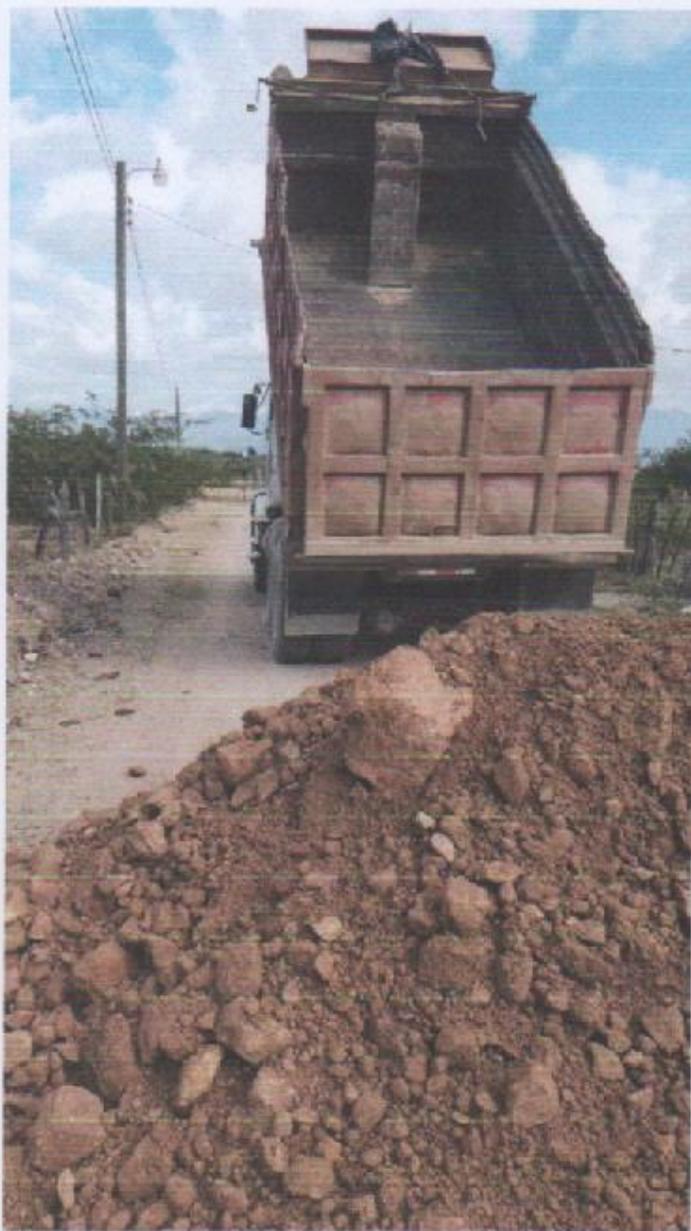

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

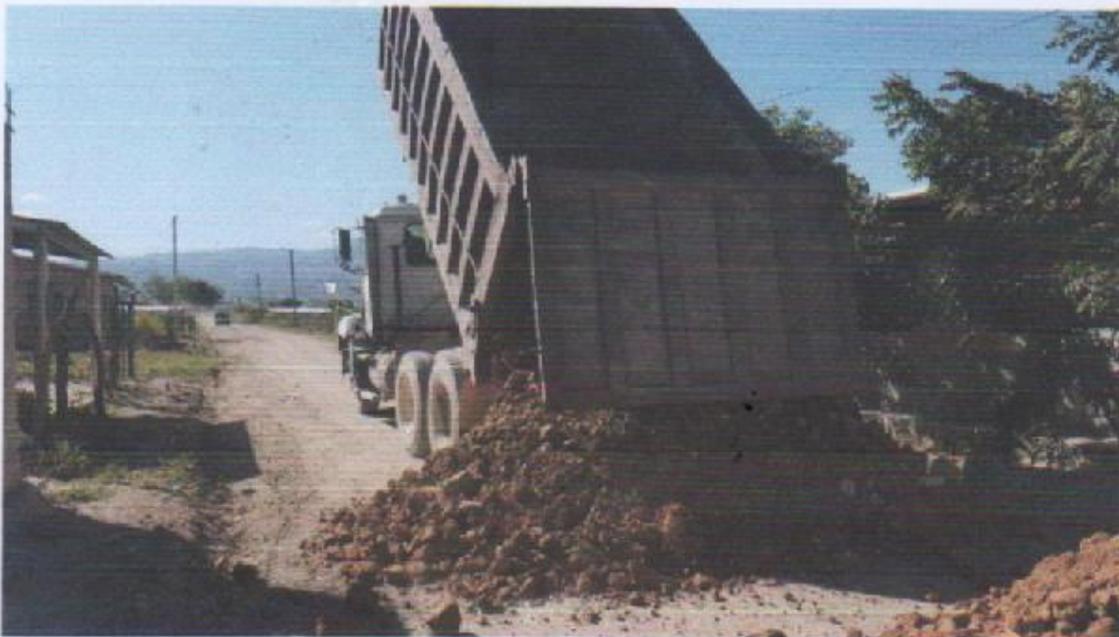


*[Handwritten signature]*

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE." Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ



  
*Signature*

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

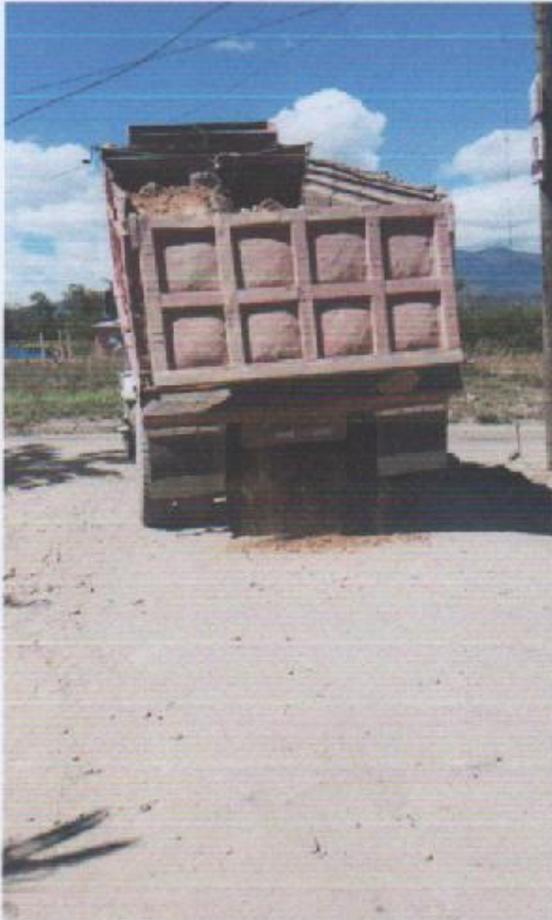


Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ



*Handwritten signature*

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

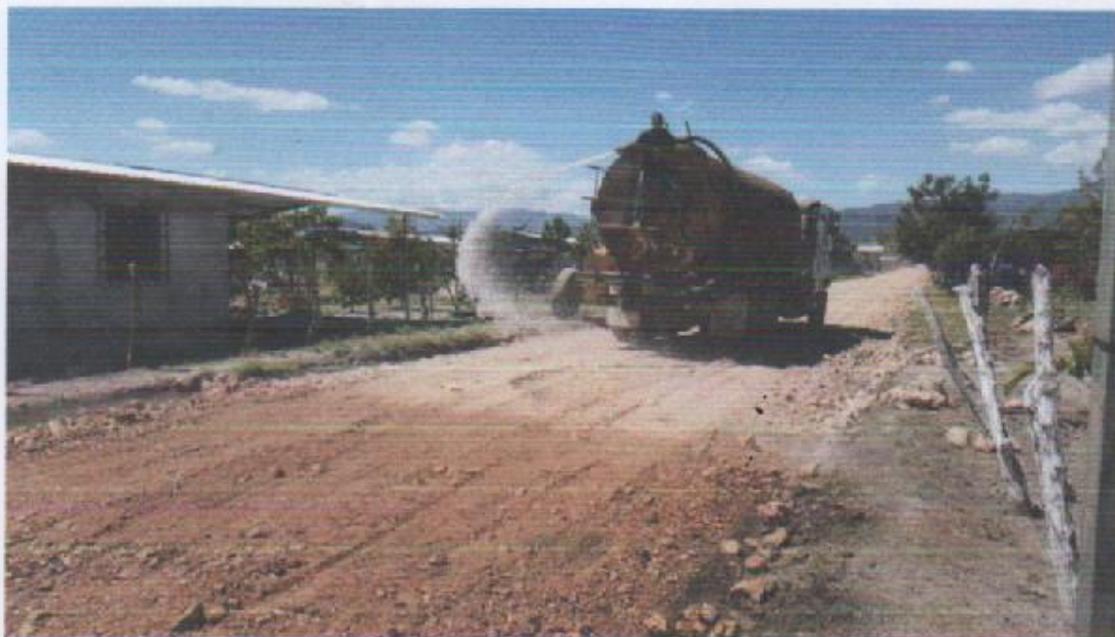


*Handwritten signature*

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE." Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ



  
*José Ángel*

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

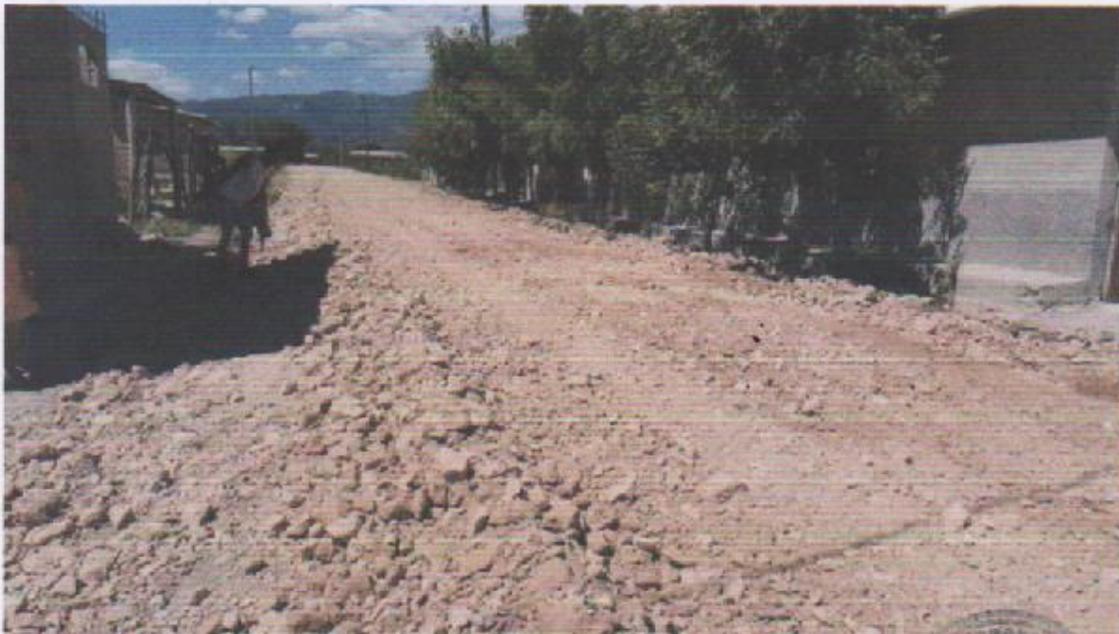


*Handwritten signature*

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION Y BALASTADO EN LA DIFERENTES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Grafica de avance de obra

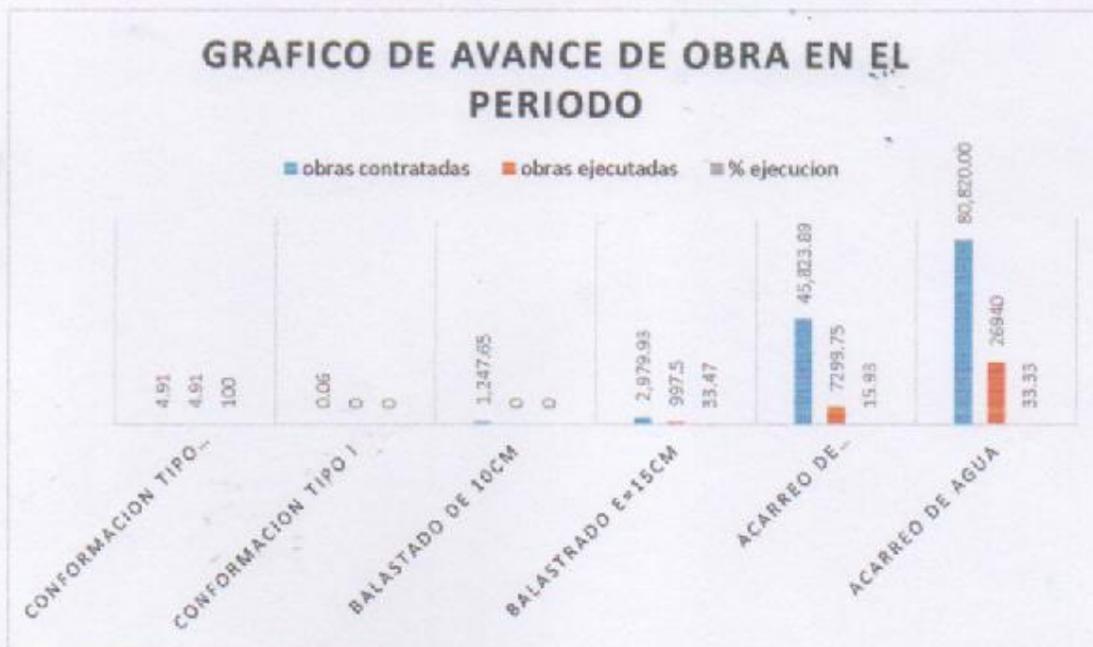



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

HECTOR SAMUEL / COLINDRES GARCIA

HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
 NACIDO EL 08 ENERO 1969  
 SEXO FEMENINO  
 EMITIDA EL 23 AGOSTO 2013

0611-1969-00031 00750431-00

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona natural podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR RNP

SOLICITADA EN OCT 11  
 HECTOR SAMUEL / COLINDRES GARCIA  
 0611-1969-00031



*[Handwritten signature]*
