



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

En respuesta a la solicitud No OIP-005-01-08-2021 enviada el día 01 de Septiembre del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de "Construcción de la iglesia católica en la comunidad de Calabazas


IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	M.O Fernando Suazo Gonzales
Sector	Noroeste del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	Construcción de la iglesia católica en la comunidad de Calabazas.
Ubicación del proyecto	Comunidad de calabazas
Descripción del proyecto	Este proyecto consiste en construir una iglesia con dimensiones de 15x7.50 metros, con paredes de bloque de 6", dos puertas una ventana, solera inferior de 20x20cm, solera superior de 15x15cm, fundición de piso de 5cm, columnas de 20x20cm, instalación de cerámica.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Este tiene un alcance muy importante ya que servirá para tener un mejor espacio de meditación de las personas que visitan un templo y para darle una educación espiritual a los futuros maestros de la palabra del señor. .
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Fernando Suazo Gonzales
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 304,805.47
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2020
Estado actual del proyecto	Ejecutado aproximadamente en un 100.00%
Costo de finalización del proyecto	Lps. 304,805.47
Fecha de finalización	24 Agosto 2021
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 08 días del mes de septiembre del año 2021


Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2021
Hora : 08:13 a.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13772

L.: 56,857.32

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10067

Fecha de Emision: 25/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERNANDO SUAZO GONSALEZ

Id/RTN: 1204195800002

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Pago de la sesta y ultima Estimación del Proyecto de Construcción de una Iglesia Católica de la Aldea de Calabazas, del Municipio de Cane, La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 001 000 001 47210 15-013-01	Construcción de la Iglesia Católica Aldea DE Calabazas	56,857.32

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	56,857.32
Monto Total:		56,857.32

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	56,857.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,857.32



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Fernando Suazo Gonzalez

Identidad No.: 1204-195800002

0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA98QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S96hAcBcksp5CO63wTpCIZYRTUbfXi8yWLRWUXY0zf+FGq3V+c NvzqinGPJIK54N1AjtMgkCBNqxqFmTAZQj



ALCALDIA MUNICIPAL
CANE LA PAZ

MUNICIPALIDAD DE CANE LA PAZ

Lic. Francisco Bustillo G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org
R.T.N. 12049995434017

RECIBO

Nº 10080

Por Lps. **56,857.32**

Recibí de la Tesorería Municipal:

La Cantidad de: Cincuenta y Seis mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 32/100 Cts.

Por Concepto de: Pago de la sexta y última estimación del Proyecto de construcción de una iglesia Católica de la Aldea Calabazos del Municipio de Cane.

Dirección de Domicilio: Barrio el Porvenir

Teléfono / Celular: 97717360

Imprenta Ríos: Tel.: 2771-8063 / 9952-2967 R.T.N. 03011964011686 20 tal del 8,801 en adelante 29-01-2020

Fecha de Pago: 25 de Agosto del 202 1

Fernando Suazo G.

1204-195800007

Nombre


Firma


Identidad

ESTIMACION No 6
MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ
PROYECTO: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA IGLESIA CATOLICA EN LA
COMUNIDAD DE CALABAZAS. DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.
UBICACIÓN: ZONA RURAL, COMUNIDAD CALABAZAS
EJECUTOR: M.O. FERNANDO SUAZO GONZALES
PERIODO DEL: 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2021

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE			EJECUCION ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD		TOTAL
1	Trazado y marcado	ML	45	20	900	45.00	900.00			45.00	900.00	100
2	Excavación	M3	10.8	355	3834	10.80	3834.00			10.80	3834.00	100
3	Cimentación de mampostería	M3	10.37	1741.5	18058.84	10.37	18058.84			10.37	18058.84	100
4	fundición de solera inferior de 20x20cm	ml	45	290	13050	45.00	13050.00			45.00	13050.00	100
5	Fundición de castillos 15x15 cm	ML	9.73	507.20	4935.06	9.73	4935.06			9.73	4,935.06	100
6	fundición de solera superior 15 x 15 cm	ml	45	280	12600	45.00	12600.00			45.00	12,600.00	100
7	Pared de bloque de 6 pulgadas	M2	156.69	690	108116.1	156.69	108,116.10			156.69	108,116.10	100
8	firme de concreto de 5cm espesor	m2	112.5	362.65	40798.13	112.5	40,798.13			112.50	40,798.13	100.00
9	moldura de piso	m2	42.8	220	9416			42.80	9,416.00	42.80	9,416.00	100.00
10	piso de cerámica	m2	112.5	506.76	57010.5	10.6	5,371.66	101.90	51,638.84	112.50	57,010.50	100.00
11	repello y afinado	m2	156.69	170	26637.3	156.69	26,637.30			156.69	26,637.30	100.00
12	relleno con material selecto	m3	22.5	419.98	9449.55	22.5	9,449.55			22.50	9,449.55	100.00
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO					304,805.47		238,378.98		61,054.84		304,805.47	100.00

ESTIMACION 4	61,054.84
RETECION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA	3,052.74
RETECION DEL 12.5%	1,144.78
TOTAL A PAGAR	56,857.32


SUPERVISOR


CONTRATANTE

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FERNANDO / SUAZO GONZALEZ




HONDURENO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 24 ENERO 1958
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 14 ABRIL 1997

1204-1958-00002




00756400-01

ARTICULO 184 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1204

FERNANDO / SUAZO GONZALEZ
1204-1958-00002

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS. MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ." MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2021
-----------------------	---	-----------

INFORME DE SUPERVICION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS. MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ."

Nombre del contratista: MO. FERNANDO SUAZO GONZALES

Nombre del supervisor: Luis Fernando Martínez Ávila

Fecha de presentación del informe: 29 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2021

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación Estimación:
A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio
2. Días no trabajados por fuerza mayor:
Todos los días se trabajaron.
3. Contratista/ MO. FERNANDO SUAZO GONZALES
Responsable de obra: MO. FERNANDO SUAZO GONZALES

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo20.03%
 Porcentaje acumulado ejecutado.....100.00%

Estos porcentajesdeberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS. MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ." MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....	20.03%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....	20.03%
Porcentaje acumulado ejecutado.....	100.00%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados por el maestro de obra se ejecutan siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión ha este proyecto se hace constante durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por la por el maestro de obra antes mencionadas, que provoquen daños a las personas que visiten el cementerio.


En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

- Instalación de piso de cerámica
- Instalación de moldura

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace de lunes a viernes periódicamente.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:

No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor:  _____

Lugar (municipio de cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación: 25 de Agosto del año 2021

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS. MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ." MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

AVANCE FINANCIERO

INFORME DE SUPERVISION

Proyecto: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS. MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ."

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 29/07/2021 - 25/08/2021 en base a la cuarta estimación.

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	304,805.47	100.00%
Deducción del 5% de calidad	3,052.74	20.03%
Estimación 6	61,054.84	20.03%
Deducción del 12.5%	1,144.78	20.03%
AVANCE FINANCIERA		6.13%

RESUMEN

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	3,052.74	20.03%
Deducción del 12.5%	1,144.78	20.03%
ESTIMACION 6	61,054.84	20.03%

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS. MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ." MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

RETENCIONES

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	LPS. 15,240.27
DEDUCCION DEL 12.5%	LPS 5,715.10


Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS. *MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.*" *MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ,* Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS. *MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.*"

UBICACIÓN MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS. MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ." MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

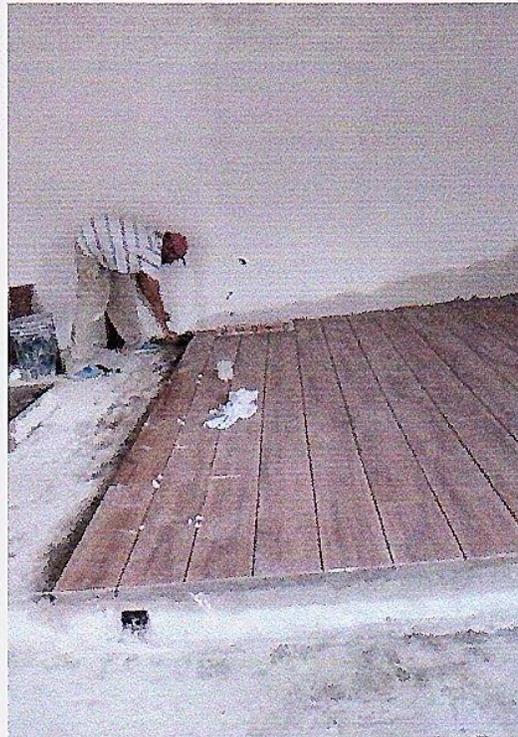

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA IGLECIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE CALABAZAS. MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ." MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

