

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN



2015

Informe de Proyectos de Inversión. Diciembre

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Gobernabilidad y Descentralización
Nombre del Proyecto:	Construcción del Edificio del aula N° 14 de la UPNFM
Ubicación del Proyecto	Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán
Propósitos:	Demanda satisfecha de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.
Descripción del Proyecto:	El proyecto "Construcción del Edificio de aulas 14 de la UPNFM", servirá para generar más y mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de espacios Pedagógicos adecuados a las exigencias del entorno educativo en que se desenvuelve el Centro de Investigación Educativa.

II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Mejorar en un 5% el acceso a Educación Superior en el área de la docencia de la población de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.
Impacto ambiental:	El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se desarrollará el proyecto.
Detalles del contacto:	Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores, 50499411275, jalvarez@upnfm.edu.hn
Fuentes de financiamiento:	Fondos del estado
Propuesta del Proyecto	L. 36,246,000.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	2013
Estado actual del proyecto	Etapas de Construcción
Costo de financiación(proyectada):	L. 38,158,282.70
Fecha de finalización (proyectada):	Diciembre de 2017

III. Ejecución del Proyecto

Relación de la planificación con los productos entregados de manera trimestral:

Se han entregado los planos, presupuestos, especificaciones y estudio de impacto ambiental en el tiempo establecido.

Variación en el costo total del proyecto:

No se puede determinar ya que el proyecto se encuentra en ejecución

Variación en el alcance y duración del proyecto:

Ninguna

Razones de los cambios



Ninguna

Responsable de la elaboración del informe (nombre y firma)



Luis Eduardo Alvarenga

30 de diciembre de 2015

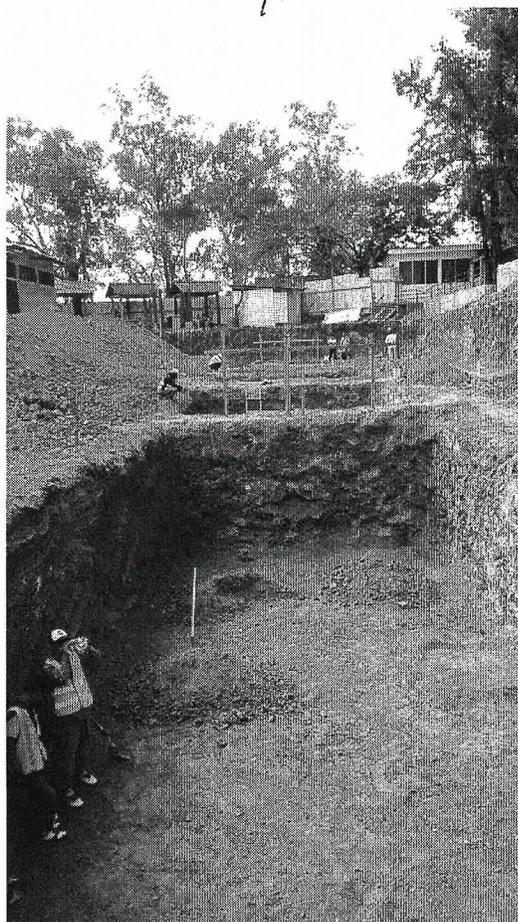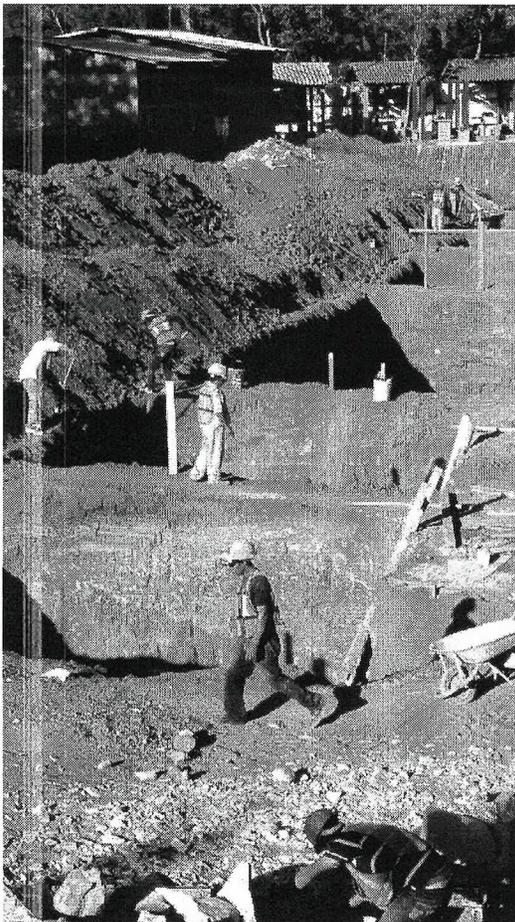

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Gobernabilidad y Descentralización
Nombre del Proyecto:	Construcción del Edificio de Talleres del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM
Ubicación del Proyecto	San Pedro Sula, Departamento de Cortés.
Propósitos:	Demanda satisfecha de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en San Pedro Sula, Departamento de Cortés.
Descripción del Proyecto:	Con la construcción de espacios físicos se pretende incrementar y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades a nivel universitario.

II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Atender el 90% de los estudiantes del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula
Impacto ambiental:	El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se desarrollará el proyecto.
Detalles del contacto:	Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores, 50499411275, jalvarez@upnfm.edu.hn
Fuentes de financiamiento:	Fondos del estado
Propuesta del Proyecto	L. 33,264,000.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	2013
Estado actual del proyecto	Etapas de Pre inversión. Se está analizando la información proporcionada
Costo de financiación(proyectada):	L. 33,264,000.00
Fecha de finalización (proyectada):	Diciembre de 2017

III. Ejecución del Proyecto

Relación de la planificación con los productos entregados de manera trimestral:

Se han entregado los planos, presupuestos, especificaciones y estudio de impacto ambiental en el tiempo establecido.

Variación en el costo total del proyecto:

No se puede determinar ya que el proyecto se encuentra en ejecución

Variación en el alcance y duración del proyecto:

Ninguna

Razones de los cambios

Ninguna

Responsable de la elaboración del informe (nombre y firma)



Luis Eduardo Alvarenga

30 de diciembre de 2015
