



Municipalidad de Lepaera, Lempira



Nombre del Proyecto

**Iluminación de Campo de Fútbol en la
comunidad de La Estancia**

BENEFICIARIOS.

HABITANTES DE LA ESTANCIA

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.

enero de 2022

[Firma]
Jefe de la Unidad Técnica
de Gestión Municipal
Lepaera, Lempira

Ficha de Proyecto

Iluminación de Campo de Futbol en la comunidad de La Estancia

1. Identificación del Proyecto

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal
Edgar Antonio Murillo

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social

3.- Nombre del Proyecto

iluminación en Campo de Futbol en la comunidad de La Estancia

4.- Ubicación del Proyecto.

La Estancia , municipio de Lepaera, Dpto. de Lempira a 6 Km del casco Urbano

5.- Propósito

Mejorar la iluminación del Campo de Futbol en la comunidad de La Estancia Lepaera y así crear condiciones más seguras para la práctica del Deporte sanos en sus diferentes áreas para alejar a los jóvenes de los vicios que dañen su salud física y mental.

6.- Descripción del Proyecto.

El Proyecto Consiste en la iluminación de un Campo de Futbol en La Estancia ,Lepaera en donde se realizaran las siguientes actividades: acarreo de postes y otros materiales hacia la comunidad, hincado de postes por parte de los beneficiarios y el ing. electricista que marco los lugares en donde se colocarían ,colocación de transformadores, cableado, colocación de transformadores, ya anteriormente se habían realizado otras

actividades propias de la construcción del campo como ser: es la Nivelación del Terreno para la Construcción de este proyecto, para esto se empleó maquinaria municipal posteriormente se preparara el material necesario y equipo para la Construcción de la cancha.

Tomando en cuenta lo anterior, es que la municipalidad de Lepaera ha tomado la iniciativa de la ejecución de un proyecto tan importante como ser: La iluminación del campo de futbol, contando con todo el apoyo necesario para desarrollar este trabajo.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

- El Municipio de Lepaera ya cuenta con varios campos de futbol, pero no todos están iluminados y al mismo tiempo existen zonas que no cuentan con estos sitios de recreación que son tan indispensables para los niños, jóvenes y adultos, los que existen ya están deteriorados y merece realizar una buena reparación

El presente proyecto es necesario por las siguientes razones:

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
- Se crean fuentes de empleo, lo que redundará en la economía de las familias del municipio
- Mejora las condiciones de recreación y convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad.
- Aleja del vicio a la juventud del municipio de Lepaera.
- Mejora la autoestima de los habitantes del municipio.
- Por lo anteriormente expuesto la alcaldía tiene planificado la ejecución del proyecto y para llevar a cabo esta obra pendiente de ejecutar, es necesario llevar a cabo una serie de actividades como ser:
- Levantamiento de Estudio de Proyecto.
- Cotización de mano de Obra calificada.
- Inicio de la obra.
- Supervisión, monitoreo y seguimiento de la obra.
- Entrega de la obra ya culminada.

Para llevar a cabo dichas actividades es necesaria la participación de los vecinos de la comunidad de la Estancia que se beneficia directamente, y de muchos aficionados que están interesados en que la obra se concluya. Lógicamente que la municipalidad es la principal responsable de la buena ejecución de la obra en mención.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, distribución del cuerpo de agua, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Catastro y La Unidad Municipal de medio Ambiente de Lepaera Hizo verificación de la zona en donde se harán las respectivas construcciones (Iluminación de Campo de Fútbol en La Estancia Lepaera), en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se dañan Terrenos, u otras áreas que se consideren de mucha importancia.

Por ser directamente la municipalidad la que ejecuta ella se encarga directamente de contratar las personas que llevarán a cabo el proyecto.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. 98072593, 2655-50-90

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: **FHIS, Gobierno Central, Beneficiarios directos y Municipalidad**

De las Fuentes financieras mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando Municipalidad, Gobierno Central,

manejados por la Municipalidad

Presupuesto del Proyecto.

El Año **2021** se ´presupuesto por medio de la Municipalidad, continuando en el 2022, y en el mes de abril fue inaugurado, manejando el siguiente presupuesto:

Aporte Municipal: Presupuestado **Lps.300,000.00**

Transferencia Positiva: **Lps.300,000.00**

Devengado: **175,000.00**

Pagado: **175,000.00**

Pendiente de Ejecutar: **Lps.125,000.00**

Con material Local = si es necesario.

Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre de 2021

Estado del Proyecto actual.

En este momento ya está finalizada su obra física

Ya que estaba listo todo el material, la parte financiera no está pagada todavía.

11. Costo de finalización Proyectado

Aporte Municipal: Presupuestado Lps.300,000.00

Transferencia Positiva: Lps.300,000.00

Devengado: 175,000.00

Pagado: 175,000.00

Pendiente de Ejecutar: Lps.125,000.00

Con material Local = si es necesario.

Fecha de finalización proyectada

Ya esta finalizada la obra física del proyecto se continuará pagando la parte financiera, posteriormente con el campo de futbol. Como ser: Mejoramiento de la Grama Sintética del campo de Futbol en un periodo no mayor de tres meses calendario, por lo que se estima que este mes de abril y mayo tendría avanzados los trabajos, pero estos son aparte.

12. Ejecución Del Proyecto

13. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 2 meses por ser un proyecto que no requiere de mucho trámite legal, ni de la compra de terrenos o materiales tan sofisticados en vista que los materiales a utilizar los provee el ing. electricista que es el encargado de la obra lo cual facilita la ejecución de la obra (dicho ing. cotiza y compra los materiales eléctricos)

De lo planificado ya se tiene un avance de un **100 % en su estructura física , y en lo financiero de un 58.33%** lo que es muy significativo y lo importante es que se está realizando conforme a lo planificado porque siempre existen algunos contratiempos, pero no de mucha relevancia como ser el Clima, que ha estado bastante lluvioso, lo que hacía bastante difícil el avance de la obra física. Pero al final se concluyó dicha obra quedando pendiente la parte financiera.

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps. 300,000.00 vigente y devengado** tiene la cantidad de **Lps. 175,000.00** y pagado la cantidad de **Lps. 175,000.00**. Quedando por ejecutar la cantidad de **Lps.125,000.00**

14. Variación en el costo total del Proyecto.

Siempre existen variaciones en los proyectos y esté presente algunos cambios en la parte presupuestaria ya que el proyecto se ejecutó en un **58.33% estructura física**, quedando pendiente parte financiera en este caso no influye, porque ya se ejecutó la parte física como es un proyecto que se está ejecutando sin parar, el presupuesto está ya finalizado, se presentara una especie de informe de la parte final.

Monto Solicitado:

Aporte Municipal: Presupuestado Lps.300,000.00

Transferencia Positiva: Lps.300,000.00

Devengado: 175,000.00

Pagado: 175,000.00

Pendiente de Ejecutar: Lps.125,000.00

Ya está finalizada la obra física y faltando la parte financiera del proyecto. Como ser: Iluminación de Campo de Futbol en un periodo no mayor de tres meses calendario

En este mes de marzo se terminaron la mayor parte de los trabajos en lo que corresponde a la estructura física y pago financiero de la obra.

15. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

En esta ocasión no existieron variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto en vista que se tenía planificado para terminar en 2 meses tiempo máximo, pero se tardó un poquito más de esta fecha en lo que corresponde a la parte física y en la parte financiera igual, esto siempre por

factores que dificultan darle continuidad a los proyectos y concluirlos en el tiempo previsto y además siempre por las condiciones climáticas de la zona

Está concluida la mayor parte de la obra eléctrica, de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para los beneficiarios, ambas se portaron a la altura cumpliendo con lo que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización tanto financiero como físicamente. Y estructura física ya está inaugurado.

16. Razones de los cambios antes mencionados.

Como mencione anteriormente hubo algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar y en época de lluvia se torna difícil darles continuidad a los proyectos. Pero aun así se logró el propósito. De iluminación del campo de futbol.

Fotos Adjuntas: solo de adjuntan las mismas fotografías porque esto no ha cambiado y que es solo iluminación

Anexos:







MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

**Construcción de Proyecto de Agua en aldea
Consolacion**

BENEFICIARIOS.

Habitantes de la comunidad de Consolacion

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.A Enero de 2022


Manuel Antonio Lara
Jefe de la Unidad
Tecame de Consolacion
Municipio

Ficha de Proyecto

Construcción de proyecto de Agua en La Comunidad de Consolacion

Identificación del Proyecto

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo

2.- Sector o Sub Sector

Sector: AGUA Y SANEAMIENTO

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Proyecto de agua en la comunidad de Consolacion

4.- Ubicación del Proyecto.

La Comunidad de Consolacion se encuentra ubicada a 13 Km de Lepaera, Lempira

5.- Propósito

Mejorar la calidad de vida de la Población de la comunidad de Consolacion a través la construcción del Proyecto de Agua. evitando enfermedades causadas por la contaminación por la falta de agua en los hogares.

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto Consiste en la Construcción de un proyecto de Agua por Bombeo en la comunidad de Consolacion en dicho proyecto inicialmente se levanta el estudio topográfico de la obra, realizando varias visitas el ing. encargado de la obra en este caso por parte de Visión Mundial que son los que pondrán la contraparte del Proyecto y se realizan visitas periódicas en donde seguidamente se construirá la línea de conducción y red de distribución respectivamente, dicho proyecto abastecerá de agua toda la población de Consolacion beneficiando varios hogares y habitantes incluyendo niños. para la red de Distribución y línea de conducción se utilizará tubería de PVC, Rd26 y HG, de acuerdo a las especificaciones técnica realizadas por el ing. encargado de la obra. Quien da instrucciones al maestro de obras. El material con que se construirá dicha tubería de diferentes dimensiones, y que es básicamente el apoyo que está brindando Visión Mundial y la municipalidad para este proyecto, el proyecto requiere de mucha mano de obra, ya que se construirán unos paneles solares porque la distancia en donde se encuentra la troncal del proyecto está muy alejada de donde se traerá el agua.

7. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto.

- Este es un proyecto que está en su etapa intermedia, en este momento ya se le dio avance en la construcción de Tanque ,a la colocación de tubería desde la obra toma hasta cierta parte de la comunidad, ya se habia realizado el levantamiento de estudio topográfico, actualmente se está construyendo la obra en mención, ya llevando un avance considerable en lo que corresponde lo Físico de la obra que en este caso es la construcción de proyecto de agua. La

municipalidad brinda los pagos respectivamente según acuerdo con beneficiarios del proyecto de agua.

- Para que los pobladores se involucren en el proyecto directamente se han llevado a cabo varias reuniones para hacer conciencia a la población de la problemática existente en el sistema de agua que existe en la actualidad y sobre la calidad de agua que se está consumiendo la cual es de pésima calidad. ya que es extraída de pequeños pozos a gran distancia de la comunidad lo cual es un riesgo especialmente para las mujeres y niños que se exponen a muchas cosas. especialmente la delincuencia ya que en la comunidad existen muchas personas mal intencionadas.
- Los beneficiarios directos del proyecto estan en la disposicion de apoyar con la mano de obra Local.

8. Impacto Ambiental.

A través de la Unidad de Medio Ambiente, Asociación de Juntas de Agua, fundación Comunitaria Puca y el ICF realizaron una inspección a la fuente adquirida para comprobar la calidad y cantidad de agua para determinar si es factible la ejecución del proyecto es decir si el agua es apta para consumo humano y además para verificar que la zona está suficientemente protegida. Al haber verificado la calidad y cantidad de agua llegaron a la conclusión que, si es factible la Construcción del proyecto de agua en mención, notificando a la corporación municipal para proceder a la ejecución del proyecto.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Unidad de Medio Ambiente, Dirección de municipal de Justicia, Asociación de Juntas de Agua y el ICF Hizo verificación de terrenos, en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se daña Terrenos, Viviendas y bosque natural

En su momento a los beneficiarios se les solicitara su apoyo para visitar a los dueños de terrenos por donde pasara el proyecto, en este caso permiso de servidumbre.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Mauricio Avalos

Mancomunidad Puca.

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: **Congreso Nacional, Visión Mundial, Beneficiarios directos y Municipalidad**

De las Fuentes financieras mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando Municipalidad, Visión Mundial, Junta de Agua y beneficiarios. Por el momento el proyecto está en su etapa inicial, la municipalidad está aportando con parte del diseño, estudio y sistema completo de la obra.

11. Presupuesto del Proyecto.

Ya está definido el presupuesto del proyecto, el cual es otorgado por Visión Mundial y la municipalidad.

12. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre de 2020 e iniciado enero de 2021 físico y financiero

13. Estado del Proyecto actual.

En este momento está en proceso de inicio la obra física, al igual ya en ejecución la parte financiera

Ya que es un proyecto que se ejecutara en una sola etapa se pretende el proyecto se ejecutara en un periodo no mayor de 6 meses. por lo difícil que es el acceso para poder llevar materiales hasta el lugar en donde se encuentra el proyecto y por la tardanza en que llegan las transferencias a la municipalidad, lo que dificulta pagar el aporte acordado por ambas partes.

Costo de finalización Proyecto

Costo Total: Lps.50,000.00

Vigente: Lps.50,000.00

Devengado: Lps.8,000.00

Pagado: Lps.8,000.00

Pendiente a ejecutar: Lps.42,000.00

Con una ejecución de un 16.00%

Además, la municipalidad brinda su aporte Con material Local
=arena, grava piedra en caso de ser necesario.

Fecha de finalización proyectada

Mayo del 2022 de la obra física.

Ejecución Del Proyecto

14. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor 6 meses en caso de necesitarse más tiempo pues se tomaría en cuenta esto por la dimensión del proyecto a ejecutar y por la localización del lugar en donde se ubicara el proyecto de agua en general incluyendo la línea de conducción y la red de distribución para abastecer al proyecto de agua, el cual por el momento lleva una excelente ejecución física de la obra, esperando se pueda concluir en tiempo y forma.

De lo planificado ya se tiene un buen avance financiero, según cantidad otorgada por la municipalidad (levantamiento de Topografía) en cuanto a lo financiero de un **16.00%**, En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía asignada la cantidad de **Lps.50,000.00** y lo real que se ha devengado es la cantidad de **Lps.8,000.00** y pagado la Cantidad de **Lps.8,000.00** quedando por ejecutar la Cantidad de **Lps. 42,000.00**

Variación en el costo total del Proyecto.

Como en todo proyecto existen variaciones, en este caso, como es un proyecto apenas inicia, no ha presentado muchas variaciones solamente financieramente ya que el proyecto se paga en la medida que ingresan las transferencias. Pero no existe otra variación.

Costo de finalización Proyectado

Costo Total: **Lps.50,000.00**

Vigente: **Lps.50,000.00**

Devengado: **Lps.8,000.00**

Pagado: **Lps.8,000.00**

Pendiente a ejecutar: **Lps.42,000.00**

Con una ejecución de un 16.00%

Además, la municipalidad brinda su aporte Con material Local =arena, grava piedra en caso de ser necesario.

Fecha de finalización proyectada

Mayo de 2022 en la obra física

18.-Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Por el momento no existen variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto en vista que apenas acaba de iniciar y se tiene una fecha de ejecución para terminar en 6 meses todo el proyecto, pero en caso de tardarse se ampliara, es necesario mencionar que ya se levantó el estudio topográfico de la obra y de esa manera adquirir todos los materiales para hacer toda la obra y a la vez se está manejando a través del diseño y presupuesto del proyecto.

15. Razones de los cambios antes mencionados.

No han existido cambios de mucha relevancia solamente en cuanto a fecha de finalización de obra física, por lo demás se ha realizado el proyecto conforme a lo planificado y se había planificado la compra de materiales y obra física concluida en Junio Lo cual no fue posible, pero si hay buen avance, quedando solamente pocos detalles del proyecto en mención.

Anexos

Se adjuntan fotografías del proyecto en mención hasta dónde va el proyecto actualmente. A continuación, fotografías tomadas en sitio de tanque

Sitio de Tanque











Ficha de Proyecto



NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de Centro de Salud, Aldea Tejeras, Lepaera,
Lempira

Lepaera, Lempira Enero de 2022

Honduras Centro América



María Reséndiz Lara Castro
Jefe de la Unidad Técnica
de Gestión.

Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto: Construcción de Centro de Salud, Aldea Tejeras, Lepaera, Lempira

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Centro de Salud, Aldea Tejeras Lepaera, Lempira

.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social (SALUD)

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Centro de Salud de la comunidad de Tejeras Lepaera, Lempira

4.- Ubicación del Proyecto.

El Proyecto se encuentra localizado en la comunidad de Tejeras del Municipio de Lepaera en el Dpto. de Lempira a 5 Km de la cabecera Municipal.

5.- Propósito

Contar con un Local adecuado en donde se le brinde una eficiente asistencia médica a todos los pacientes que a diario visitan el centro de Salud de la comunidad de Tejeras, con un ambiente de seguridad por contar con un espacio que reúna los requisitos de calidad.

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en Construir un Centro de Salud de la comunidad de Tejeras, en donde se realizarán los siguientes trabajos : Construcción de arranques, Levantamiento de paredes, acondicionamiento de módulos sanitarios con sus respectivos lavabos, los módulos con sus paredes repelladas, y pulidas, techado de los respectivos módulos, en donde se utilizarán los siguientes materiales como ser: cemento, hierro de $\frac{1}{2}$, Hierro de $\frac{3}{8}$, bloque de 5", manguera, cerámica ,Lamina de Alucín, sanitarios y otros accesorios que son de mucha importancia para el proyecto, y también Colocación de Puertas en diferentes áreas los cuales se ubicarán en un terreno que es propiedad del mismo centro de salud. una vez terminado será utilizado por los pacientes que a diario reciben asistencia médica.

7. Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto.**
- 1. Contar con un centro de Salud que reúna todas las características necesarias para la atención de pacientes que a diario visitan este centro asistencial.
- Que el local cuente con módulos sanitarios y lavabos para que los pacientes y médicos le den el uso adecuado.
- 2. Mejorar en un **85%** las condiciones de Salud e higiénicas para los pacientes de la comunidad del Tejeras y demás comunidades del municipio.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección del terreno donde se construirá la obra, o se harán las

mejoras para verificar que no sean destruida la vegetación esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la construcción no se haga en una zona de riesgo. En este caso no fue necesario tanto tramite porque ya estaba local para reuniones en ese predio.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente ya se cuenta con un terreno legalmente escriturado, el cual es propiedad Municipal y está ubicado en un lugar que reúne las condiciones básicas como ser: Agua Potable, electrificación y de fácil acceso.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara,
jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: secretaria de Salud, Plan en Honduras, FHIS, CEPROD, embajada de Japón y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento el financiador directo es la Municipalidad como principal financiador la cual a su vez apoya con la mano de Obra Calificada y materiales locales

como ser: Piedra, Grava y Arena. Para la ejecución del Proyecto, esas actividades a realizar con Fondos propios y fondos provenientes de las transferencias.

Presupuesto del Proyecto.

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal y para el cual a su vez se firmó una carta acuerdo con secretaria de Salud y la municipalidad.

Estado Actual del Proyecto.

En este momentos está en proceso de ejecución , ya construidas a nivel de paredes e iniciando otras áreas

11. Costo de finalización Proyectado

Costo Total: L.255,000.00

Aporte Municipal Vigente: L.255,000.00

Devengado: **Lps.67,000.00**

Ejecutado: Lps. **67,000.00**

Pendiente a ejecutar: Lps.188,000.00

Fecha de finalización proyectada

2022 financieramente

12. Ejecución Del Proyecto

13. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 7 meses por la cantidad de actividades a realizarse en el proyecto y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la fuente financiamiento como ser: **La secretaria de Salud y la Municipalidad**. Es necesario mencionar que falta ejecutar actividades ya de menor costo, pero se cuenta con fondos ya comprometidos por parte de la municipalidad.

La municipalidad está supervisando el proyecto permanentemente, en vista que, aunque ya se quieren utilizar las instalaciones porque es una prioridad, quedan pequeñas actividades inconclusas que es necesario darles continuidad, pero son actividades de menor costo pero que no dejan de ser importantes.

14. Variación en el costo total del Proyecto.

Si como en todo proyecto hay variaciones, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia por utilizar es muy grande, en vista que se habían presupuestado en el aporte municipal **Lps. 255,000.00** y solo se ha ejecutado hasta la fecha **L. 67,000.00** quedando disponible **Lps. 188,000.00** pero en este caso se deben pagos pendientes de materiales locales y mano de obra calificada, estos pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado.

Monto Solicitado:

Costo Total: L.255,000.00

Aporte Municipal Vigente: L.255,000.00

Devengado: Lps.67,000.00

Ejecutado: Lps. 67,000.00

Pendiente a ejecutar: Lps.188,000.00

Fecha de finalización proyectada

2022 financieramente

Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Como en todo proyecto siempre existen variaciones ya sea climáticas o de tipo financiero, pero más que todo financiero en nuestro municipio lo que afecta grandemente es que los proyectos se ejecutan en la medida en que las transferencias se perciben, esto dificulta grandemente la ejecución de los proyectos, ya que las ferreterías locales con las que contamos no siempre tienen los materiales que necesitamos o no dan al crédito. En cuanto al clima si ha habido algunos contra tiempo, pero en menor escala, por estas razones hubo variación en cuanto a la duración del proyecto en vista que se tenía planificado para terminar en tres meses tiempo máximo, pero se tardó más de tres meses todas las actividades del proyecto, además de eso que no solo ese proyecto se estaba ejecutando, hay más proyectos llevándose a cabo al mismo tiempo y esto también es un atraso.

Al final el proyecto se está ejecutando de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para los beneficiarios directos, ambas se han portado a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización de la obra en mención.

15. Razones de los cambios antes mencionados.

Solo hubo dos razones por las cuales no se le ha dado el avance necesario el proyecto en el tiempo previsto:

- 1.- Lentitud en que llegan las transferencias a la Municipalidad que es uno de los cooperantes del proyecto.
- 2.- El Clima, que es un factor inevitable, pero que nos afecta grandemente.
- 3.- Existen otros proyectos ejecutándose al mismo tiempo, lo que dificulta terminar en el tiempo previsto.

Anexos

Avance mes de septiembre















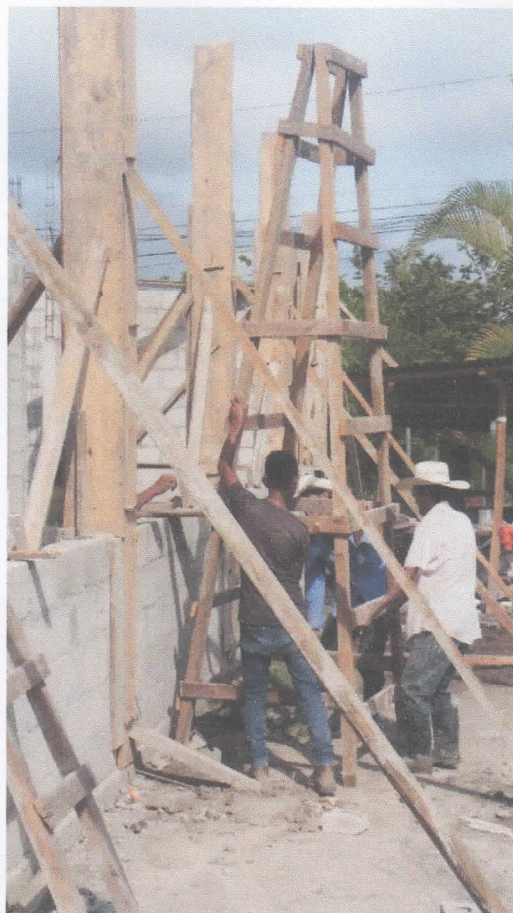

Antes







Municipio de Lepaera Departamento de Lempira



NOMBRE DEL PROYECTO:

Pavimentación de Calles de iniciando frente a casa del Sr. Rosa Mateo Hasta casa de la señora Herminia villanueva en Barrio San Juan en Lepaera en el Dpto. de Lempira

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Barrio San Juan de Lepaera, Lempira.

ORGANIZACIÓN PROPONENTE Y RESPONSABLE:

La Municipalidad de Lepaera, Lempira

Email: lepaera2006@yahoo.com

Lepaera Lempira

Enero de 2022



Costa Rica
Mano Rosa
Jefe de la Unidad Técnica
de Gestión Municipal

Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Pavimentación de Calles de iniciando frente a casa del Sr. Rosa Mateo hasta casa de la señora Herminia Villanueva en Barrio San Juan Lepaera en el Dpto. de Lempira

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social (componente Vial)

3.- Nombre del Proyecto

Pavimentación de Calles de iniciando frente a casa del Sr. Rosa Mateo Hasta casa de la señora Herminia Villanueva en Barrio San Juan Lepaera, Lempira

4.- Ubicación del Proyecto.

El municipio de Lepaera se encuentra ubicado al Norte del departamento de Lempira en el occidente de Honduras C.A. El proyecto se pretende realizar en el Barrio San Juan específicamente de calle que inicia desde casa del Sr. Rosa Mateo hasta casa de Herminia Villanueva en Barrio San Juan en Lepaera en el Dpto. de Lempira

5.- Propósito

Mejorar las Condiciones del Municipio a través de la pavimentación de **11.20** metros Cuadrados de calle que inicia desde casa Pavimentación de Calles de iniciando frente a casa del Sr. Rosa Mateo hasta Cancha de Vida Mejor barrio San Juan en Lepaera en el Dpto. de Lempira

6.- Descripción del Proyecto.

Este proyecto consiste en la construcción de enchapado **11.20** Metros cuadrados de Calle de pavimento desarrollado de la siguiente manera: Largo :**77** Metros Lineales Ancho : **5.97** Metros Lineales con una rea de construcción de **459.69 Mtrs** Cuadrados se incluye bordillo de cemento, de calle que inicia desde casa del Sr. Rosa Mateo **hasta**

casa de Herminia Villanueva ,Barrio San Juan en Lepaera en el Dpto. de Lempira

Este proyecto se necesita porque en invierno se dificulta el tránsito para los pobladores y para el transporte ya que podrán tener una mejor comunicación y acceso en el barrio San Juan y el Parque de Vida Mejor específicamente y es necesario mencionar que ya cuenta con un buen porcentaje de calles pavimentadas durante años anteriores. Y ya se tiene B.V de la Corporación Municipal para darle seguimiento a la parte financiera en el presente año 2021 a este tipo de proyecto.

En la actualidad urge la pavimentación de estas carreteras para poder restablecer la comunicación - con la ejecución de este proyecto se benefician unos **17 familias directamente y 500 habitantes** que indirectamente usan diariamente estas vías de comunicación para el traslado de sus bienes de consumo , La modalidad para Construcción de este tramo será con mano de obra contratada directamente por la municipalidad y así beneficiar a **17 Familias** por un espacio de 2 meses o según sea la duración del proyecto en mención., ya que cada ruta tiene su duración respectiva eso depende la cantidad de metros a ejecutar y así mismo se realizan los pagos

7. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto.

La mayoría de municipios de lempira enfrentan problemas de infraestructura de las calles municipales debido a las fuertes tormentas, los barrios y colonias son los que sufren las consecuencias debido a que no puede haber comunicación, el invierno copioso causo severos daños a red vial de la zona urbana el cual destruye dichas calles.

Con esta modalidad **Pavimentación de calles** buscamos mejorar la comunicación del Barrio el centro, Barrio delicias, San Juan y a los diferentes barrios que tiene el municipio de Lepaera lempira el cual incorporaremos a la población a las actividades de mejora y rehabilitación de sus vías de acceso además generar empleo temporal para aquellas familias que se encuentran en rango de pobreza.

Para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto, que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser Recolección de información para llevar a cabo el presente proyecto, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede

a informar a la población de Lepaera como ser: beneficiarios directos para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras preliminares. Pero el ejecutor directo es la Municipalidad que es quien contrata el personal especializado para este tipo de proyecto.

8. Impacto Ambiental.

El presente proyecto por ser un proyecto de infraestructura por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro, Unidad Técnica de Gestión y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección de la zona donde se ejecutará el proyecto de pavimentación para verificar que no sean destruida las áreas verdes esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la pavimentación no se haga en una zona de riesgo sea donde haya viviendas que puedan quedar a la deriva o donde ya está el proyecto de alcantarillado. Ya que si no existe un alcantarillado Sanitario no es posible ejecutar el proyecto.

Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente ya se cuenta con la supervisión directa del Ing. de la Mancomunidad Puca en donde se define claramente los metros a pavimentar, el diseño y define si no hay problemas con alguna propiedad ya que la ruta a pavimentar son calles establecidas y bien definidas por el dpto. De catastro. Y a la vez ya se cuenta con los permisos respectivos, en caso de que fuese necesario.

9. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo,

Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Mauricio Avalos

Ing. Mancomunidad Puca, supervisor de proyectos

Cel. 9655-4401

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: FHIS, SOPTRAVI Municipalidad, Fondo Vial y FONDO CAFETERO NACIONAL.

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo el principal financiador es FHIS y la Municipalidad, ya sea con fondos propios o fondos provenientes de las transferencias ya que cuenta con su propia maquinaria, a la vez cuando son reparacion y mantenimiento de carreteras brinda su aporte El Fondo Cafetero, un comité provisional que se organizó y beneficiarios apoyan con el cuneteo y con la alimentación de las personas que operan la maquinaria a utilizar.

10. Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal, se realizaron las respectivas cotizaciones., y luego de su análisis se procedió a la elección de la cotización mas baja.

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal con la presencia de representantes de la comisión Ciudadana de Transparencia, que siempre están presentes en cualquier reunión que se realiza en la municipalidad.

Estado del Proyecto actual.

En este momento el proyecto ya está en proceso de ejecución en un **64.65% financiero** en el mes de septiembre de 2021 y **70%** ejecución física. Pero se sigue trabajando en la obra ya que al hacer la supervisión se verifico que hay una zona que nesecita hacerse embaulamiento porque hay unas crecientes de agua que han hecho zanjones y no se puede continuar por esa razón. Es necesario mencionar que falta pavimentar otras del casco urbano, pero una vez concluido el sistema de agua Nuevo y parte de barrios que hacen falta el sistema Alcantarillado en algunas zonas específicamente de barrio el Calvario y Barrio El Centro que por el momento no se realizó conforme a lo aprobado.

Costo de finalización Proyectado

Aporte Municipal: Lps. 171,000.00

Vigente: Lps. 171,000.00

Devengado: Lps. 25,000.00

Ejecutado: L.25,000.00

Pendiente a ejecutar: Lps.146,000.00

Fecha de finalización proyectada

Financiero octubre de 2022

11. Ejecución Del Proyecto

12. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 2 meses, por ser un proyecto que no es muy complicado realizarse en el proyecto y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la **Municipalidad**. Podemos mencionar que hasta donde esta según ruta ejecutada ha sido muy buen avance, es decir que el proyecto está acorde a lo planteado en el contrato mpal. lógicamente existen variaciones, pero no de mucha relevancia, el proyecto en mención se planifico a ser concluido en el mes de Octubre de 2021 dependiendo el clima y otros factores externos no se para la ejecución del proyecto.

seguirá dando el aporte financiero hasta concluir el proyecto ya que en este periodo se ejecutó un **100% la parte física de la primera etapa. siempre pendiente pago financiero de la obra.**

Variación en el costo total del Proyecto.

Las variaciones han existido como en todo proyecto, ya que el clima afecto grandemente la fecha acordada para el primer tramo., y también en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia en este periodo es muy grande ya que se tenía que ejecutar **Lps.171,000.00** según lo asignado y se devengo: **Lps.25,000.00** quedando pendiente de ejecutar: **Lps.146,000.00**

Este es de acuerdo al avance físico el cual es muy significativo ya que es de un 100% hasta donde va ese tramo. Y el financiero es de **14.62%**, Pero los pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal. Ya que es un proyecto Continuo.

Monto Solicitado:

Total, del proyecto Pavimentación de Calles de iniciando frente a casa del Sr. Rosa Mateo hasta casa de la sra. Herminia Villanueva pasando en Barrio San Juan en Lepaera en el Dpto. de Lempira

Costo de finalización Proyectado

Aporte Municipal: **Lps. 171,000.00**
Vigente: **Lps. 171,000.00**
Devengado: **Lps. 25,000.00**
Ejecutado: **L.25,000.00**
Pendiente a ejecutar: **Lps.146,000.00**

Fecha de finalización proyectada

Financiero agosto de 2022

Fecha de finalización proyectada

Octubre de 2021 Físico y Financiero diciembre de 2022 se seguirá enviando informe financiero hasta completar el aporte municipal, aunque la obra esté concluida.

13. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Existieron algunas variaciones en cuanto a la fecha de finalización y la parte técnica, ya que en el momento estando ya finalizado la primer etapa se verifico que hay un tramo el cual está incluido y no se le puede dar continuidad porque se ha hecho un agujero debido a las fuertes lluvias ,para lo cual es necesario hacer un embaulamiento y cuneteo de

de estas calles pero estas dificultades serán resueltas de manera satisfactoria en fechas posteriores entre el maestro de obra e ing. a cargo del proyecto, en cuanto a la duración no hay variación, ya que la exigencia era que se debía terminar este primer tramo en un periodo 2 meses , pero si se ha cumplido con el avance de la obra mencionada hasta cierta parte faltando otros dos tramos uno corto y otro largo y ya se lleva avance del tramo número dos y tramo final esta en espera , podemos decir que si se cumplió en periodo todas las actividades relacionadas con el proyecto, algo que afectó un poco fueron las condiciones climáticas de la zona y la tardanza para el depósito de las transferencias a la municipalidad.

El proyecto se está ejecutando por el momento es decir la obra física lo cual es de mucha satisfacción para la municipalidad como para los habitantes del casco urbano, y es necesario mencionar que la municipalidad ha cumplido con los pagos hasta la etapa en que el proyecto se encuentra actualmente, porque, aunque bien es cierto de la lentitud en los pagos estos no se retrasan mucho, porque de ello depende la continuidad del proyecto.

Razones de los cambios antes mencionados.

Como mencione anteriormente hubo algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar que afectó en el sentido que al haber lluvia se detienen los proyectos, pero fue en un tiempo corto. Ya que no se puede posponer mucho tiempo. Hubo variación también en cuanto al pago de la obra física ya que esta se paga conforme ingresan las transferencias a la municipalidad.

ANEXOS.

-- Fotografías Proyecto Pavimentación de Calles

Antes



Proyecto Pavimentación Barrio San Juan de Don Rosa Mateo hasta parque



de Vida Mejor. Ejecución









Avances





