



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTA ACLARATORIA

PARA: Thelma Yolibeth de la O Pineda
Oficina de información pública

DE: Luis Fernando Martínez
Desarrollo comunitario y proyectos

En respuesta a la solicitud enviada el 01 de Abril del presente año con numero No: OIP-005-01-04-2022 por la oficina de información pública, sobre la ejecución de proyectos; le comunico que en el mes de Marzo del año mencionado se hizo el proceso de cotización del proyecto PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRISAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE.

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente nota a los 07 días del mes de Abril del año 2022.


Luis Fernando Martínez Avila
Desarrollo comunitario/proyectos





Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia

Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	MATELCY
2. Sector o Sub sector:	De la colonia Francisco Bustillo
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de obra eléctrica de la colonia Habitacional Francisco Bustillo.
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Con la ejecución de este proyecto pretendemos resolver problemas de inseguridad, Con la Iluminación permanente en las calles de la colonia francisco Bustillo Gonzales, Además mejorar, El ingreso per Cápita por familia con la venta de mano de Obra calificada mediante. La instalación de, Carpintería, barberías, pulperías etc.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	Mejorar el ingreso percapita Prevención de robos Mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto propuesto consiste en la en instalación de red eléctrica para la nueva colonia francisco bustillo que fue construidas con fondos de la alcaldía municipal y la institución no gubernamental CEPUDO, la distancia anda en un aproximado de 1 km de tendido eléctrico llevando un trasformador de 240 voltios la instalación de 8 postes para tendido eléctrico primario y 14 postes de tendido eléctrico secundario, el proyecto se pretende terminar en 15 días calendario.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a más de 187 personas que tendrán luz eléctrica en cada una de sus viviendas.
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	No aplica
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo	Lps. 114,822.50



exacto, mostrar una proyección del mismo):				
7. Fecha de Finalización:	01/04/2022			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
final	En esta etapa se instaló la red energética que a la colonia Francisco Bustillo	22/03/2022 al 01/04/2022	Luis Fernando Martínez	Disminución de asalto a la población
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 100.00%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA			



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario y Proyectos





LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
 ALCALDE MUNICIPAL
 CEL. 9918-3582

E-mail: muncane@yahoo.com

COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores:
 Presente: Carlos Rainiary Yanes (MATELCY)

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precios, especificaciones especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos y nos la devuelva debidamente firmada y sellada en un sobre.

Firma autorizada y sello

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	710 mts Lineales	Instalación de tendido eléctrico líneas primarias	20.00	14,200.00
2	3,869 mts Lineales	Instalación de tendido eléctrico líneas secundarias	12.5	48,300.00
3	1	Instalación de transformador	7,000.00	7,000.00
4	22	parado de postes de madera	900.00	19,800.00
5	18	Instalación de retenidas	300.00	5,400.00
6	22	Excavación de agujeros para postes	320.00	7,040.00
7	18	Excavación de agujeros para retenidas	320.00	5,760.00
8	22	Revestimiento de postes para tendido de líneas.	330.00	7,260.00
	ul.....		
		Total.....		714,822.50

Cane, La Paz _____ de _____ del 2022


 Firma y Sello



080J 196303395
 Número de Identidad



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
CEL. 9918-3582
E-mail: municane@yahoo.com

COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores:

Presente:

Walter David Guzmán

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precios, especificaciones especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos y nos la devuelva debidamente firmada y sellada en un sobre.

Firma autorizada y sello

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	710 mts Lineales	Instalación de tendido eléctrico líneas primarias	24.00	17,040.00
2	3,869 mts Lineales	Instalación de tendido eléctrico líneas secundarias	13.00	50,297.00
3	1	Instalación de transformador	7,500.00	7,500.00
4	22	parado de postes de madera	1,000.00	22,000.00
5	18	Instalación de retenidas	310.00	5,580.00
6	22	Excavación de agujeros para postes	300.00	6,600.00
7	18	Excavación de agujeros para retenidas	300.00	5,400.00
8	22	Revestimiento de postes para tendido de líneas.	400.00	8,800.00
	ul.....		
		Total.....		123,217.00

Cane, La Paz de del 2022

Walter David Guzmán
Firma y Sello
INGENIERO CIVIL
15-10-12
24-10-12
C.I.C.H. No. 5028

1204-1982-00038

Número de Identidad



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
CEL. 9918-3582
E-mail: municane@yahoo.com

COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores:

Presente. Jorge Ivan Avila

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precios, especificaciones especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos y nos la devuelva debidamente firmada y sellada en un sobre.

Firma autorizada y sello

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	710 mts Lineales	Instalación de tendido eléctrico líneas primarias	25.00	17,750
2	3,869 mts Lineales	Instalación de tendido eléctrico líneas secundarias	13.00	50,297
3	1	Instalación de transformador	8,500.00	8,500
4	22	parado de postes de madera	1,000.00	22,000
5	18	Instalación de retenidas	320.00	5,760
6	22	Excavación de agujeros para postes	330.00	7,260
7	18	Excavación de agujeros para retenidas	330.00	5,940
8	22	Revestimiento de postes para tendido de líneas.	350.00	7,700
	ul.....		
		Total.....		125,207.00

Cane, La Paz _____ de _____ del 2022

Jorge Ivan Avila Ventura

Firma y Sello

1204-1988-00058

Número de Identidad



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2022

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14602

L.: 106,928.45

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10904

Fecha de Emisión: 1/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CARLOS REINIERY YANES AGUILAR

Id/RTN: 0801196303395

La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago a contrato del Proyecto de Electrificación de la colonia Francisco Bustillo primera Etapa y Ampliación el la Lotificación Brizas del Carbonal casco urbano del Municipio de Cane.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento y Reparacion al Sistema de Energia Electrica Barrio El Porvenir, San Francisco, La Violeta, Colonia Jose Rosario Tejeda y la Colonia Villa Linda Etapa I Y II	106,928.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	106,928.45
Monto Total:		106,928.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	106,928.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	106,928.45

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Carlos Reiniery Yanas Aguilar
 Identidad No.: 0801196303395

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFiyZKrWnypbVScrxL6yoD8REF0egE+;2qdcu3fn0NJsCIPrNUakUWmG1ZOIHfnMkIDus0cgbTwpQ==

MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ

PROYECTO: " DE ELECTRICIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICADORA BRISAS DEL CARBONAL. CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE".

UBICACION: BARRIO LOTIFICADORA BRISAS DEL CARBONAL, COLONIA FRANCISCO BUSTILLO, CANE, LA PAZ

EJECUTOR: MATELCY

PERIODO DEL: 22 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2022

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE			EJECUTADO ANTERIOR			EJECUTADO ACTUAL			ACUMULADO FINAL			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	%
1	Instalacion de tendido electrico lineas primarias	ML	710	20	14200	710	14200	710	14200	710	14200	710	14200	100
2	Instalacion de tendido electrico lineas secundarias	ML	3869	12.5	48362.5	3869	48362.5	3869	48362.5	3869	48362.5	3869	48362.5	100
3	instalacion de transformador	UNIDAD	1	7000	7000	1	7000	1	7000	1	7000	1	7000	100
4	parado de postes de madera	UNIDAD	22	900	19800	22	19800	19800	19800	19800	19800	19800	19800	100
5	instalacion de retenida	UNIDAD	18	300	5400	18	5400	18	5400	18	5400	18	5400	100
6	excavacion de agujeros para postes	UNIDAD	22	320	7040	22	7040	22	7040	22	7040	22	7040	100
7	excavacion de agujeros para retenida	UNIDAD	18	320	5760	18	5760	18	5760	18	5760	18	5760	100
8	revestimiento de postes para tendido de lineas	UNIDAD	22.00	330	7260	22.00	7,260.00	22.00	7260	22.00	7260	22.00	7260	100
	TOTAL				114,822.50									
	TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO				114,822.50								114,822.50	100.00


ESTIMACION 1	114,822.50
RETECION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA	5,741.13
RETECION DEL 12.5%	2,152.92
TOTAL A PAGAR	106,928.45



[Signature]
CONTRATANTE



[Signature]
CONTRATISTA



[Signature]
SUPERVISOR

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRIZAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE. CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2022
-----------------------	---	-----------

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRIZAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE."

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Nombre del contratista: CARLOS REINIERY YÁNEZ "MATELCY"

Nombre del supervisor: ing. LUIS FERNANDO MARTINEZ AVILA 'DC/P

Fecha de presentación del informe: 22 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2022

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación Estimación:
A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio
2. Días no trabajados por fuerza mayor:
Todos los días se trabajaron.
3. Contratista/ CARLOS REINIERY YANEZ "MATELCY"
Responsable de obra: CARLOS REINIERY YANEZ "MATELCY"

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo100.00%

Porcentaje acumulado ejecutado.....100.00%

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRIZAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE. CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Estos porcentajes deberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....	100.00%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....	100.00%
Porcentaje acumulado ejecutado.....	100.00%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados se han realizado siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor. El trabajo realizado por el contratista sobre el tendido eléctrico se hicieron en base a lo estipulado en el contrato y siguiendo las medidas de seguridad que garantiza el buen funcionamiento de los técnicos.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión a este proyecto se hace constante por lo menos una 3 veces durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por el ejecutor, que provoquen daños a las personas que transitan la calle.

En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

- Instalación de tendido eléctrico líneas primarias
- Instalación de tendido eléctrico líneas secundarias
- Instalación de transformador
- parado de postes de madera
- Instalación de retenidas
- Excavación de agujeros para postes
- Excavación de agujeros para retenidas
- Revestimiento de postes para tendido de líneas.

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace durante los días lunes a viernes, en un horario entre las 8am hasta las 5 pm.

Los trabajos hasta que finalizan aproximadamente a las 6 de la tarde.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:

No hay ninguna recomendación

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRIZAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE. CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Firma del supervisor: _____

Lugar (municipio de Cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación: 01 de Abril del año 2022



AVANCE FINANCIERO

INFORME DE SUPERVISION

Proyecto: "DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRIZAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE."

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 22/03/2022- 01/04/2022 en base a la primera estimación.

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	114,822.50	100.00%
Deducción del 5% de calidad	5,741.13	100.00%
Estimación 1	114,822.50	100.00%
Deducción del 12.5%	2,152.92	100.00%
AVANCE FINANCIERA		100.00%

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRIZAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE. CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	5,741.13	100.00%
Deducción del 12.5%	2,152.92	100.00%
ESTIMACION 1	114,822.50	100.00%

RETENCIONES

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	5,741.13
DEDUCCION DEL 12.5%	2,152.92

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRIZAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE. CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ



FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

"PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRIZAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE."

Ubicación del proyecto: CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ

MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRIZAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE. CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

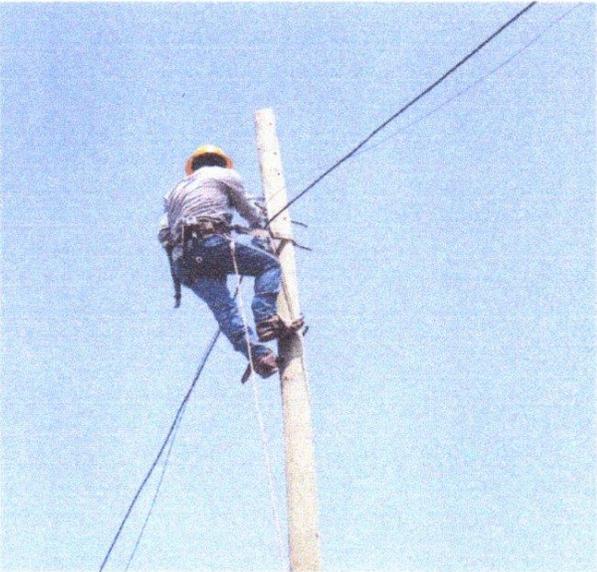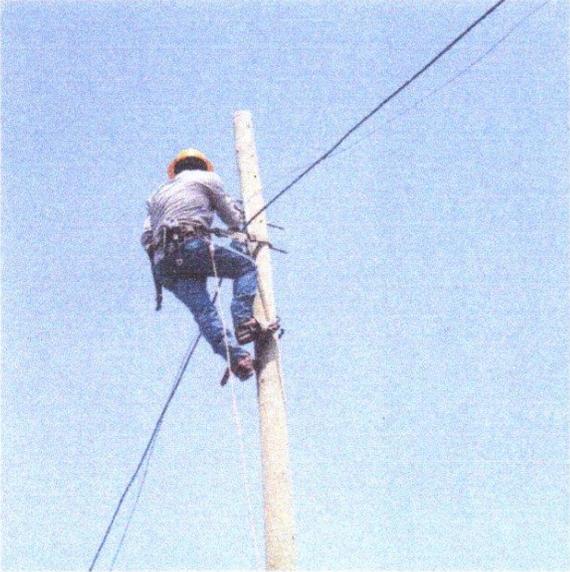

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRIZAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE. CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA FRANCISCO BUSTILLO PRIMERA ETAPA Y AMPLIACION EN LA LOTIFICACION BRIZAS DEL CARBONAL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE. CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE". Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

