



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTA ACLARATORIA

PARA: Thelma Yolibeth de la O Pineda
Oficina de información pública

DE: Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario y Proyectos

En respuesta a la solicitud enviada el 01 de Septiembre del presente año con numero-No: OIP-005-01-09-2022 por la oficina de información pública, sobre la ejecución de proyectos; le comunico que en el mes de AGOSTO se culminó el proyecto COT-CANE-02-2022, "REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente nota a los 13 días del mes de Septiembre del año 2022.



Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia

Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	Maestro de obra, Domingo Ávila Macías
2. Sector o Sub sector:	Barrio el Porvenir
3. Nombre del Proyecto:	"PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Con la ejecución de este proyecto se pretende mejorar el centro social caneños para futuras actividades sociales ya que presenta deterioros en la parte del piso. Para darle una buena atención a población se construirá un área de ventas de bebidas.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	Construcción de área de ventas de bebidas Mejorar el servicio a la comunidad Mejorar el centro social.
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto consiste en la construcción de una área de bebidas de 7x4 metros, la mejora del piso de escenario que tiene una medida de 76.3 m2, piso del pasillo lado este 46.78m2 y pasillo oeste 55.22 m2 y la reparación de los sanitarios.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 5190 personas que es la población de la comunidad del municipio de Cane.
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	el contrato se firmó el 13 de junio, teniendo una vigencia de 90 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. 405,815.83
7. Fecha de Finalización:	15/09/2022
Detalles del Proyecto	



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
FINAL	En esta etapa se instaló piso del corredor lado este y oeste	04/07/2022 al 22/07/2022	Luis Fernando Martínez	Instalación del piso del escenario. Instalación del servicios sanitarios
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 100.00%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA			


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y Proyectos





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2022
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15003

L.: 35,120.72

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11310

Fecha de Emisión: 23/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DOMINGO AVILA

Id/RTN: 1204196600053

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de la quinta estimación de contrato por el Proyecto de Reparación del centro social Caneño ubicado en el barrio El Porvenir casco Urbano por el monto de L. 35,120.72

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 001 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento Y reparación de Edificios Municipales (Centro Social Caneño, Cementerio Municipal)	35,120.72

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,120.72
Monto Total:		35,120.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,120.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,120.72



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: DOM

Identidad No.: 1204196600053

0s+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94f6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFiyZKrwNypbVScrxL6yoD8REF0egE+j2qdclu3fn0NJsCIPrNUakUWmG1ZOtHfmMklDus0cgbTwpQ==



MUNICIPALIDAD DE CANE LA PAZ

Lic. Francisco Bustillo G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org
R.T.N. 12049995434017

RECIBO N° 11486

Por Lps. **35,520.72**

Recibí de la Tesorería Municipal:

La Cantidad de: Trenta y cinco mil cinco veinte con 72/100 ctls

Por Concepto de: Pago de los Ocho Ocho Estimaciones de Contratos del Proyecto de Reparación del Centro Social Comunal del

Dirección de Domicilio: B- San pablo Municipio de Cane.

Teléfono / Celular:

Imprenta Rios: Tel.: 2771-8063 / 9952-2967 R.T.N. 03011964011686 20 tal del 10,801 en adelante 20-05-2022

Fecha de Pago: 23 de Agosto del 2022

Domingo Avila

Nombre

[Firma]

Firma

12041966300053

Identidad

ESTIMACION No 5
MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ
PROYECTO: "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIALCANEÑO, CANE
UBICACIÓN: BARRIO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE CANE, DEPTO DE LA PAZ
EJECUTOR: DOMINGO AVILA
PERIODO DEL: 04 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2022

N°	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD		TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE CACETA PARA VENTA DE CERVEZA "BAR"												
1	Trazado y marcado	JDR	22	15.47	340.34	22	340.34			22.00	340.34	100
2	Excavación	M3	8.96	299.250	2,681.28	8.96	2,681.28			8.96	2,681.28	100
3	Mampostería	M3	8.96	2,000.00	17,920.00	8.96	17,920.00			8.96	17,920.00	100
4	Fundición de solera inferior 20cm	ml	11	1,800.50	19,805.50	11	19,805.50			11.00	19,805.50	100
5	Pared de bloque de 5"	M2	15.6	4,000.00	62,400.00	15.6	62,400.00			15.60	62,400.00	100
6	Fundición de castillos 15x15cm	ml	10.5	170.00	1,785.00	10.5	1,785.00			10.50	1,785.00	100
7	Fundición de solera superior 15cm	ml	10.4	380.00	3,952.00	10.4	3,952.00			10.40	3,952.00	100
8	Repello y pulido	M2	31.2	175.42	5,473.10	31.20	5,473.10			31.20	5,473.10	100.00
9	Compactación de material selecto	M3	5.17	750.00	3,877.50	5.17	3,877.50			5.17	3,877.50	100
10	Fundición de losa de 5cm	M2	25.84	382.67	9,888.19	25.84	9,888.19			25.84	9,888.19	100
11	Instalación de piso mosaico	M2	25.84	480.00	12,403.20	25.84	12,403.20			25.84	12,403.20	100
12	Instalación de techo 7x4m	UND	1	6,000.00	6,000.00	1.00	6,000.00			1.00	6,000.00	100
13	Construcción de un bar	M2	3.5	216.60	758.10	3.50	758.10			3.50	758.10	100
14	Construcción de acera en caceta de 7x1.70m	M2	11.9	216.60	2,577.54	11.90	2,577.54			11.90	2,577.54	100
15	Piso de concreto avenida de 4.10x1m	M2	4.1	216.60	888.06	4.10	888.06			4.10	888.06	100
SUB TOTAL					150,749.82		150,749.81		0.00		150,749.81	100.00
REPARACIÓN DEL ESCENARIO DEL CENTRO SOCIAL												
16	Demolición de piso existente	M2	76.3	10.11	771.39	76.30	771.39			76.30	771.39	100
17	Retiro de material existente de escenario	M3	59.51	80.00	4,760.80	59.51	4,760.80			59.51	4,760.80	100
18	Compaciación con material selecto "escenario"	M3	45.78	750.00	34,335.00	45.78	34,335.00			45.78	34,335.00	100
19	Instalación de piso mosaico	M2	76.5	480.00	36,720.00			76.50	36,720.00	76.50	36,720.00	100


SUB TOTAL					76,587.19	39,867.19	36,720.00	76,587.19	100
CORREDOR LADO ESTE									
20	Demolición de piso existente	M2	46.78	10.11	472.95	46.78	472.95	46.78	100
21	Retiro de material existente	M3	30.41	80.00	2,432.80	30.41	2,432.80	30.41	100
22	Compactación con material selecto	M3	23.39	750.00	17,542.50	23.39	17,542.50	23.39	100
23	Instalación de piso mosaico	M2	46.78	480.00	22,454.40	46.78	22,454.40	46.78	100
SUB TOTAL					42,902.65		0.00	42,902.65	100.00
CORREDOR LADO OESTE									
24	Demolición de piso existente	M2	55.22	10.11	558.27	55.22	558.27	55.22	100
25	Retiro de material existente	M3	35.89	80.00	2871.2	35.89	2871.20	35.89	100
26	Compactación con material selecto	M3	27.61	750.00	20707.5	27.61	20707.5	27.61	100
27	Instalación de piso mosaico	M2	55.22	480.00	26505.6	55.22	26505.6	55.22	100
SUB TOTAL					50,642.57		0.00	50,642.57	100.00
REPARACION DE AREA DE BAÑOS DE MUJERES Y VARONES									
28	Remover sanitarios y urinarios	UND	7	86	602	7	602	7	100
29	Demolición de paredes	M2	16.028	31.19	499.91	16.028	499.91	16.028	100
30	Pared de bloque 5"	M2	16.028	4,000.00	64112	16.028	64112	16.028	100
31	Repello y pulido	M2	32.06	175.42	5623.965	32.06	5623.965	32.06	100
32	Instalación sanitarios y urinarios	UND	7	141.93	993.52		141.93	141.93	100
33	Instalación de Cerámica	M2	8	1,269.90	10,159.20	8	10,159.20	8	100
34	Fundición de castillos 15x15cm	ml	10.9	170.00	1853	10.9	1853	10.9	100
35	Jambas de 15x15cm	ml	10.9	100	1090	10.9	1090	10.9	100
SUB TOTAL					84,933.60		993.52	84,933.60	100.00
TOTAL					405,815.83	368,102.30	37,713.52	405,815.82	100.00
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO					405,815.83	368,102.30	37,713.52	405,815.82	100.00

ESTIMACION 4	37,713.52
RETECION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA	1,885.68
RETECION DEL 12.5%	707.13
TOTAL A PAGAR	35,120.72



[Handwritten Signature]
 CONTRATANTE


CONTRATISTA




[Handwritten Signature]
 SUPERVISOR

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

Instalación de piso mosaico en el escenario


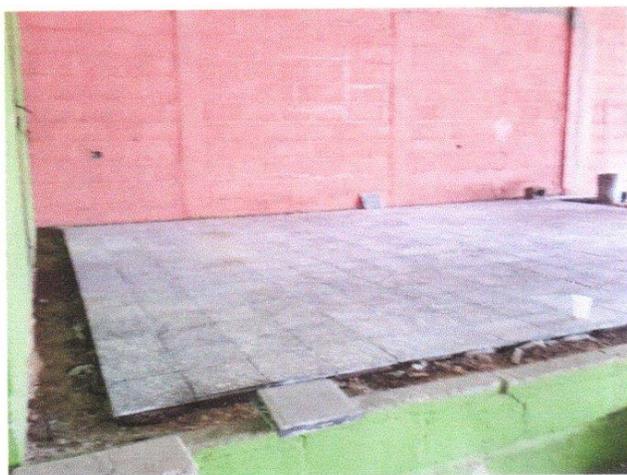


Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

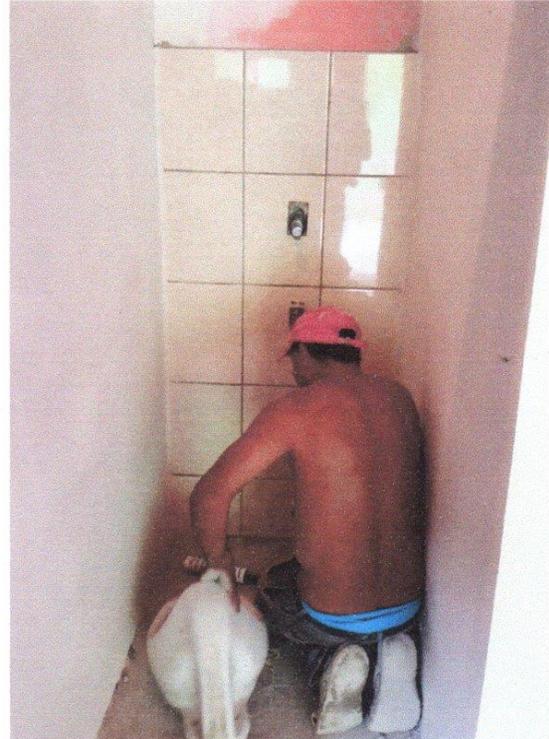

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

Instalación de servicios sanitarios, puertas y urinarios

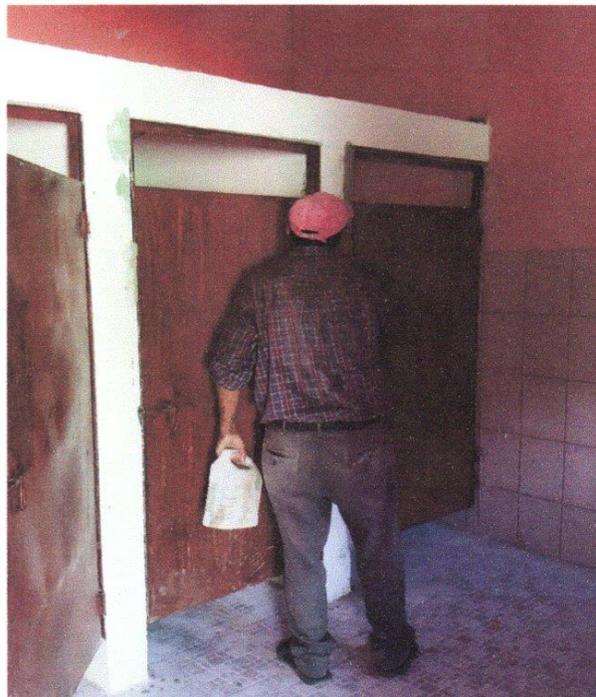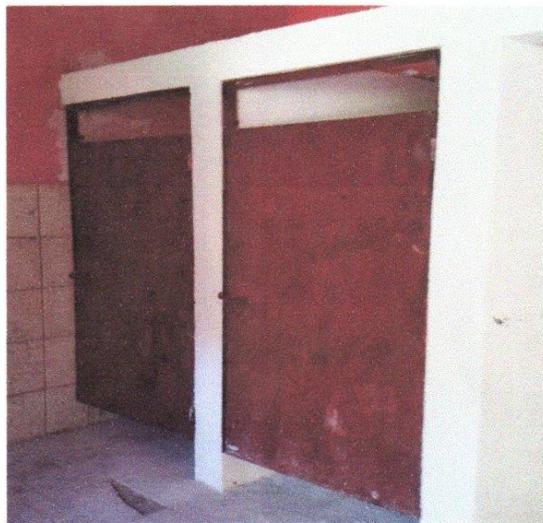

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

"PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ."

Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ

MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	405,815.82	100.00%
Deducción del 5% de calidad	1,885.68	9.29%
Estimación 5	37,713.52	9.29%
Deducción del 12.5%	707.13	9.29%
AVANCE FINANCIERA		9.29%

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	20,290.80	100.00%
Deducción del 12.5%	7,609.05	100.00%
ESTIMACION 1,2,3,4,5	405,815.82	100.00%

RETENCIONES

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	20,290.80
DEDUCCION DEL 12.5%	7,609.05

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

REPARACION DE AREA DE BAÑOS DE MUJERES Y VARONES

Instalación sanitarios y urinarios en un 100 % de ejecución

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace durante los días lunes a viernes, en un horario entre las 8am hasta las 5 pm.

Los trabajos inician desde la 6 am hasta que finalizan aproximadamente a las 2 de la tarde.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:
No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor: _____

Lugar (municipio de Cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación: 22 de AGOSTO del año 2022

AVANCE FINANCIERO

INFORME DE SUPERVICION

Proyecto: "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ."

Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 04 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2022 en base a la QUINTA estimación.

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo9.29%
Porcentaje acumulado ejecutado.....100.00%

Estos porcentajes deberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....9.29%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....9.29%
Porcentaje acumulado ejecutado.....100.00%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados se han realizado siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor. El trabajos realizado por el maestro de obra sobre la PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO se hace con lo mejor en calidad de materiales para garantizar un buen trabajo del contratista hacía en contratante. Se utilizan medidas de mitigación para evitar accidentes en el área de trabajo.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión a este proyecto se hace constante por lo menos 3 veces durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por el ejecutor, que provoquen daños a las personas que transitan la calle.

En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

REPARACIÓN DEL ESCENARIO DEL CENTRO SOCIAL

Instalación de piso mosaico en un 100 % de ejecución

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ.".Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2022
-----------------------	---	-----------

INFORME DE SUPERVICION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "PROYECTO DE REPARACION DEL CENTRO SOCIAL CANEÑO, UBICADO EN EL BARRIO EL PROVENIR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE DEPTO. DE LA PAZ."

Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR CANE, LA PAZ

Nombre del contratista: M.O. DOMINGO AVILA MACIAS

Nombre del supervisor: ing. LUIS FERNANDO MARTINEZ AVILA 'DC/P

Fecha de presentación del informe: 04 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2022

Datos:

Ubicación del proyecto: BARRIO EL PORVENIR CANE, LA PAZ

Nombre del contratista: M.O. DOMINGO AVILA MACIAS

Nombre del supervisor: ing. LUIS FERNANDO MARTINEZ AVILA 'DC/P

Fecha de presentación del informe: 04 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2022

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación

Estimación:

A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio

2. Días no trabajados por fuerza mayor:

Todos los días se trabajaron.

3. Contratista/ M.O. DOMINGO AVILA MACIAS

Responsable de obra: DOMINGO AVILA MACIAS

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

00761400216
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00009653

Cane, 23/08/2022
Lugar y Fecha

Domingo Avila Inacio L35,120.72
Pase a la orden de

Trenta y cinco mil ciento veinte con 72/100 cts Lempiras
Cantidad en letras



[Handwritten Signature]
Firma(s)



1:0 100 1 14 2:0000 76 14000 2 18 00009653

PR Dominican Republic, S.A. de C.V.
