



República de Honduras
Municipalidad de Taulabé
Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAMPO MES DE FEBRERO 2023

INFORME UTM

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2023

Sirva el presente para dar a conocer las diferentes actividades que formaron parte de las intervenciones de la Unidad Técnica Municipal (UTM). Durante el mes de FEBRERO, detallado de la siguiente manera:

A) Visitas Técnicas

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	LUGAR DE VISITA	DETALLE	RECORRIDO
1/2/2023	Ing Edin Piñeda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Supervisión proyecto Construcción de Clínicas Odontológicas	N/A
	Ing Edin Piñeda (UTM); Brenda Cortes (OMM), Alcalde Denis Membreño	Buenos Aires.	Socialización de proyecto para construcción de porquerizas, Especies Menores	N/A
2/2/2023	Ing Edin Piñeda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Supervisión proyecto Construcción de Clínicas Odontológicas	N/A
	Ing Edin Piñeda (UTM), alcalde Denis Membreño	Bacadiá.	Visita Técnica para cálculo de materiales en centro social y centro de salud	N/A

	Ing Edin Pineda (UTM), Alcalde Denis Membreño	Camalotales	Supervision de proyecto, mantenimiento de calle	N/A
3/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Supervision proyecto Construcción de Clinicas Odontológicas	N/A
5/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Supervision proyecto Construcción de Clinicas Odontológicas	N/A
6/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Supervision proyecto Construcción de Clinicas Odontológicas	N/A
	Ing Edin Pineda (UTM)	Jaitique.	Entrega de materiales, para construcción de galpones	20.5 km
	Ing. Edin Pineda (UTM); Carlos Villuela (DMJ)	Barrio Vista Hermosa, Taulabé, Comayagua	Visita técnica para resolución de conflicto de apertura de calle	N/A
7/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Supervision proyecto Construcción de Clinicas Odontológicas	N/A
	Ing Edin Pineda (UTM)	Jaitique.	Entrega de materiales, para construcción de galpones	21.3 KM
	Ing Edin Pineda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Supervision proyecto Construcción de Clinicas Odontológicas	N/A
8/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Buenos Aires.	Entrega de materiales, para construcción de porquerizas	19.5 km
	Ing Edin Pineda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Presentación de bases de licitación, para Segunda Etapa de Parque central José Trinidad Cabañas	N/A
9/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Jaitique	Entrega de materiales, para construcción de galpones	13.5 km
10/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Jaitique.	Entrega de materiales, para construcción de galpones	15 km
	Ing Edin Pineda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Supervision proyecto Construcción de Clinicas Odontológicas	N/A
11/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Visita de campo, con representantes de ofertas para licitación de segunda etapa de construcción de parque central de José Trinidad Cabañas	N/A
13/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Buenos Aires	Entrega de materiales para construcción de porquerizas	23.5 km
14/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM), Alcalde Denis Membreño	Bella Vista	Supervisión de proyecto, mantenimiento de calle	N/A
15/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM), Walner Martínez	Taulabé, Comayagua	Visita técnica para calculo de materiales para techo en bomba hidráulica de agua potable	N/A

	Ing Edin Pineda (UTM), Alcalde Denis Membreño	Taulabé, Comayagua	Visita técnica para reparación de techo en Esc Rodas Alvarado Visita técnica para reparación de baños, Jardín de Niños José Dolores Urquía Visita técnica para mejoras en Cuevas de Taulabé	N/A N/A N/A
16/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Jatiqué	Entrega de materiales para construcción de porquerizas	17.3 km
	Ing Edin Pineda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Supervisión proyecto Construcción de Clínicas Odontológicas	N/A
20/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM), Alcalde Denis Membreño	Terrero Blanco	Supervisión de proyecto Mantenimiento de calle	N/A
	Ing Edin Pineda (UTM), Alcalde Denis Membreño	Taulabé, Comayagua	Visita técnica para construcción de salón de convenciones de maestros jubilados	N/A
21/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM), Alcalde Denis Membreño	Los Llanos	Visita técnica proyecto mantenimiento de calle	N/A
	Ing Edin Pineda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Supervisión proyecto Construcción de Clínicas Odontológicas	N/A
22/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Huerto del Edén, Buenos Aires	Entrega de materiales para construcción de galpones y porquerizas	27 km
23/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM), Alcalde Denis Membreño	Camalotales Terrero Blanco Brisas de Bacardía	Visita técnica para reparación de baños, Escuela Juan Lindo Supervisión de proyecto mantenimiento de calle Visitas técnicas para cálculo de materiales salón comunal	48 km
27/2/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Los Llanos	Supervisión de proyecto mantenimiento de calle	21.1 km
	Ing Edin Pineda (UTM)	Taulabé, Comayagua	Supervisión proyecto Construcción de Clínicas Odontológicas	N/A
28/2/2023	Ing Edin Pineda (UMT), Ing Ana Cervantes (UDEL)	Taulabé, Comayagua	Reunión para redacción de análisis FODA, PDM	N/A

[Handwritten Signature]
Ing. José Pineda
#112



JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
Brenda Cortés



OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
#112



DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA

[Handwritten Signature]
#112



ADMINISTRACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO




[Handwritten Signature]
#112



UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Ing. Ana Cortés

REGISTRO FOTOGRAFICO

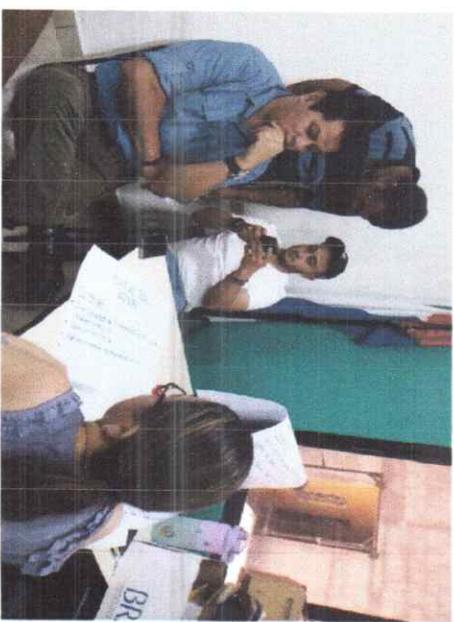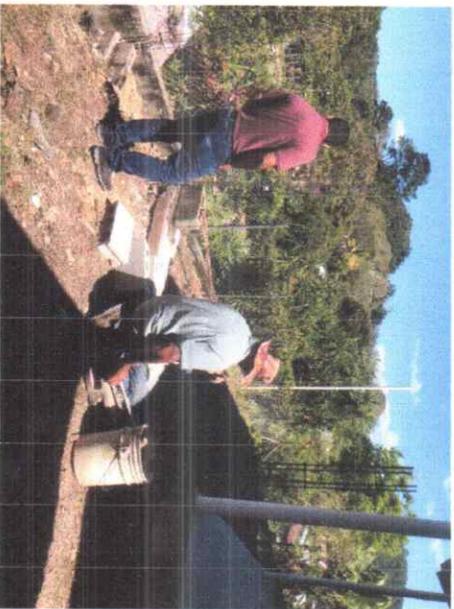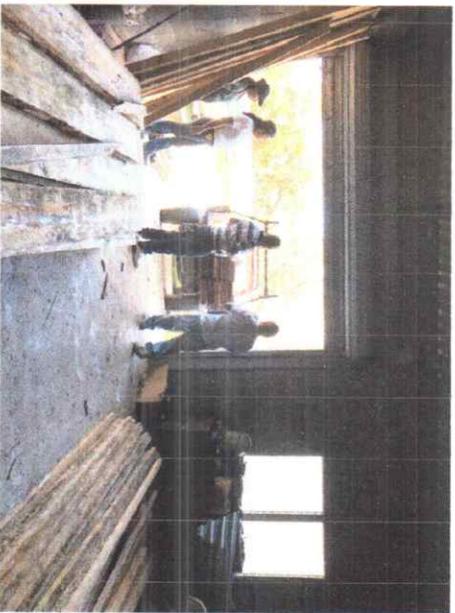



República de Honduras
Municipalidad de Taulabé
Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
CUADRO RESUMEN DE CONTRATOS MES DE ENERO, FEBRERO 2023

FECHA	EN CARGADO DE OFICINA	DETALLE	PROYECTO O ACTIVIDAD	EJE	CONTRATISTA	LUGAR
7/1/2023	IngEdm Pineda (UTM)	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	CACORA S. DE R.L.	Jardines
9/1/2023	IngEdm Pineda (UTM)	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	CACORA S. DE R.L.	Buenos Aires
17/1/2023	IngEdm Pineda (UTM)	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	CACORA S. DE R.L.	Palmichal Carnier
25/1/2023	IngEdm Pineda (UTM)	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	CACORA S. DE R.L.	La Laguna
3/2/2023	IngEdm Pineda (UTM)	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	CACORA S. DE R.L.	Pinozapá
11/2/2023	IngEdm Pineda (UTM)	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	CACORA S. DE R.L.	La Misión
11/2/2023	IngEdm Pineda (UTM)	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	CACORA S. DE R.L.	Camalotales
18/2/2023	IngEdm Pineda (UTM)	Informe de Supervisión	Construcción de Clínicas Odontológicas	Salud	Rolando Pineda Machado	Taulabé, Comayagua
21/2/2023	IngEdm Pineda (UTM)	Informe de supervisión	Construcción de porquerizas	Producción	PRESENTACION MENDOZA	Buenos Aires
21/2/2023	IngEdm Pineda (UTM)	Informe de supervisión	Construcción de Galpones	Producción	BAYRON SAUL HERNANDEZ	Jatique


Jefe de Unidad Técnica Municipal
Ing. Edm Pineda Moral
C.A. Taulabé, Comayagua





Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: MANTENIMIENTO DE CALLES.
Departamento: Comayagua.
Municipio: Taulabé
Ubicación: Calle Principal de la Comunidad de Jardines a Desvió de Palmichal Fátima

Responsables:
Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez
Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	7 de enero de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 3.69 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejorar el perfil de rodadura.
- Se apertura acceso donde nos los había.
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman las cunetas en todas las calles.

CONCLUSIONES:



- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 3.69 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.







 SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES


CONTROL DE MAQUINARIA PATROL 670G JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
16.3	JARDINES	06/01/2023	670G JHONN DEER	15352.8	15360.5	7.7	L2,300.00	L17,710.00
		07/01/2023	670G JHONN DEER	15360.5	15369.1	8.6	L2,300.00	L19,780.00
		08/01/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
		09/01/2023	670G JHONN DEER	15369.1	15376.1	7	L2,300.00	L16,100.00
TOTAL								L53,590.00

CONTROL DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR DE 12 TONELADAS BOMEG								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
16.4	JARDINES	06/01/2023	BOMEG	2898	2903.2	5.2	L1,300.00	L6,760.00
		07/01/2023	BOMEG	2903.2	2908.7	5.5	L1,300.00	L7,150.00
		08/01/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		09/01/2023	BOMEG	2908.7	2914.4	5.7	L1,300.00	L7,410.00
TOTAL								L21,320.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:

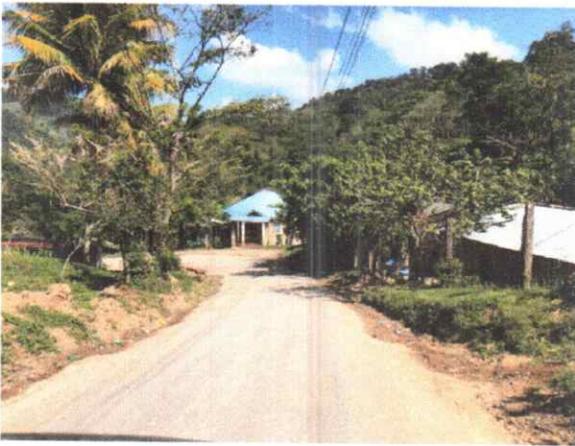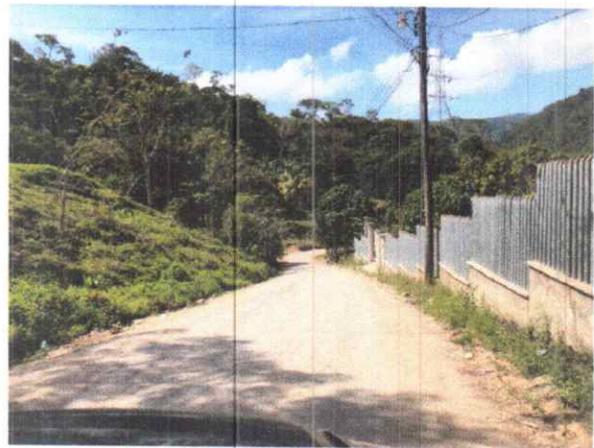

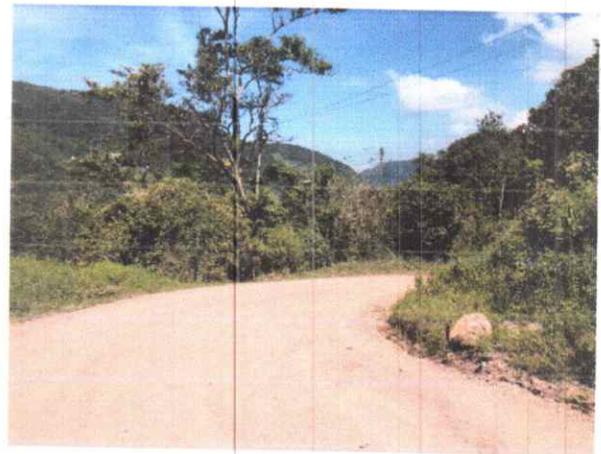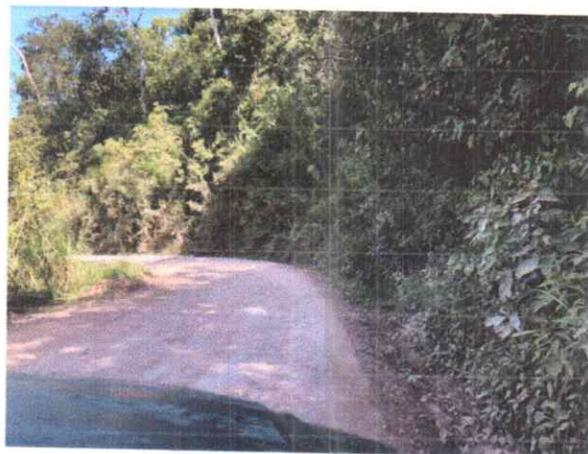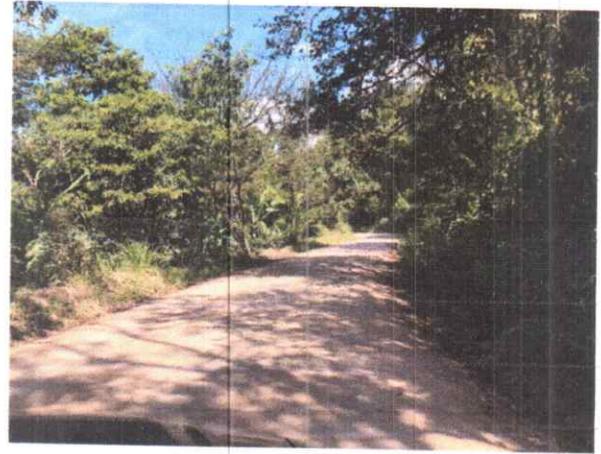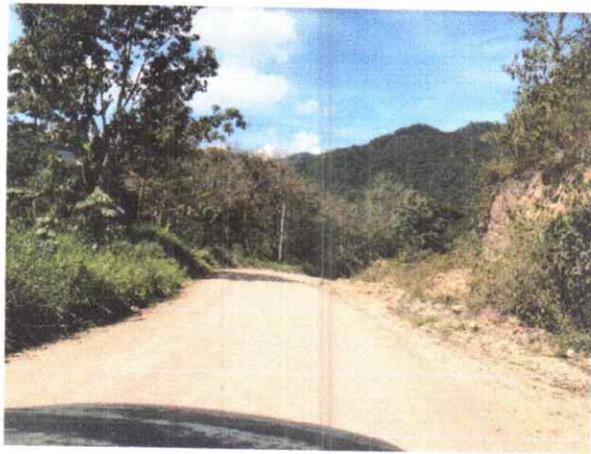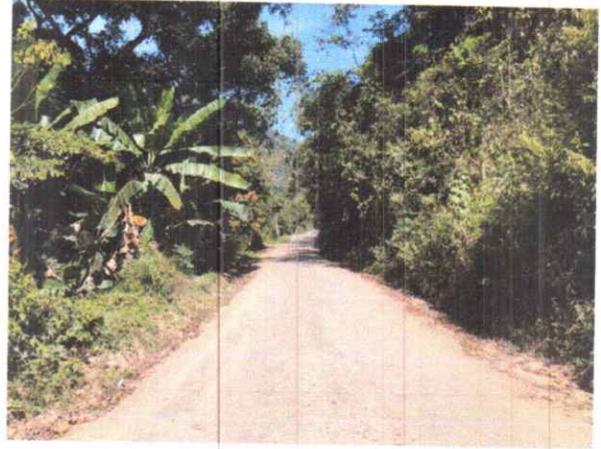

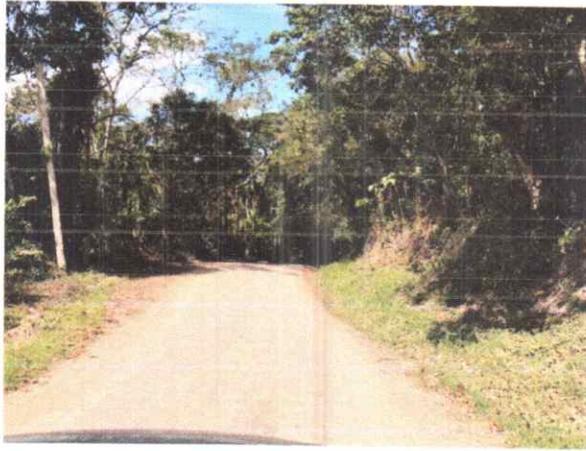



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

<p>Nombre del proyecto: MANTENIMIENTO DE CALLES.</p> <p>Departamento: Comayagua.</p> <p>Municipio: Taulabé</p> <p>Ubicación: Comunidad de Buenos Aires y Huerto de Edén.</p>
--

<p>Responsables:</p> <p>Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez</p> <p>Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.</p>

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	9 de enero de 2023

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 1.53 km y 4.56 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas donde sean críticas de mejor el perfil de rodadura.
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman las cunetas en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 1.53 km y 4.56 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES







13/12/21




CONTROL DE MAQUINARIA PATROL 670G JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
14	BUENOS AIRES	02/01/2023	670G JHONN DEER	15338.8	15344.4	5.6	L2,300.00	L12,880.00
		03/01/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
		04/01/2023	670G JHONN DEER	15344.4	15352.8	8.4	L2,300.00	L19,320.00
		05/01/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
TOTAL								L32,200.00

CONTROL DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR DE 12 TONELADAS BOMEG								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
9.8	BUENOS AIRES	02/01/2023	BOMEG	2888.2	2892.6	4.4	L1,300.00	L5,720.00
		03/01/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		04/01/2023	BOMEG	2892.6	2898	5.4	L1,300.00	L7,020.00
		05/01/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
TOTAL								L12,740.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:

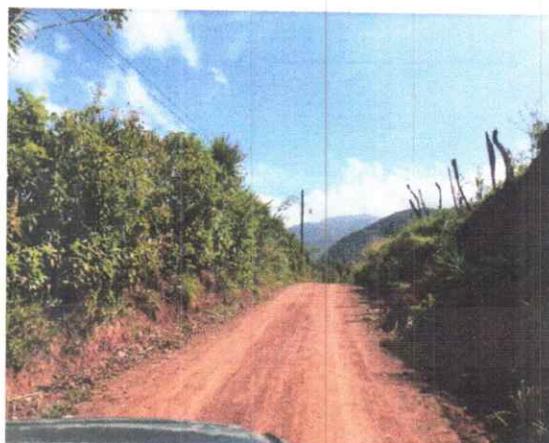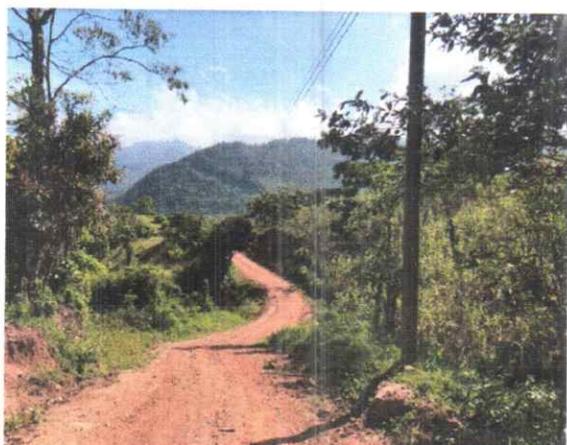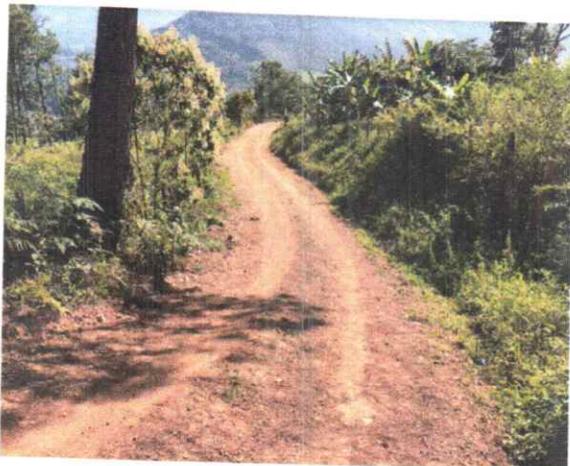

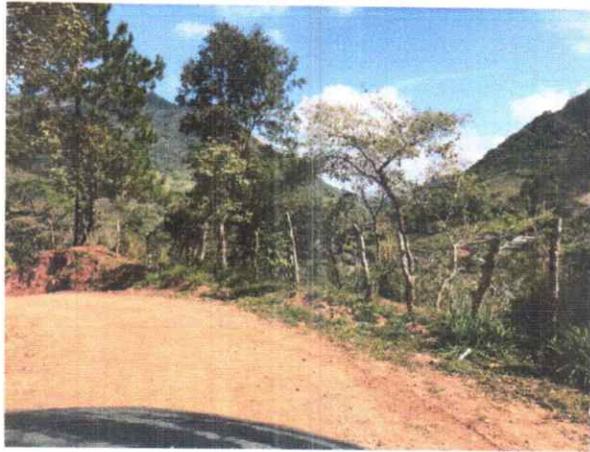

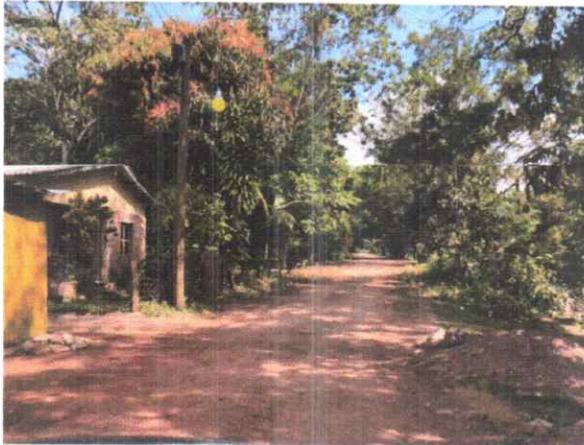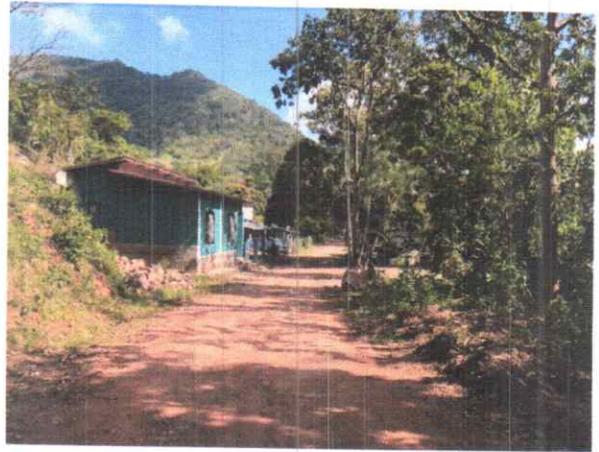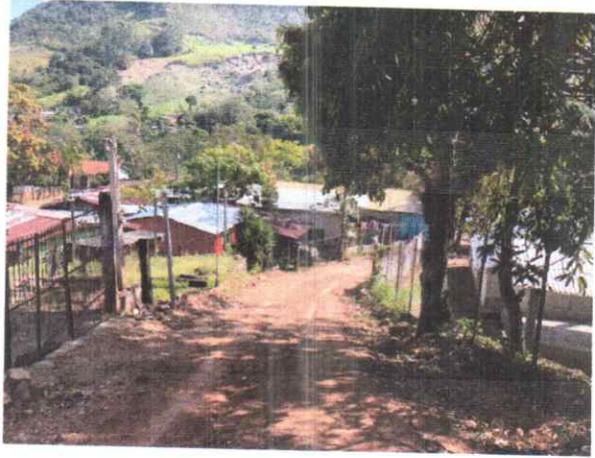



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO DE CALLES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de Palmichal Carmen.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramirez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	17 de enero de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 3.36 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor el perfil de rodadura.
- Se aperturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman las cunetas en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 3.36 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.




SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES





CONTROL DE MAQUINARIA PATROL 670G. JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
32	PALMICHAL CARMEN	10/01/2023	670G JHONN DEER	15376.1	15385.1	9	L2,300.00	L20,700.00
		11/01/2023	670G JHONN DEER	15385.1	15394.1	9	L2,300.00	L20,700.00
		12/01/2023	670G JHONN DEER	15394.1	15400.8	6.7	L2,300.00	L15,410.00
		13/01/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
		14/01/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
		15/01/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
		16/01/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
		17/01/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
		18/01/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
		19/01/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
		20/01/2023	670G JHONN DEER	15400.8	15408.1	7.3	L2,300.00	L16,790.00
		TOTAL						

CONTROL DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR DE 12 TONELADAS BOMEG								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
26.2	PALMICHAL CARMEN	10/01/2023	BOMEG	2914.4	2922.2	7.8	L1,300.00	L10,140.00
		11/01/2023	BOMEG	2922.2	2928.8	6.6	L1,300.00	L8,580.00
		12/01/2023	BOMEG	2928.8	2934.8	6	L1,300.00	L7,800.00
		13/01/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		14/01/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		15/01/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		16/01/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		17/01/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		18/01/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		19/01/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		20/01/2023	BOMEG	2934.8	2940.6	5.8	L1,300.00	L7,540.00
		TOTAL						

REGISTRO FOTOGRAFICO:

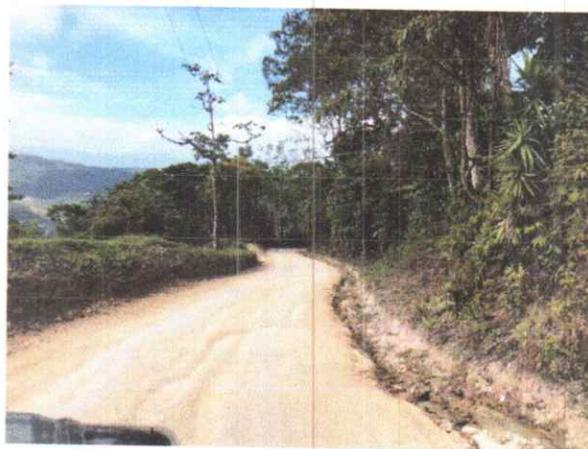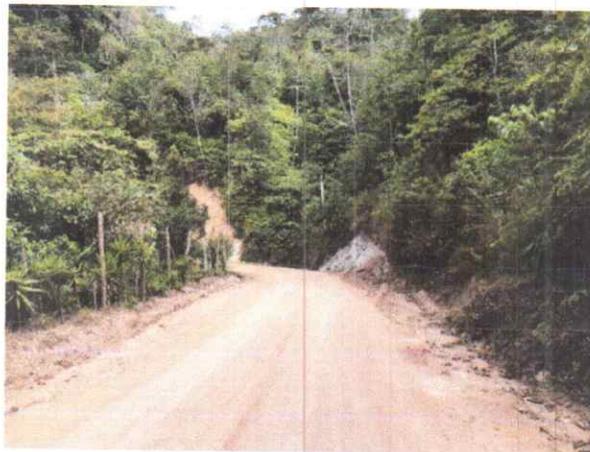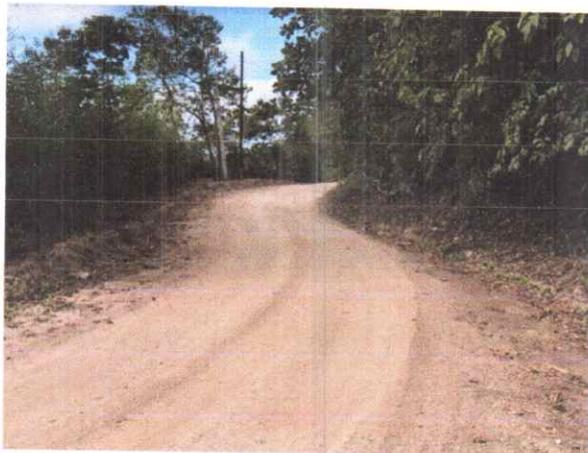



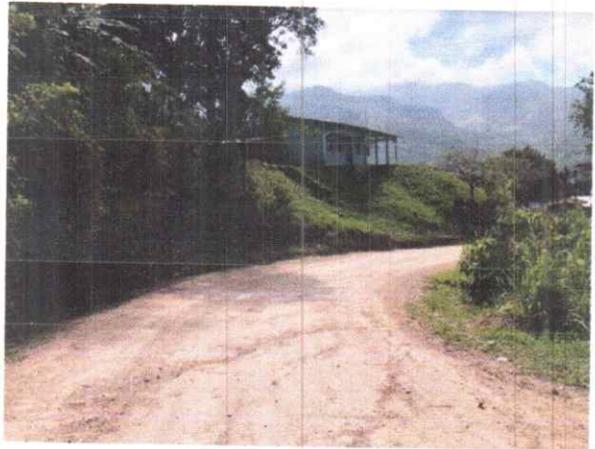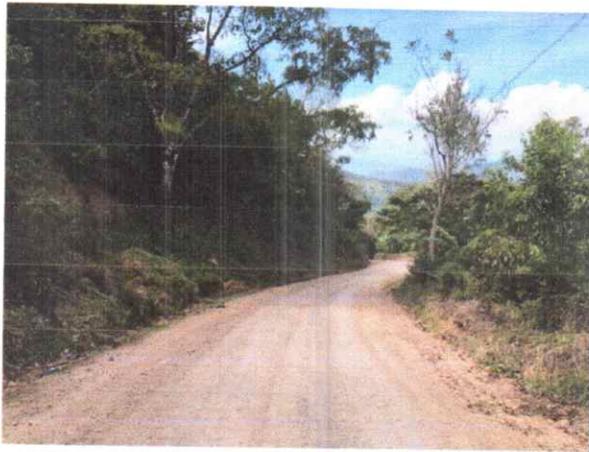



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

<p>Nombre del proyecto: MANTENIMIENTO DE CALLES.</p> <p>Departamento: Comayagua.</p> <p>Municipio: Taulabé</p> <p>Ubicación: Comunidad de La Laguna.</p>
--

<p>Responsables:</p> <p>Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez</p> <p>Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.</p>

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	25 de enero de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 4.96 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor el perfil de rodadura.
- Se apeturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman las cunetas en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 4.96 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.





SUPERVISION UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES










CONTROL DE MAQUINARIA PATROL 670G JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACION	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
18.4	LA LAGUNA	18/1/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
		19/1/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	L0.00
		20/1/2023	670G JHONN DEER	15408.1	15415	6.9	L2,300.00	L15,870.00
		21/1/2023	670G JHONN DEER	15415	15421.7	6.7	L2,300.00	L15,410.00
		22/1/2023	670G JHONN DEER	15421.7	15426.5	4.8	L2,300.00	L11,040.00
TOTAL								L42,320.00

CONTROL DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR DE 12 TONELADAS BOMEG								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACION	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
2.2	LA LAGUNA	18/1/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		19/1/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		20/1/2023	BOMEG	2940.6	2942.8	2.2	L1,300.00	L2,860.00
		21/1/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
		22/1/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	L0.00
TOTAL								L2,860.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:

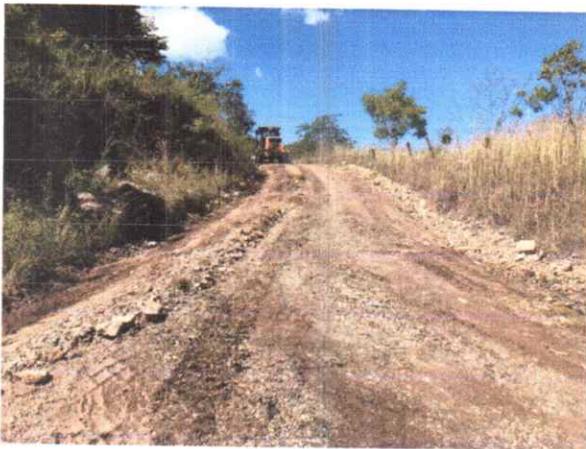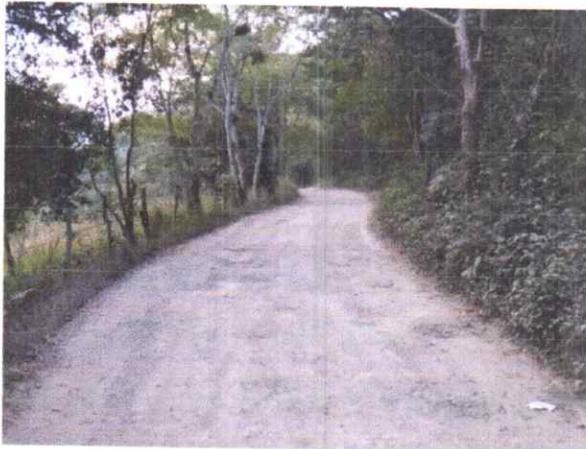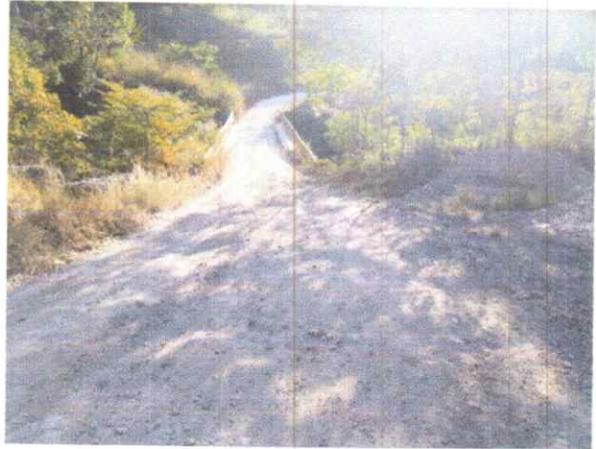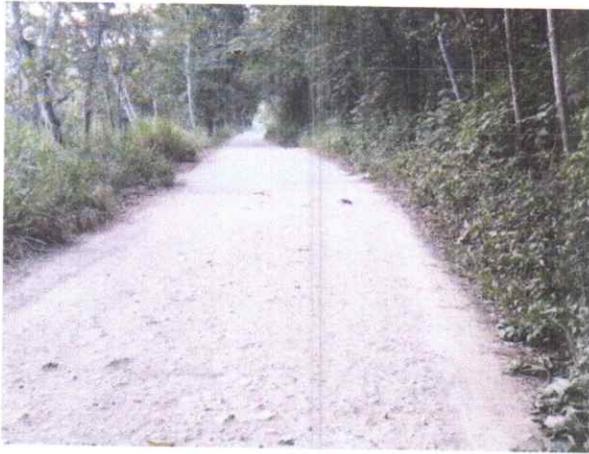

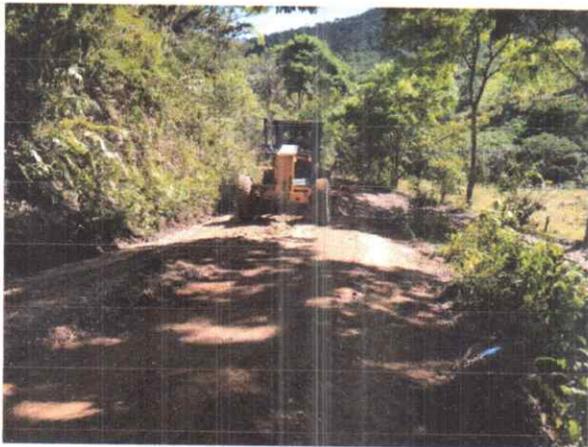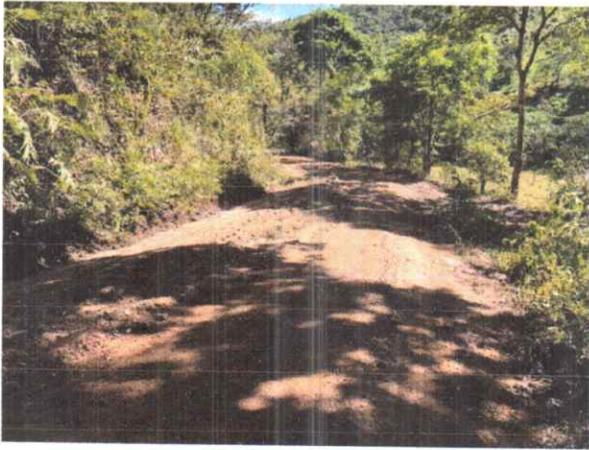

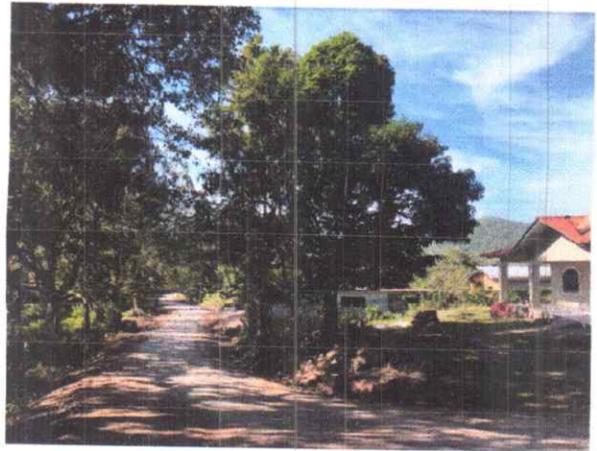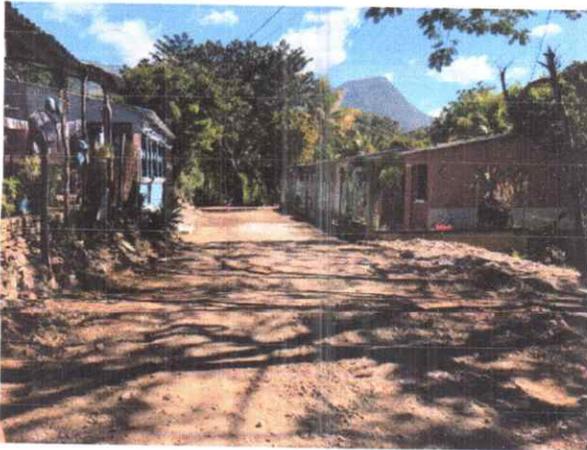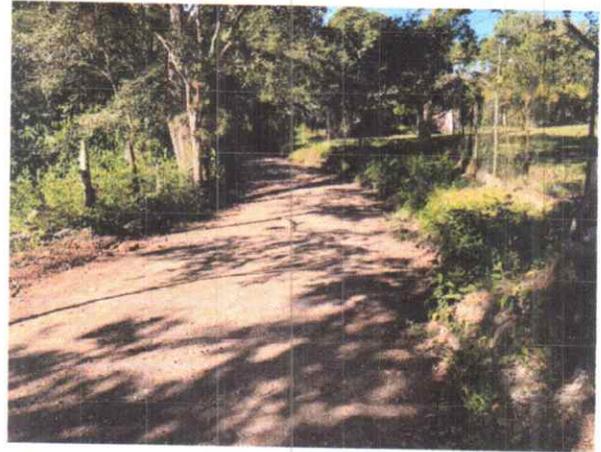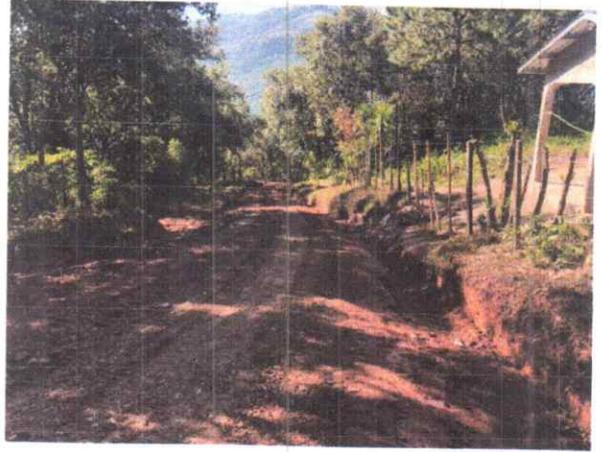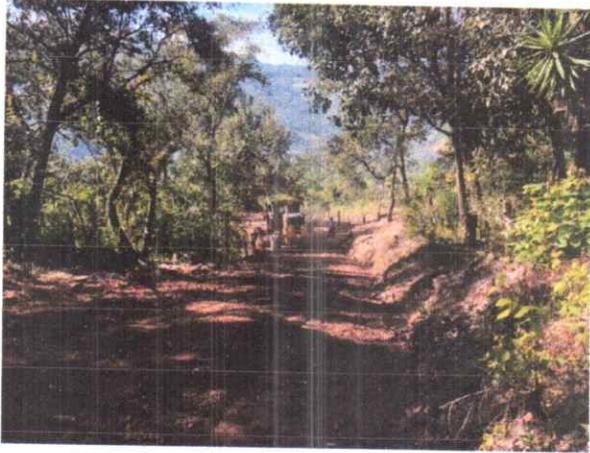



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

<p>Nombre del proyecto: MANTENIMIENTO DE CALLES.</p> <p>Departamento: Comayagua.</p> <p>Municipio: Taulabé</p> <p>Ubicación: Comunidad de Pinolapa.</p>

<p>Responsables:</p> <p>Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez</p> <p>Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.</p>

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	03 de febrero de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 3.47 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejorar el perfil de rodadura.
- Se aperturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman las cunetas en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 3.47 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES









CONTROL DE MAQUINARIA PATROL 670G JHONN DEER										
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACION	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL		
35	PINOLAPA	23/1/2023	670G JHONN DEER	15426.4	15426.4	0	L2,300.00	L0.00		
		24/1/2023	670G JHONN DEER	15426.4	15430.7	4.3	L2,300.00	L9,890.00		
		25/1/2023	670G JHONN DEER	15430.7	15440.1	9.4	L2,300.00	L21,620.00		
		26/1/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA				L2,300.00	L0.00	
		27/1/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA				L2,300.00	L0.00	
		28/1/2023	670G JHONN DEER	15440.1	15446.6	6.5	L2,300.00	L14,950.00		
		29/1/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA				L2,300.00	L0.00	
		30/1/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA				L2,300.00	L0.00	
		31/1/2023	670G JHONN DEER	15446.6	15453	6.4	L2,300.00	L14,720.00		
		1/2/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA				L2,300.00	L0.00	
		2/2/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA				L2,300.00	L0.00	
		3/2/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA				L2,300.00	L0.00	
		4/2/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA				L2,300.00	L0.00	
		5/2/2023	670G JHONN DEER	15453	15461.4	8.4	L2,300.00	L19,320.00		
		TOTAL								L80,500.00

CONTROL DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR DE 12 TONELADAS BOMEG										
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACION	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL		
26.7	PINOLAPA	23/1/2023	BOMEG	2942.8	2947.8	5	L1,300.00	L6,500.00		
		24/1/2023	BOMEG			0	L1,300.00	L0.00		
		25/1/2023	BOMEG	2947.8	2954.9	7.1	L1,300.00	L9,230.00		
		26/1/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA				L1,300.00	L0.00	
		27/1/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA				L1,300.00	L0.00	
		28/1/2023	BOMEG	2954.9	2958.1	3.2	L1,300.00	L4,160.00		
		29/1/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA				L1,300.00	L0.00	
		30/1/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA				L1,300.00	L0.00	
		31/1/2023	BOMEG	2958.1	2962.4	4.3	L1,300.00	L5,590.00		
		1/2/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA				L1,300.00	L0.00	
		2/2/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA				L1,300.00	L0.00	
		3/2/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA				L1,300.00	L0.00	
		4/2/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA				L1,300.00	L0.00	
		5/2/2023	BOMEG	2962.4	2969.5	7.1	L1,300.00	L9,230.00		
		TOTAL								L34,710.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:

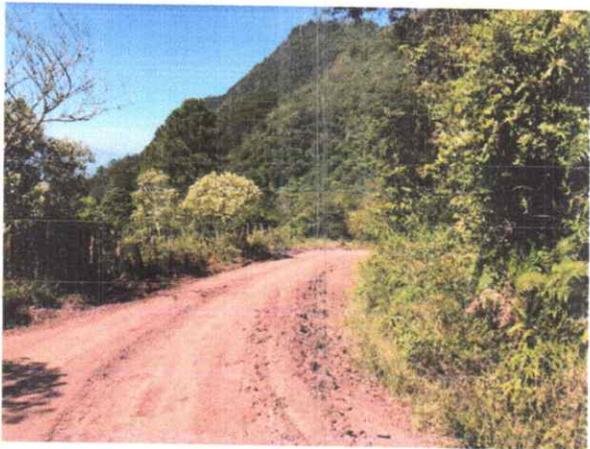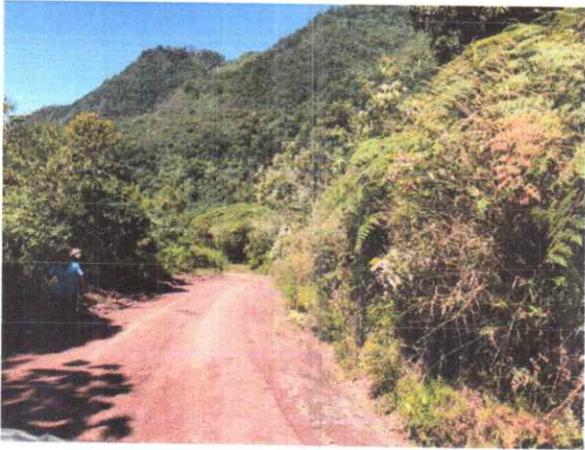

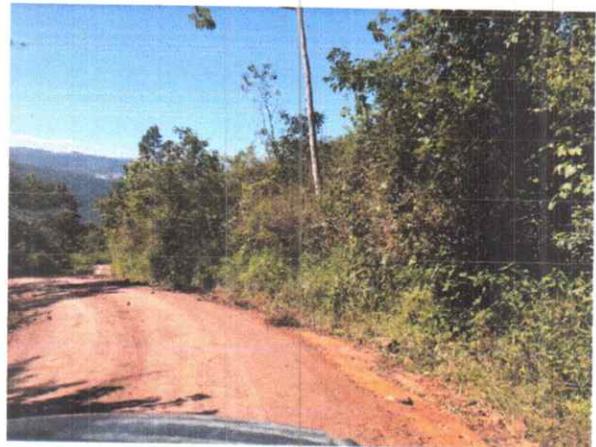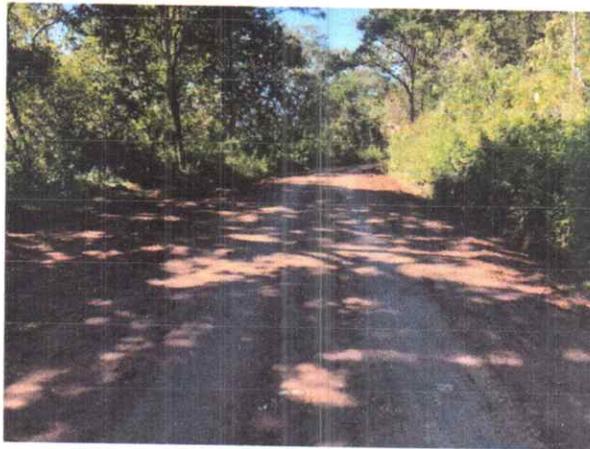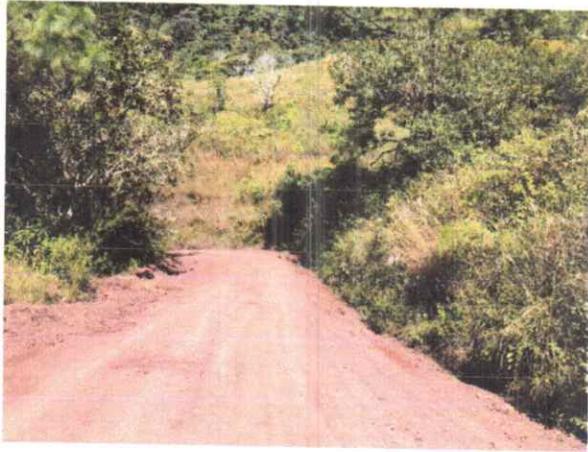

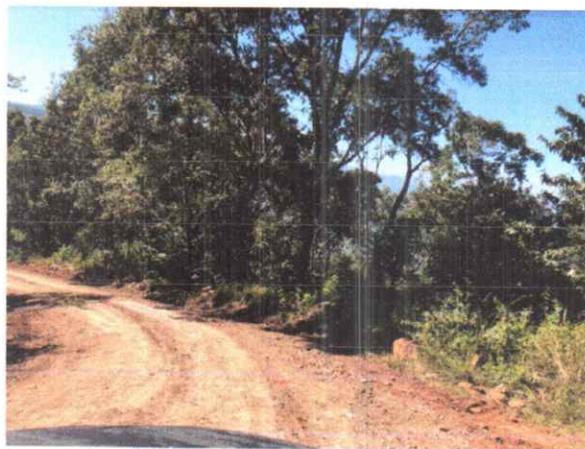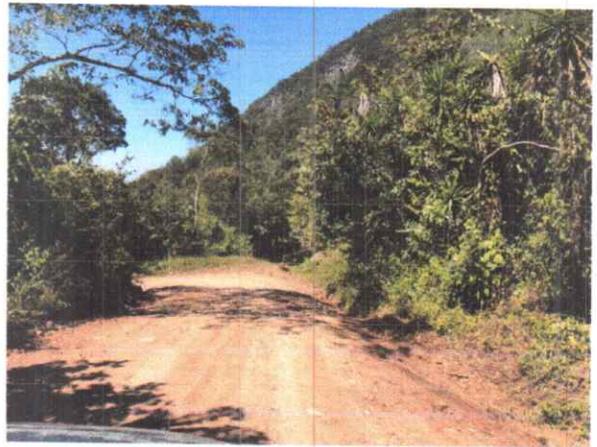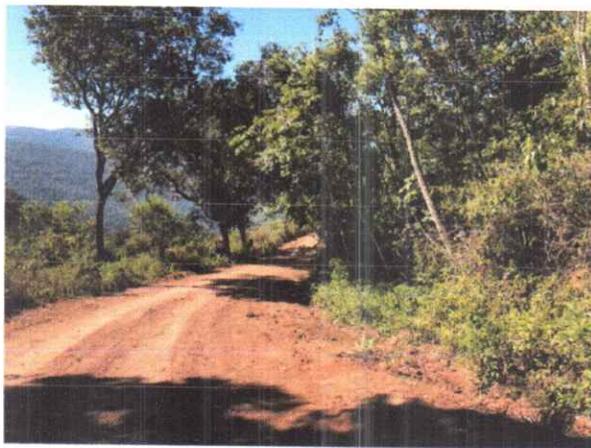



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: MANTENIMIENTO DE CALLES.
Departamento: Comayagua.
Municipio: Taulabé
Ubicación: Comunidad de La Mision.

Responsables:
Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez
Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	11 de febrero de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 2.26 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor el perfil de rodadura.
- Se apeturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman las cunetas en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 2.26 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



ING EDIN PINEDA MORALES




CONTROL DE MAQUINARIA PATROL 670G JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACION	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
27.4	LA MISION	04/02/2023	670G JHONN DEER	15461.5	15469.7	8.2	1,2,300.00	118,860.00
		05/02/2023	670G JHONN DEER	15469.7	15478.7	9	1,2,300.00	120,700.00
		06/02/2023	670G JHONN DEER	15478.7	15488.9	10.2	1,2,300.00	123,460.00
TOTAL								163,020.00



CONTROL DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR DE 12 FONELADAS BOMEG								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACION	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
24	LA MISION	04/02/2023	BOMEG	2969.3	2976.6	7.1	1,1,300.00	19,230.00
		05/02/2023	BOMEG	2976.6	2985.1	8.5	1,1,300.00	111,030.00
		06/02/2023	BOMEG	2985.1	2993.5	8.4	1,1,300.00	110,920.00
TOTAL								131,200.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:

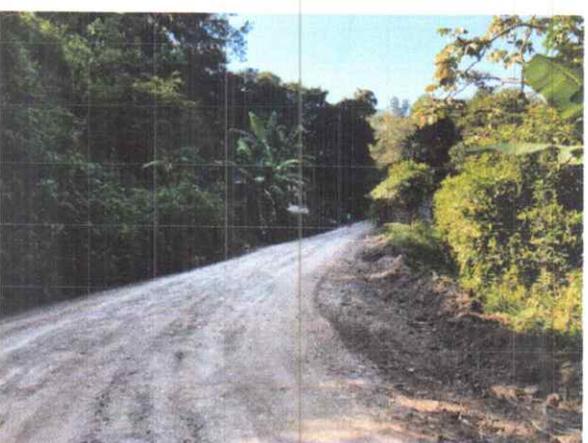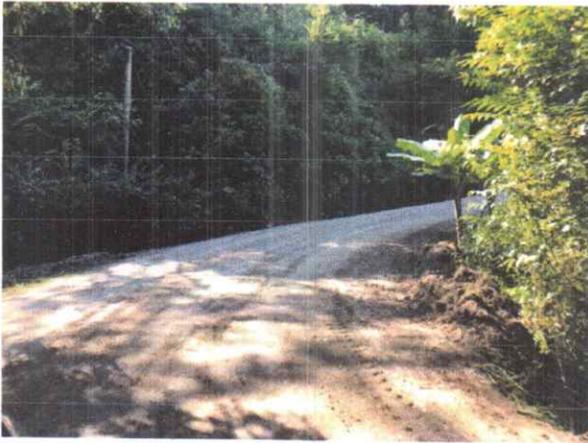



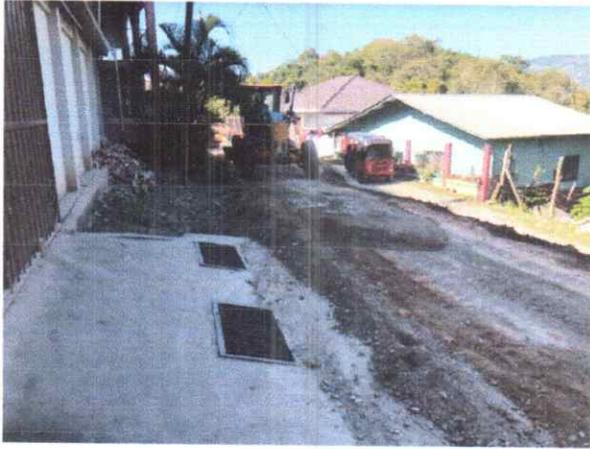

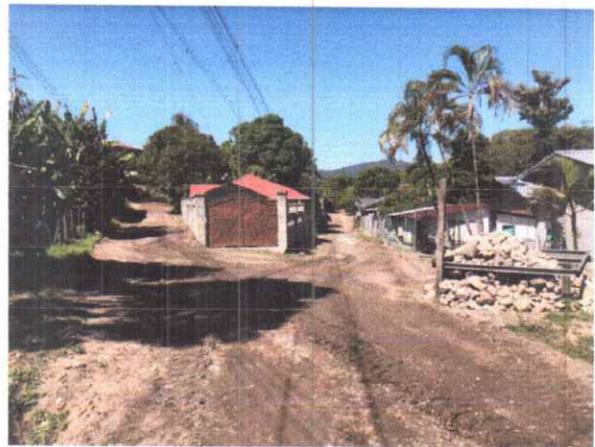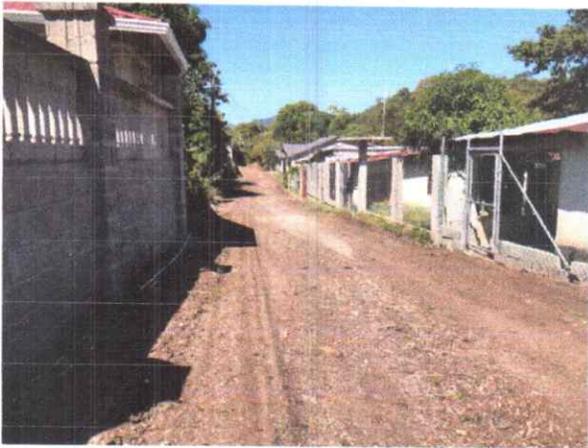



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: MANTENIMIENTO DE CALLES.
Departamento: Comayagua.
Municipio: Taulabé
Ubicación: Comunidad de Camalotales.

Responsables:
Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez
Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	11 de febrero de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 2.33 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor el perfil de rodadura.
- Se apeturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman las cunetas en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 2.33 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.


SUPERVISION UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES





CONTROL DE MAQUINARIA PATROL 670G JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
27.2	CAMALOTALES	11/2/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	
		12/2/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	
		13/2/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	
		14/2/2023	670G JHONN DEER	15488.9	15495.4	6.5	L2,300.00	L14,950.00
		15/2/2023	670G JHONN DEER	15495.4	15502.9	7.5	L2,300.00	L17,250.00
		16/2/2023	670G JHONN DEER	15502.9	15511.3	8.4	L2,300.00	L19,320.00
		17/2/2023	670G JHONN DEER	15511.3	15516.1	4.8	L2,300.00	L11,040.00
		TOTAL						

CONTROL DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR DE 12 TONELADAS BOMEG								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
22.1	CAMALOTALES	11/2/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	
		12/2/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	
		13/2/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	
		14/2/2023	BOMEG	2993.5	2998.4	4.9	L1,300.00	L6,370.00
		15/2/2023	BOMEG	2998.4	3004.3	5.9	L1,300.00	L7,670.00
		16/2/2023	BOMEG	3004.3	3011.7	7.4	L1,300.00	L9,620.00
		17/2/2023	BOMEG	3011.7	3015.6	3.9	L1,300.00	L5,070.00
		TOTAL						

REGISTRO FOTOGRAFICO:

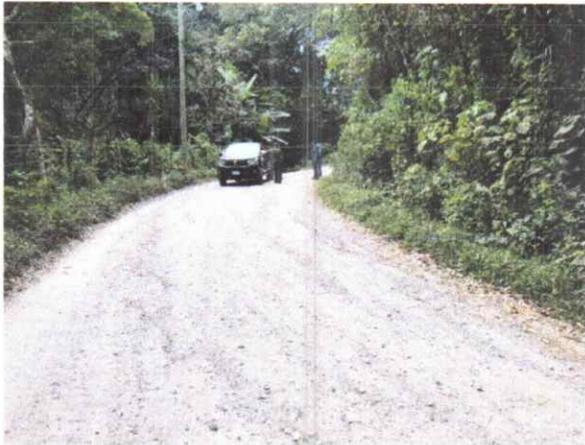

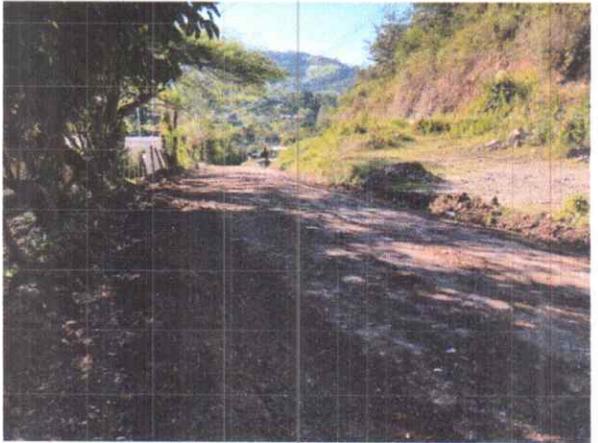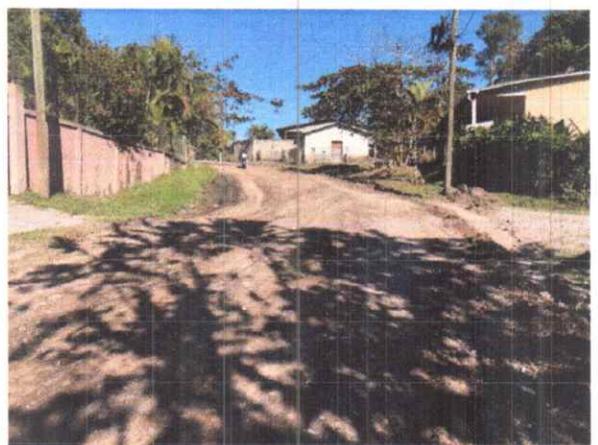







Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: CONSTRUCCION DE CLINICAS DE ODONTOLOGIA
Departamento: Comayagua.
Municipio: Taulabé
Ubicación: Centro de Salud

Responsables:
Ejecutor: Rolando Pineda Machado.
Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	18 de febrero de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Albañiles	4
				Peón	3

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:


- Se inician actividades con la excavación de zanja para cimentación, con un desnivel de 1.20 metros en el punto mas bajo, las especificaciones técnicas cuentan con un ancho de 60 cm y 60 cm de profundidad.
- El armado de las zapatas corrida cuenta con 4#4 y #4@ 20 cms a.s, y cuenta con un espesor de 20 cm en toda la longitud de la cimentación.
- Zapatas aisladas 60 cm x 60 cm y 20 cm de espesor
- Cimentación con bloque de 8 fundido y bastoneado con varilla de #4 @ 40 cms.
- Soleras inferiores con un armado de 4#4 y #3 @ 20 cms.
- Pared de 6" con acero horizontal @ 3 hiladas.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de clima, que tengan retraso en las actividades realizadas.
- El suministro de materiales en tiempo y forma estuviera pendiente del desarrollo de la obra.
- Se desarrollo completamente todo lo especificado anteriormente.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



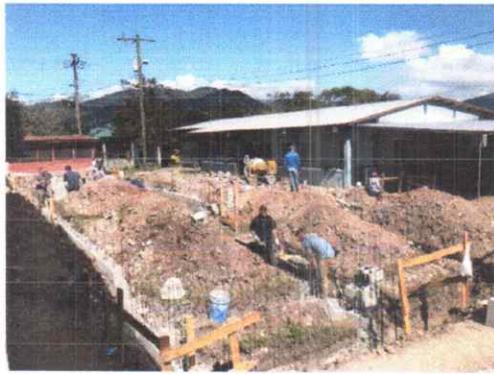



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION DE PORQUERIZAS PARA PROYECTO ESPECIES MENORES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de La Unión de Buenos Aires

Responsables:

Ejecutor: Presentación Mendoza.

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	21 de febrero de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	2
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza a preparar todo el terreno especificado para cada galpón, esta actividad incurre como contrapartida de los beneficiarios.
- Se suministra todos los materiales necesarios por parte de Proyecto Aldea Global y Municipalidad de Taulabé.
- Se realizan toda la nivelación para instalación de postes.
- Se realiza excavación para filtro.
- Se comienza hacer la instalación de acuerdo a las especificaciones indicadas por parte de la unidad de supervisión de Proyecto Aldea Global.



CONCLUSIONES:

- No se presenta ningún contratiempo al proyecto.
- Se realiza con éxitos, toda la cantidad de beneficiados en la comunidad.
- Se dará seguimiento para la metodología aplicada una vez entregado los cerdos a cada beneficiado.



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

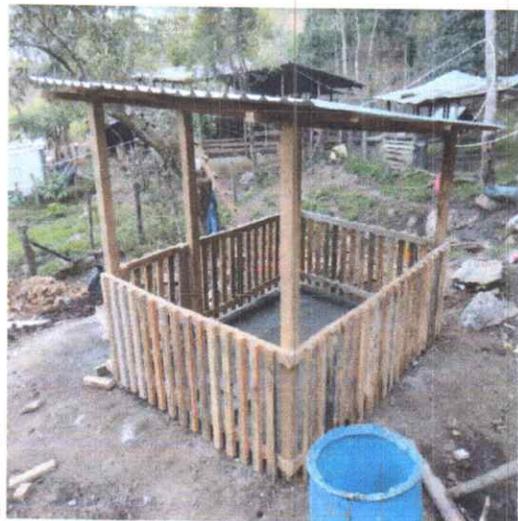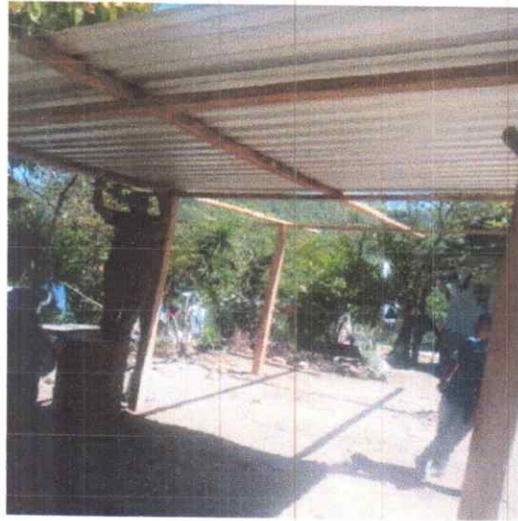





Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION DE GALPONES PARA PROYECTO ESPECIES MENORES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de Jaitique

Responsables:

Ejecutor: Bayron Saul Hernández Mejía

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	21 de febrero de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	2
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza a preparar todo el terreno especificado para cada galpón, esta actividad incurre como contrapartida de los beneficiarios.
- Se suministra todos los materiales necesarios por parte de Proyecto Aldea Global y Municipalidad de Taulabé.
- Se realizan toda la nivelación para instalación de postes.
- Se comienza hacer la instalación de acuerdo a las especificaciones indicadas por parte de la unidad de supervisión de Proyecto Aldea Global.

CONCLUSIONES:

- No se presenta ningún contratiempo al proyecto.
- Se realiza con éxitos, toda la cantidad de beneficiados en la comunidad.
- Se dará seguimiento para la metodología aplicada una vez entregado las gallinas a cada beneficiado.



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

