



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia


Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	Arquitectos e ingenieros Constructores
2. Sector o Sub sector:	Barrio la violeta
3. Nombre del Proyecto:	"PROYECTO DE AMPLIACION Y REPARACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LAPAZ"
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Con la ejecución de este proyecto se pretende mejorar las instalaciones del edificio que estaban en mal estado, para generar un edificio con las mejores instalaciones para el desempeño de los trábalos de los empleados.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	Construcción y reparación del edificio de la municipalidad Generar un mejor desempeño del trabajador Menos aglomeración de personal en oficinas
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto se está ejecutando en la parte de atrás de la alcaldía municipal donde se están construyendo dos edificios más que van encima del lugar donde se ubicaban el salón de sesiones y oficinas actuales. Las piezas de las oficinas serán separadas con tabla yeso. Las paredes con bloque de 5, y todo establecido como se indican en el contrato.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 30 empleados directamente y a la población en general del municipio de Cane que se beneficiara e indirectamente.
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 17 de Noviembre del 2022, teniendo una vigencia de 180 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. L. 2690,332.55
7. Fecha de Finalización:	19/05/2023
Detalles del Proyecto	



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	Se está en paredes del segundo nivel	21/11/2022 al 28/02/2023	Luis Fernando Martínez	Paredes culminadas y repelladas
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado %	aproximadamente	en un	21
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA			




Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y Proyectos



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023

Hora : 07:50 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15590

L.: 483,971.85

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 11904Fecha de Emision: 1/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIAId/RTN: 1201198200300La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de la Primera Estimacion del Proyecto Construcción, Mejoramiento y Adiciones de la Alcaldia Municipal del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción, Mejoramiento y Adiciones de la Alcaldia Municipal del Municipio.	483,971.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	483,971.85
Monto Total:		483,971.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	483,971.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	483,971.85

Firma y Sello de Presupuestario

KENNY VELIMIR BANEGAS
CAH - LV - 1415

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA
Identidad No.: 1201-1982-003000s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94li6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFi5vulTsLT2YmLkeUX6fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R
xapLzgZD1XGt6l8Qj8bBg==

**ARQUITECTOS E INGENIEROS
CONSTRUCTORES**

Prop. Kenny Velimir Banegas Mejia
CAH-1415

Profesión u Oficio: ARQUITECTO, EDIFICIOS

Tel. 2774-2485, Cel. 9780-7341 / R.T.N. 12011982003000

CAI:8B0A26-33518E-154BB6-CDF298-A020AB-7E

Bo. La Concepción, esquina opuesta al CRIP, La Paz, La Paz

E-mail:aicstudio3@gmail.com



Por L. **483,971.85**

Fecha, 28 de FEBLEPO del 2023

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

R.T.N. 12049995434017

La cantidad de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPICAS CON 85/100

Por concepto de: PAGO DE PRIMECA ESTIMACIÓN

DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION

DEL SEGUNDO NIVEL PARA OFICINAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

Impresos y Gráficos Independencia, Bo. Alajó, frente a las Oficinas de ZEH, Contrayuga / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10600-54



Rango otorgado: 12049995434017 000-001-04-00000225

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000207**

Total por Honorarios L.		
Total de la Retención L.		
Total Neto Recibido L.	483,971	85

ESTIMACION 1

Proyecto: Construccion segundo nivel para oficinas Alcaldia Municipal de Cane

Propietario: Municipalidad de Cane


Ubicación: Cane, La Paz

Periodo: Del 21 de noviembre del 2022 al 28 de febrero del 2023

Ítem	Concepto	unidad	CONTRATADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO EN EL PERIODO		ACUMULADO		% AVANCE
			Cantidad	Precio Unif.	Precio Total	Cantidad	Precio Unif.	Cantidad	Precio Total	Cantidad	Precio Total	
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	111.56	L. 73.81	L. 8,234.69			51.20	3,779.28	51.20	3,779.28	46%
2	DESMONTAJE DE CANAL A. LL. PVC (INCL. BAJANTE 3")	M.L.	18.12	L. 17.88	L. 323.90			17.88	319.61	17.88	319.61	99%
3	DESMONTAJE INST. ELECTR. (LAMP., VENT., TOMA E INT) Y AIRE ACONDICIONADO	DIA	1.00	L. 3,718.00	L. 3,718.00			1.00	3,718.00	1.00	3,718.00	100%
4	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M²	121.08	L. 64.35	L. 7,791.50			121.08	7,791.50	121.08	7,791.50	100%
5	DESMONTAJE DE CANALETA	UNID	22.46	L. 63.12	L. 1,417.72			22.46	1,417.56	22.46	1,417.56	100%
6	DEMOLICION DE CIELO FALSO (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M²	89.38	L. 77.22	L. 6,901.77			89.38	6,901.92	89.38	6,901.92	100%
7	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	UNID	4.00	L. 160.88	L. 643.50			4.00	643.50	4.00	643.50	100%
8	DESMONTAJE DE VENTANAS	M²	5.00	L. 100.39	L. 501.93			5.00	501.93	5.00	501.93	100%
9	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	M²	62.24	L. 89.38	L. 5,563.06			62.24	5,562.70	62.24	5,562.70	100%
10	DEMOLICION DE ELEM. CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML	M.L.	19.60	L. 57.20	L. 1,121.12			19.60	1,121.12	19.60	1,121.12	100%
11	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)	M²	40.81	L. 89.38	L. 3,647.39			40.81	3,647.39	40.81	3,647.39	100%
12	DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO	UNID	2.00	L. 214.50	L. 429.00			2.00	429.00	2.00	429.00	100%
13	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	M³	10.72	L. 446.88	L. 4,792.29			10.72	4,790.50	10.72	4,790.50	100%
14	CIMENTACION MAMPOSTERIA	M³	8.93	L. 1,678.83	L. 14,995.34			5.75	9,653.29	5.75	9,653.29	64%
15	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25, 6 N°5, a.s.	UNID	14.00	L. 2,380.17	L. 33,322.38			14.00	33,322.38	14.00	33,322.38	100%
16	COLUMNA 30 X 30, 8N°6, N°3 @ 0.2 CONC. 1:2:2	M.L.	99.96	L. 2,026.91	L. 202,609.72			63.00	127,695.20	63.00	127,695.20	63%
17	SOLERA 15X15 4 N°3, N°2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	173.10	L. 400.61	L. 69,345.24			60.10	24,076.54	60.10	24,076.54	35%
18	SOLERA 10X15 2N°3 Y N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	19.02	L. 287.08	L. 5,460.24			0.00	-	0.00	-	0%
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.	M²	320.36	L. 643.66	L. 206,201.64			18.09	11,643.74	18.09	11,643.74	6%
20	PARED DE TABLAYESO	M²	174.00	L. 893.56	L. 155,478.57			0.00	-	0.00	-	0%
21	VIGA DE B=20, H=40, 2 #5, 2 #8, #3 @ 0.30 CONC. 1:2:2	M.L.	102.20	L. 1,537.08	L. 157,089.68			28.40	43,653.10	28.40	43,653.10	28%
22	LOSA CONCRETO e=8 CMS N°3 a/c 30 CMS a/s CON LAMINA ALUZIG, CANALETA DOBLE 2x4 Pul	M²	280.24	L. 1,753.43	L. 491,380.38			121.41	212,883.57	121.41	212,883.57	43%
23	CURADO DE LOSA	M²	280.24	L. 91.65	L. 25,684.00			121.41	11,127.23	121.41	11,127.23	43%
24	CASTILLO 15X15, 4 N°3, N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	55.46	L. 393.52	L. 21,824.79			5.80	2,282.43	5.80	2,282.43	10%
25	JAMBA VERTICAL 10X15, 2#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	44.00	L. 294.27	L. 12,947.79			0.00	-	0.00	-	0%
26	CARGADOR DE 10X15 2#3; #2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.60	L. 330.47	L. 5,155.38			0.00	-	0.00	-	0%
27	SOLERA SUPERIOR 15X15 4 N°3, N°2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	47.94	L. 400.61	L. 19,205.15			0.00	-	0.00	-	0%
28	TECHO DE CANALETA 6" y 4" ALUZINC ONDU. C.S. UNA AGUA	M²	141.33	L. 1,299.00	L. 183,587.53			0.00	-	0.00	-	0%
29	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M²	40.81	L. 554.81	L. 22,641.96			40.81	22,641.96	40.81	22,641.96	100%
30	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M²	320.36	L. 255.22	L. 81,761.00			69.96	17,854.91	69.96	17,854.91	22%
31	CERAMICA EN PISO 30 X 30	M²	290.88	L. 952.34	L. 277,016.95			0.00	-	0.00	-	0%
32	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.15 MT	M.L.	199.92	L. 99.15	L. 19,822.27			96.90	9,607.73	96.90	9,607.73	48%
33	CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2 X4, Y FLEJE ALUMINIO	M²	99.43	L. 556.32	L. 55,315.10			0.00	-	0.00	-	0%
34	VENTANA FRANCESA	UNID	12.00	L. 4,290.00	L. 51,480.00			0.00	-	0.00	-	0%
35	PUERTA METALICA (2.1X1 MTS.)	UNID	12.00	L. 9,076.51	L. 108,918.11			0.00	-	0.00	-	0%
36	SUMINISTRO Y INSTALACION DE TUBERIA PVC ½"	M.L.	31.84	L. 32.81	L. 1,044.73			16.90	554.52	16.90	554.52	53%
37	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE ½" Ø X90°	UNID	11.00	L. 29.15	L. 320.61			8.00	233.17	8.00	233.17	73%
38	SUM. E INST. DE TEE P.V.C.	UNID	9.00	L. 34.35	L. 309.11			5.00	171.73	5.00	171.73	56%
39	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	11.98	L. 124.64	L. 1,493.24			5.98	745.37	5.98	745.37	50%
40	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	10.61	L. 56.00	L. 594.20			5.60	313.62	5.60	313.62	53%
41	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE 2" Ø X90°	UNID	3.00	L. 98.05	L. 294.14			3.00	294.14	3.00	294.14	100%

42	SUM. E INST. SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)	UNID	6.00	L. 5,996.28	L. 35,977.66			0.00	-	0.00	-	0%
43	SUM. E INST. DE LAVAMANOS (INC. ACCESORIOS)	UNID	3.00	L. 2,665.27	L. 7,995.82			0.00	-	0.00	-	0%
44	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	2.00	L. 1,770.44	L. 3,540.89			0.00	-	0.00	-	0%
45	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP. POLIDUCTO ½	M.L.	100.10	L. 108.93	L. 10,903.59			0.00	-	0.00	-	0%
46	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP. POLIDUCTO 3/4	M.L.	109.13	L. 113.11	L. 12,344.02			0.00	-	0.00	-	0%
47	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	18.00	L. 512.40	L. 9,223.11			0.00	-	0.00	-	0%
48	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	8.00	L. 486.02	L. 3,888.14			0.00	-	0.00	-	0%
49	SUM. E INST. DE LAMPARA INCANDESCENTE	UNID	10.00	L. 531.90	L. 5,318.95			0.00	-	0.00	-	0%
50	PINTURA ACRILICA (BASE AGUA)	M²	494.36	L. 96.20	L. 47,557.43			0.00	-	0.00	-	0%
51	PASAMANO HG 1-1/2", 1 MT DE ALTO	M.L.	43.04	L. 2,968.28	L. 127,754.64			0.00	-	0.00	-	0%
52	GRADAS DE CONCRETO	M²	29.61	L. 5,249.69	L. 155,443.20			0.00	-	0.00	-	0%
sub total					L. 2,690,332.55		L. -		L. 569,378.65		L. 569,378.65	
sub total					L. 2,690,332.55		L. 0.00		L. 569,378.65		L. 569,378.65	
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTOS		GLB	1.00	1.00	L. 2,690,332.55		L. 0.00		L. 569,378.65		L. 569,378.65	
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO		GLB	1.00	1.00	L. 2,690,332.55		L. 0.00		L. 569,378.65		L. 569,378.65	21%

SUBTOTAL ESTIMACION	L. 569,378.65
DEVOLUCION 15% POR ANTICIPO	L. 85,406.80
TOTAL A PAGAR	L. 483,971.85


CONTRATISTA
 KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA
 AIC


CONTRATANTE
 CO BUSTILLO
 ALCALDE MUNICIPAL


TESORERA
 GARMEN MARIA NOLASCO REYES


INGENIERO MANSUCOPA
 NAHUM ORTEGA TROCHEZ



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto
"PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS EN ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE., DEL MUNICIPIO DE CANE. Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	
-----------------------	--	--

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE.

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Nombre del contratista: CONSTRUCTORA AIC ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES.

Nombre del supervisor: ing. Nahúm Ortega "MANSUCOPA"

Fecha de presentación del informe: 21/11/2022- 28/2/2023



FOTOGRAFIAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

"PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINAS EN ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE."

UBICACIÓN MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ


Ítem	Actividad	Cantidad
1.00	TRAZADO Y MARCADO	51.20 M.L.

Ítem	Actividad	Cantidad
2.00	DESMONTAJE DE CANAL A. LL. PVC (INCL. BAJANTE 3")	17.88 M.L.

Ítem	Actividad	Cantidad
3.00	DESMONTAJE INST. ELECTR.(LAMP.,VENT.,TOMA E INT) Y AIRE ACONDICIONADO	1.00 DIA



Ítem	Actividad	Cantidad
4.00	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	121.08 M2

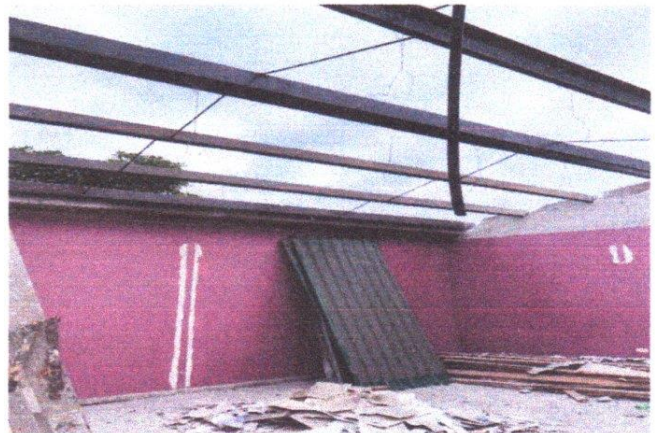

Ítem	Actividad	Cantidad
5.00	DESMONTAJE DE CANALETA	22.46 UNID



Ítem	Actividad	Cantidad
6.00	DEMOLICION DE CIELO FALSO (INCL. ACARREO 20 MTS.)	89.38 M2



Ítem	Actividad	Cantidad
7.00	DESMONTAJE DE PUERTAS INCLUYE CONTRAMARCO	4.00 UNID





Ítem	Actividad	Cantidad
8.00	DESMONTAJE DE VENTANAS	501.93 M2




Ítem	Actividad	Cantidad
9.00	DEMOLICION DE PARED (BLOQUE/LADRILLO/ADOBE)	62.24 M2




Ítem	Actividad	Cantidad
10.00	DEMOLICION DE ELEM.CONCRETO 0.10-0.25 M ANCHO / ML	19.60 M.L.

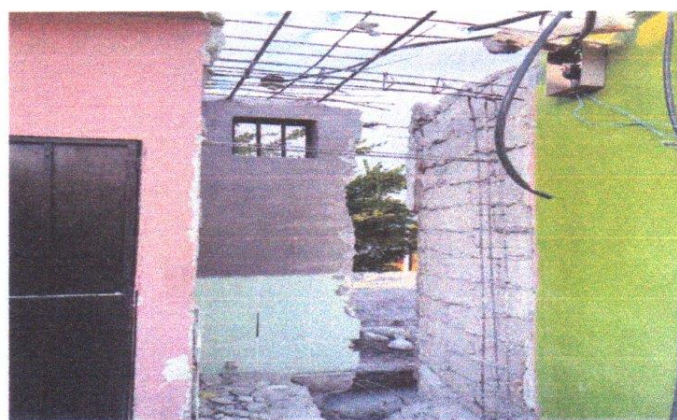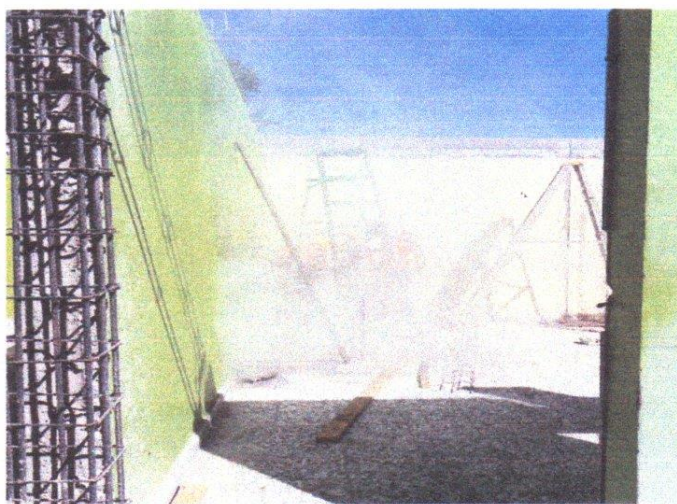



Ítem	Actividad	Cantidad
11.00	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (8 - 10 CM.)	40.81 M2

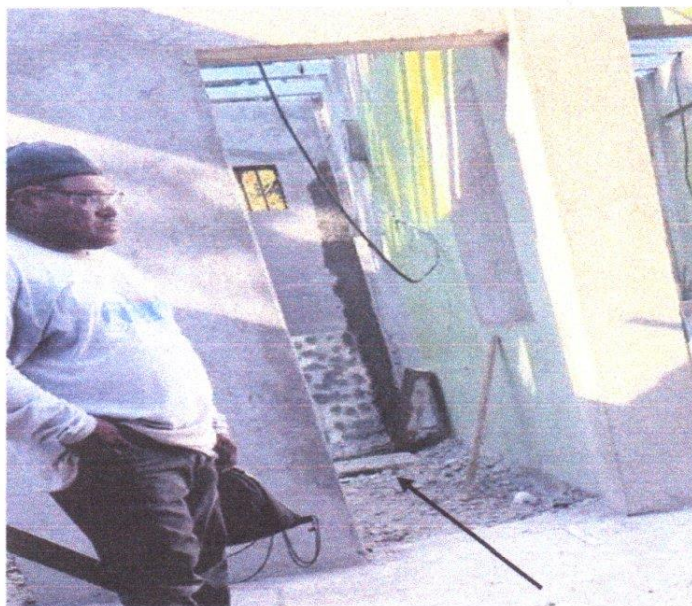


Ítem	Actividad	Cantidad
12.00	DESMONTAJE DE INODOROS/LAVAMANOS/URINARIO	2.00 UNID

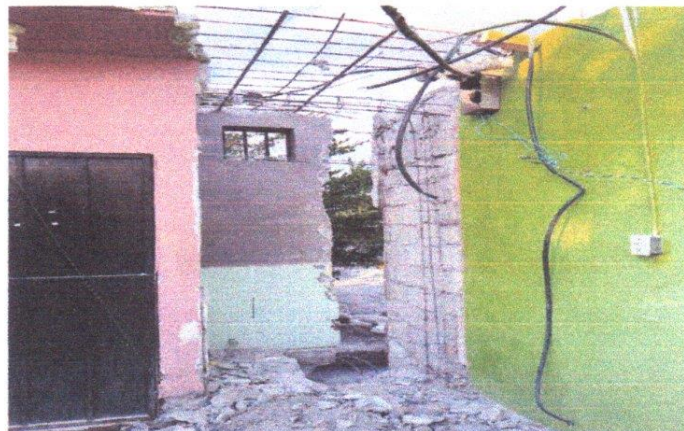


Ítem	Actividad	Cantidad
13.00	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	10.72 M3

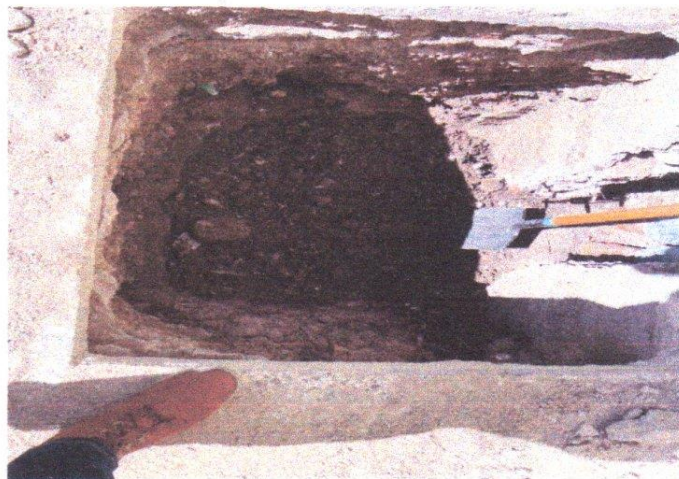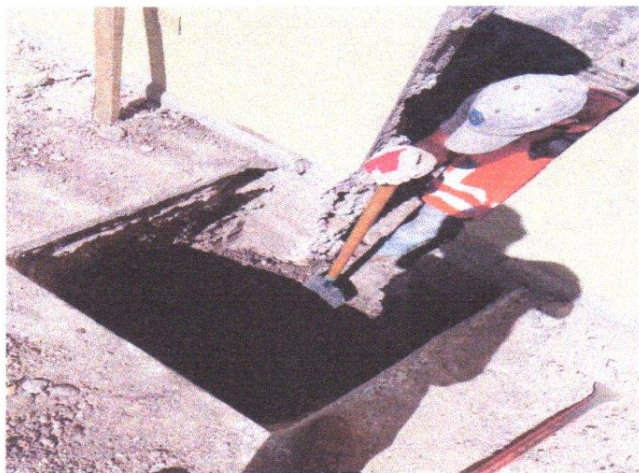


Ítem	Actividad	Cantidad
14.00	CIMENTACION MAMPOSTERIA	5.75 M3

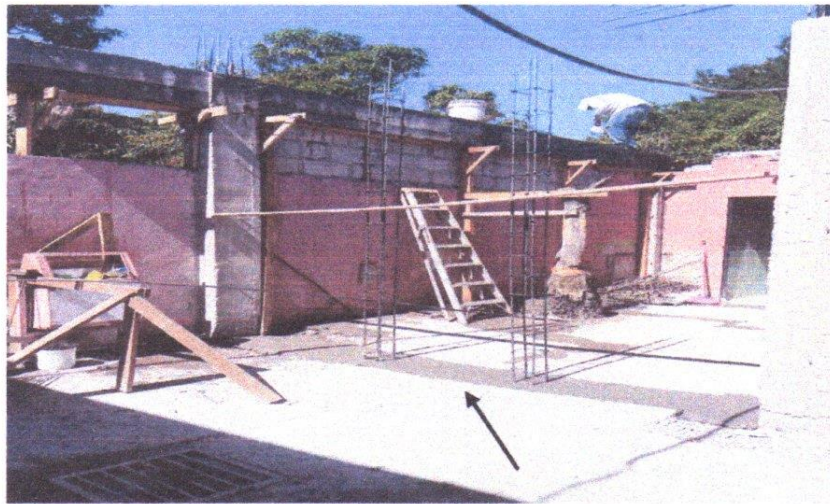


Ítem	Actividad	Cantidad
15.00	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.25 , 6 N°5, a.s.	14.00 UNID

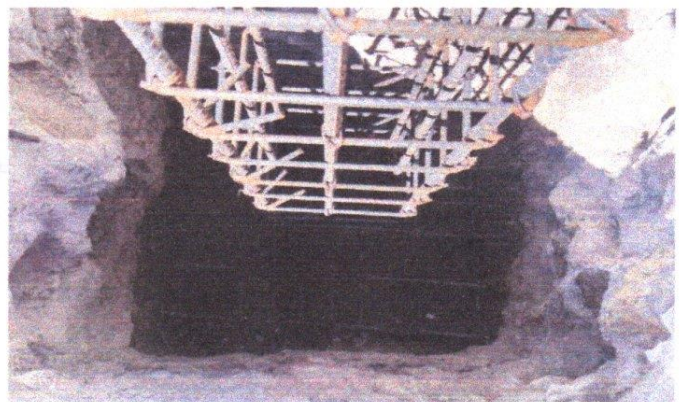


Ítem	Actividad	Cantidad
16.00	COLUMNA 30 X 30, 8Nº6, Nº3 @ 0.2.CONC. 1:2:2	63.00 M.L.

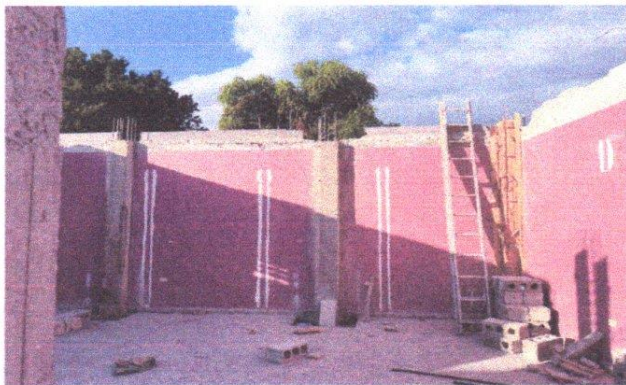

Ítem	Actividad	Cantidad
17.00	SOLERA 15X15 4 Nº3, Nº2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	60.10 M.L.

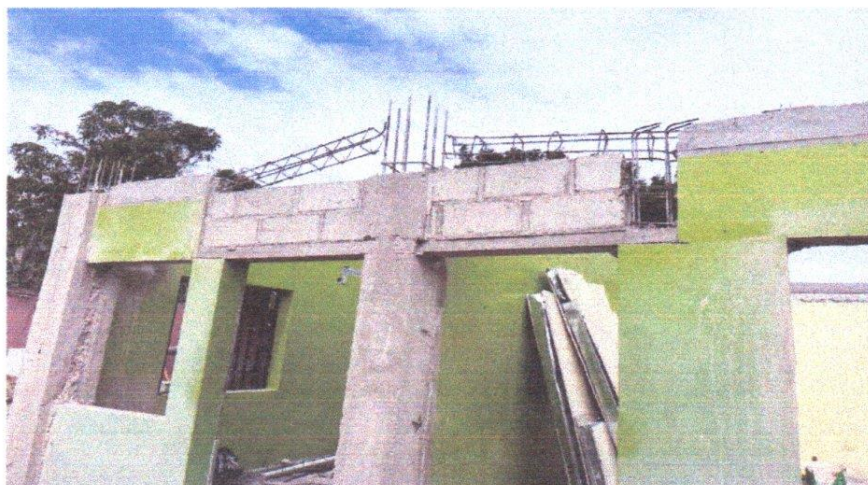


Ítem	Actividad	Cantidad
19.00	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.	18.09 M2

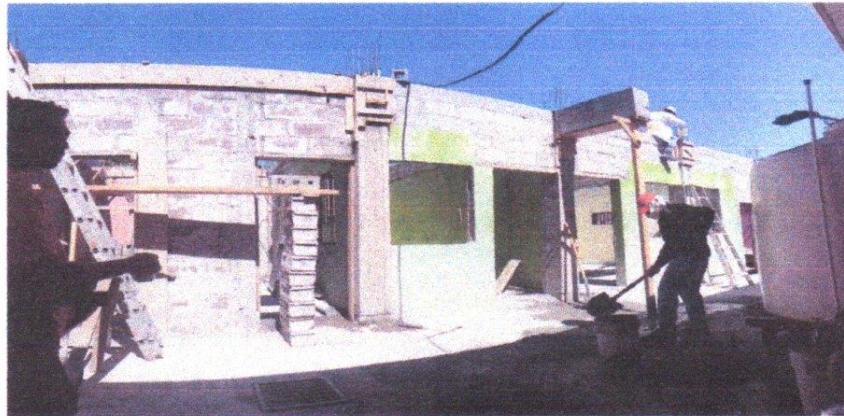

Ítem	Actividad	Cantidad
21.00	VIGA DE B=20, H=40,2 #5,2 #8, #3 @ 0.30,CONC.1:2:2	28.40 M.L.




Ítem	Actividad	Cantidad
22.00	LOSA CONCRETO e=8 CMS Nº3 a/c 30 CMS a/s CON LAMINA ALUZIG, CANALETA DOBLE 2x4 Pul	121.41 M2

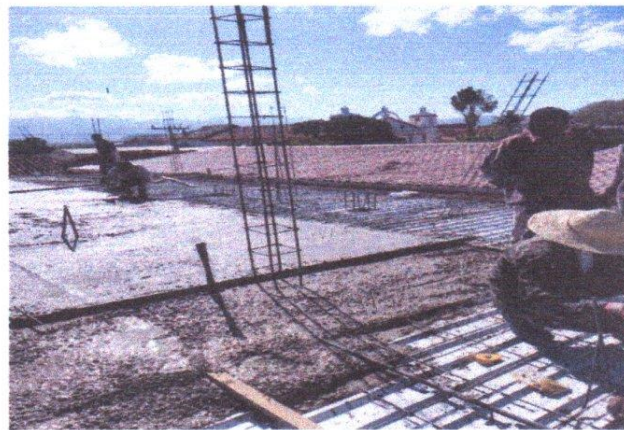


Ítem	Actividad	Cantidad
23.00	CURADO DE LOSA	121.41 M2


Ítem	Actividad	Cantidad
24.00	CASTILLO 15X15, 4 Nº3, Nº2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	5.80 M.L.

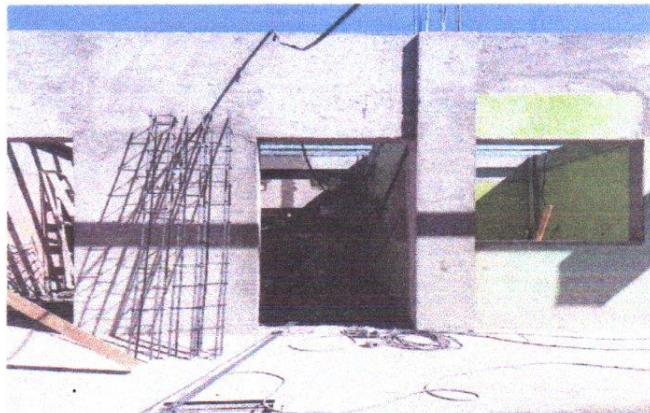


Ítem	Actividad	Cantidad
32.00	TALLADO DE ELEMENTOS L=0.15 MT	96.90 M.L.

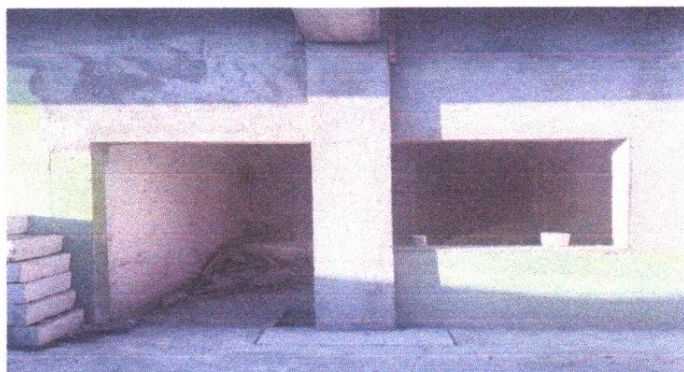

Ítem	Actividad	Cantidad
36.00	SUMINISTRO Y INSTALACION DE TUBERIA PVC ½"	16.90 M.L.

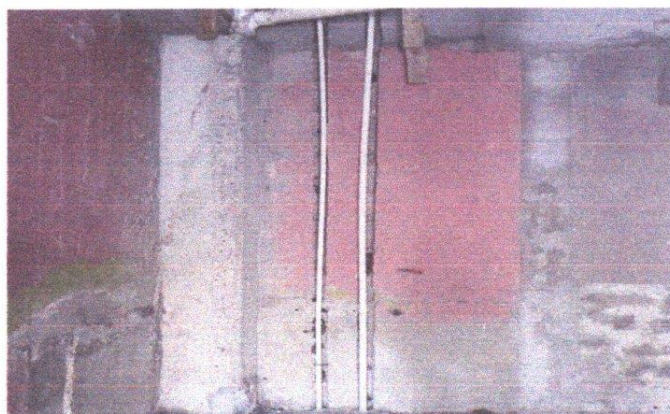

Ítem	Actividad	Cantidad
29.00	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	40.81 M2

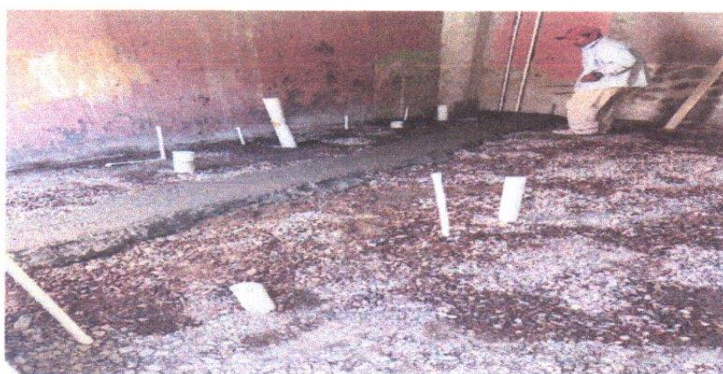


Ítem	Actividad	Cantidad
30.00	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	69.96 M2




Ítem	Actividad	Cantidad
37.00	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE ½" Ø X90º	8.00 UNID

Ítem	Actividad	Cantidad
38.00	SUM. E INST. DE TEE P.V.C.	5.00 UNID

Ítem	Actividad	Cantidad
39.00	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4"	5.98 M.L.

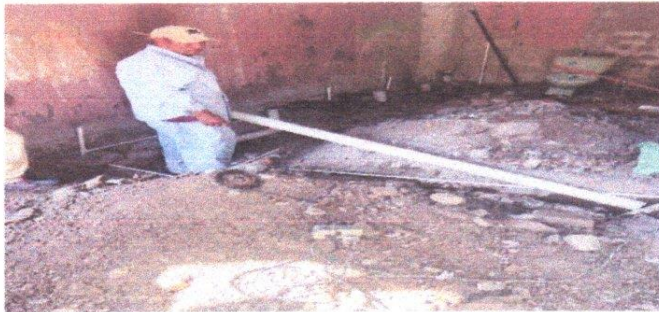

Ítem	Actividad	Cantidad
40.00	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	5.60 M.L.

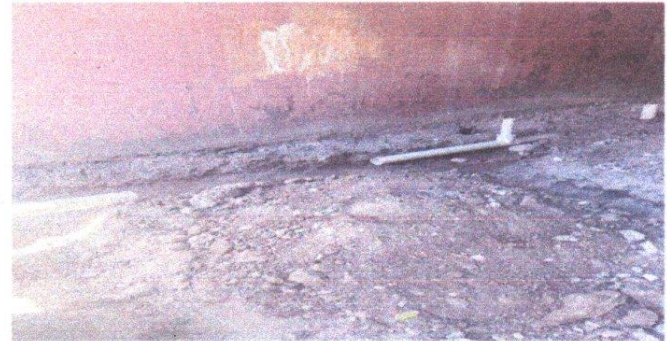

Ítem	Actividad	Cantidad
41.00	SUM. E INST. DE CODO P.V.C. DE 2" Ø X90º	3.00 UNID

FECHA 21 / 11 / 2022

Nº

Proyecto: AMPLIACION DE OFICINAS, CONSTRUCCION
DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL
EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE.

Ubicacion: BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ.

ESTE DIA SE PROCEDE APERTURA ESTE LIBRO DE
BITACORA PARA HACER LAS ANOTACIONES MAS RELEVANTES
DE DICHO PROYECTO, ASI COMO AVANCES, MODIFICACIONES,
ADICIONES SI LAS HUBIESEN.

QUEDANDO ESTABLECIDO TAMBIEN ESTE DIA COMO ORDEN
DE INICIO, SE ESTABLECE UNA DURACION DE 180 DIAS
CALENDARIO PARA LA EJECUCION DE DICHO PROYECTO.



SUPERVISOR
INVS. NAHOM ORTEGA
MANGUPOA.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 21 / 11 / 2022

Nº

SE COMENZO CON EL TRABAJO DE DESMONTAJE DEL CIELO FALSO EN OFICINA #1.

OFICINA #1 → MEDIDAS

DE FRENTE = 6.82 METROS.

PORTE LATERAL = 5.70 METROS.

PUERTA #1

ALTO = 1.96 METROS

ANCHO = 1.0 METROS

VENTANA #1

ALTO = 1.15 METROS

ANCHO = 2.2 METROS

PUERTA #2

ALTO = 2.13 METROS

ANCHO = 1.0 METROS

VENTANA #2

ALTO = 1.20 METROS

ANCHO = 2.26 METROS

22 DE NOVIEMBRE DE 2022

→ SE CONTINUO CON EL DESMONTAJE DEL CIELO FALSO OFICINA #2 Y #3.

→ SE REALIZO EL DESMONTAJE DE MADERA Y VIGAS DE OFICINA #1, #2, #3.

→ DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA #1

→ DESMONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA (LAMP, TOMA E INTER.)

→ DESMONTAJE DE ALUZINC EN OFICINAS #1, #2, #3.

→ DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA #3.

COLEGIO DE
ARQUITECTOS
DE HONDURAS

KENNY VELIMIR BANEGAS
CAH-LV-1415

FECHA 27 / 11 / 2022

N°

→ MEDIDAS DE OFICINA #2

PARTE FRONTAL = 4.55 METROS.

PARTE LATERAL = 5.65 METROS

→ PUERTA #1

ALTO = 2.13 METROS

ANCHO = 1.0 METROS

VENTANA #1

ALTO = 2.26 METROS

ANCHO = 1.20 METROS

→ MEDIDAS DE OFICINA #3

PARTE FRONTAL = 2.30 METROS

PARTE LATERAL = 5.66 METROS

→ PUERTA #1

ALTO = 2.13 METROS

ANCHO = 1 METROS

VENTANA #1

ALTO = 1.20 METROS

ANCHO = 2.26 METROS

23/NOVIEMBRE/2022

→ SE CONTINUO CON EL DESMONTAJE DE CANAL PVC
(INCLUYENDO BAYANTE DE 3").

→ SE REALIZO DESMONTAJE DE CANALETA.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kenny Velimir Banegas".

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 24 / 11 / 2022

Nº

→ SE COMENZO CON LA DEMOLICION DE CULATAS.

HERRAMIENTAS USADAS.

→ ALMACANA.

→ CINCEL.

OFICINAS #1, #2, #3.

4 CULATAS

MEDIDAS = 5.70 METROS

→ POR LA TARDE TAMBIEN SE COMENZO CON LA DEMOLICIÓN DEL CANAL PARA AGUA LLUVIA DE CONCRETO EN LA PARTE TRACERA.

25 / NOVIEMBRE / 2022.

→ SE CONTINUO TRABAJANDO EN LA DEMOLICION DE CANAL PARA AGUA LLUVIA EN LA PARTE TRACERA.



[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 28 / 11 / 2022

Nº

→ SE RECIBIO MATERIAL, PARA REALIZAR CASTILLOS Y ZAPATAS.

* VARILLA $3/8"$ PARA ANILLOS.

* VARILLA $1/2"$ LG PARA CASTILLOS.

* VARILLA $5/8"$ LG PARA ZAPATA.

* ALAMBRE DE AMARRE

* CLAVOS $2 1/2"$.

→ SE TRABAJO EN EL CORTE DE VARILLA PARA ANILLOS DE $3/8"$

→ CORTE DE VARILLA $1/2"$ LG PARA ARMAR CASTILLOS.

CASTILLO.

- 8 PEDAZOS DE VARILLA DE $1/2"$ LG (4.50 M CADA PEDAZO)
- 30 PEDAZOS DE VARILLA $8.5 \times 3/8"$ PARA ESTRIBOS O ANILLOS. (1.10 CM CADA PEDAZO).

→ CASTILLO SISTEMA ANTISISMICO.


LOS ANILLOS 13 PRIMEROS VAN A 10 CM, LOS SIGUIENTES 7 ANILLOS VAN A 20 CM Y LOS 13 ANILLOS FINALES VAN A 10 CM

→ CASTILLO DE 25×25

→ EMPALME DE 50 CM

AYER SE REALIZARON 4 CASTILLOS
HERRAMIENTAS USADAS.

- CORTADORA DE CONCRETO MANUAL.
- CINCEL — PLOCHA
- ALMAQUANA — BARRA
- PALA
- POLIDORA PARA CORTAR HIERRO EXISTENTE.



[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 29 / 11 / 2022

Nº

→ SE CONTINUO TRABAJANDO EN LA REALIZACION DE ANILLOS Y CASTILLOS.

→ POR LA TARDE SE COMENZO CON EL CORTE DE PARED REALIZANDO ASI EL TRAZADO, SEGUIDO DEL CORTE DE PAREDES Y PISO, PARA COMENZAR A FUNDIR ZAPATAS Y HACER CASTILLOS.

→ PROFUNDIDAD DE ZAPATA 1 METRO.
ZAPATA 80X80

→ ALTURA DE CASTILLO 2.90 METROS.



[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 30 / 11 / 2022

N°

- SE CONTINUO CORTANDO PAREDES PARA REFORZAR CON CASTILLOS.
- SE CORTO Y DEMOLIO PISO PARA HACER AGUJERO PARA ZAPATAS #3, #4.
- PROFUNDIDAD 1 METRO.
- ZAPATA 80X80
- ALTURA DE PARED DEMOLIDA PARA CASTILLOS 2.90 METROS.

1 DICIEMBRE DE 2022.

- SE CONTINUO HACIENDO CASTILLOS Y ROMPIENDO SUELO PARA ABIR AGUJEROS de 80X80 PARA COLOCAR ZAPATAS #3 Y ZAPATA #4 PARTE FRONTAL.
- SE SACARON MEDIDAS PARA COMPRAR TABLAS QUE SE UTILIZARAN EN EL ENCOFRADO DE COLUMNAS, CON EL MAESTRO DE OBRA.



[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 2 / 12 / 2022

N°


- SE CONTINUO HACIENDO LOS AGUJEROS PARA LAS ZAPATAS #3, #4, #5.
- SE CORTO PARED PARA LA COLOCACION DE CASTILLO Y ZAPATA #4.
- SE COMENZO A REALIZAR PETATES PARA ZAPATAS CON VARILLA DE 5/8 LEGITIMA.
CORTANDO 12 PEDAZOS DE 0.75, 6 PARA CADA LADO.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

- ALICATE
- PALA
- BARRA
- CORTADORA DE CONCRETO MANUAL.

SABADO 3 DE DICIEMBRE DE 2022.

- SE DEMOLIO PARED QUE SE RAJO DE OFICINA #1.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "K. Banegas".

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 5 / 12 / 2022

N°

- SE TERMINO DE HACER LOS AGUJEROS DE LAS ZAPATAS.

MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2022.

- SE COMENZO A FUNDIR ZAPATAS.


MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022.

- SE COMENZO A FUNDIR PEDESTALES

JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2022

- SE CONTINUO FUNDIENDO PEDESTALES.

- SE COMENZO A HACER AGUJEROS DE ZAPATAS DE LA PARTE POSTERIOR.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 9 / 12 / 2022

Nº

- SE REALIZARON FUNDICIONES DE PEDESTALES DE 2 ZAPATAS POSTERIORES.
- SE DEMOLIO PARTES DE LAS PAREDES, ARRIBA DE LAS PUERTAS DE OFICINAS #2, #3 CON FISURAS, PARA HACER REPARACIONES.

SABADO 10 DE DICIEMBRE DE 2022.

- SE ENCOFRARON COLUMNAS #3, #4
- SE RELLENARON DE TIERRA LOS AGUJEROS DE LAS ZAPATAS #7, #9, #10.
- SE FUNDIO PEDESTAL DE COLUMNA #7.
- SE METIERON BLOQUES.

LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2022.

- SE REALIZO CORTE DE PAREDES PARA CASTILLOS #8, #11.
- SE DEMOLIO PARED QUE VA DEL CASTILLO #6 AL #7.



BITÁCORA DE OBRA


FECHA 13 / 12 / 2022

Nº

- SE COMENZO A FUNDIR COLUMNAS #2, #3, #4.
- SE REPARO CONTADURA DE CONCRETO.
- SE HICIERON AGUJEROS DE ZAPATAS #8, #11.
- SE CONTINUO CON EL CORTE DE PAREDES PARA COLOCAR CASTILLOS.

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2022.

- SE CONTINUO CORTANDO PAREDES PARA COLOCACION DE CASTILLOS PARA REFONZAR #12, #13, #14.
- SE HIZO CORTE DE PARED PARA VENTANAS DE OFICINAS #2, #3.
- SE CULMINO AGUJERO DE ZAPATA #11.



[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 15 / 12 / 2022

N°


- SE FUNDIO DADOS DE CONCRETO DONDE VA COLOCADA LA PARRILLA DE VARILLA DE 5/8 (ZAPATA) #11, #10.
- SE FUNDIO PEDESTAL DE LAS ZAPATAS #11 Y #10.

VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

- SE COMIENZO A REALIZAR AGUJEROS PARA LAS ZAPATAS #12 Y #13.
- SE REALIZO CORTE DE PARED PARA LA COLOCACIÓN DE CASTILOS #12 Y #13.
- SE FUNDIO COLUMNA #7.

SABADO 17 DE DICIEMBRE DEL 2022.

- SE CONTINUO REALIZANDO LOS 2 AGUJEROS DE LAS ZAPATAS #12 Y #13.
- SE DEMOLIO PARTE DE LOS BAÑOS.
- SE FUNDIO COLUMNA #9.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kenny Velmir Banegas".

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 19 / 12 / 2022

Nº

- SE FUNDIO COLUMNA #10.
- SE SACO Y BOTO TIERRA SACADA DE AGUJEROS.
- SE FUNDIO PEDESTAL DE COLUMNA #8.
- SE DESMONTÓ SANITARIO DE BAÑO DEMOLIDO
- SE DESMONTÓ PUERTA DE BAÑO.
- SE DEMOLU PARTE DE LA LOSA DE BAÑO.
- SE FUNDIO PEDESTAL PARA LA COLUMNA #12.

NOTA= SE HIZO UN CIMIENTO DE PIEDRAS JUNTO CON EL PEDESTAL, PORQUE SE ENCONTRO UNA PARED INTERNA.

- SE HIZO PARTE DE PARED ARRIBA DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS 2 Y 3, CON BLOQUE Y CARGADORES.

MARTES 20 DE DICIEMBRE DEL 2022.

- SE FUNDIO COLUMNA #8.
- SE CONTINUO SACANDO Y BOTANDO TIERRA DE AGUJEROS.
- SE FUNDIO COLUMNA #11.
- SE CONTINUO CON LA PERFORACION DE AGUJERO PARA LA ZAPATA #13.



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the architect Kenny Velimir Banegas.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 21 / 12 / 2022

N°

- SE ENCOFRÓ COLUMNA #12.
- SE CONTINUÓ CON LA PERFORACIÓN DEL AGUJERO PARA LA ZAPATA #13.
- SE COMIENZO A PEGAR BLOQUES DE PARED QUE SE BOTO DE LA OFICINA #1.
- SE CONTINUÓ BOTANDO TIERRA Y BOTANDO EN CAMION.
- SE RECIBIO 5M3 DE ARENA LAVADA.

JUEVES 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.

- SE CONTINUÓ CON EL AGUJERO PARA LA ZAPATA #3
- SE COMIENZO A PERFORAR AGUJERO PARA LA ZAPATA #14.
- SE CONTINUÓ PEGANDO BLOQUES EN LA OFICINA #1.



[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 23 / 12 / 2022

Nº

- SE CONTINUO CON LA PERFORACION DEL AGUJERO DE LA ZAPATA #14.
- SE COMENZO CON LA PERFORACION DEL AGUJERO PARA LA ZAPATA #1.
- SE CONTINUO DEMOLIENDO LOSA DE BAÑO.
- SE FUNDIO SOLERA Y CARGADOR DE OFICINA #1.
- SE METIO ARENA DEL PARQUE A LA CONSTRUCCION.
- SE FUNDIO DADOS DE CONCRETO PARA COLOCAR PETATE DE ZAPATAS #1, #13, #14.
- SE COLOCARON LOS PETATES DE VARILLA DE ZAPATAS #1, #13, #14.

LUNES 26 DE DICIEMBRE DE 2022.

- NO SE TRABAJO.

MARTES 27 DE DICIEMBRE DEL 2022.

- SE RECIBIO VARILLA 3/8 8.5 PARA ANILLOS
- SE PEGARON TODOS LOS BLOQUES DE OFICINA #1.
- SE HICIERON ANILLOS PARA LAS VIGAS
- SE DEMOLIO PILA EXISTENTE
- SE TERMINO AGUJERO DE ZAPATA #14.
- SE FUNDIO DADOS DE CONCRETO PARA LA ZAPATAS #1 y #13.
- SE COLOCARON PETATES DE VARILLA DE ZAPATAS.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 28 / 12 / 2022

Nº

- SE FUNDIO SOLERA (ARRIBA) OFICINA #1.
- SE FUNDIO VADO DE CONCRETO PARA LA ZAPATA #14.
- SE RECIBIO GRAYA.
- SE FUNDIO SOLERAS (ARRIBA) DE OFICINA #2 Y #3.
- SE FUNDIO COLUMNA #12.

JUEVES 29 DE DICIEMBRE DEL 2022.

- SE METIO GRAYA DEL PARQUE A LA CONSTRUCCION
- SE FUNDIERON PEDESTALES PARA COLUMNAS #1, #13, #14.
- SE DESENCOFRO SOLERA OFICINA #1.

VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2022

- SE ENCOFRARON COLUMNAS #1, #13.
- SE RETIRO MATERIAL DE PAREDES CORTADAS Y DE AGUJEROS DE CASA QUE COLINDA CON LA CONSTRUCCION.



[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 4 / 1 / 2023

Nº

- SE DESENCOFRO LA COLUMNA #1.
- SE ENCOFRARON Y FUNDIERON DOS RESTOS O FINALES DE COLUMNAS
- SE CONTINUO HACIENDO ANILLOS.
- SE COMENZO A ARMAR HIERRO PARA VIGAS.
- SE SACO Y BOTO DESECHOS DE TIERRA.

JUEVES 5 DE ENERO DE 2023.

- SE ENCOFRO COLUMNA #14
- SE FUNDIO COLUMNA #14
- SE DESENCOFRO COLUMNAS O PARTES DE COLUMNAS FUNDIDAS EL MIERCOLES
- SE ARMARON LAS PRIMERAS VIGAS
- SE CONTINUO HACIENDO ANILLOS.

VIERNES 6 DE ENERO DE 2023.

- SE TERMINARON DE ARMAR LAS 4 VIGAS
- SE METIERON VARILLAS DE REFUERZO A VIGAS.
- SE DEMOLIO LA OTRA PARTE DEL BAÑO.
- SE LORTO LA ARMAZON DE HIERRO DE LOSA DEL BAÑO.
- SE SACO LO DEMOLIDO (RESTOS DE CONCRETO.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 7 / 1 / 2023

Nº

- SE SUBIO EL HIERRO DE LAS VIGAS.
- SE PILOTIO LA VIGA QUE VA AEREA.
- SE PEGARON TRES LINEAS DE BLOQUES DE PARED QUE VA DE LA COLUMNA #1 A LA COLUMNA #14.
- SE DESENCOFRO COLUMNA #14.

LUNES 9 DE ENERO DE 2023.

- SE DESENCOFRO LA VIGA QUE VA AEREA.
- SE FUNDIO LA VIGA QUE VA AEREA.

NOTA:

VIGA = 5.80 LARGO

40 CM ALTO

26 CM ALTO

SE UTILIZARON 9 BOLSAS DE CEMENTO.

MARTES 10 DE ENERO DE 2023

- SE SUBIO EL HIERRO DE LA VIGA #1
- SE ENCOFRO VIGA #2
- SE FUNDIO VIGA #1

NOTA:

VIGA = 5.80 ALTO

40 CM ALTO

26 CM ALTO

SE UTILIZARON 9 BOLSAS DE CEMENTO.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 11 / 1 / 2023

Nº

- SE DESENCOFRO VIGA #3 QUE VA AEREA (SOLO LATERALES)
- SE ENCOFRO VIGA #1
- SE ENCOFRO Y FUNDIO VIGA #1.

NOTA: 5.80 ALTO

40 CM ALTO

26 CM ALTO

- SE UTILIZARON 9 BOLSAS DE CEMENTO.

JUEVES 12 DE ENERO DE 2023

- SE DESENCOFRO VIGA #2
- SE COMENZO A PEGAR ANILLOS DE BLOQUES EN TODAS LAS PAREDES PARA NIVELARLAS.
- SE ENCOFRO VIGA #4.

VIERNES 13 DE ENERO DE 2023.

- SE FUNDIO VIGA #4
- SE CONTINUO PEGANDO HILADAS DE BLOQUES PARA MONTAR SOLERA.
- SE HICIERON ANILLOS.



[Handwritten signature]

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 14 / 1 / 2023

Nº

- SE ARMO HIERRO PARA SOLERA.
- SE SUBIO HIERRO
- SE BASTONIARON 4 COLUMNAS.
- SE CONTINUO HACIENDO ANILLOS.
- SE CONTINUO PEGANDO BLOQUES.

LUNES 16 DE ENERO DEL 2023

- SE DESENCOFRARON TODAS LAS VIGAS.
- SE ABRIÓ SANJO PARA FUNDIR ZAPATA PARA LEVANTAR PARED DE LOS BAÑOS
- SE ENCONTRÓ Y FUNDIO PARTE DE LA SOLERA FINAL DE CIERRE.

MARTES 17 DE ENERO DEL 2023.

- SE FUNDIO EL SANJO DE PARED DE LOS BAÑOS.
- SE AMARRARON Y FUNDIERON DOS CASTILLOS DE PARED DE LOS BAÑOS.
- SE DESENCOFRO LA PRIMERA PARTE FUNDIDA DE LA SOLERA FINAL.
- SE ENCONTRÓ SEGUNDA PARTE DE LA SOLERA FINAL Y SE FUNDIO.
- SE CONTINUO ARMANDO HIERRO DE SOLERA FINAL.

COLEGIO DE
ARQUITECTOS
DE HONDURAS
KENNY VELIMIR BANEGAS
CAH-LV-1415

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 18 / 1 / 2023

Nº

- SE COMENZO A PEGAR BLOQUES DE LA PARED DE LOS BAÑOS.
- SE COLOCO HIERRO DE LA SOLERA DE LA PARED DE LOS BAÑOS
- SE FUNDIERON LOS DOS CASTILLOS COLOCADOS EN LA PARED
- SE ARMO EL ULTIMO HIERRO DE LA SOLERA FINAL

JUEVES 19 DE ENERO DEL 2023.

- SE COLOCO HIERRO Y SE ENCOFRO SOLERA, FALTANDO 6 METROS.
- SE TERMINO DE PEGAR BLOQUES EN PAREDES PARA PONER SOLERAS.
- SE DEMOLIERON LADRILLOS DE UNA SOLERA EXISTENTE.

VIERNES 20 DE ENERO DEL 2023.

- SE FUNDIERON DOS FINALES DE 2 METROS DE LOS CASTILLOS DE PARED DE LOS BAÑOS.
- SE FUNDIO TODA LA SOLERA QUE SE ENCOFRO UN DIA ANTERIOR.
- SE FUNDIO UN TROMO DE SOLERA DONDE SE DEMOLIO UNOS LADRILLOS.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. J." or similar.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 21 / 1 / 2023

N°

- SE ENCOFRÓ Y SE FUNDIÓ LA SOLERA DE PARED DE LOS BAÑOS.
- SE PEGARON DE LA ÚLTIMA PARTE DE PAREDES LEVANTADAS PARA TERMINAR DE FUNDIR LA SOLERA.
- SE FUNDIERON LAS TERMINACIONES DE COLUMNAS #1 Y #4.

LUNES 23 DE ENERO DE 2023.

- SE DESENCOFRARON TODAS LAS SOLERAS.
- SE ENCOFRARON Y FUNDIERON TERMINACIONES DE COLUMNAS #9, #11, #13.
- SE COMENZÓ A REPELLAR PARED DE LOS BAÑOS.

MARTES 24 DE ENERO DE 2023

- SE ENCOFRÓ ÚLTIMO TRAMO DE LA SOLERA FALTANTE Y SE FUNDIÓ.
- SE TERMINÓ DE REPELLAR LA PARED DEL FRENTE DE LOS BAÑOS DE LA PARTE DE ATRAS.
- SE CONTINUÓ REPELLANDO PAREDES.

MIÉRCOLES 25 DE ENERO DE 2023.

- SE CONTINUÓ REPELLANDO TRAMOS NUEVOS DE LEVANTAMIENTO DE LAS PAREDES.

JUEVES 26 DE ENERO DE 2023.

- SE TALLARON BORNETES DE VENTANAS
- SE CONTINUÓ REPELLANDO PAREDES.



Handwritten signature

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 27 / 1 / 2023

Nº

- SE COMENZO A TALLAR COLUMNAS.

- SE COMENZO A PICAR COLUMNAS.

SABADO 28 DE ENERO DE 2023.

- SE CONTINUO TALLANDO COLUMNAS.

LUNES 30 DE ENERO DE 2023.

- SE CONTINUO TALLANDO COLUMNAS.

- SE COMENZO A ENSAMBLAR TUBOS DE 4X4 ESTRUCTURAL CHAPA 14 PARA LA LOSA.

MARTES 31 DE ENERO DE 2023.

- SE CONTINUO PICANDO Y TALLANDO COLUMNAS.

- SE CONTINUO ENSAMBLANDO TUBOS 4X4 ESTRUCTURAL CHAPA 14.

MATERIALES USADOS

- TUBO ESTRUCTURAL 4X4 CHAPA 14.

- ELECTRODO 6013 X 1/8

- DISCO DE PULIR #7


- VARIILA 3/8

HERRAMIENTAS USADAS

- SOLDADORA.

- PULIDORA.

- SE CERRO VENTANA CON BLOQUES Y SE REPELO.



Handwritten signature

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 1 / 2 / 2023

Nº

- SE CONTINUO PICANDO COLUMNAS
- SE CONTINUO TALLANDO COLUMNAS.
- SE CONTINUO ENSAMBLANDO TUBO ESTRUCTURAL 4x4.

* ESTAS MISMAS ACTIVIDADES SE REALIZARON LOS SIGUIENTES DIAS 2 DE FEBRERO, 3 DE FEBRERO Y 4 DE FEBRERO DE 2023.

LUNES 6 DE FEBRERO DE 2023.

- SE PICARON TODAS LAS VIGAS
- SE TERMINARON DE TALLAR LOS RESALTES DE COLUMNAS.
- SE COMENZO A SUBIR LOS TUBOS PARA COLGARLOS PARA LA LOSA.
- SE COMENZO A DEMOLER PISO DE CONCRETO DEL AREA DE BAÑOS Y SE SACO EL MATERIAL.

MARTES 7 DE FEBRERO DE 2023.

- SE TERMINO DE SUBIR LOS TUBOS
- SE CONTINUO ENSAMBLANDO ARRIBA LA PARTE QUE RESTABA DE LOS TUBOS ESTRUCTURALES 4x4.
- SE TALLARON LAS VIGAS #3, #4.
(#4 SOLO TIENE UNA CARA) (#3 TIENE 2 CARAS)
- SE COMENZO A TALLAR VIGA #7 (2 CARAS)
- SE TERMINO DE DEMOLER PISO DEL AREA DE BAÑOS.
- SE SACO RAIZ DEL PAU DE MANGO QUE HABIA EN ESA AREA.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 8 / 2 / 2023

Nº

- SE TALLARON LOS LADOS DE LAS VIGAS RESTANTES.
(SOLO FALTA LA PARTE DE ABAJO)
- SE FUNDIERON LOS PRIMEROS BATIENTES,
- SE CONTINUO ENSAMBLANDO TUBOS PARA LA LOSA.

JUEVES 9 DE FEBRERO DE 2023.

- SE TALLARON LAS PARTES SALIENTES DE LAS VIGAS.
- SE FUNDIERON LOS TRES BATIENTES RESTANTES.
- SE TALLARON LOS ULTIMOS 2 RESALTES DE LAS COLUMNAS #13, #14.
- SE FUNDIERON 7 TRAMOS DE PISO DE LAS COLUMNAS DONDE SE ROMPIO PARA LAS ZAPATAS.
- SE COMENZO A COLOCAR LOS TUBOS ESTRUCTURALES 4x4 EN LA POSICION QUE QUEDARAN PARA LA FUNDICION DE LA LOSA.

VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2023

- SE EMPALMARON TUBOS ESTRUCTURALES DE 4x4

NOTA:



SE ENSAMBLABAN TRES TUBOS Y LES FALTO 50 CM QUE SE EMPALMARON HOY.

- SE RESANARON DETALLES DE PAREDES Y DEJARLAS LISTAS PARA PUERTAS.
- SE HICIERON RANURAS PARA METER TUBOS PVC DE AGUA POTABLE QUE VAN HACIA EL TANQUE.

NOTA:

* SE USO TUBO PVC 1/2 DE PRESION.

* RANURA SE HIZO EN LA PARED POSTERIOR.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 11 / 2 / 2023

Nº

- SE CONTINUO EMPALMANDO LOS TUBOS DE 4x4 GALVANIZADOS.

LUNES 13 DE FEBRERO DE 2023.

- SE CONTINUO EMPALMANDO TUBOS DE 4x4 GALVANIZADOS.
- SE TALLO VIGA AEREA POR LA PARTE DE ABAJO.
- SE DEMOLIO EL SEGUNDO SANITARIO.
- SE COLLOCARON LOS PINES QUE VAN EN LOS TUBOS DE 4x4 GALV.
- SE SACO EL MATERIAL DE SANITARIO DEMOLIDO.
- SE SACO LOS LADRILLOS QUEBRADOS DONDE SE PERFORO AGUJERO PARA LAS ZAPATAS.

MARTES 14 DE FEBRERO DE 2023.

- SE SELLARON 2 VENTANAS QUE HABIAN EN LOS SANITARIOS DEMOLIDOS.
- SE SELLO 1 VENTANA QUE HABIA ENTRE OFICINA #1 Y #2.
- SE ARMARON LOS CASTILOS DE LAS PUERTAS DE LA SEGUNDA PLANTA.
- SE ARMARON LOS DOS CASTILOS DONDE IRAN EL TANQUE.
- SE TERMINO DE ENSAMBLAR TODOS LOS TUBOS 4x4 GALV.
- SE BOTO EN UN VIAJE MATERIAL QUE SE BOTO EN LA DEMOLICION DEL SANITARIO.

MIERCOLES 15 DE FEBRERO DE 2023.

- SE PONDIO UN CASTILLO PARA CUBRIR UN TUBO DE 3" pig DE LAS AGUAS GRISAS QUE VAN AL SEGUNDO NIVEL.
- SE HICIERON CINCO VIAJES DE ACARreo DE MATERIAL DE BAÑOS Y PISO DEMOLIDO.
- SE COMENZO A SUBIR ALUZINC PARA LA LOSA.

[Handwritten signature]



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 16 / 2 / 2023

Nº

- SE TERMINO DE SUBIR TODO EL AZULING.
- SE ATORNILLO TODOS LAS LAMINAS DE AZULING.
- SE SUBIO TODA LA VARILLA PARA LA LOSA DE 3/8".

VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2023.

- SE COLOCARON TAPONES CON CANALETA 4x2 - 1.30 mm EN LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS DE 4x4 GALV.
- SE COMENZO A AMARRAR EL HIERRO PARA LA LOSA.

SABADO 18 DE FEBRERO DE 2023.

- SE TERMINO DE AMARRAR TODO EL HIERRO PARA LA LOSA.
- SE METIERON LOS BLOQUES.

DOMINGO 19 DE FEBRERO DE 2023.

- SE ENCOFRÓ CASI TODAS LAS ORILLAS PARA FUNDIR LA LOSA.
- SE ENCOFRARON TODOS LOS DETALLES PARA FUNDIR LA LOSA.
- * PARTES DE COLUMNAS SALIENTES AL SEGUNDO NIVEL.
- * PARTE DE LA PARED POSTERIOR.

MARTES 21 DE FEBRERO DE 2023.

- SE TERMINO DE ENCOFRAR PARTE FRONTAL DE LA LOSA.
- SE SUBIERON Y COLOCARON LOS CASTILLOS DE LAS PUERTAS DEL SEGUNDO NIVEL.
- SE INICIO A HACER INSTALACIONES HIDRAULICAS DEL AREA DE BAÑOS DEL PRIMER NIVEL.
- SE INICIO A HACER AGUJERO DE LA CAYA DE CIRCUITOS PRIMER NIVEL.



Handwritten signature

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 22 / 2 / 2023

Nº

- SE CONTINUÓ Y SE TERMINÓ LAS CONEXIONES HIDRAULICAS
- SE COLOCARON CASTILLOS QUE VAN HACIA AL TANQUE.
- SE INSTALÓ LA CAJA DE CIRCUITOS
- SE HIZO ESTRUCTURA METALICA DE TUBO GALVANIZADO 4X4 CHAPA 14 Y AWZINC PARA EL DESCANSO DE LA GRADA DEL SEGUNDO AL TERCER NIVEL.

JUEVES 23 DE FEBRERO DEL 2023.

- SE FUNDIO PISO DEL AREA DE LOS SANITARIOS.
- SE REFORZO DESCANSO DE LA GRADA DEL SEGUNDO AL TERCER NIVEL CON VARIILLA DE 1/2 LG Y 5/8 LG.
- SE ENCOFRE DESCANSO DE LA GRADA.

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023

- SE COLOCARON TODAS LAS MAISTRAS DE LA LOSA.
- SE HICIERON TODAS LAS CONEXIONES DE LOS CIRCUITOS. DEL SEGUNDO NIVEL CON TUBERIA CONDUIT Cedula #30.
- SE MIDIO TODA LA TUBERIA DE LOS CIRCUITOS.
- SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LA PREPARACION DE LA FUNDICION DE LOSA.

SABADO 25 DE FEBRERO DEL 2023

- SE FUNDIO LOSA.
- SE CURÓ LOSA.
- SE RIGÓ LOSA.



Handwritten signature



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3698000

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA
Nombre, Razón o Denominación Social
ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES
Nombre Comercial
12011982003000
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: LA CONCEPCION, Casa N°: NA. Municipio LA PAZ, departamento LA PAZ, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☐	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de COMAYAGUA a los 30 días del mes de Marzo de 2022.

Fecha Emisión: 30/03/2022

Fecha Vencimiento: 30/03/2023



Director Ejecutivo


SAR

1B3E48



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32290

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BANEGAS MEJIA KENNY VELIMIR**
Con Registro Tributario Nacional: **12011982003000**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32290 en fecha 08/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412213251 de fecha 08/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.


ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 08/11/2022 hasta 05/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-22-10500-32290** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-9792

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BANEGAS MEJIA KENNY VELIMIR**
Con Registro Tributario Nacional: **12011982003000**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-9792 en fecha 16/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413257642 de fecha 16/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27721495620, presentada el 16/05/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-9792** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El Suscrito, Hace Constar : Que el contribuyente

Kenny Velimir Banegas M.

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20__ por lo que se le extiende esta constancia de pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el art. 2 del Dec. leg. N°. 15 de 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 1051450

La Paz 04-01-2023

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA 31/12/2023



Alcalde.
Firma y Sello

La Paz

PREAVISO

Identidad 1201198200300
Nombre KENNY VELIMIR BANEAS MEJIA

Factura # 2207373
Fecha Emisión 04/01/2023 Fecha Vence 04/01/2023
Estado En Tesorería
Recibo # Recibo

Detalle Factura PAGO POR SOLVENCIA MUNICIPAL

BANRURAL HONDURAS S.A.
Sucursal.: LA PAZ / LA PAZ
Numero de Transacción.: 836091382
RTN de Cliente.: 1201198200300
Caja No.: 060-CAJ002
Fecha....: 04.01.2023 12:08:02 P.M.
Concepto.: Pago de impuestos municipalidad de la i

RTN: Muni.

Monto: 50.00 HNL
Fecha Impresión 04/01/2023

Cuenta	Descripción	Clave Catastro	Cant.	Valor Unitario	Total
111150304	IMPORTE DE EXTENSION O SOLVENCIA MUNICIPAL		1	50.0000	50.0000
Total Factura:					50.00

Firma y Sello

Elaborada Por: B6LIA20

NOMMRE / FORENAMES

APELLIDO / SURNAME

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1201 1982 00300

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

10-06-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



3400000004782110



DOMICILIO / ADDRESS

LA PAZ

LA PAZ

CORRIJONADOS PROPRIETARIO

I<HND0056783155<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8206107M3106109HND<<<<<<<<<<<<<8
BANEGAS<MEJIA<<KENNY<VELIMIR<<



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

munilapazcontroltributario1@gmail.com TELEFONO. 2774-2523/95559928

PERMISO DE
OPERACIÓN
NUMERO

10

Permiso De Operación De Negocio

Propietario Representante KENNY VELIMIR BANEGAS MEJIA

Nombre del Negocio: "ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES"

Tipo de negocio: ARQUITECTURA E INGENIERIA


Actividad Principal: CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

Emisión: 04/01/2023

Valido hasta el: 31/12/2023

Dirección: BARRIO LA CONCEPCION, LA PAZ.

La Municipalidad de La Paz, El Alcalde Municipal extiende permiso de operación, el cual deberá ser colocado en un lugar visible La Paz, La Paz 04 de Enero del 2023


José Anibal Flores Ayala
Alcalde Municipal
2022-2026



RENOVAR ESTE PERMISO DURANTE EL MES DE
ENERO DEL AÑO PROXIMO

NOTA: FAVOR NOTIFICAR POR ESCRITO EL CIERRE DE
SU NEGOCIO

10/01/2023

007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE, LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00010312

Cane, 05/03/2023
Lugar y Fecha


Kenny Velimir Banegas Mejia
Páguese a la orden de

L483,971.85


Centrocientos ochenta y tres mil novecientos setenta y una con 85/100
Cantidad en letras Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.




Firma(s)





⑆01001142⑆00007614000218⑆00010312

PR Compañía de Honduras, S.A. de C.V.

Municipalidad de Cane
