



ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ
UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL

“INFORME No 2”

Informe De Supervisión

**PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL CON
INTERCONEXION A LA RED
UBICADO EN EL ESPINO Y AGUA FRIA MUNICIPIO DE
AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

Contratista:
DICONELEC S. DE R.L.

Alcalde Municipal
Señor. Erlin Omar Rodríguez Ramos

Aguanqueterique La Paz, 4 de abril de 2023



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Aguanqueterique La Paz 4 de abril de 2023

Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal de Aguanqueterique La Paz

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED UBICADO EN EL ESPINO Y AGUA FRIA MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ**, y está ejecutado en un **100.00%** de su totalidad

Por lo tanto, se puede proceder con el trámite de la estimación correspondiente al pago de segunda estimación. por un valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 07/100 (L. 351,874.07)**. A Favor de **DICONELEC S. DE R.L.** Representada legalmente por el **Ing. Javier Fermín Calix Manueles**
Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.



Abner Israel Perdomo
UNIDAD TÉCNICA
de Supervisión Municipal
LA PAZ, HONDURAS



1. Antecedentes

El Municipio de Aguanqueterique La Paz, se encuentra ubicado en la zona baja del canal seco.

Por su ubicación Aguanqueterique este municipio se encuentra en la zona sur del departamento de La Paz y además cuenta con alto nivel de vulnerabilidad. Ya que la población carece del servicio de energía eléctrica.

En repetidas ocasiones la comunidad manifiesta haber realizado la solicitud para que las autoridades prioricen el desarrollo de un proyecto eléctrico. Sin embargo, hasta hoy no había sido posible.

Descripción del proyecto:

En este tipo de proyecto, se pretende dar respuestas a la necesidad del servicio de energía eléctrica en esta comunidad, para lo cual según las especificaciones técnicas y contractuales el proyecto consta de las siguientes actividades:



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



1.- Resumen de la situación actual:

NOMBRE: ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED

UBICADO EN: EL ESPINO Y AGUA FRIA MUNICIPIO DE
AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

Bbeneficiarios: La comunidad **EL ESPINO Y AGUA FRIA**, consta de unas 300 familias y en total se encuentran unas 400 personas, según se ha entrevistado con miembros de la comunidad.

Comunidad Solicitante: miembros de patronato y del comité coordinador para solicitar dicho proyecto.

Duración: 75 Días.

Situación Actual del Proyecto: ejecutado en un **100%**.

Costo Total del Proyecto Presupuestado: L. **1,730.048.39**

Monto Solicitado por esta estimación: L. **351,874.07**

Fuente Financiera: Municipalidad de Aguanqueterique 100%

2. Conclusiones y recomendaciones:

- El proyecto está ejecución al 100 % y presenta muy buena calidad de obra, por lo que se adjunta el cuadro de estimación, para dar fe.
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se recomienda a la comunidad hacer vigilancia para evitar pérdidas y daños a las obras previo la recepción por parte de la alcaldía.
- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y buena calidad de las obras.



3. MATERIAL FOTOGRAFICO





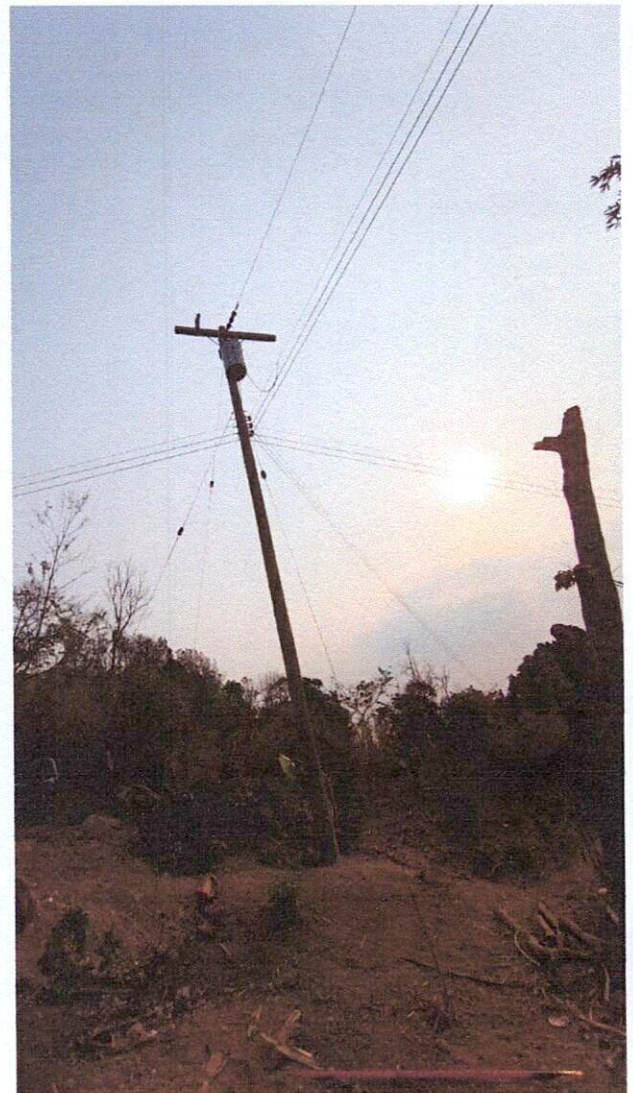
**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**



**ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED UBICADO EN EL ESPINO Y AGUA FRIA,
AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**



**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**



**ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED UBICADO EN EL ESPINO Y AGUA FRIA,
AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-39191

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SRL**

Con Registro Tributario Nacional: **08019006502892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-39191 en fecha 05/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25716240751 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748779026, presentada el 24/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-39191** o mediante el siguiente código QR:





**ALCALDÍA MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ**

**PERMISO
PARA OPERACION DE NEGOCIO**

VALIDO PARA 20 23

NUMERO 1090-2023

PROPIETARIO: JAVIER FERMIN CALIX MANUELES
 UBICACION: BARRIO BUENA VISTA, MARCALA, LA PAZ

Conforme al Reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en este Municipio, el (la) Alcalde(sa) Municipal concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en sitio visible.


CLASE DE NEGOCIO: DICONELEC S. DE R.L


Actividad Principal DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES Y ELECTROMECANICAS

No. de Solicitud 1090-2023

FECHA DE VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Dada en la ciudad de MARCALA, a los 23
 dias del mes de ENERO de 20 23


 ALCALDE(SA) MUNICIPAL


 JEFE OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ESTIMACION NO. 2
MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERQUE, LA PAZ




PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED
UBICACION: EL ESPINO Y AGUA FRIA MUNICIPIO AGUANQUETERQUE, LA PAZ.
EJECUTOR: DICONTEC S. DE R.L.

ESTIMACION No. 2

Periodo: del 28 de marzo al 5 de mayo de 2023

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANT	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	ESTRUCTURA A-1-5 (p/34.5 KV)	C/U	3.00	3,650.41	10,951.23	3.00	10,951.23	0.00	0.00	3.00	10,951.23	100.00
2	ESTRUCTURA A-1-2 (p/34.5 KV)	C/U	7.00	2,352.80	16,469.60	7.00	16,469.60	0.00	0.00	7.00	16,469.60	100.00
3	ESTRUCTURA A-1-4 (p/34.5 KV)	C/U	6.00	2,456.99	14,741.94	6.00	14,741.94	0.00	0.00	6.00	14,741.94	100.00
4	ESTRUCTURA A-1-6 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	4,123.35	4,123.35	1.00	4,123.35	0.00	0.00	1.00	4,123.35	100.00
5	ESTRUCTURA B-1-1-2A	C/U	1.00	950.88	950.88	1.00	950.88	0.00	0.00	1.00	950.88	100.00
6	ESTRUCTURA B-1-1-5A	C/U	1.00	1,067.22	1,067.22	1.00	1,067.22	0.00	0.00	1.00	1,067.22	100.00
7	ESTRUCTURA B-1-1-3A	C/U	15.00	1,273.94	19,109.10	15.00	19,109.10	0.00	0.00	15.00	19,109.10	100.00
8	ESTRUCTURA B-1-1-4A	C/U	21.00	1,210.87	25,428.27	21.00	25,428.27	0.00	0.00	21.00	25,428.27	100.00
9	ESTRUCTURA B-1-1-1B	C/U	4.00	2,346.96	9,387.84	4.00	9,387.84	0.00	0.00	4.00	9,387.84	100.00
10	ESTRUCTURA B-1-1-1A	C/U	2.00	1,344.82	2,689.64	2.00	2,689.64	0.00	0.00	2.00	2,689.64	100.00
11	ESTRUCTURA B-1-1-8B	C/U	2.00	2,221.74	4,443.48	2.00	4,443.48	0.00	0.00	2.00	4,443.48	100.00
12	DETALLE DE NEUTRO B-1-4	C/U	6.00	582.12	3,492.72	6.00	3,492.72	0.00	0.00	6.00	3,492.72	100.00
13	DETALLE DE NEUTRO B-1-3	C/U	1.00	747.64	747.64	1.00	747.64	0.00	0.00	1.00	747.64	100.00
14	RETENIDA E-1-1	C/U	45.00	2,645.93	119,066.85	45.00	119,066.85	0.00	0.00	45.00	119,066.85	100.00
15	RETENIDA E-1-2	C/U	20.00	3,050.56	61,011.20	20.00	61,011.20	0.00	0.00	20.00	61,011.20	100.00
16	CONEXION A TIERRA CT-LDX	C/U	15.00	951.69	14,275.35	15.00	14,275.35	0.00	0.00	15.00	14,275.35	100.00
17	ILUMINACION VP-AP. 100W	C/U	23.00	2,261.46	52,013.58	23.00	52,013.58	0.00	0.00	23.00	52,013.58	100.00
18	POSTE DE MADERA DE 40'. CLASE 5	C/U	13.00	9,604.98	124,864.74	13.00	124,864.74	0.00	0.00	13.00	124,864.74	100.00
19	POSTE DE MADERA DE 30'. CLASE 4	C/U	36.00	7,222.46	260,008.56	36.00	260,008.56	0.00	0.00	36.00	260,008.56	100.00
20	CABLE # 2 ACSR S/F	M.L.	3,804.00	44.79	170,381.16	3,804.00	170,381.16	0.00	0.00	3,804.00	170,381.16	100.00
21	CABLE # 1/0 ACSR S/F	M.L.	1,943.00	45.95	89,280.85	1,943.00	89,280.85	0.00	0.00	1,943.00	89,280.85	100.00
22	CABLE # 1/0 AWG. 1W	M.L.	4,818.00	47.90	230,782.20	4,818.00	230,782.20	0.00	0.00	4,818.00	230,782.20	100.00
23	TRANSFOR. DE 15KVA. 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	4.00	61,738.38	246,953.52	4.00	246,953.52	0.00	0.00	4.00	246,953.52	100.00
24	CUCHILLA PORTAFUSIBLE. 100 A. 27KV /34.	C/U	1.00	9,180.11	9,180.11	1.00	9,180.11	0.00	0.00	1.00	9,180.11	100.00
UB TOTAL PROYECTO					1491,421.03		1491,421.03	308,147.21	18,488.83		1491,421.03	100.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS					89,485.26		70,996.43	18,488.83			89,485.26	100.00
UTILIDAD DEL PROYECTO					149,142.10		118,327.38	30,814.73			149,142.10	100.00
TOTAL PROYECTO					1730,048.39		1372,597.63	357,450.77			1730,048.40	100.00%

DESCRIPCION	Acumulado Anterior	Ejecutado Actual	Acumulado Total
MONTO ESTIMADO	0.00	357,450.77	357,450.77
Retención por Anticipo	0.00	5,576.70	5,576.70
Retención por I.S.R.		0.00	0.00
Otras Retenciones		0.00	0.00
Neto a Pagar		351,874.07	351,874.07

CONTRATISTA FIRMA:  ADMINISTRACION MUNICIPAL ALTA GUAYAMA, P.R. NOMBRE: Omar Lopez FECHA: 12-05-2023	SUPERVISOR En virtud que doy fe que he revisado y presente estimación corresponde a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad, con el fin de proceder a las condiciones generales de mi contrato solicito se proceda a pagar al contratista por el finiquite presente. FIRMA:  NOMBRE: Elyris Omar Rodriguez FECHA: 12-05-2023	VISTO BUENO MUNICIPALIDAD. FIRMA:  NOMBRE: Elyris Omar Rodriguez FECHA: 12-05-2023
--	---	---



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: KMONTES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4570

L.: 351,874.07

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 696

Fecha de Emision: 12/5/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS SRL Id/RTN: 08019006502892

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SIETE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION (ULTIMA) DEL PROYECTO ELECTRIFICACION CON INTERCONEXION A LA RED UBICADA EN LAS ALDEAS EL ESPINO Y AGUA FRIA, EN AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR LA CANTIDAD DE L.351,874.07

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Sistema de Energía Eléctrica en las comunidades de agua Fría y el Espino	351,874.07

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	351,874.07
Monto Total:		351,874.07

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		351,874.07
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		351,874.07

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcaldía</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	----------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Javier Brown
 Identidad No.: 1208197300223



0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdJl7HFOxAKNylkzKGear7v7QV9GxHvb0rCksE919700AebSuaqWfDupaF3ZaSOOFiZ13mzigGuKfYD6/oapn4oDFwJHZSEaNwVsQ
 bpU9FOVSS90zcqksV8ytIMPdfXoRQy3zmm



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Trabajo, Desarrollo y Transparencia



VAUCHER DE PAGO

Fecha:	12 Mayo 2023	Orden N°	4570	Cheque N°	82928461
Nombre Completo:	DPSenos y Construcciones Electromecánicas			Identidad	8019006502892
Cargo				Cantidad	LPS. 351,874.07

DESCRIPCION

Pago de Segunda estimación (última) del proyecto electrificación con interconexión a la red ubicada en las aldeas El Espino y Agua Fría en Aguanqueterique, La Paz por la cantidad de \$ 351,874.07 temporales.

Forma de Pago	Efectivo	<input type="checkbox"/>
Credito <input type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>	Cheque <input checked="" type="checkbox"/>
Autorización de Pago		Realizo el Pago
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: TESORERA MUNICIPAL	
Nombre: ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	Nombre: XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS	
Identidad: 1202-1975-00007	Identidad: 1202-1985-00157	
Firma y sello:	Firma y sello:	
Fecha: 12 Mayo 2023	Fecha: 12 Mayo 2023	

Recibe Conforme:

Cargo:	Gerente	Nombre:	Javier Colon
Fecha:	12-05-2023	Identidad:	10849730022
Celular:	99284931	Firma:	



CHEQUE No. 82928461

Lugar y Fecha

17 Mayo 2023

Diseños y Construcciones Electromecánicas SRL

L 351,874.07

Páguese a la orden de

Trescientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y cuatro con 07/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆70⑆079⑆00⑆⑆70⑆00⑆5729⑆⑆8292846⑆

R/C Bancomer de Honduras, S.A. de C.V.
