



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ
UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL

“INFORME”

Informe De Supervisión

PROYECTO: CONSTRUCCION DE ESCUELA CARLOS ANDOLFO S.
UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES
MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Contratista:
SECOR S DE R.L DE C.V

Alcalde Municipal
Señor. Erlin Omar Rodríguez Ramos

Aguanqueterique La Paz, Jueves 25 de mayo de 2023

CONSTRUCCION DE ESCUELA CARLOS ANDOLFO S.



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Aguanqueterique La Paz 25 de mayo de 2023

Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos

Alcalde Municipal de Aguanqueterique La Paz

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **CONSTRUCCION DE ESCUELA CARLOS ANDOLFO S.**

UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, y está ejecutado en un 26.11% de su totalidad

Por lo tanto, se puede proceder con el trámite de la estimación correspondiente al pago de primera estimación. **POR UN VALOR DE CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 163,719.50).**

A Favor de **SERVICIOS DE CONSTRUCCION ROMERO S DE R.L DE C.V.** representada legalmente por el Ingeniero Alex Joel Romero Espinoza.

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Abner Israel Perdomo Medina

CONSTRUCCION DE ESCUELA CARLOS ANDOLFO S.



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



- Descripción del proyecto

El proyecto consta de las siguientes actividades, presentando el porcentaje de avance elaborado en el proyecto: CONSTRUCCION DE ESCUELA CARLOS ANDOLFO S.

Ubicado en la comunidad de Los Laureles, municipio de Aguanqueterique, La Paz.

- Resumen de la situación actual

NOMBRE: CONSTRUCCION DE ESCUELA CARLOS ANDOLFO S.

UBICADO EN: COMUNIDAD DE LOS LAURELES MUNICIPIO DE

AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Beneficiarios: La comunidad Los Laureles, consta de unas 28 familias y en total se encuentran unas 215 personas, según se ha entrevistado con miembros de la comunidad.

Comunidad Solicitante: miembros de patronato y del comité coordinador para solicitar dicho proyecto.

Duración: 90 Días.

Situación Actual del Proyecto: ejecutado en un 26.11%

CONSTRUCCION DE ESCUELA CARLOS ANDOLFO S.



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



Costo Total del Proyecto Presupuestado: L. 848,368.86

Monto Solicitado por esta estimación: L. 163,719.50

Fuente Financiera: Municipalidad de Aguanqueterique

1. Conclusiones y recomendaciones:

- El proyecto está ejecución al 26.11% y presenta muy buena calidad de obra, se adjunta el cuadro de actividades realizadas
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se recomienda a la comunidad hacer vigilancia para evitar pérdidas y daños a las obras previo la recepción por parte de la alcaldía
- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y buena calidad de las obras.

CONSTRUCCION DE ESCUELA CARLOS ANDOLFO S.



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



ESTIMACION NO. 1

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ESCUELA CARLOS ANDOLFO EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES AGUANQUETERIQUE, LA PAZ"

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

PERIODO: 27 DE MARZO DE 2023 AL 26 DE MAYO DE 2023.

NO.	DETALLE	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD DE OBRA	TOTAL	ACTUAL PERIODO		ACUMULADO		AVANCE %
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	L. 32.00	47.00	L. 1,504.00	47.00	L. 1,504.00	47.00	1,504.00	
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	L. 245.00	16.47	L. 4,035.15	16.47	L. 4,035.15	16.47	4,035.15	
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	L. 55.00	26.40	L. 1,452.00	26.40	L. 1,452.00	26.40	1,452.00	
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	L. 60.00	53.59	L. 3,215.40	53.59	L. 3,215.40	53.59	3,215.40	
5	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	L. 402.30	16.34	L. 6,573.58	16.34	L. 6,573.58	16.34	6,573.58	
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 NÚ3, NÚ2 @ 20 cm	UNID	L. 450.00	13.00	L. 5,850.00	13.00	L. 5,850.00	13.00	5,850.00	
7	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	L. 2,200.00	14.85	L. 32,670.00	14.85	L. 32,670.00	14.85	32,670.00	
8	SOLERA 20X20, 4NÚ3 Y NÚ2 @ 15cm, CONCRETO 1:2:2	M.L.	L. 450.00	34.00	L. 15,300.00	34.00	L. 15,300.00	34.00	15,300.00	
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X8 CM.	M.L.	L. 110.00	12.55	L. 1,380.50	12.55	L. 1,380.50	12.55	1,380.50	
10	SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	L. 285.00	10.55	L. 3,006.75	10.55	L. 3,006.75	10.55	3,006.75	
11	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L.	L. 350.00	38.60	L. 13,510.00	38.60	L. 13,510.00	38.60	13,510.00	
12	CASTILLO 15X15, 3 NÚ3 Y NÚ2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	L. 300.00	8.64	L. 2,592.00	8.64	L. 2,592.00	8.64	2,592.00	
13	LOSA DE LIBRERO 0.6X0.1 MTS. (Pulida)	M.L.	L. 350.00	8.00	L. 2,800.00	8.00	L. 2,800.00	8.00	2,800.00	
14	LIBRERO EMPOTRADO KINDER	UNID	L. 17,000.00	1.00	L. 17,000.00		L. 0.00	0.00	0.00	
15	SOLERA 15X20 4NÚ3 Y NÚ2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	L. 395.00	34.00	L. 13,430.00	34.00	L. 13,430.00	34.00	13,430.00	
16	solera 20X25, 4#3 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L.	L. 700.00	22.84	L. 15,988.00		L. 0.00	0.00	0.00	
17	CARGADOR DE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	L. 250.00	1.15	L. 287.50	1.15	L. 287.50	1.15	287.50	
18	BATIENTE DE 10X20cm 2#3, #2 @ 15cm CONCRETO 1:2:2	ML	L. 275.00	8.55	L. 2,351.25	8.55	L. 2,351.25	8.55	2,351.25	
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO 15CM(INHABILITADA)	M2	L. 600.00	73.77	L. 44,262.00	65.00	L. 39,000.00	65.00	39,000.00	
20	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	L. 850.00	21.38	L. 18,173.00	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
21	PUERTA METALICA (1X2.10m),TUBO IND. 3/4",LAM 1/16"	UNID	L. 5,500.00	1.00	L. 5,500.00	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
22	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	L. 430.00	83.64	L. 35,965.20	30.00	L. 12,900.00	30.00	12,900.00	
23	PISO DE CONCRETO SIMPLE e=11.0cms,CONC. 150 kg/cm2	M2	L. 500.00	2.13	L. 1,065.00	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
24	TECHO CANALETA 6", LAM. ALUMINIZADA ONDULADA AULA	M2	L. 980.00	108.83	L. 106,653.40	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
25	PIZARRA DE FORMICA 2.4X1.20(SUM/INST)	UNID	L. 2,100.00	1.00	L. 2,100.00	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
26	ENTABICADO BLOQUE 30 CM(REPE/PUL)(**)	M.L.	L. 350.00	17.70	L. 6,195.00	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
27	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	L. 10.00	85.77	L. 857.70	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
28	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	L. 200.00	92.88	L. 18,576.00	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
29	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	L. 200.00	82.34	L. 16,468.00	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
30	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 m	ML	L. 85.00	85.76	L. 7,289.60	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
31	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	L. 90.00	16.50	L. 1,485.00	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
32	PINTURA DE ACEITE	M2	L. 70.00	191.39	L. 13,397.30	0.00	L. 0.00	0.00	0.00	
MODULO DE AULA DE 9X8			SUB-TOTAL:			L. 161,858.13		L. 161,858.13		

38.45%

CONSTRUCCION DE ESCUELA RURAL MIXTA
LOS ANDOLFO, COMUNIDAD DE LOS LAURELES



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



33	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	L. 32.00	17.72	L. 567.04	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
34	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	L. 245.00	1.68	L. 411.60	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
35	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	L. 55.00	1.53	L. 84.15	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
36	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	L. 65.00	4.00	L. 260.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
37	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	L. 402.30	0.30	L. 120.69	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
38	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	L. 2,200.00	1.33	L. 2,926.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
39	DADO DE CONCRETO 40 X40 X 30, 4 NÚ3, Nú2 @ 20 cm	UNID	L. 330.00	10.00	L. 3,300.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
40	SOLERA 15X15cm, 3#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	L. 285.00	12.50	L. 3,562.50	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
41	CASTILLO 15X15, 3 No.3 Y No.2 @ 20,CONCRETO 1:2:2	M.L.	L. 300.00	24.00	L. 7,200.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
42	SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM,CONCRETO 1:2:2	M.L.	L. 250.00	15.25	L. 3,812.50	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
43	JAMBA VERTICAL 15X10, 2#3 Y #2 @ 20,CONCRETO 1:2:2	M.L.	L. 245.00	6.45	L. 1,580.25	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
44	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.(**)	M2	L. 550.00	19.09	L. 10,499.50	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
45	PUERTA METALICA P-7(0.80X2.15m),TUBO IND 3/4"	UNID	L. 4,000.00	3.00	L. 12,000.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
46	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	L. 850.00	0.90	L. 765.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
47	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	L. 430.00	3.00	L. 1,290.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
48	TECHO CANALETA DE 4" Y LAMINA DE ZINC CAL. 28	M2	L. 550.00	15.84	L. 8,712.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
49	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MÓTERO DE 1:4	M2	L. 200.00	50.09	L. 10,018.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
50	PINTURA DE ACEITE	M2	L. 70.00	50.09	L. 3,506.30	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
51	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	L. 10.00	3.75	L. 37.50	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
52	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	L. 2,200.00	3.00	L. 6,600.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
53	TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96(SUM/INST)	UNID	L. 300.00	3.00	L. 900.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
54	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	L. 30.00	7.00	L. 210.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
55	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	L. 64.50	7.00	L. 451.50	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
56	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	M.L.	L. 18.00	6.00	L. 108.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
57	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41	M.L.	L. 55.00	6.00	L. 330.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
58	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	L. 16.00	4.00	L. 64.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
59	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	L. 25.30	4.00	L. 101.20	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
60	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	L. 14.00	12.00	L. 168.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
61	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	L. 13.00	12.00	L. 156.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
62	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	L. 100.00	1.32	L. 132.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
63	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	L. 1,400.00	2.00	L. 2,800.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
64	PILA CON RIVAL 1.30X0.90X1.00 EN MODULO SANITARIO	UNID	L. 5,500.00	1.00	L. 5,500.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
MODULO DE 3 SANITARIOS			SUB-TOTAL:		L. 88,173.73	L. 0.00		L. 0.00		0.00%
65	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	L. 32.00	23.60	L. 755.20	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
66	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	L. 245.00	1.34	L. 328.30	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
67	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	L. 65.00	1.68	L. 109.20	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
68	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.(**)	M2	L. 550.00	3.34	L. 1,837.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
69	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	L. 402.30	0.71	L. 285.63	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
70	SOLERA 10X15, 2 #3, #2 @ 25 CM,CONCRETO 1:2:2	M.L.	L. 250.00	16.70	L. 4,175.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
71	PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA	M2	L. 400.00	9.96	L. 3,984.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
ACERAS DE AULAS MODULOS SANITARIOS			SUB-TOTAL:		L. 11,474.33	L. 0.00		L. 0.00		0.00%
72	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	L. 32.00	35.00	L. 1,120.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
73	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	L. 245.00	5.33	L. 1,305.85	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
74	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	L. 55.00	3.30	L. 181.50	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
75	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	L. 65.00	6.67	L. 433.55	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
76	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	L. 2,200.00	3.15	L. 6,930.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
77	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	L. 402.30	2.18	L. 877.01	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
78	PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA	M2	L. 400.00	31.20	L. 12,480.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
ACERAS DE AULAS			SUB-TOTAL:		L. 23,327.91	L. 0.00		L. 0.00		

CONSTRUCCION DE ESCUELA RURAL MIXTA

LOS ANDOLFO, COMUNIDAD DE LOS LAURELES



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



79	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	L. 245.00	14.85	L. 3,638.25	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
80	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	L. 65.00	18.56	L. 1,206.40	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
81	LOSA CONCRETO e=10 CMS Nú3 a/c 15 CMS a/s	M2	L. 850.00	8.28	L. 7,038.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
82	PARED REFOR. LAD. RAFON A TEZON 2 Nú3 @ mt.	M2	L. 1,200.90	21.80	L. 26,179.62	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
83	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2	M.L.	L. 350.00	14.00	L. 4,900.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
84	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M2	L. 200.00	25.49	L. 5,098.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
85	SOLERA 15X15,3#3,#2@20CM. CONC 1:2:2(INHABILITADA)	M.L.	L. 285.00	18.30	L. 5,215.50	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
86	LOSA CONCRETO e=15 CMS Nú4 a/c 15 CMS a/s	M2	L. 1,450.00	6.32	L. 9,164.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
87	FILTRO DE PIEDRA	M3	L. 1,200.00	0.81	L. 972.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
88	RELL CAPAS MAT.FILTRAN.(GRA 3/4" A 1-1/2")E=15 CM.	M3	L. 1,095.30	2.47	L. 2,705.39	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
89	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	L. 100.00	0.30	L. 30.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
90	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	L. 1,400.00	2.00	L. 2,800.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
91	SUM. E INST. TUBERIA PVC 3" RD-41 PERFORADA	M.L.	L. 73.00	3.00	L. 219.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
92	ACCESORIOS PARA TUBERIA EN SISTEMA DE TRATAMIENTO	GLB	L. 900.00	1.00	L. 900.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
TANQUE SEPTICO FILTRO ANAEROBICO 2 AULAS					SUB-TOTAL:	L. 70,066.16	L. 0.00		L. 0.00	
93	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	L. 32.00	59.38	L. 1,900.16	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
94	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	L. 245.00	5.34	L. 1,308.30	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
95	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	L. 2,200.00	5.34	L. 11,748.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
96	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC. M2	M2	L. 705.60	11.88	L. 8,382.53	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
97	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	L. 100.00	9.31	L. 931.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
98	PISO DE CONCRETO SIMPLE 8 CM. P/ACERA	M2	L. 400.00	55.38	L. 22,152.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
99	SUM/INST DE LUMINARIA DE TECHO LED	UND	L. 1,500.00	9.00	L. 13,500.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
ACERAS DE CIRCULACION					SUB-TOTAL:	L. 59,921.99	L. 0.00		L. 0.00	
100	INTERRUPTOR DOBLE	UND	L. 350.00	2.00	L. 700.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
101	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UND	L. 285.00	2.00	L. 570.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
102	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)(INHABILITADA)	UNID	L. 3,400.00	1.00	L. 3,400.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
103	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UND	L. 3,420.00	1.00	L. 3,420.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
104	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	L. 301.00	1.00	L. 301.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
105	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO Ø	M.L.	L. 199.00	55.00	L. 10,945.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
106	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP, TUBERIA EMT Ø	M.L.	L. 241.20	26.00	L. 6,271.20	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
107	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO Ø	M.L.	L. 200.00	15.00	L. 3,000.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
108	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE(*)	ML	L. 85.00	40.00	L. 3,400.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
INSTALACIONES ELECTRICAS					SUB-TOTAL:	L. 32,007.20	L. 0.00		L. 0.00	
109	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UND	L. 7,010.36	1.00	L. 7,010.36	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
GENERAL					L. 7,010.36	L. 0.00		L. 0.00		
COSTO DIRECTO					L. 712,915.01	L. 161,858.13		L. 161,858.13	26.11%	
UTILIDAD (14%)					L. 99,808.10	L. 22,660.14		L. 22,660.14		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (5%)					L. 35,645.75	L. 8,092.91		L. 8,092.91		
MONTO CONTRATADO					L. 848,368.86	L. 192,611.18		L. 192,611.18		
AMORTIZACION DE ANTICIPO (15%)						L. 28,891.68		L. 28,891.68		
DEDUCCION DE I.S.R. (5%)						L. 0.00		L. 0.00		
NETO ESTIMACION 1.						L. 163,719.50		L. 221,502.86		

ELABORADO POR:
ING. JOEL ROMERO
GERENTE
SECOR S. DE R.L.

ALCALDIA DE AGUANQUETERIQUE
MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ
ABNER ISRAEL PERDOMO
GERENTE
ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ.

ABRORADO POR:
ERLIN OMAR RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
AGUANQUETERIQUE LA PAZ.

CONSTRUCCION DE ESCUELA RURAL MIXTA
LOS ANDOLFO, COMUNIDAD DE LOS LAURELES

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 07/02/2017 RTN: 12139017905981

SERVICIOS DE CONSTRUCCION ROMERO S DE R L DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Administración Tributaria

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la Administración Tributaria cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento SAR-412-2480755

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 12131986000372

ALEX JOEL ROMERO ESPINOZA

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐

Fecha de Emisión: 20120824

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1135302 Transacción: 512C87

HONDURAS



COMMONS AND PROPRIETARY

I<HND0015370091<<<<<<<<<<<<
8604068M3104068HND<<<<<<<<<<6
ROMERO<ESPINOZA<<ALEX<JOEL<<<



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-21853

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS DE CONSTRUCCION ROMERO S DE R L DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **12139017905981**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-21853 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414458124 de fecha 28/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 05745874936, presentada el 19/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.cargobn/>, ingresando el número **201-23-10500-21853** o mediante el siguiente código QR:



IMÁGENES DE OBRA



CONSTRUCCION DE LA ESCUELA CARLOS ANDULFO EN LA COMUNIDAD DE
LOS LAURELES AGUANQUETERIQUE LA PAZ.

IMÁGENES DE OBRA




CONSTRUCCION DE LA ESCUELA CARLOS ANDULFO EN LA COMUNIDAD DE
LOS LAURELES AGUANQUETERIQUE LA PAZ.

IMÁGENES DE OBRA




CONSTRUCCION DE LA ESCUELA CARLOS ANDULFO EN LA COMUNIDAD DE
LOS LAURELES AGUANQUETERIQUE LA PAZ.

IMÁGENES DE OBRA

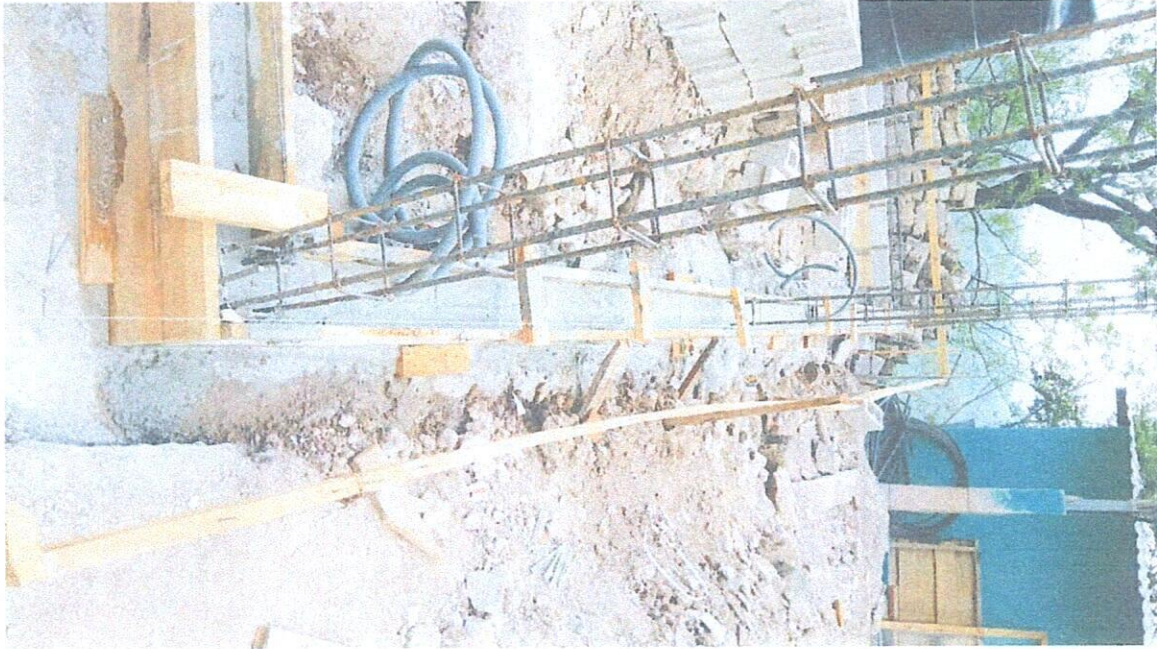


CONSTRUCCION DE LA ESCUELA CARLOS ANDULFO EN LA COMUNIDAD DE
LOS LAURELES AGUANQUETERIQUE LA PAZ.

IMÁGENES DE OBRA

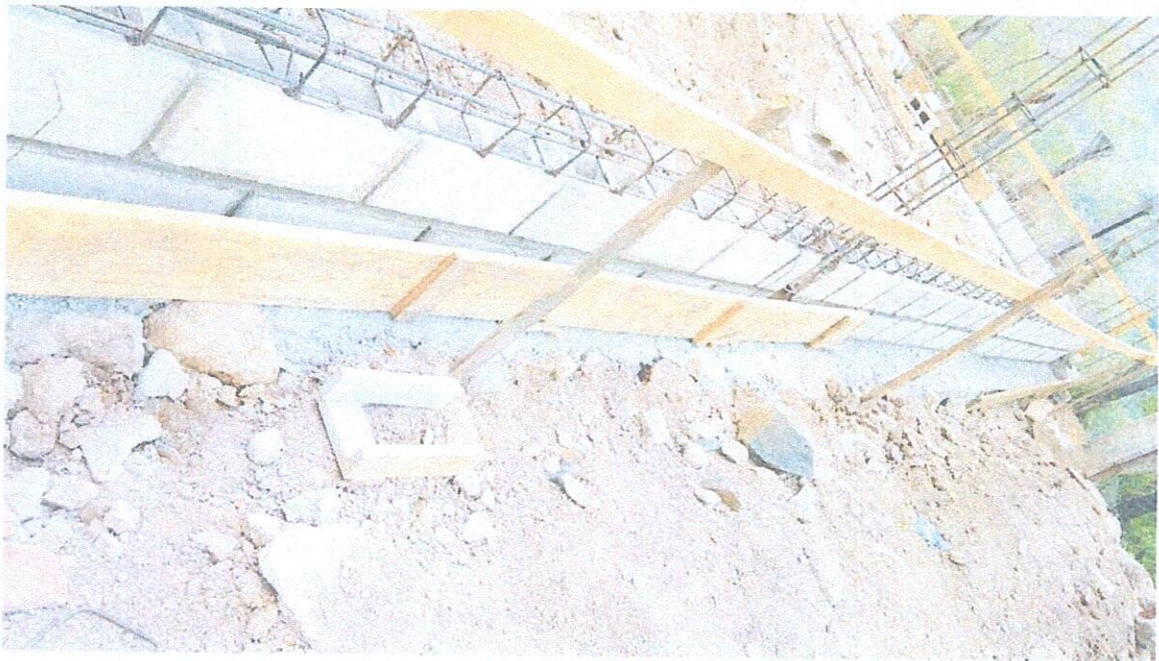

CONSTRUCCION DE LA ESCUELA CARLOS ANDULFO EN LA COMUNIDAD DE
LOS LAURELES AGUANQUETERIQUE LA PAZ.

IMÁGENES DE OBRA

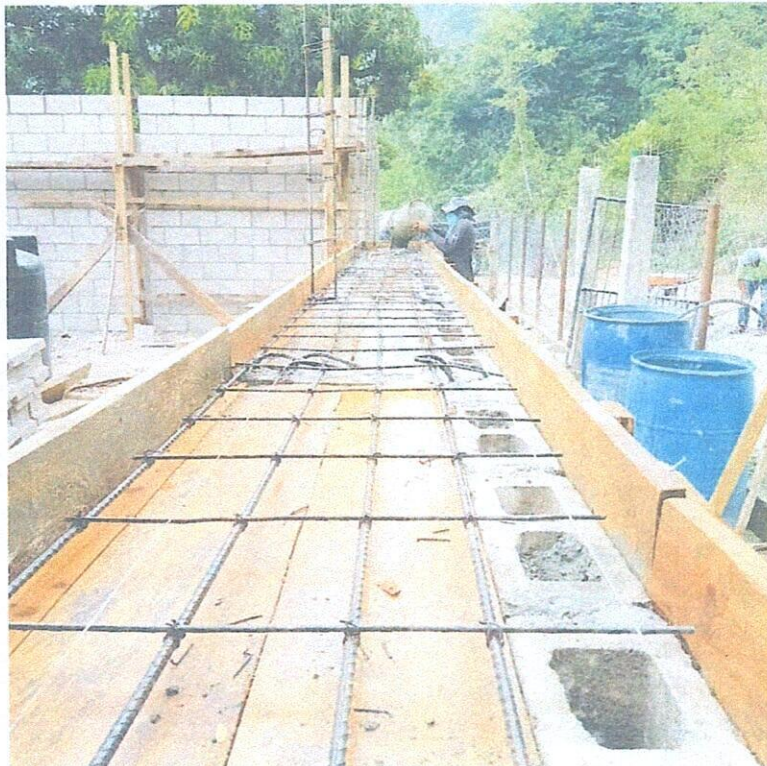

CONSTRUCCION DE LA ESCUELA CARLOS ANDULFO EN LA COMUNIDAD DE
LOS LAURELES AGUANQUETERIQUE LA PAZ.
