


ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.



CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DESDE ENERO HASTA ABRIL 2023

Nº	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto Hasta el mes de enero	Monto Ejecutado del Proyecto Hasta el mes de febrero	Monto Ejecutado del Proyecto Hasta el mes de marzo	% de Ejecucion acumulado
1	CONSTRUCCION DE ACERA DEL KINDER HECTOR V. MEDINA, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.	40,202.64			100
2	REPARACION DE 18 METROS DE CIELO FALSO EXTERNO EN INSTITUTO HECTOR V. MEDINA.		6,840.00		100
3	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA LOS ANGELES DEL BARRIO EL CANTÓN, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.			133,170.00	81.43
4	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL KINDER JOHAN MICHELL DE LA ALDEA CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.			80,696.38	46.72

VALLE DE ANGELES 10 DE ABRIL DE 2023


 Ing. Jose Eduardo Cabrera Hernandez
 Jefe de Unidad Tecnica Municipal de Valle de Angeles





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERA DEL KINDER HECTOR V. MEDINA, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.

Ubicación: Centro, Valle de Ángeles

Ejecutado por: Willian Michael Trejo Maireno

Identidad: 0826-1986-00099

Monto: 40,202.64 lps.

En esta fecha 24/1/2023 se rinde el informe de avance en el proyecto de "CONSTRUCCION DE ACERA DEL KINDER HECTOR V. MEDINA, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN".

En este informe del proyecto se realizó la fundición de 137.36 m² de firme de concreto, demolición y botado de material de desperdicio de 137.36 m² de losa existente y el relleno y compactado del área.

Por lo tanto, en calidad de constructor **WILLIAN MICHAEL TREJO MAIRENO** quien prestó sus servicios para la realización del proyecto con número de identidad **0826-1986-00099**, aplica para que se le haga el desembolso por sus servicios prestados cumpliendo con el 100% del trabajo.

Descripción	Und	Cantidad de obra	Porcentaje de obra ejecutada	Total
Fundición de Firme de Concreto	M2	137.36	100%	L 24,587.44
Demolición y Botado de Material de Desperdicio.	M2	137.36	100%	L 9,615.20
Relleno y Compactado	Global	1	100%	L 6,000.00
			total	40,202.64 lps

En fe de lo anterior se firma esta acta.

Valle de Ángeles F.M. a los 24 días de enero del 2023.



LUGAR Y FECHA

Sr. Marvin Aguilar
(Regidor de infraestructura)




Ing. José Eduardo Cabrera
(Unidad Técnica Municipal)

Durante el Proyecto:

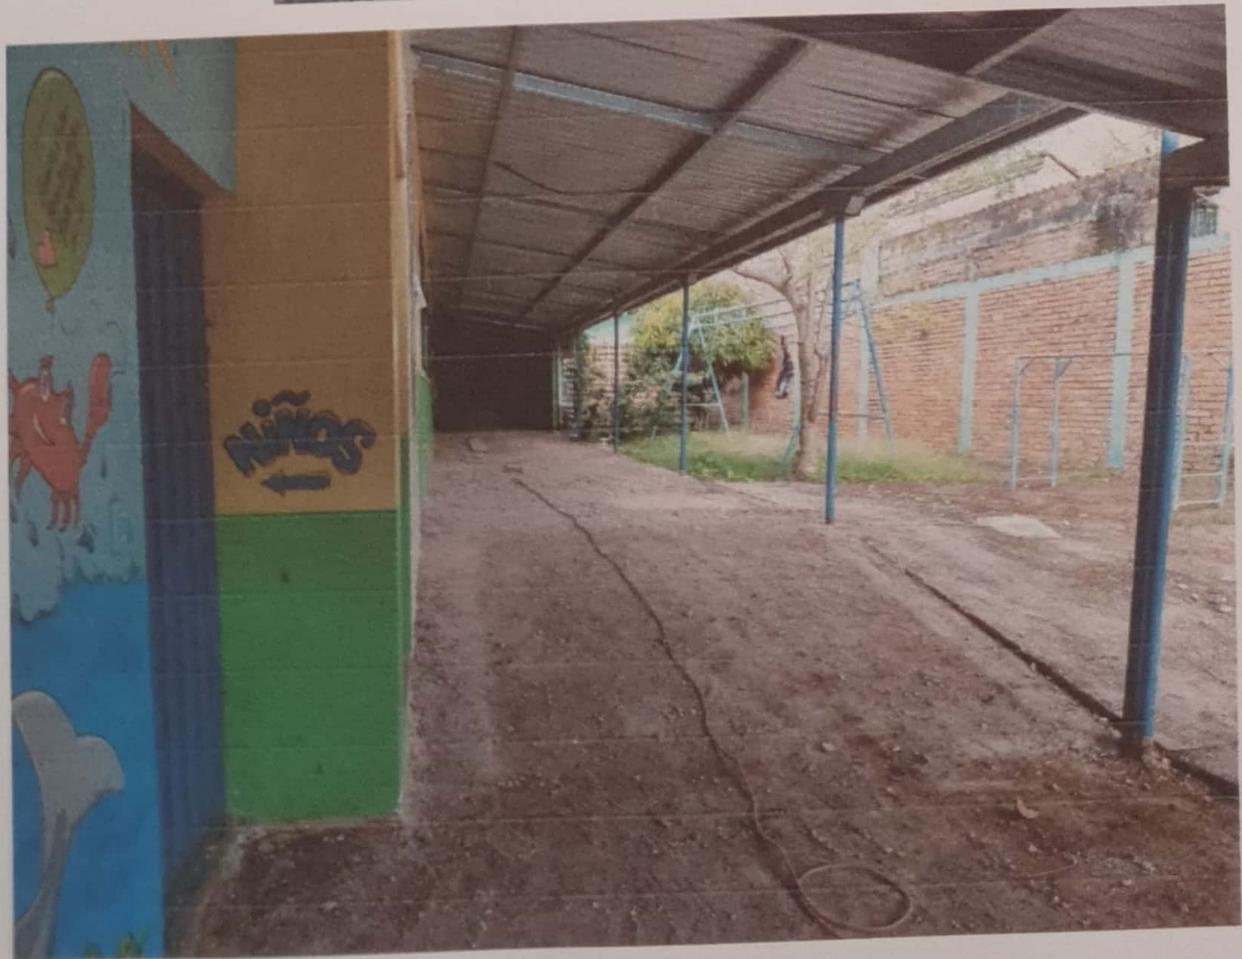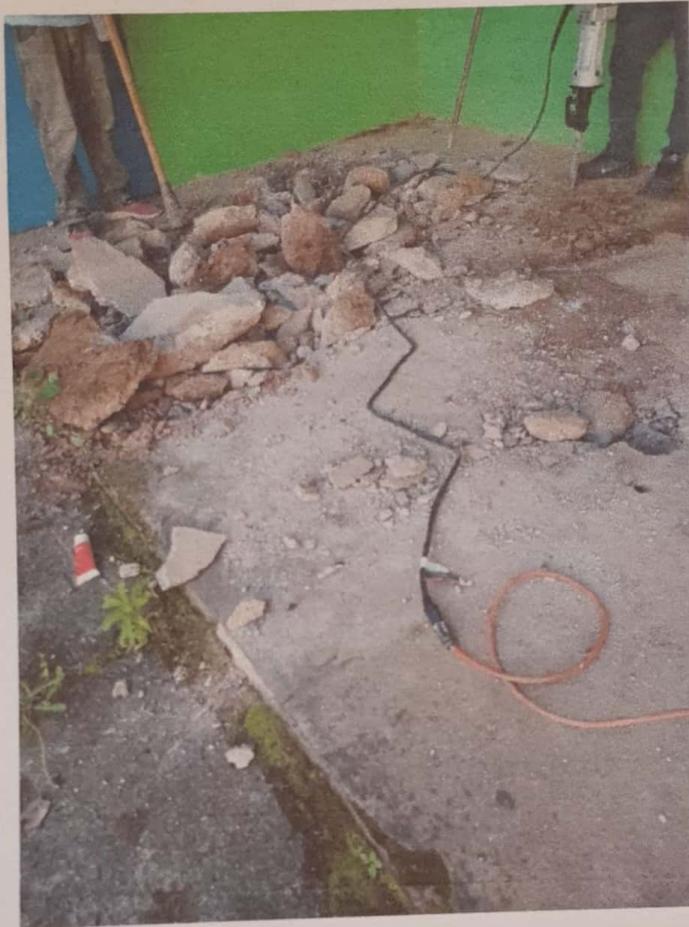



Después:

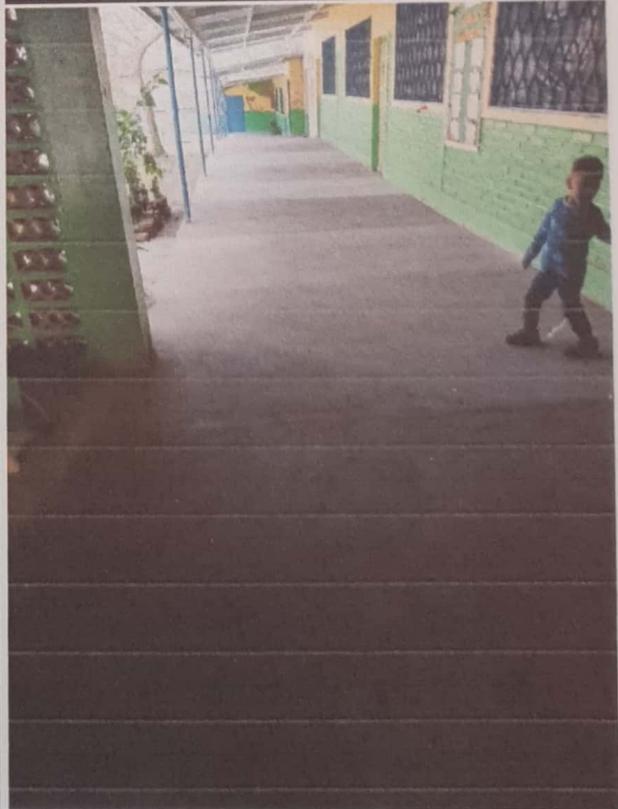



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES

Nombre del Proyecto: REPARACION DE 18 METROS DE CIELO FALSO EXTERNO EN INSTITUTO HECTOR V. MEDINA.

Ubicación: Barrio Zunteco, Valle de Ángeles

Ejecutado por: Fredy Alexander Cruz Soto.

Identidad: 0820-1994-00017

Monto: L. 6,840.00

En esta fecha 20/2/2023 se rinde el informe de avance en el proyecto de **“REPARACION DE 18 METROS DE CIELO FALSO EXTERNO EN INSTITUTO HECTOR V. MEDINA”**.

En este informe del proyecto se realizó la demolición de tabla yeso caído y desmontaje de estructura, armado de 18 metro lineales de tabla yeso con estructura furring, canal de carga, jamo y rebordes j.

Por lo tanto, en calidad de constructor **FREDY ALEXANDER CRUZ SOTO** quien prestó sus servicios para la realización del proyecto con número de identidad **0820-1994-00017**, aplica para que se le haga el desembolso por sus servicios prestados cumpliendo con el 100% del trabajo.

Descripción	Und	Cantidad de obra	Porcentaje de obra ejecutada	Total
Instalacion de cielo falso con jamo y reborde	ML	18	100%	L 6,840.00
			total	6,840.00 lps

En fe de lo anterior se firma esta acta.

Valle de Ángeles F.M. a los 20 días de febrero del 2023.

LUGAR Y FECHA

Sr. Marvin Aguilar


(Regidor de infraestructura)



Ing. José Eduardo Cabrera
(Unidad Técnica Municipal)

Antes el Proyecto:



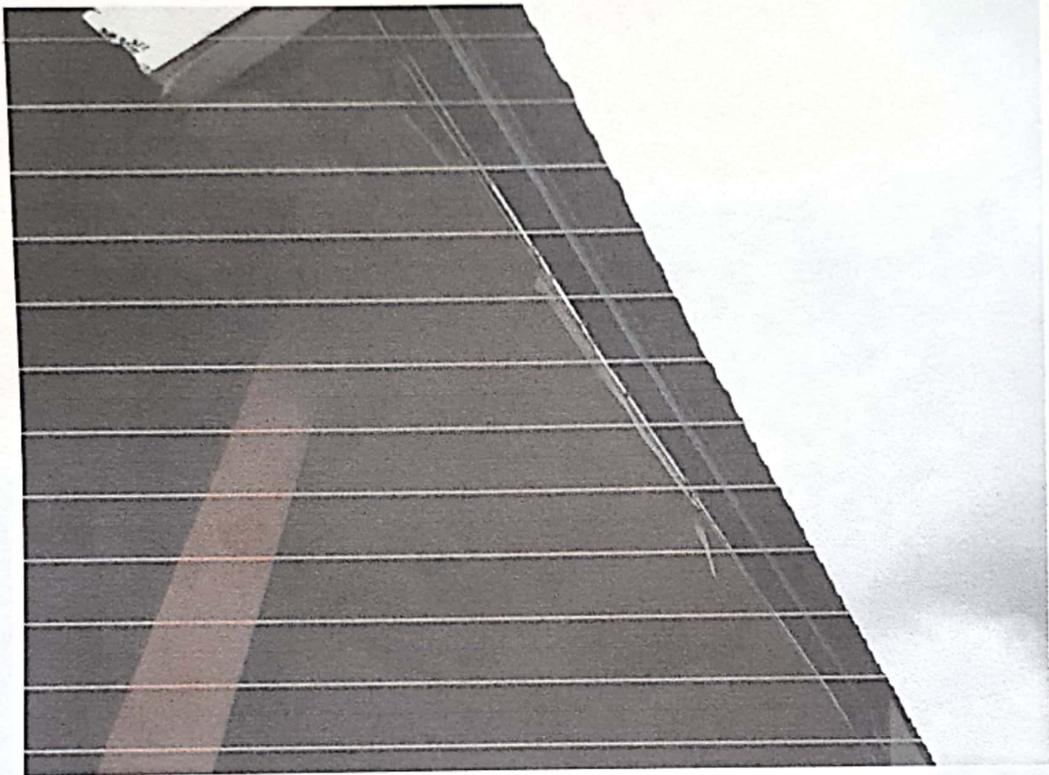



Después:





PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
 NOMBRE DEL PROYECTO : MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA
 LOS ANGELES DEL BARRIO EL CANTÓN, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.
 CONTRATISTA: MARLON ALEXIS GARCIA BARAHONA.
 FECHA: 29/3/23



No.	CONCEPTO DE OBRA	OBRA CONTRATADA				ACUMULADO ANTERIOR		PERIODO		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE
		UNID.	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	
1 01	EXCAVACION	ML	L 172.50	30.00	L 5,175.00			30.00	L5,175.00	30.00	L 5,175.00	100.00%
1 02	ZAPATA CORRIDA	ML	L 230.00	30.00	L 6,900.00			30.00	L6,900.00	30.00	L 6,900.00	100.00%
1 03	PEGADO DE BLOQUE BASTONEADO	UND	L 23.00	200.00	L 4,600.00			200.00	L4,600.00	200.00	L 4,600.00	100.00%
1 04	ZAPATAS DE CASTILLOS	UND	L 230.00	8.00	L 1,840.00			8.00	L1,840.00	8.00	L 1,840.00	100.00%
1 05	PEGADO DE BLOQUE SISADO	UND	L 18.40	1,100.00	L 20,240.00			1,100.00	L20,240.00	1100.00	L 20,240.00	100.00%
1 06	FUNDICION DE CASTILLO	ML	L 230.00	72.00	L 16,560.00			72.00	L16,560.00	72.00	L 16,560.00	100.00%
1 07	FUNDICION DE SOLERA	ML	L 230.00	60.00	L 13,800.00			60.00	L13,800.00	60.00	L 13,800.00	100.00%
1 08	RELLENO Y COMPACTADO	GLOB	L 6,900.00	1.00	L 6,900.00			1.00	L6,900.00	1.00	L 6,900.00	100.00%
1 09	FUNDICION DE FIRME	M2	L 230.00	56.00	L 12,880.00			56.00	L12,880.00	56.00	L 12,880.00	100.00%
1 1	REPELLO Y PULIDO DE MOCHETAS	M2	L 103.50	90.00	L 9,315.00							0.00%
1 11	TECHO DE CANALETA Y ALUZINC	M2	L 287.50	90.00	L 25,875.00			90.00	L25,875.00	90.00	L 25,875.00	100.00%
1 12	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLOB	L 11,500.00	1.00	L 11,500.00							0.00%
1 13	INSTALACION DE PUERTA	UND	L 1,725.00	1.00	L 1,725.00							0.00%
1 14	FUNDICION DE ACERA	M2	L 230.00	19.00	L 4,370.00							0.00%
1 15	ACARREO DE MATERIAL	GLOB	L 18,400.00	1.00	L 18,400.00			1.00	L18,400.00	1.00	L 18,400.00	100.00%
1 16	LIMPIEZA GENERAL	GLOB	L 3,450.00	1.00	L 3,450.00							0.00%
					L 163,530.00				L 133,170.00		L 133,170.00	81.43%

TOTAL ESTIMACIÓN	L	133,170.00		L	-
(-) AMORTIZACIÓN ANTICIPO	L	-			
(-) RETENCIÓN DE I.S.R. (12.5%), SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA					
NETO A RECIBIR	L	133,170.00		L	-



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES

Nombre del Proyecto: MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA LOS ANGELES DEL BARRIO EL CANTÓN, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.

Ubicación: Barrio el Cantón, Valle de Ángeles F.M

Ejecutado por: Marlon Alexis García Barahona.

Identidad: 0826-1984-00208

Monto: 133,170.00 Lps.

Punto de acta: N°. 12, del Acta N°. 31.

En esta fecha 29/03/2023 se rinde el informe de avance en el proyecto de **“MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA LOS ANGELES DEL BARRIO EL CANTÓN, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.”**.

En este informe del proyecto se realizó la obra correspondiente a 30 metros lineales de excavación, 30 metros lineales de zapata corrida, pegado de 200 bloques de sobrecimiento armado, 8 zapatas aisladas, pegado de 1100 bloque en pared sisados, fundición de 72 metros lineales de castillos, fundición de 60 metros lineales de solera, compactado y relleno de toda el área de firme y sobrecimiento, fundición de 56 metros cuadrados de firme de concreto, instalación 90 metros cuadrados de techo de canaleta y aluzinc, y el acarreo global del material para la construcción.

Por lo tanto, **MARLON ALEXIS GARCIA BARAHONA** en calidad de constructor quien prestó sus servicios para la realización del proyecto con número de identidad **0826-1984-00208**, aplica para que se le haga el desembolso por sus servicios prestados cumpliendo con el 81.43% del trabajo.

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD DE OBRA	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA	SUBTOTAL
EXCAVACION	ML	30	100%	L5,175.00
ZAPATA CORRIDA	ML	30	100%	L6,900.00


PEGADO DE BLOQUE BASTONEADO	UND	200	100%	L4,600.00
ZAPATAS DE CASTILLOS	UND	8	100%	L1,840.00
PEGADO DE BLOQUE SISADO	UND	1100	100%	L20,240.00
FUNDICION DE CASTILLO	ML	72	100%	L16,560.00
FUNDICION DE SOLERA	ML	60	100%	L13,800.00
RELLENO Y COMPACTADO	GLOB	1	100%	L6,900.00
FUNDICION DE FIRME	M2	56	100%	L12,880.00
TECHO DE CANALETA Y ALUZINC	M2	90	100%	L25,875.00
ACARREO DE MATERIAL	GLOB	1	100%	L18,400.00
TOTAL				L133,170.00

En fe de lo anterior se firma esta acta.

Valle de Ángeles F.M. a los 29 días de marzo del 2023.

LUGAR Y FECHA

Sr. Marvin Aguilar
(Regidor de infraestructura)



Ing. José Eduardo Cabrera
(Unidad Técnica Municipal)



Durante el Proyecto:





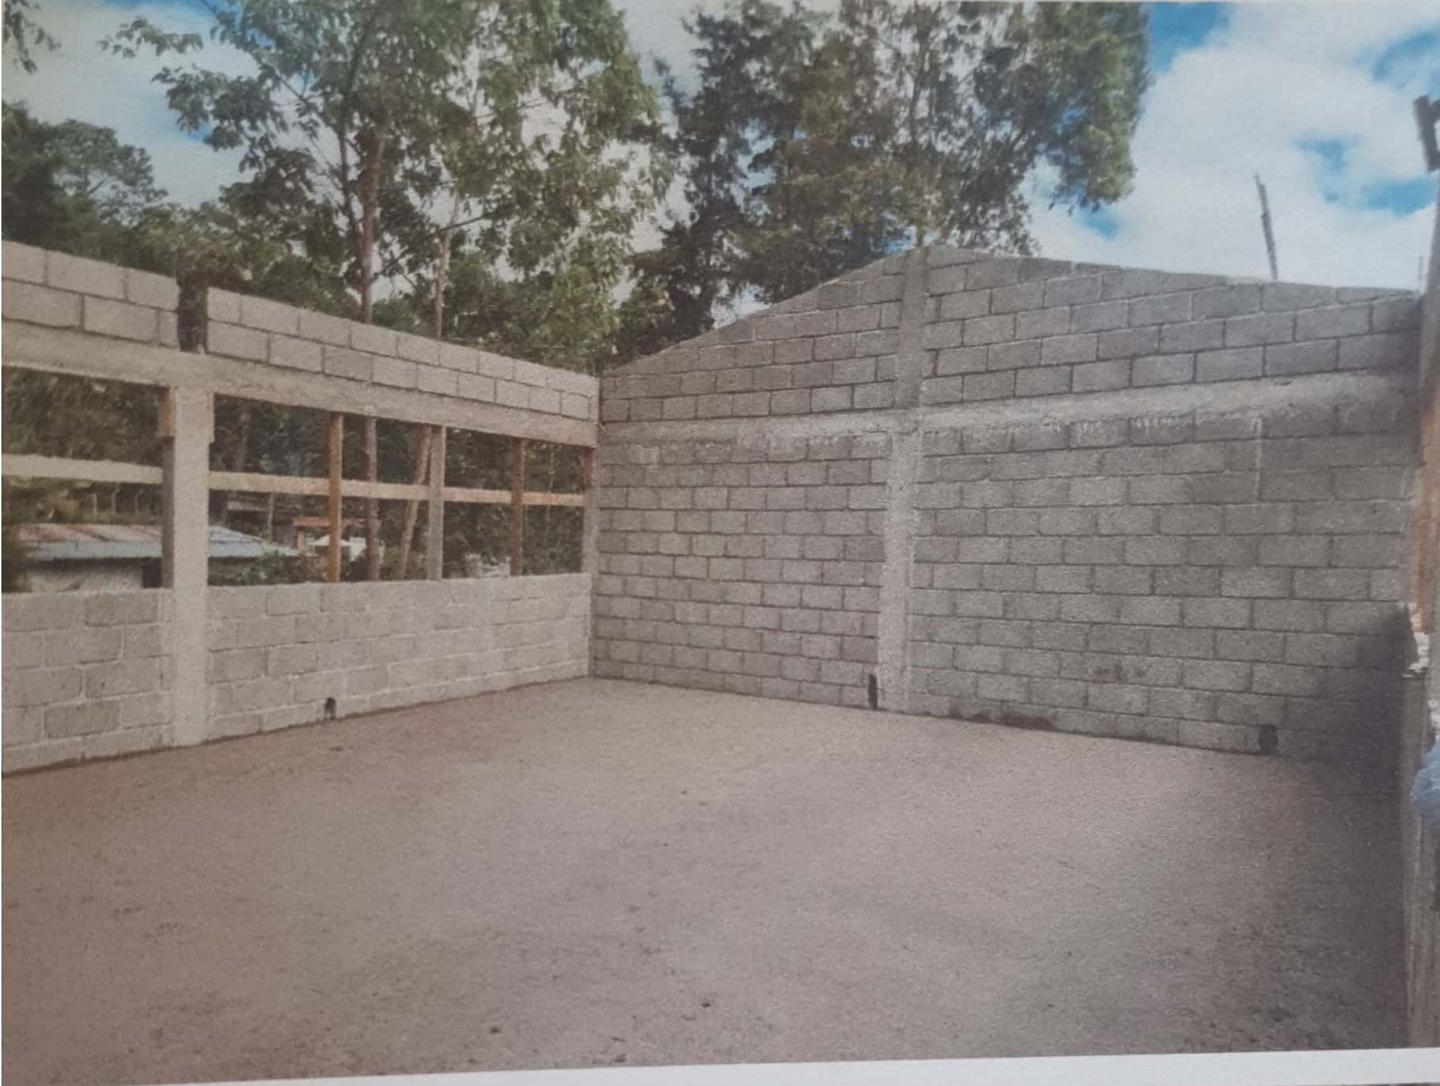





PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES
 NOMBRE DEL PROYECTO : MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL KINDER
 JOHAN MICHELL DE LA ALDEA CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.
 CONTRATISTA: JUAN MANUEL COLINDRES MATAMOROS
 FECHA: 29/3/23



No.	CONCEPTO DE OBRA	OBRA CONTRATADA				ACUMULADO ANTERIOR		PERIODO		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE
		UNID.	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	
1 01	EXCAVACION	ML	L 363.60	22.00	L 7,999.20			22.00	L7,999.20	22.00	L 7,999.20	100.00%
1 02	CORTE DE ARBOL	GLOB	L 4,000.00	1.00	L 4,000.00			1.00	L4,000.00	1.00	L 4,000.00	100.00%
1 03	RELLENO DE PIEDRA	ML	L 709.00	22.00	L 15,598.00			22.00	L15,598.00	22.00	L 15,598.00	100.00%
1 04	FUNDICION DE SOLERA	ML	L 226.47	68.00	L 15,399.96			68.00	L15,399.96	68.00	L 15,399.96	100.00%
1 05	PEGADO DE BLOQUE	M2	L 254.54	55.00	L 13,999.70			55.00	L13,999.70	55.00	L 13,999.70	100.00%
1 06	FUNDICION DE CASTILLO	ML	L 225.00	40.00	L 9,000.00			40.00	L9,000.00	40.00	L 9,000.00	100.00%
1 07	FUNDICION DE FIRME	M2	L 208.92	56.00	L 11,699.52			56.00	L11,699.52	56.00	L 11,699.52	100.00%
1 08	PEGADO DE CERAMICA	M2	L 337.50	56.00	L 18,900.00							0.00%
1 09	TALLADO DE MOCHETAS	ML	L 134.55	204.00	L 27,448.20							0.00%
1 1	RELLENO Y COMPACTADO	M2	L 120.00	25.00	L 3,000.00			25.00	L3,000.00	25.00	L 3,000.00	100.00%
1 11	ELECTRICIDAD	UND	L 878.00	10.00	L 8,780.00							0.00%
1 12	TECHO	M2	L 396.20	82.00	L 32,488.40							0.00%
1 13	FUNDICION DE ACERA	M2	L 275.00	16.00	L 4,400.00							0.00%
					L 172,712.98				L 80,696.38		L 80,696.38	46.72%

TOTAL ESTIMACIÓN	L 80,696.38		L -
(-) AMORTIZACIÓN ANTICIPO	L -		
(-) RETENCIÓN DE I.S.R. (12.5%), SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA			
NETO A RECIBIR	L 80,696.38		L -



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES

Nombre del Proyecto: MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL KINDER JOHAN MICHELL DE LA ALDEA CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.

Ubicación: Aldea Cerro Grande, Valle de Ángeles F.M

Ejecutado por: Juan Manuela Colindres Matamoros.

Identidad: 0826-1971-00053

Monto: 80,696.38 lps.

Punto de acta: N°. 13, del Acta N°. 31.

En esta fecha 29/03/2023 se rinde el informe de avance en el proyecto de “**MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL KINDER JOHAN MICHELL DE LA ALDEA CERRO GRANDE, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.**”.

En este informe del proyecto se realizó la obra correspondiente a 22 metros lineales de excavación, un corte de árbol, relleno de 22 metros lineales de piedra, fundición de solera, 55 metros cuadrados de pared de bloque sisado, fundición de 40 metros lineales de castillo, 56 metros cuadrados de firme de concreto y 25 metros cuadrados de relleno y compactado.

Por lo tanto, **JUAN MANUELA COLINDRES MATAMOROS** en calidad de constructor quien prestó sus servicios para la realización del proyecto con número de identidad **0826-1971-00053**, aplica para que se le haga el desembolso por sus servicios prestados cumpliendo con el 46.72% del trabajo.

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD DE OBRA	PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA	SUBTOTAL
EXCAVACION	ML	22.00	100%	L7,999.20
CORTE DE ARBOL	GLOB	1.00	100%	L4,000.00
RELLENO DE PIEDRA	ML	22.00	100%	L15,598.00
FUNDICION DE SOLERA	ML	68.00	100%	L15,399.96
PEGADO DE BLOQUE	M2	55.00	100%	L13,999.70

FUNDICION DE CASTILLO	ML	40.00	100%	L9,000.00
FUNDICION DE FIRME	M2	56.00	100%	L11,699.52
RELLENO Y COMPACTADO	M2	25.00	100%	L3,000.00
TOTAL				L80,696.38

En fe de lo anterior se firma esta acta.

Valle de Ángeles F.M. a los 29 días de marzo del 2023.

LUGAR Y FECHA

Sr. Marvin Aguilar
(Regidor de infraestructura)



Ing. José Eduardo Cabrera
(Unidad Técnica Municipal)

Durante el Proyecto:





