

No. 1035-SGIMSG-2023

PARA: LIC. LORNA ELISA CALIX MEJIA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ING. VICTOR VILLAFRANCA
SUBGERENTE NACIONAL DE ING. MANT. Y SERVICIOS GENERALES


ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Información de Proyectos mes de marzo 2023:

- 1- Memorando No. 0946- SGIMSG-2023
- 2- Memorando No. 0977 SGIMSG-2023
- 3- Memorando No. SGMHRN-0392-2023

cc: Archivo

VV/ED

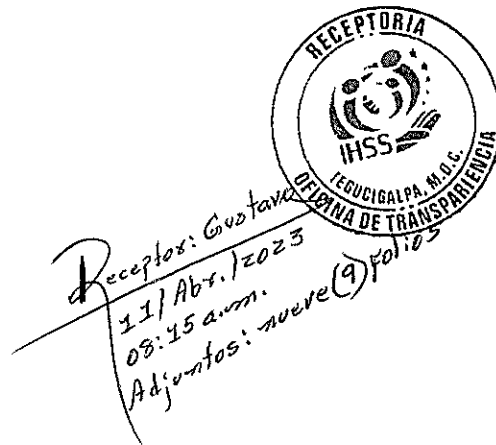

MEMORANDO
No. 0946-SGIMSG-2023

ING - 127
28 de Marzo del 2023

PARA: ING. VICTOR VILAFRANCA

SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, Y SERV. GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA

COORD. PROYECTOS Y OBRAS CIVILES



ASUNTO: AVANCE DE PROYECTOS

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **MARZO del 2023:**


1. "Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS" y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

- Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
- Sector Subsector:** Salud
- Nombre del Proyecto:** "Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS"
- Ubicación de Proyecto:** La Ceiba y Choluteca.
- Propósito:** Construcción de dos Edificios que puedan brindar los servicios de Hemodiálisis a los pacientes de estas dos ciudades, a fin de que se mejore la atención de los pacientes de esas zonas.
- Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de nivelación de terrenos, cimentaciones, construcción de cimentaciones, paredes de bloque, colocación de pisos y firmes de concreto, paredes de tabla roca, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, cisterna, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

- Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Hemodiálisis del IHSS en las ciudades de La Ceiba y Choluteca.



2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño al terreno del Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - vvillafranca9@gmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 16,103,703.91
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Noviembre de 2019
8. **Estado del Proyecto:** Se emitió fecha de inicio el 20 de enero del 2020, actualmente sigue en ejecución. El proyecto a la fecha se encuentra aún detenido debido a que no se ha podido llegar a un conceso en lo que corresponde a los precios de los aires acondicionados.
1. **Costo de Finalización:** Se sigue en elaboración de Orden de Cambio; pero el Presupuesto del Contrato es de L. 14, 970, 402.78.
9. **Fecha de Finalización:** Se está en negociación de Obras Adicionales y Fichas de Costo de los Aires Acondicionados para definir el tiempo restante de ejecución y el costo final de las obras.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución.

2. "Servicios de Evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS" y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** "Servicios de evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS"
4. **Ubicación de Proyecto:** Nivel Nacional
5. **Propósito:** Contar con un evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de avalúo a los terrenos, edificios y demás Propiedad del IHSS, esto para realizar una actualización de la situación actual de estos a solicitud de la comisión nacional de banca y seguros



adicionalmente actualizar mejoras en contabilidad y las alcaldías correspondientes así como actualizar planos de los bienes inmuebles del IHSS.

B. Elaboración del Proyecto:

- 7. Alcance del Proyecto (principal producto):** Realizar Avalúos de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS.
- 8. Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
- 9. Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño a Los terrenos o Edificios del Instituto.
- 10. Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - vvillafranca9@gmail.com
- 11. Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
- 12. Presupuesto del Proyecto:** L. 2,934,951.00
- 13. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Febrero de 2022
- 14. Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.
- 2. Costo de Finalización:** El Costo Final del proyecto quedo en L. 2,934,951.00
- 15. Fecha de Finalización:** El proyecto se Recepciono Parcialmente el 08 de marzo del 2023; pero se les dieron Treinta (30) días calendarios para correcciones de los Entregables y con ello entregarles el Acta de Recepción Final

C. Ejecución del Proyecto:


El proyecto se encuentra Recepcionado Parcialmente y en revisión de todos los documentos entregables para elaboración de Acta de recepción Final.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo

RR



MEMORANDO

No. 0977-SGIMSG-2023

ING 129

30 de Marzo del 2023

PARA: **ING. VICTOR VILAFRANCA**
SUBGERENTE NACIONAL DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO. Y SERV. GENERALES

DE: **ING. ANGEL AMAYA**
COORDINADOR OBRAS ELÉCTRICAS

ASUNTO: **AVANCE DE PROYECTO**



En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al Ítem N° 2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **FEBRERO del 2023:**

1. **“Adquisición e Instalación de 286 Unidades de Aire Acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social” se informa lo siguiente:**

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “ Adquisición e Instalación de 286 Unidades de Aire Acondicionado a nivel nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad Social”
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital de Especialidades y Hospital Regional del Norte.
5. **Propósito:** Climatizar área de Quirófanos en el Hospital Regional del Norte y Climatizar área de Emergencia de Adulto, Observaciones y UCIP para el Hospital de Especialidades.
6. **Descripción del Proyecto:** Desmontaje, Suministro e Instalación de Unidades de Aire Acondicionado Tipo Paquetes de 15,5 y 3 Toneladas, cabe hacer la observación que para este contrato solo se instalaran las 13 Unidades tipo Paquete Únicamente.

Mano Mediano
30-3-23
8:45AM
OK

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los pacientes de Salas Quirúrgicas y Observaciones tanto para el Hospital de Especialidades y Hospital Regional del Norte.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño a los edificios de la Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - vvillafranca9@gmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 15,000,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 09 de noviembre de 2021
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.
9. **Costo de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto.
10. **Fecha de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto, el mismo tiene Orden de Inicio a la Firma de Contrato con Fecha 03 de Febrero 2022.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra aún en ejecución.



2. **“Adquisición e Instalación de 4 Ascensores para el Edificio RSPS de Tegucigalpa, Hospital General de Especialidades y Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS”**

Se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Adquisición e Instalación de 4 Ascensores para el Edificio RSPS de Tegucigalpa, Hospital General de Especialidades y Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula, del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS”
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital de Especialidades en La Granja, Edificio de RSPS y Hospital Regional del Norte.
5. **Propósito:** Brindar una Mejor Atención a los Derechohabientes.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de Reemplazo de dos Ascensores en el Hospital de Especialidades, Instalación de Un Ascensor en el Edificio de RSPS e Instalación de Un Ascensor para el Hospital Regional del Norte.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención de los Pacientes de Salas Quirúrgicas y Observaciones tanto para el Hospital de Especialidades y Hospital Regional del Norte.
2. **Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del Proyecto.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño a los Edificios del Instituto.
4. **Detalles del contacto:**
 - Ing. Víctor Villafranca
 - Tel: 9470-5964
 - vvillafranca9@gmail.com
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 15,500,000.00
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 16 de Marzo de 2021
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha.



9. **Costo de Finalización:** El proyecto está en ejecución por lo que aún no se Tiene el precio final del proyecto.
10. **Fecha de Finalización:** Se sigue en ejecución del proyecto, el mismo tiene Orden de Inicio con fecha 15 de Marzo de 2022 y Fecha de Finalización 15 de Octubre de 2022

C. Ejecución del Proyecto:


El proyecto se encuentra aún en ejecución, cabe hacer mención que en fecha viernes 02 de Diciembre de 2022 fue concluida la instalación del ascensor del Hospital Regional del Norte.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo

VV/AA




MEMORANDO
No. SGMHRN-0392-2023

PARA: ING. VICTOR VILLAFRANCA
Sub Gerente de Ing. Manto y Servicios Generales a Nivel Nacional
IHSS-Tegucigalpa

DE: ING. ALLAN ZAVALA
Subgerente de Mantenimiento H.R.N.

ASUNTO: Información de Proyecto Hospital regional del Norte IHSS-San Pedro Sula.

Marzo 27 del 2023.



Por este medio se remite información en relación a la ejecución de proyectos en el Hospital Regional del Norte, correspondiente al mes de **MARZO del 2023**:


El proyecto de **“REPARACIÓN DE TECHOS LOSAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ETAPA 1 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”. Contrato No. 0129-2022**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “REPARACIÓN DE TECHOS LOSAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ETAPA 1 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte S.P.S. Col. Tara, San Pedro Sula.
5. **Propósito:** reparación de estructura y cubierta de techos, reemplazo de encielados e impermeabilización de losas del ala norte del HRN.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizarán trabajos de demoliciones, desmontajes de aires acondicionado, montaje de las misma unidades colocación de láminas de aluzic, cielo falso, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención en el servicio de Salas de Ginecología, Maternidad, Cirugía de Mujeres, Cirugía de Hombres, Medicina de Mujeres, Medicina de Hombres, Pediatría A, Pediatría B, Ortopedia y Almacén Regional del Hospital Regional del Norte, IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No aplica



OK

9. Impacto en el Terreno y Asentamientos: No aplica

10. Detalles del contacto:

- Ing. Víctor Villa
- Tel: 9470-5964
- victor.villafranca@ihss.com

11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios


12. Presupuesto del Proyecto: L. 8,272,677.29

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en proceso de ejecución.

Sin más que agregar.

Atte.



cc. Archivo

