



MUNICIPALIDAD TALGUA LEMPIRA

Cuenta N.º: 11-101-003235-7

CHEQUE No. **00006490**

TALGUA

21 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

56,500.00

L

JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente, S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Daniel O. Quintana
Firma (s)

⑈01101079⑆00111010032357⑆00006490

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 59,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13951 CHEQUE N° 6490

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º	00006490		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA		RECIBÍ CONFORME
		<p>Josman Adalid Murcia Gomez</p>	



Honduras, C.A.

TALGUA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2023

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: J.SARMIENTO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13951

L: 59,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1354

Fecha de Emisión: 21/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ

Id/RTN: 1323199200217

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:




SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS TALGUA LEMPIRA POR LA CANTIDAD DE LPS. 59,000.00 CON ORDEN DE PAGO N° 13951 CHEQUE N° 6490

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 011 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER DE ALDEA DE TEJERAS	59,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	2,500.00
Total de retenciones:		2,500.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		59,000.00
- RETENCIONES		2,500.00
TOTAL		56,500.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde 	

Recibido por: Josman Adalid Murcia Gomez
 Identidad No.: 1323-1992-00217

0s+js/j9JmfafNiQwxjMurJIZNTgpl.1KQivXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSlVfk0lcl3QZz6cB5H6pD5kIRdMbXwWxXXL0deWMFRyoPvR/AFpkD+mKajX8kqPcJAsd
 GwrdK9Uuoc23W5akakGtOnzvjuZ4454x



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS TALGUA, LEMPIRA

Yo, **DANIEL DERAS BENITEZ**, mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, Con Número de Identidad personal 1323-1960-00034, No de solvencia Municipal 136713, R T N. 1323196000345, con domicilio en la Comunidad de El Aguaje, Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Calidad de Alcalde Municipal, del Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en Adelante Denominado **EL CONTRATANTE**;- Y **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ**, mayor de edad, casado, albañil y soldador, hondureño con DNI No 1323-1992-00217, R.T.N. No. 13231992002170, Solvencia Municipal No. 00018479 y con domicilio en la comunidad de Ciruelito del Municipio de Talgua, Departamento de Lempira, en representación legal de su misma, en adelante denominado, **EL CONTRATADO**, El primero en pleno uso y goce de sus derechos y Facultades que la Ley le Confiere para celebrar este tipo de actos y el Segundo en pleno uso y goce de sus derechos civiles y facultades mentales, y de común **ACUERDO** hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO**; de prestación de servicios de construcción de Cerca perimetral del kínder Nuevo Amanecer en la comunidad de Tejeras Talgua, Lempira.

PRIMERA; El **CONTRATANTE**, manifiesta que en las instalaciones del Kinder de la aldea de Tejeras Talgua, Lempira, se ocasionan perjuicios tanto en la obra física como en el material y mobiliario escolar, debido a que no existe la protección adecuada, para lo cual se contratan los servicios del señor **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ**, para que pueda realizar el proyecto de construcción de cerca Perimetral de dicho Kinder, quien será responsable de desarrollar las siguientes actividades:

No	Tipo de actividades	UNID.	CANT
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	120.05
2	EXCAVACION COMUN 0.40 X 0.50 M	M3	20
3	EXCAVACION TIPO-I (SEMI -DURO)	M3	5
4	ACARREO Y DESALOJO DE LO EXCAVADO	M3	35
5	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE 0.40 X 0.50 M X 115 ML	M3	23
6	SOLERA INF. DE 15 X 20 CMS. REF. 4#3 Y ANILLOS # 2 MM, CONCRETO 1:2:2	GLB	115
7	CASTILLO 15 X 15 CMS. REF. 4 # 3 Y ANILLOS # 2. FONDICION DE TUBERIA HG DE 2" DIAM.	ML	72
8	COLUMNAS DE 28X28 CMS. REF.4#4, ESTRIBOS # 3 mm.	ML	20
9	PARED DE BLOQUE DE 6" SISADA.	M2	50
10	SOLERA DE REMATE 12 X 22 CMS.REF. 4 # 3 Y ESTRIBOS #2 . (INC. PECHO PALOMA)	ML	115
11	TALLADO DE SOLERA DE REMATE 12X22 CMS.	ML	230
12	POSTE TUBO HG DE 2" DE DIAMETRO	ML	174
13	MALLA CICLON CAL-12 DE 6 PIES	M2	210
14	TENSOR SUPERIOR TUBO HG DE 3/4"	ML	115
15	ALAMBRE DE PUA	ML	345
16	SUM. E INST.PORTON METALICO DOBLE HOJA 2.30 ALTURA X 4.00 M	UNID	1

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.



SEGUNDA: PLAZO, el plazo del Presente CONTRATO es de 90 días contados a partir de la Fecha de su firma. **EL MONTO** del presente CONTRATO es por la cantidad de **NOVENTA Y CINCO MIL, LEMPIRA EXACTOS, Lps. 89, 000.00**), por pago de mano de obra calificada, de los cuales se le retendrá el 12.5% de una utilidad neta obtenida de Lps. 20,000.00, después de los gastos ocasionados en las actividades desarrolladas en mano de obra calificada, considerando los costos de vida, y se deducirá este aporte en el último desembolso.

TERCERA: Forma de pago, las dos partes Acuerdan que se realicen en Dos desembolsos: Un primer pago de Lps 30,000.00 considerando el 35% en la ejecución de las obras descritas y un Segundo y último pago de Lps 59,000.00 considerando el 100% en la ejecución de las obras descritas, del cual se le retendrá el 12.5 % de la utilidad neta, el cual se retendrá en el último pago.

EL CONTRATANTE: advierte que, de no existir fondos en esta Tesorería Municipal, los pagos no se efectuarán como esta cláusula lo manifiesta y se hará en un solo desembolso considerando la existencia de fondos en la Tesorería Municipal, debido a los retrasos existentes en los desembolsos de la Transferencia del Gobierno Central. Osea que trabajara al crédito.

- ❖ **EL CONTRATADO**, manifiesta que está Totalmente de Acuerdo con las condiciones establecidas en el presente CONTRATO, comprometiéndose para ello.
 - A prestar su servicio en el tiempo y forma establecida en el contrato.
 - Estar disponible a la hora de ser llamado y recibir el pago, una vez que el **CONTRATANTE** asegure que el proyecto tiene a sido finalizado.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA
HONDURAS HONDURAS C.A.

asegure que el proyecto tiene a sido finalizado.


CUARTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: el **CONTRATADO**, acepta la supervisión y sugerencias de la Alcaldía Municipal, mediante las personas que se designen y de las autoridades del Centro Educativo; manifiesta que el personal necesario para desarrollar los trabajos requeridos en mano de obra calificada los pondrá el **CONTRATADO** y en caso de existir contratiempo en el desarrollo de este trabajo, se compromete a buscar la forma de cumplir en el tiempo establecido, si esto se diera por aspectos fuera del alcance humano, se tratará de solucionar con la extensión de tiempo que se incurra y la comprensión será por ambas partes. Reteniendo por parte de esta municipalidad el porcentaje que en base a ley corresponde

QUINTA: GARANTIA DE CALIDAD. El Señor **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ** será responsable por la ejecución y calidad de la obra en base a diseño y estudio y se obliga a subsanar y responder por cualquier defecto inherente a la prestación de los servicios hoy aquí contratados, garantizando la calidad de la obra. Reteniendo por parte de esta municipalidad el porcentaje que en base a ley corresponde.


SEXTA: Ambas partes acuerdan que son causas para dar por terminado el presente **CONTRATO**, él incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores de este Contrato por una de las partes; por lo que la parte incumplidora compensará a la parte Afectada, con la devolución de valores entregados en forma anticipada, o la cancelación de servicios recibidos.

SEPTIMA: Ambas partes Acuerdan que, en caso de existir controversias, estas se trataran de solventar por la vía del dialogo, sin embargo, de no lograrse arreglo alguno por este medio, renunciarnos a nuestro domicilio común, y nos sometemos a consideración del Juzgado competente para qué dicte resolución conforme a derecho.

OCTAVA: Ambas partes manifiestan qué están Totalmente de **ACUERDO**, y ratifican en cada una de sus partes el presente **CONTRATO**, en fe de lo cual firmamos el presente, en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira, a los 10 días del Mes de Marzo del Año 2023.


~~(F) DANIEL DERAS BENITEZ~~
ALCALDE MUNICIPAL
Contratante




(F) **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ.**
CONTRATADO

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

E-mail: munitalgua@hotmail.com



Realizado por:

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO

Año 2023



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPTO. LEMPIRA.

Proyecto:

**CONSTRUCCION CERCA PERIEMTRAL, KINDER
NUEVO AMANECER 120.05 ML**

Ubicación:
LEMPIRA,


LAS TEJERAS, TALGUA DEPTO. DE

Fecha:

ABRIL 2023



Of. Gerencia Social
Calle Santa Rosa de
Cruz, Managua
(504) 2662-6610
(504) 2662-6692
(504) 9692-4915
info@concehiguito.mn

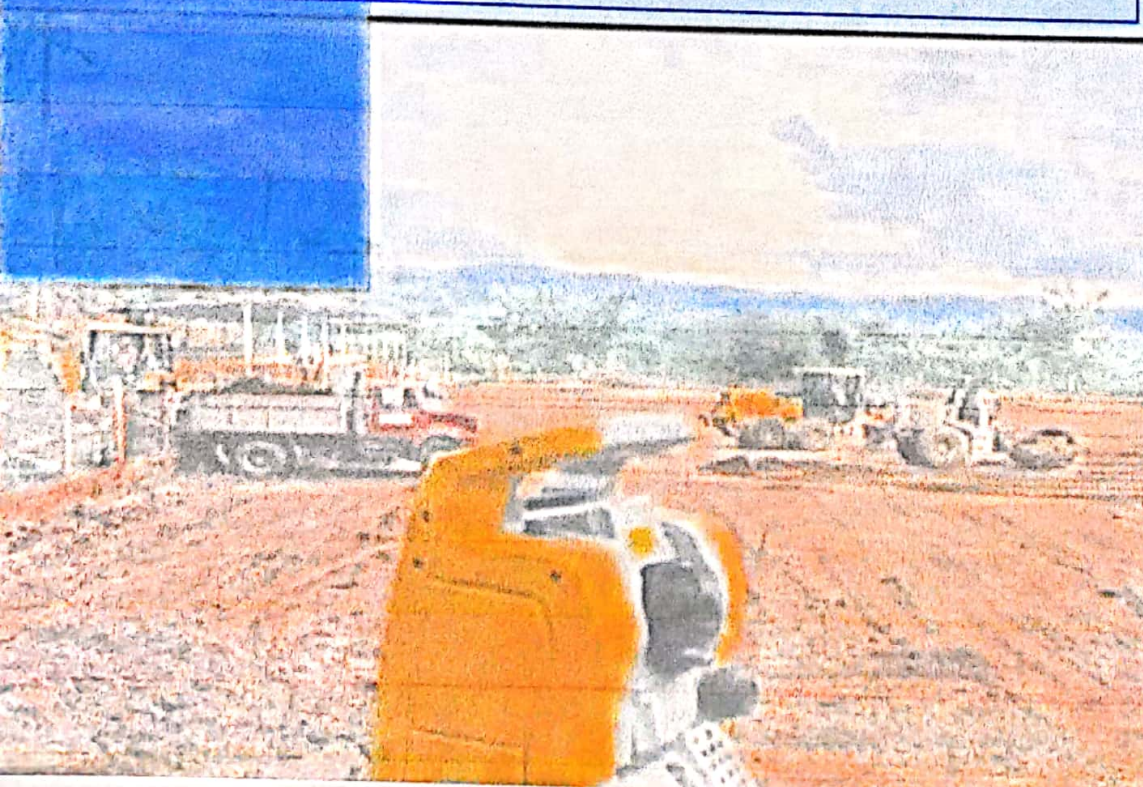



Realizado por:

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO

Año 2023



MUNICIPALIDAD DE TALGUA, DEPTO. LEMPIRA.

Proyecto:

**CONSTRUCCION CERCA PERIEMTRAL, KINDER
NUEVO AMANECER 120.05 ML**

Ubicación:
LEMPIRA,

LAS TEJERAS, TALGUA DEPTO. DE

Fecha:

ABRIL 2023



CO. CANTONAL DE OBRAS
COMUNALES E IGLESIA
SAN JUAN GUAYACÁN
CANTÓN, LEMPIRA
(504) 2662-4611
(504) 2662-0682
(504) 2632-4915
www.cantonaliglesia.com

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

PROYECTO: CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL TUBO HG 2" CON MALLA CICLON.

UBICACION: KINDER NUEVO AMANECER, LAS TEJERAS, TALGUA DEPTO. LEMPIRA.

FECHA: ABRIL 2023



CERCA CON MALLA CICLON Y TUBERIA HG 2" 120.05 ML					
NO.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P/UNIT.	S/TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	120.05	30.00	L. 3,601.50
2	EXCAVACION COMUN O 40 X 0 50 M	M3	20	250.00	L. 5,000.00
3	EXCAVACION TIPO I (SEMI DURO)	M3	5	300.00	L. 1,500.00
4	ACARRIO Y DESALOJO DE LO EXCAVADO	M3	35	150.00	L. 5,250.00
5	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE 0.40 X 0.50 M X 115 ML	M3	23	2800.00	L. 64,400.00
6	SOLERA INF DE 15 X 20 CMS. REF. 4#3 Y ANILLOS # 2 MM. CONCRETO 1:2:2	GLB	115	L. 380.00	L. 43,700.00
7	CASTILLO 15 X 15 CMS. REF. 4#3 Y ANILLOS # 2. FONDICION DE TUBERIA HG	ML	72	L. 350.00	L. 25,200.00
8	COLUMNAS DE 28X28 CMS. REF. 4#4. ESTRIBOS # 3 mm.	ML	20	L. 900.00	L. 18,000.00
9	PARO DE BLOQUE DE 6" SISADA	M2	50	L. 450.00	L. 22,500.00
10	SOLERA DE REMATE 12 X 22 CMS REF. 4#3 Y ESTRIBOS #2. (INC. PECHO PA	ML	115	L. 300.00	L. 34,500.00
11	TALLADO DE SOLERA DE REMATE 12X22 CMS.	ML	230	L. 70.00	L. 16,100.00
12	POSTE TUBO HG DE 2" DE DIAMETRO	ML	174	L. 280.00	L. 48,720.00
13	MALLA CICLON CAL 12 DE 6 PIES	M2	210	L. 115.00	L. 24,150.00
14	TENSOR SUPERIOR TUBO HG DE 3/4"	ML	115	L. 60.00	L. 6,900.00
15	ALAMBRE DE PUA	ML	345	L. 15.00	L. 5,175.00
16	SUM. E INST. PORTON METALICO DOBLE HOJA 2.30 ALTURA X 4.00 M	UNID.	1	L. 10,000.00	L. 10,000.00
SUB TOTAL					L. 334,696.50
TOTAL CERCA CON MALLA CICLON Y TUBERIA HG DE 2"					L. 334,696.50
MONTO TOTAL DEL PROYECTO					L. 334,696.50

ING. RIGERTO R. MARQUEZ

C.I.C.H 2083

3183-2348

PRESUPUESTO POR INSUMOS

PROYECTO: CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL TUBO HG 2" CON MALLA CICLON.

UBICACIÓN: KINDER NUEVO AMANECER, LAS TEJERAS, TALGUA DEPTO. LEMPIRA.

FECHA: ABRIL 2023.



HERRAMIENTA Y EQUIPO					
No	Materiales	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	MEZCLADORA DE UNA BOLSA	HORAS	10	600.00	L. 6,000.00
2	VOLQUETA 5 M3	HORAS	10	800.00	L. 8,000.00
3	HERRAMIENTA	GLOBAL	1	3806.50	L. 3,806.50
SUB-TOTAL HERRAMIENTO Y EQUIPO					L. 17,806.50

EQUIPO Y HERRAMIENTA					L. 17,806.50
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------

CERCA CON MALLA CICLON Y TUBERIA HG 2"					
--	--	--	--	--	--

INSUMOS FERRETEROS					
--------------------	--	--	--	--	--

No	Materiales	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO TIPO PORTLAND, PUESTO EN OBRA	BOLSA	170	L. 215.00	L. 36,550.00
2	PULIDO	BOLSA	8	L. 130.00	L. 1,040.00
3	BLOQUE DE 6"	UNID	700	L. 24.00	L. 16,800.00
4	ARENA DE RIO, PUESTO EN OBRA	M3	20	L. 700.00	L. 14,000.00
5	GRAVA DE RIO, PUESTA EN OBRA.	M3	15	L. 700.00	L. 10,500.00
6	PIEDRA RIO O DE CANTERA, EN OBRA.	M3	15	L. 700.00	L. 10,500.00
7	AGUA	M3	55	L. 70.00	L. 3,850.00
8	MADERA RUSTICA DE PINO (3 USOS)	PT	252	L. 25.00	L. 6,300.00
9	VARILLA CORRUGADA #2 (LEGITIMA) 1/4"	LANCE	105	L. 90.00	L. 9,450.00
10	VARILLA CORRUGADA #3 (LEGITIMA) 3/8"	LANCE	110	L. 280.00	L. 30,800.00
11	VARILLA CORRUGADA #4 (LEGITIMA) 1/2" COLUMNA	LANCE	10	L. 380.00	L. 3,800.00
12	TUBO HG DE 2" DIAMETRO, PARA POSTES	LANCE	30	L. 1,200.00	L. 36,000.00
13	MALLA CICLON CAL-12	ROLLO	4	L. 5,700.00	L. 22,800.00
14	TUBO HG DE 3/4" DIAMETRO, TENSOR SUPERIOR EN MALLA	LANCE	20	L. 350.00	L. 7,000.00
15	ROLLO DE ALAMBRE DE PUA	ROLLO	4	L. 800.00	L. 3,200.00
16	ELECTRODO 6013	LB	20	L. 45.00	L. 900.00
17	ALAMBRE DE AMARRE	LB	50	L. 30.00	L. 1,500.00
18	CLAVOS 1 A 4 PULGADAS	LB	30	L. 30.00	L. 900.00
19	SUM. E INST. PORTON METALICO DOBLE HOJA 2.30 ALTURA X 4.00 M	UNID	1	L. 10,000.00	L. 10,000.00

SUB TOTAL INSUMOS FERRETEROS					L. 225,890.00
-------------------------------------	--	--	--	--	----------------------

MANO DE OBRA CALIFICADA					
-------------------------	--	--	--	--	--

No	PERSONAL	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	MAESTRO DE OBRA	JDR	20	900.00	L. 18,000.00
2	ALBAÑIL	JDR	40	600.00	L. 24,000.00
3	ARMADOR DE ACERO	JDR	8	500.00	L. 4,000.00
4	SOLDADOR	JDR	12	500.00	L. 6,000.00

SUB TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					L. 52,000.00
--	--	--	--	--	---------------------

MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
----------------------------	--	--	--	--	--

No	PERSONAL	UNIDAD	CANT.	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	AYUDANTE	JDR	60	350.00	L. 21,000.00
2	PEON	JDR	60	300.00	L. 18,000.00

SUB TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L. 39,000.00
---	--	--	--	--	---------------------

	TOTAL MANO DE OBRA	L. 91,000.00
	MONTO TOTAL CERCA MALLA CICLON Y TUBO HG DE 2"	L. 334,696.50


ING. RIGOERTO R. MARQUEZ

C.I.C.H 2083

3183-2348

CERCA PERIMETRAL KINDER NUEVO AMANECEER. LAS TEJERAS

= CERCA CON TUBO HG 2" Y MALLA CICLON. = 120.05 ML

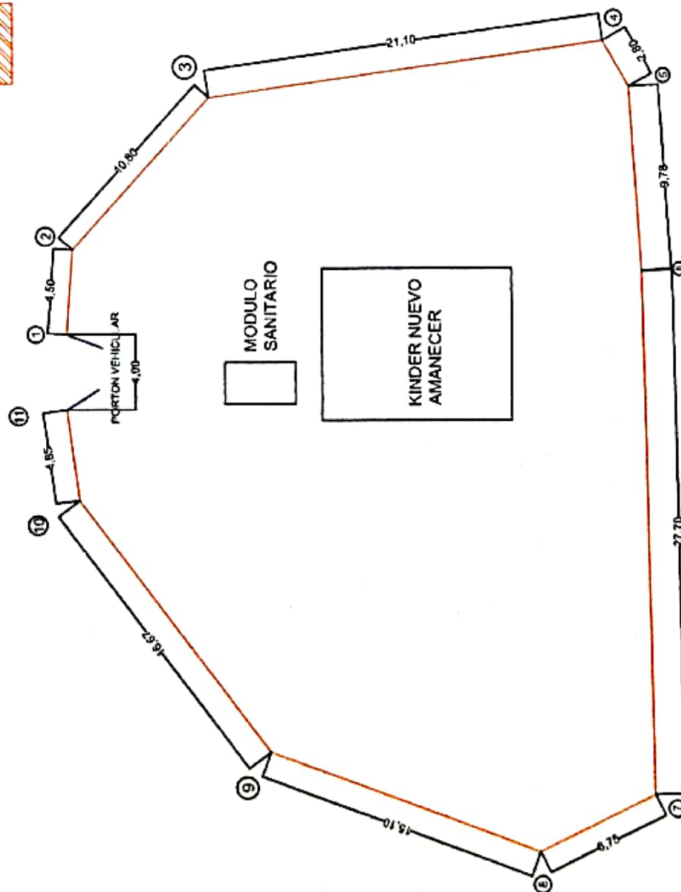

HOJA
01
DE: 2



ESCALA:
5/1N ESC


CONTENIDO:
VISTA EN PLANTA
FECHA:
ABRIL-2023.

DISEÑO:
ING. RIGOBERTO R. MARQUEZ
REVISÓ:
ING. RIGOBERTO MARQUEZ

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN CERCA PER. METRAL, KINDER NUEVO AMANECEER
1:1 (1/1)
MUNICIPALIDAD TALGUA, DEPTO. LEMPIRA.

CERCA PERIMETRAL KINDER NUEVO AMANECER. LAS TEJERAS

CERCA PERIMETRAL KINDER NUEVO AMANECER = 120.05 ML.

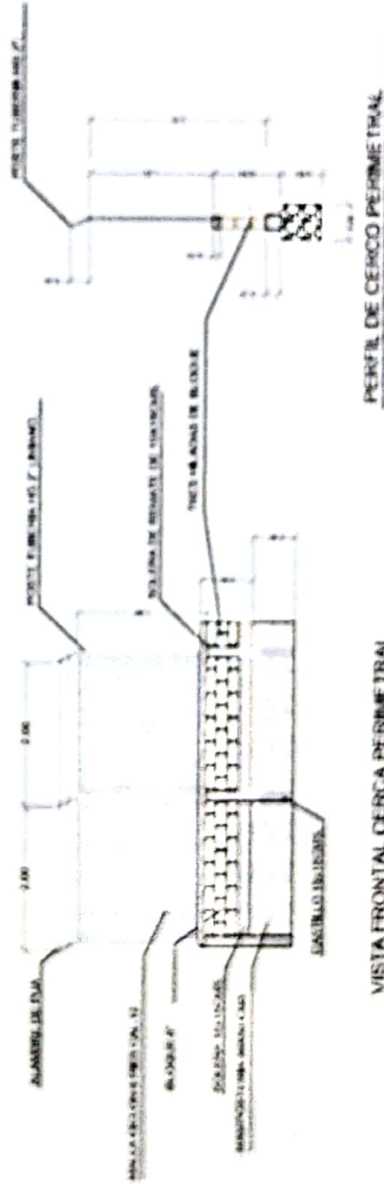

PERFIL DE CERCO PERIMETRAL

VISTA FRONTAL CERCA PERIMETRAL

PROYECTO LA POSTAL - KM. 11.5 - FINCA LAS ESQUINAS - R. V. C. AMANECER S.A.	CLIENTE M. INC. LA PALESTRA S.A. S. DE R. L. DEPTO. LIMPIKA	DISEÑO ING. ROBERTO R. RAMIREZ REVISOR ING. ROBERTO RAMIREZ	COMPROBADO DETALLES CONSTRUCTIVOS P. J. J. A. AÑO: 2013	ESCALA 20x100		HOJA 02 DE 02

COTIZACION

PROYECTO: CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL TUBO HG 2" CON MALLA CICLON.

UBICACIÓN: KINDER NUEVO AMANECER, LAS TEJERAS, TALGUA DEPTO. LEMPIRA.

FECHA: 01 de marzo 2023



CERCA CON MALLA CICLON Y TUBERIA HG 2" 120.05 ML					
NO.	DESCRIPCION	UNID	CANT	P/UNIT.	S/TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	120.05	30.00	L 3,601.50
2	EXCAVACION COMUN 0.40 X 0.50 M	M3	20	99.00	L 1,980.00
3	EXCAVACION TIPO-I (SEMI -DURO)	M3	5	80.00	L 400.00
4	ACARREO Y DESALOJO DE LO EXCAVADO	M3	35	81.00	L 2,835.00
5	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE 0.40 X 0.50 M X 115 ML	M3	23	150.00	L 3,450.00
6	SOLERA INF. DE 15 X 20 CMS. REF. 4#3 Y ANILLOS # 2 MM, CONCRETO 1:2:2	GLB	115	L 80.00	L 9,200.00
7	CASTILLO 15 X 15 CMS. REF. 4 # 3 Y ANILLOS # 2. FONDICION DE TUBERIA HG	ML	72	L 80.00	L 5,760.00
8	COLUMNAS DE 28X28 CMS. REF. 4#4, ESTRIBOS # 3 mm.	ML	20	L 80.00	L 1,600.00
9	PARED DE BLOQUE DE 6" SISADA.	M2	50	L 95.00	L 4,750.00
10	SOLERA DE REMATE 12 X 22 CMS. REF. 4 # 3 Y ESTRIBOS #2 . (INC. PECHO PA	ML	115	L 79.00	L 9,085.00
11	TALLADO DE SOLERA DE REMATE 12X22 CMS.	ML	230	L 50.00	L 11,500.00
12	POSTE TUBO HG DE 2" DE DIAMETRO	ML	174	L 80.00	L 13,920.00
13	MALLA CICLON CAL-12 DE 6 PIES	M2	210	L 30.00	L 6,300.00
14	TENSOR SUPERIOR TUBO HG DE 3/4"	ML	115	L 30.00	L 3,450.00
15	ALAMBRE DE PUA	ML	345	L 15.00	L 5,175.00
16	SUM. E INST. PORTON METALICO DOBLE HOJA 2.30 ALTURA X 4.00 M	UNID	1	L 5,993.50	L 5,993.50
SUB-TOTAL					L 89,000.00
TOTAL CERCA CON MALLA CICLON Y TUBERIA HG DE 2"					L 89,000.00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO					L 89,000.00

Josman Adalid Murcia Gomez

y

COTIZACION

PROYECTO: CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL TUBO HG 2" CON MALLA CICLON.

UBICACIÓN: KINDER NUEVO AMANECER, LAS TEJERAS, TALGUA DEPTO. LEMPIRA.

FECHA: 01 de marzo 2023



CERCA CON MALLA CICLON Y TUBERIA HG 2" 120.05 ML					
NO.	DESCRIPCION	UNID	CANT	P/UNIT.	S/TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	120.05	40.00	L. 4,802.00
2	EXCAVACION COMUN 0.40 X 0.50 M	M3	20	110.00	L. 2,200.00
3	EXCAVACION TIPO-I (SEMI -DURO)	M3	5	100.00	L. 500.00
4	ACARREO Y DESALOJO DE LO EXCAVADO	M3	35	81.00	L. 2,835.00
5	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE 0.40 X 0.50 M X 115 ML	M3	23	155.00	L. 3,565.00
6	SOLERA INF. DE 15 X 20 CMS. REF. 4#3 Y ANILLOS # 2 MM, CONCRETO 1:2:2	GLB	115	L. 100.00	L. 11,500.00
7	CASTILLO 15 X 15 CMS. REF. 4 # 3 Y ANILLOS # 2. FONDICION DE TUBERIA HG	ML	72	L. 90.00	L. 6,480.00
8	COLUMNAS DE 28X28 CMS. REF.4#4, ESTRIBOS # 3 mm.	ML	20	L. 90.00	L. 1,800.00
9	PARED DE BLOQUE DE 6" SISADA.	M2	50	L. 95.00	L. 4,750.00
10	SOLERA DE REMATE 12 X 22 CMS.REF. 4 # 3 Y ESTRIBOS #2 . (INC. PECHO PA	ML	115	L. 90.00	L. 10,350.00
11	TALLADO DE SOLERA DE REMATE 12X22 CMS.	ML	230	L. 62.00	L. 14,260.00
12	POSTE TUBO HG DE 2" DE DIAMETRO	ML	174	L. 95.00	L. 16,530.00
13	MALLA CICLON CAL-12 DE 6 PIES	M2	210	L. 35.00	L. 7,350.00
14	TENSOR SUPERIOR TUBO HG DE 3/4"	ML	115	L. 40.00	L. 4,600.00
15	ALAMBRE DE PUA	ML	345	L. 30.00	L. 10,350.00
16	SUM. E INST.PORTON METALICO DOBLE HOJA 2.30 ALTURA X 4.00 M	UNID	1	L. 6,500.00	L. 6,500.00
SUB-TOTAL					L. 108,372.00
TOTAL CERCA CON MALLA CICLON Y TUBERIA HG DE 2"					L. 108,372.00

MONTO TOTAL DEL PROYECTO					L. 108,372.00
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

[Handwritten Signature]

José Ramiro Cordero

COTIZACION

PROYECTO: CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL TUBO HG 2" CON MALLA CICLON.
UBICACIÓN: KINDER NUEVO AMANECER, LAS TEJERAS, TALGUA DEPTO. LEMPIRA.
FECHA: 01 de marzo 2023



CERCA CON MALLA CICLON Y TUBERIA HG 2" 120.05 ML					
NO.	DESCRIPCION	UNID	CANT	P/UNIT.	S/TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	120.05	35.00	L. 4,201.75
2	EXCAVACION COMUN 0.40 X 0.50 M	M3	20	110.00	L. 2,200.00
3	EXCAVACION TIPO-I (SEMI -DURO)	M3	5	80.00	L. 400.00
4	ACARREO Y DESALOJO DE LO EXCAVADO	M3	35	81.00	L. 2,835.00
5	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE 0.40 X 0.50 M X 115 ML	M3	23	155.00	L. 3,565.00
6	SOLERA INF. DE 15 X 20 CMS. REF. 4#3 Y ANILLOS # 2 MM, CONCRETO 1:2:2	GLB	115	L. 80.00	L. 9,200.00
7	CASTILLO 15 X 15 CMS. REF. 4 # 3 Y ANILLOS # 2. FONDICION DE TUBERIA HG	ML	72	L. 85.00	L. 6,120.00
8	COLUMNAS DE 28X28 CMS. REF.4#4, ESTRIBOS # 3 mm.	ML	20	L. 80.00	L. 1,600.00
9	PARED DE BLOQUE DE 6" SISADA.	M2	50	L. 95.00	L. 4,750.00
10	SOLERA DE REMATE 12 X 22 CMS.REF. 4 # 3 Y ESTRIBOS #2. (INC. PECHO PA	ML	115	L. 79.00	L. 9,085.00
11	TALLADO DE SOLERA DE REMATE 12X22 CMS.	ML	230	L. 50.00	L. 11,500.00
12	POSTE TUBO HG DE 2" DE DIAMETRO	ML	174	L. 85.00	L. 14,790.00
13	MALLA CICLON CAL-12 DE 6 PIES	M2	210	L. 30.00	L. 6,300.00
14	TENSOR SUPERIOR TUBO HG DE 3/4"	ML	115	L. 33.00	L. 3,795.00
15	ALAMBRE DE PUA	ML	345	L. 25.00	L. 8,625.00
16	SUM. E INST.PORTON METALICO DOBLE HOJA 2.30 ALTURA X 4.00 M	UNID	1	L. 6,000.00	L. 6,000.00
SUB-TOTAL					L. 94,966.75
TOTAL CERCA CON MALLA CICLON Y TUBERIA HG DE 2"					L. 94,966.75
MONTO TOTAL DEL PROYECTO					L. 94,966.75

Jose Ramiro Caceres

<Municipalidad>

TEL. _____

Orden de Inicio Proyecto de Ejecución

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto "CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL EDIFICIO DEL KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS " Para el día 10 de MARZO del año 2023 al Señor JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ, Con numero de identidad 1323-1992-00217 quien ha sido adjudicado para el desarrollo del proyecto según la cotización realizada.

Departamento: LEMPIRA

Ubicación: TEJERAS, TALGUA LEMPIRA

Fuente de financiamiento: MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA

A los 10 Días del mes de MARZO del año 2022.


DANIEL DERAS-BENEZ
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TALGUA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL EDIFICIO KINDER DE LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS

Fecha de realizaci3n:	15/3/2022
Ubicaci3n:	TEJERAS ; TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimaci3n :	10 DE MARZO AL 10 JUNIO
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA

Contratista:	JOSMAN ADALID MURCIA	Ident.	1323-1992-00217
Supervisor/UTM :	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	99753268		

MONTO CONTRATO A TODO CO	89,000.00	Plazo en d1as:	90
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DEL 2022	Ampliaci3n Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	30,000.00	% Avance F1sico (seg3n estimaci3n):	60%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	59,000.00	% Avance Financiero (seg3n Tesorer1a):	60%
PAGO ACUMULADO	89,000.00	% Avance en Tiempo (seg3n contrato):	60%

OBSERVACIONES GENERALES:

Observaciones a la obra:

CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA

101EL TRABAJO VA AVANZADO EN UN 100% EN BASE A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL

maestro de obra 1

Alba1iles: 2

Peones: 5

Otros

Suficiente No suficiente

Cantidad de Materiales:

Suficiente No suficiente

Materiales Rechazados:

0

Calidad de obra:

b1ena Regular

Aprobado Rechazado

Observaciones en la obra:


ACTIVIDADES EVACUADAS:

TRAZADAO Y MARACADO

ESCABACION COMUN

ACARRREO Y DESALOJO

CIMENTACION Y MAPOSTERIA



Conclusiones

COSNTRUCCION DE CERCA 'PERIMETRAL VA EN UN ESTA TERMINADA EL KINDER DE TEJERAS

MUNICIPALIDAD DE TALGUA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL EDIFICIO KINDER DE LA COMUNIDAD DE LAS TEJERAS

Fecha de realización:	9/6/2022
Ubicación:	TEJERAS ; TALGUA LEMPIRA
Periodo de estimación :	10 DE MARZO AL 10 JUNIO
Fuente financiamiento	MUNICIPALIDAD DE TALGUA


Contratista:	JOSMAN ADALID MURCIA	Ident.	1323-1992-00217
Supervisor/UTM :	ONAN JAFET VASQUEZ TORRES		
Tel. Supervisor/UTM:	99753268		

MONTO CONTRATO A TODO CO	89,000.00	Plazo en días:	90
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DEL 2022	Ampliación Plazo:	
PAGO ESTIMACION ANTERIOR	30,000.00	% Avance Físico (según estimación):	100%
PAGO ESTIMACION ACTUAL	59,000.00	% Avance Financiero (según Tesorería):	100%
ACUMULADO	89,000.00	% Avance en Tiempo (según contrato):	100%

OBSERVACIONES GENERALES:					
Observaciones a la obra:		CUANTIFICACION DE PERSONAL DE OBRA			
101 EL TRABAJO VA AVANZADO EN UN 100% EN BASE A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL		maestro de obra	1		
		Albañiles:	2		
		Peones:	5		
		Otros			
		Suficiente	X	No suficiente	
		Cantidad de Materiales:		Suficiente	X
Materiales Rechazados:		0			
Calidad de obra:					
buena	X	Regular			
Aprobado	X	Rechazado			

**Observaciones en la obra:
ACTIVIDADES EVACUADAS:**

- SOLERA DE REMATE
- TALLADO DE SOLERA DE REMATE
- POSTE DE TUBO HG
- MALLA CICLÓN
- TENSOR SUPERIOR DE TUBO
- ALAMBRE DE PUA INSTALACION
- PORTON METALICO DE UNA HOJA



Conclusiones

COSNTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL VA EN UN 100% ESTA TERMINADA EL KINDER DE TEJERAS



MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A




CONSTANCIA DE AVANCE DE OBRA

Por medio de la presente el suscrito encargado de LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL **INFORMA** del avance de obra en referencia al proyecto, de mejoras al "CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL EDIFICIO DEL KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS " Construcción que realizada bajo la responsabilidad del contratista: Señor **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ** con numero de identidad: **1323-1992-00217** llevando un avance físico del 100%, por lo cual el contratista solicitó un un último abono por la cantidad de 59,000.00 LEMPIRAS EXACTOS, según lo estipula el contrato celebrado entre la municipalidad y el señor **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ** como contratista, reteniendo el 12.5% según lo estipula la ley .

Para los fines Legales consiguientes que al interesado convenga se extiende la presente en el Municipio de Talgua, departamento de Lempira a los 5 Días del mes de JUNIO del año dos 2022.


DANIEL DERAS BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL




JOSMAN ADALID MURCIA
CONTRATISTA


ONAN JAFET VASQUEZ TORRE
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO

MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
HONDURAS C.A



ACTA DE RECEPCION FINAL

Nosotros los abajo firmantes, después de haber realizado la inspección final de las obras y haberlas confrontado con el proyecto "CONTRATO DE SERVICIOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL EDIFICIO DEL KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS" por medio de la presente hacemos constar que los trabajos del proyecto en referencia ejecutados bajo la responsabilidad del señor: **JOSMAN ADALID MURCIA GOMEZ**, con identidad; **1323-1992-00217**, con fondos provenientes de la municipalidad de Talgua Lempira, han sido realizados con apego a las clausulas de contrato, sus respectivas especificaciones y demás documentos contractuales.

Por lo tanto, se da por recibido a entera satisfacción la obra objeto del contrato.

Talgua, Lempira 10 del mes de JUNIO del año 2022


DANIEL-DERAS
ALCALDE MUNICIPAL


ALCALDE
TALGUA, LEMPIRA


JOSMAN ADALID MURCIA
CONTRATADO


ONAN JAFET VASQUEZ TORRES
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA
U.T.M.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL FUTURO DEL MUNICIPIO



