



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	01
Nivelación de terracería de Cancha de Fútbol y Reapertura de Brecha de comunicación vial		Misora Lepaera	155-149800098			
Tipo de Proyecto: Infraestructura vial.			Cargo del Supervisor(a)			
			Jefe: Unidad Técnica municipal			
Coordenadas del inicio de la obra:		Fecha de Inicio de la obra	14 de sep 2023		Fecha de inicio del reporte:	03 de Octubre 2023.
Lat:	Long: -		Número telefónico:			
Coordenadas del final de la obra:			99465694		Fecha de final del reporte:	03 de Octubre 2023.
Lat:	Long: -		Correo Electrónico			
Empleos Directos: 1			unidadtecnicamunicipal69@gmail.com			
Empleos Indirectos: 2.						
Duración del Proyecto: 20 horas.						

4. Situación de Campo			5. Breve Descripción del Proyecto		
Rótulo original de Proyecto :	Si	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Desde la fundación de la comunidad de Misora; los antecesores lucharon por ver esa apertura en conducciones adecuadas para facilitar el acceso de comunicación vial. el proyecto consiste en la Reapertura de esa brecha y nivelación de terracería de campo ya que la misma esta en desmed. y por ello no se puede usar.	
Estado del tiempo:	Caluroso.				
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	20 km.				
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Adecuado	<input checked="" type="checkbox"/>	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Materiales:	Adecuado	<input checked="" type="checkbox"/>	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Equipos y herramientas:	Adecuado	<input checked="" type="checkbox"/>	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	




7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

✱ En la primera visita el Trabajista reporto la ejecución de 5 hrs. para el campo, Postponiendo el proyecto por una semana. haciéndose presente a trabajar el resto de 15 hrs. el día 02 de octubre.

✱ El día de hoy 3 de octubre se hizo una Constancia sobre la autorización de desplazar 5 horas tractor del campo para la brecha del siendo esta la de mayor prioridad.

*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe

8. Diagnóstico Fotográfico avance del proyecto

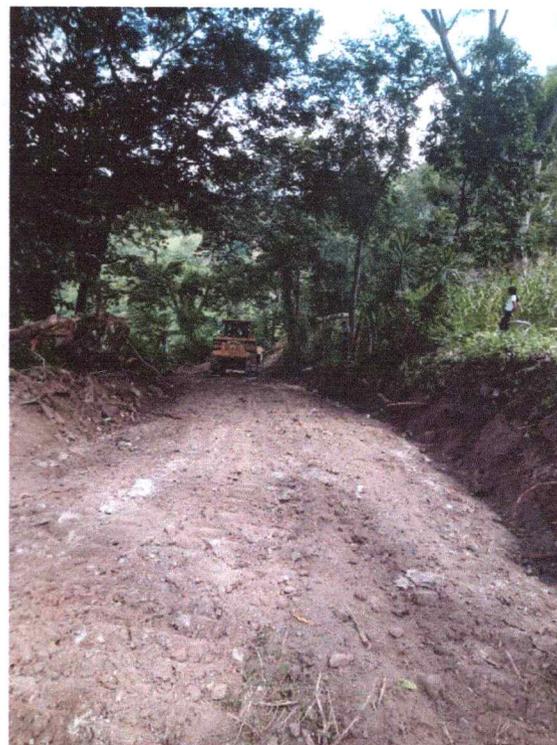

Descripción: Apertura de brecha para acceso vial desde la comunidad hasta el punto de hamaca.



8. Diagnóstico Fotográfico avance del proyecto



Descripción: Maquina trabajando en la limpieza del terreno: para la reapertura.

WLU



FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte		
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	02.	
Electificación		La Tejera Rinconada	1313 1998 00298				
Tipo de Proyecto:			Cargo del Supervisor(a)				
infraestructura Social			Jefe de UTM				
Coordenadas del inicio de la obra:		Lat: 163607	Long: - 322357	Agosto/2023.		Fecha de inicio del reporte:	19 de sept.
Coordenadas del final de la obra:		Lat: 16.3601	Long: - 322357	Número telefónico:			
Empleos Directos:		1		Fecha de Inicio de la obra			
Empleos Indirectos:		6		9946 56 97			
Duración del Proyecto:		Dos Meses.		Correo Electrónico		Fecha de final del reporte:	19 de sep.
				unidadtecnicamunicipal69@gmail.com			

4. Situación de Campo			5. Breve Descripción del Proyecto			
Rótulo original de Proyecto :	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	el proyecto consistió en la instalación de Red primaria - Red Secundaria - Instalación de Transformadores de 15 KVA. - Suministro e instalación del 11 postes de madera clase 5. En la Tejera Rinconada		
Estado del tiempo:		Catorzo				
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:		12 Km.				
6. Recursos Presentes en Obra						
Personal/Mano de Obra:	Adecuado	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input type="checkbox"/>		
Materiales:	Adecuado	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>		
Equipos y herramientas:	Adecuado	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>		



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto



- ➔ A la fecha se instalaron:
- ✓ 11 postes de madera de 30 pies clase 5.
 - ✓ Suministro e instalación de 4 postes de madera de 40 pies clase 5.
 - ✓ Suministro e instalación de 8 postes de madera de 35 pies clase 5.
 - ✓ Suministro e instalación de 1 transformador 15KVA/34.5/20/120V.
 - ✓ Suministro de instalación de 56 retencidas.
 - ✓ Instalación y suministro de 4,592 pies de cable #40 ACSR.
 - ✓ Suministro e instalación de 4592 pies de cable #16 WP.

*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe

- ✓ Suministro e instalación de 5576 pies de cable #2, ACSR

✓ 12 Estructuras de red secundarias

8. Diagnóstico Fotográfico avance del proyecto

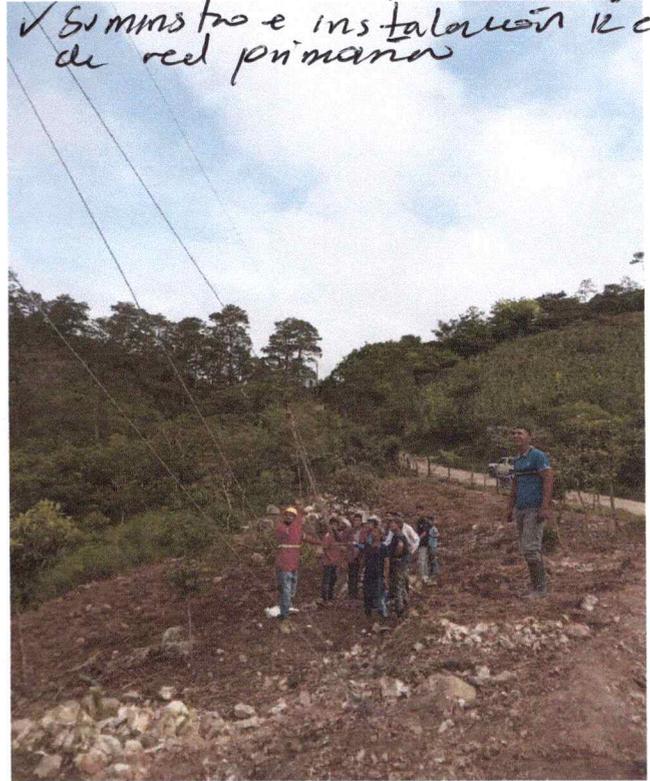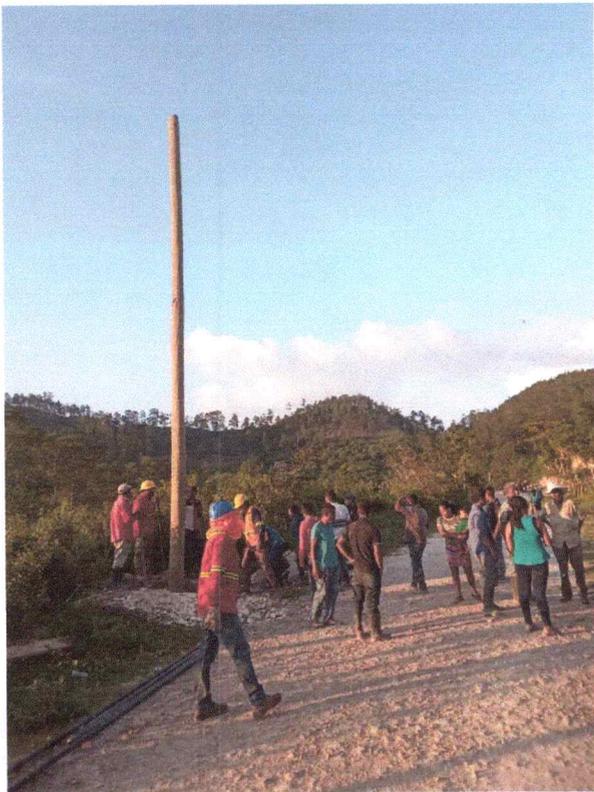

✓ Suministro e instalación de 9 luminarias completas

✓ Suministro e instalación 12 estructuras de red primarias

Descripción: Colocación de posts y crucetas.
- Perforación de los Agüjones



8. Diagnóstico Fotográfico avance del proyecto



Descripción: *x suministro de instalación de 1 transformador
y 9 luminarias completas.*

WWD

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	04
Parque Infantil		Jagua Lepaera	1313 199800208			
Tipo de Proyecto: Infraestructura Social			Cargo del Supervisor(a) sefe UTM.			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat:	Long: -	22/09/2023 Nov./2023.		Fecha de inicio del reporte:	20 de Sept. 2023.
Coordenadas del final de la obra:	Lat:	Long: -	Número telefónico:			
Empleos Directos:	1		99465694		Fecha de final del reporte:	20 de Sep/2023.
Empleos Indirectos:	6		Correo Electrónico			
Duración del Proyecto:	Dos Meses.		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com			

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto :	Si	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	El proyecto consiste en la construcción de un parque infantil en la comunidad de Jagua. Proyecto financiado por la Secretaría de Parques Nacionales de Honduras y Recreación.	
Estado del tiempo:	Caluroso.				
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	10km.				
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Adecuado	<input checked="" type="checkbox"/>	Suficiente	<input type="checkbox"/>	
Materiales:	Adecuado	<input checked="" type="checkbox"/>	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Equipos y herramientas:	Adecuado	<input checked="" type="checkbox"/>	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

- *El proyecto está cumpliendo todos los requerimientos y especificaciones técnicas.
 - *Se usó madera rústica para poder hacer la construcción de la cerca perimetral y bodega de suministros y almacenamiento.
 - *Se cortaron árboles de Eucalipto que representaban Peligro y así mismo las raíces.
 - *Actualmente el proyecto requiere que se ocupe un área de material selecto, pero se determinó que no se *inmanera*
- *Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe

8. Diagnóstico Fotográfico avance del proyecto



Descripción:

*Perforación del suelo para agujeros de los postes y poder hacer el cerco soltado.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	04
Construcción cerca Perimetral.		Libertad.	1513 1998 00498			
Tipo de Proyecto: Educación			Cargo del Supervisor(a) jefe UTM.			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat:	Long: -	Septiembre 2021		Fecha de inicio del reporte:	11 sept.
Coordenadas del final de la obra:	Lat:	Long: -	Número telefónico:		Fecha de final del reporte:	11 Sep.
Empleos Directos:	1		9946 5694			
Empleos Indirectos:	_____		Correo Electrónico			
Duración del Proyecto:	1 mes.		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com			
			Fecha de Inicio de la obra			

4. Situación de Campo			5. Breve Descripción del Proyecto		
Rótulo original de Proyecto :	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	El proyecto ya está en la fase Final. Quedando pendiente la colocación del Portón el cual está siendo elaborado.		
Estado del tiempo:	Caluroso.				
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	12 Km.				
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Adecuado <input checked="" type="checkbox"/>	Insuficiente <input checked="" type="checkbox"/>			
Materiales:	Adecuado <input checked="" type="checkbox"/>	Insuficiente <input checked="" type="checkbox"/>			
Equipos y herramientas:	Adecuado <input checked="" type="checkbox"/>	Insuficiente <input checked="" type="checkbox"/>			



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

El portón que falta de colocar esta siendo elaborado. Se estima que se colocará la próxima semana.

*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe

8. Diagnóstico Fotográfico avance del proyecto



Descripción:

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	05
Pavimento de concreto hidráulico			1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto:	Infraestructura		Cargo del Supervisor(a) Jefe de la Unidad Técnica Municipal			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat:	Long:	Julio 2023		Fecha de inicio del reporte:	24-09-2023
Coordenadas del final de la obra:	Lat:	Long:	Número telefónico:			
Empleos Directos:	1		9946.5694		Fecha de final del reporte:	24-09-2023
Empleos Indirectos:	8		Correo Electrónico			
Duración del Proyecto:	Cuatro meses		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com			

4. Situación de Campo			5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto:	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	El proyecto consiste en la pavimentación de 800ML de concreto hidráulico, en el B° Las Delicias, con alcantarillado, que va desde la casa del Sr. Hernan Palencia hasta la casa del Sr. Gorje Ponce.	
Estado del tiempo:	Caluroso			
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	0.5 Km.			
6. Recursos Presentes en Obra				
Personal/Mano de Obra:	Adecuado <input checked="" type="checkbox"/>	Insuficiente <input type="checkbox"/>		
Materiales:	Adecuado <input checked="" type="checkbox"/>	Insuficiente <input type="checkbox"/>		
Equipos y herramientas:	Adecuado <input checked="" type="checkbox"/>	Insuficiente <input type="checkbox"/>		



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

EL PROYECTO RESPONDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMO SER:

1. TRAZADO Y MARCADO NIVEL
2. ACARREO DE EQUIPO CON LOW BOY
3. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO
4. CORTE/ RELLENO Y COMPACTADO CON TERRACERIA
5. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO E=15CM CONCRETO 4,000 PSI
6. PINTURA DE TRÁFICO PARA BORDILLO
7. LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES Y ACERAS).

_En la supervisión realizada, se han detectado pastillas con grietas, y se ha reportado a quien corresponde, esperando la sugerencia sea acatada y el margen de error se pueda corregir.

_En este mes solo se hizo esa supervisión y se estima que el proyecto debe ser entregado finales del mes de octubre.

_Las pastillas agrietadas se aduce que pueden ser por las temperaturas altas que se han tenido, mala mezcla de los agregados o las juntas se hacen cuando el concreto está demasiado fino.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto

No se adjuntan fotografías, hasta la siguiente ficha.

Descripción:



FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	05
Pavimentación concreto hidráulico		Las Pilas.	B13 199800298			
Tipo de Proyecto:	infraestructura vial		Cargo del Supervisor(a) Jefe UTM.			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat:	Long: -	Julio/2024		Fecha de inicio del reporte:	19/09/2024
Coordenadas del final de la obra:	Lat:	Long: -	Número telefónico:			
Empleos Directos:	1		9946 5694		Fecha de final del reporte:	19/09/24
Empleos Indirectos:	8		Correo Electrónico			
Duración del Proyecto:	3 meses.		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com			

4. Situación de Campo			5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto :	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	El proyecto consiste en la pavimentación de 208 ml de concreto hidráulico en la comunidad Las Pilas-Cammaya.	
Estado del tiempo:		<input type="checkbox"/>		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:		1 km.		
6. Recursos Presentes en Obra				
Personal/Mano de Obra:	Adecuado	<input checked="" type="checkbox"/>	Insuficiente	<input type="checkbox"/>
Materiales:	Adecuado	<input checked="" type="checkbox"/>	Insuficiente	<input type="checkbox"/>
Equipos y herramientas:	Adecuado	<input checked="" type="checkbox"/>	Insuficiente	<input type="checkbox"/>






7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

El proyecto está respondiendo a todas las especificaciones técnicas en los TDR. especialmente:

- ✓ Trazado y Marcado del nivel
- ✓ Relleno compactado con material selecto.
- ✓ corte/Relleno y compactado con temerorria.
- ✓ Losa/Pavimento de concreto hidráulico $t=15\text{cm}$ concreto 3000 PSI
- ✓ Pintura de Tráfico para bordillos.
- ✓ Limpieza final de exteriores (comedores y Aterrid).

*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe

8. Diagnóstico Fotográfico avance del proyecto

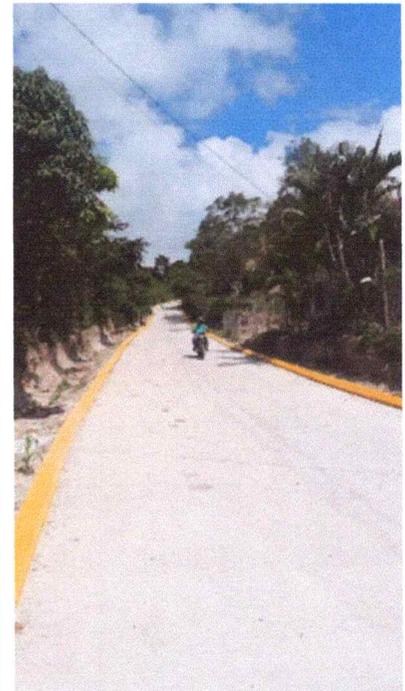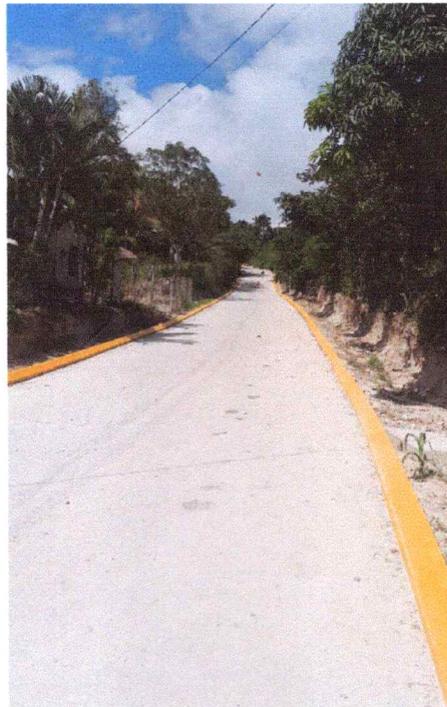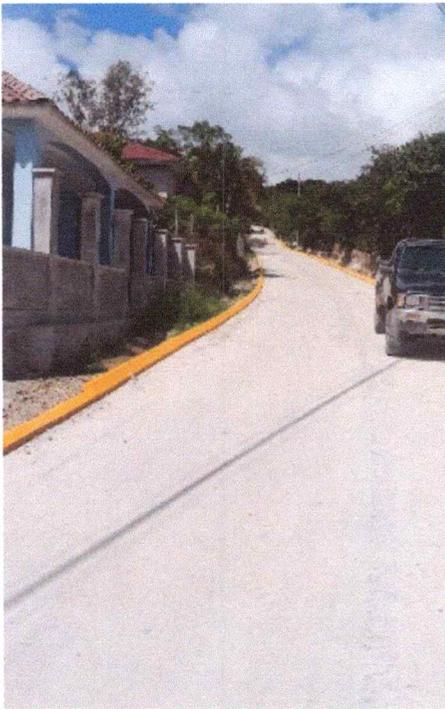

Descripción: Pintado de Bordillos y Limpieza.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	04
Mejoras y adiciones al mercado San Juan Bono.		San Juan.	1503 1998 00248			
Tipo de Proyecto: Infraestructura			Cargo del Supervisor(a)			
			Jefe UTM.			
Coordenadas del inicio de la obra:		Lat:	Long: -	Fecha de inicio del reporte:		8/09/23.
Coordenadas del final de la obra:		Lat:	Long: -	Número telefónico:		
Empleos Directos:		5		Fecha de inicio de la obra:		8/09/23.
Empleos Indirectos:		—		Correo Electrónico		
Duración del Proyecto:		4 meses.		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com		

4. Situación de Campo			5. Breve Descripción del Proyecto		
Rótulo original de Proyecto :	Si	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mejoramiento de la estructura CC. del Mercado Nuevo para dar oportunidades a nuevos locatarios	
Estado del tiempo:	calurosos				
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	710mts.				
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Adecuado	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Materiales:	Adecuado	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Equipos y herramientas:	Adecuado	<input type="checkbox"/>	Suficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	




7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

el proyecto está cumpliendo todas las especificaciones acordadas con el contratista, Sin embargo se han tenido atascos con la pintura para pintar en primera Estancias por el costo y segundo por proveer los balcones y portones ya están siendo terminados.

*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe

8. Diagnóstico Fotográfico avance del proyecto

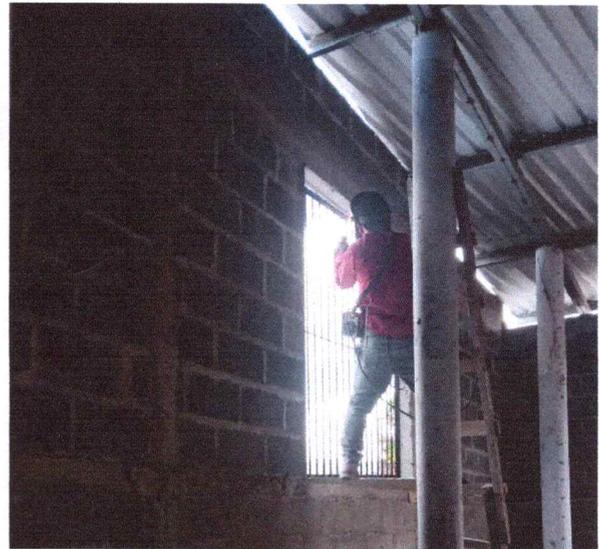

Descripción:

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	02
Mejoramiento de Agua Potable.		Plandel Ocotal	BB/99800298			
Tipo de Proyecto: Agua y saneamiento			Cargo del Supervisor(a) Jefe UTM			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: 14.8033	Long: - 88.6066	Agosto/2023		Fecha de inicio del reporte:	04/09/23.
Coordenadas del final de la obra:	Lat: 14.8033	Long: - 88.6066	Número telefónico:			
Empleos Directos:	01.		99465694		Fecha de final del reporte:	04/09/23.
Empleos Indirectos:	Voluntariado		Correo Electrónico			
Duración del Proyecto:	3 meses		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com			

4. Situación de Campo			5. Breve Descripción del Proyecto		
Rótulo original de Proyecto :	Si	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Demolición y construcción de pilas, Taque, baños, Fosa séptica y demás obra aduonentes que hacen el proyecto efectivo.	
Estado del tiempo:	Caluroso				
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	20 Km.				
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Adecuado <input checked="" type="checkbox"/>	Suficiente <input checked="" type="checkbox"/>			
Materiales:	Adecuado <input checked="" type="checkbox"/>	Suficiente <input checked="" type="checkbox"/>			
Equipos y herramientas:	Adecuado <input checked="" type="checkbox"/>	Suficiente <input checked="" type="checkbox"/>			



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

El proyecto a respondido a la gran mayoría de especificaciones técnicas excepto por la estructura y elevación de la colocación de las puertas de los sanitarios; se hizo la observación de corregir ese detalle por evitar un problema al abrirlos.

*Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe

8. Diagnóstico Fotográfico avance del proyecto



Descripción: Pulido de las Pelas, ✓ Inclusion de columnas del Jarque.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	06
Construcción del Kinder		Club Potanío	1313190800298			
Tipo de Proyecto: Educación			Cargo del Supervisor(a) Jefe UTM. Sandra Pinto.			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: 14.8033	Long: -88.6066	13/Julio		Fecha de inicio del reporte:	13/sep/23.
Coordenadas del final de la obra:	Lat: 14.8033	Long: -88.6066	Número telefónico:		Fecha de final del reporte:	13/sep/23.
Empleos Directos:	2		99465694		Fecha de final del reporte:	13/sep/23.
Empleos Indirectos:	1		Correo Electrónico			
Duración del Proyecto:	4 meses.		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com			

4. Situación de Campo			5. Breve Descripción del Proyecto		
Rótulo original de Proyecto :	Si	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	- Construcción de Kinder en el club Potanío - Respectiva a la oficina. - Baños.	
Estado del tiempo:	Caluroso.				
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:					
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Adeuado	<input type="checkbox"/>	siuente	<input checked="" type="checkbox"/>	
Materiales:	Adeuado	<input type="checkbox"/>	siuente	<input type="checkbox"/>	
Equipos y herramientas:	Adeuado	<input type="checkbox"/>	siuente	<input type="checkbox"/>	
7. Diagnóstico de Avance del Proyecto					



- El proyecto cumplió las disposiciones contractuales.
- Ya se finalizó.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico Fotográfico avance del proyecto



Descripción:

- BINDER finalizado.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR

