

MEMORANDO ADUANAS-GNP-UCEP-047-2023.

PARA: **ABG. MITZI ALEJANDRA PÉREZ**
Encargada del Departamento de Transparencia y Anticorrupción

DE: **ARQ. GRETELL CÁLIX.**
Gerente Nacional de Proyectos

FECHA: 02 de agosto de 2023

ASUNTO: **RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN**


En atención a su **MEMORANDO ADUANAS-DTA-296-2023** recibido en fecha 26 de julio del 2023, referente a proporcionar información de la ejecución de proyectos del mes de julio de 2023.

Se remite la siguiente documentación:

1. Informe de transparencia (reporte de infraestructura del mes de julio 2023).
2. Nota aclaratoria

Atentamente,

CC. Archivo
GC/KM



“Contratación de una Empresa para la Construcción y Habilitación de Módulos de Atención TIM en la Aduana de Guasaule”

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Jefe de la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- Contratación de una Empresa para la Construcción y Habilitación de Módulos de Atención TIM en la Aduana de Guasaule.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Aldea San Juan, Municipio del Triunfo, Departamento de Choluteca, Aduana de Guasaule, Frontera entre Honduras y Nicaragua.

PROPÓSITO

Optimizar las operaciones de tránsito internacional de mercancías mediante el rediseño del flujo operativo actual.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- En la actualidad se cuenta solamente con un TIM de entrada y uno de salida. Este proyecto consiste en rediseñar el flujo operativo del módulo TIM, habilitando 6 estaciones distribuidas en seis módulos, en el módulo 1, 2, 3 y 4 operaría de la siguiente manera modulo 1 y 3 Migración, Modulo 2 y 4 SEPA y Aduanas esto en el caso de salida del país para el ingreso al país en el módulo 1 estaría un representante de Salud y uno de Migración, en el módulo 2 operaría un representante de SEPA y uno de Aduanas Honduras.

Desarrollándose el proyecto en una sola etapa consistirá en la instalación completa de los 6 módulos de atención antes mencionados donde operarían las siguientes instituciones.

1. Administracion Aduanera de Honduras
2. Instituto Nacional de Migración
3. Servicio de Protección Agropecuaria (SEPA)



Con el apoyo de estas instituciones se pretende brindar un mejor servicio para mejorar los flujos de atención de carga pesada que transita por la Aduana de Guasaule.

ELABORACION DEL PROYECTO

ALCANCE

- En la actualidad el despacho de medios de transporte en el módulo de tránsito internacional de mercancías (TIM) se realiza en la misma estación por parte de personal de Migración, SEPA y Aduanas. Donde el transportista se ve en la obligación de bajarse de vehículo y realizar todo sus trámites dentro de la Aduana ya sea con Migración, SEPA o Aduanas logrando con esto que los procesos de atención sean lentos por lo que con la habilitación de los módulos de atención TIM el transportista podrá realizar su trámite de una manera más ágil sin necesidad de bajarse de su vehículo, logrando así mejorar los tiempos de despacho en la Aduana, en caso que se necesite alguna revisión cuarentenaria esta se hará de manera como se actualmente en los andenes de revisión para que posteriormente el transportista pueda hacer sus trámite correspondientes en las ventanillas de atención de los TIM

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:
Aire: Ruidos debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de demolición.
Aire: Partículas de polvo generadas por actividades de demolición los cuales son de carácter temporal.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS.


- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Jefe de Unidad de Cooperación Externa y Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniera Andrea Flamenco/ SERPIC.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la Institución, para la contratación de una empresa por medio de licitación publica para el desarrollo del proyecto.



PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **4,745,925.49 millones de lempiras.**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Cuarto Trimestre del 2022

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el oferente **SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L DE C.V (SERPIC).**

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de **4,739,974.23 millones de lempiras.**

Las inversiones realizadas son las siguientes:

1. Limpieza y desmontaje de capa vegetal, desmontaje de malla ciclón, Demolición de Módulos TIM existentes (Incluye Desmontaje de sistema eléctrico, ventanas, puertas y gradas de acceso), Demolición y Ranuración de pavimento Hidráulico, excavación para cimentación de mampostería, instalación de 6 contenedores para oficina de atención, forrado con paredes de Tabla yeso, y cielo falso de tabla yeso, pintura anticorrosiva a dos manos en los contenedores, Instalación de red de datos en todos los módulos, instalaciones hidrosanitarias e instalación de 6 biodigestores con su respectiva caja de lodos, pintura de señalización de alto tráfico, construcción de caseta de vigilancia y pluma metálica .

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 28 de julio del 2023.

PORCENTAJE DE AVANCE

- **77.85 % (porcentaje validado al 31 de julio de 2023)**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- Está en la fase de construcción por lo que no se ha hecho entrega de ningún producto todavía.



VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- Existen obras adicionales en el proyecto, pero también hubo disminución de obras contractuales por lo que el proyecto no ha tenido aumento en el presupuesto destinado para el desarrollo del mismo, el costo final del proyecto será de Lps. **4,739,974.23 millones de lempiras**, teniendo una disminución de **5,951.26 lempiras** a favor de la administración Aduanera de Honduras.


VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

- En el alcance del proyecto existe una pequeña variación debido a que se realizó la construcción de una caseta de vigilancia y pluma vehicular, instalación de pozos de absorción, mejoramiento del sistema eléctrico de caseta de la bomba del pozo de Agua Potable.
- Debido a las fuertes lluvias en la zona que se presentaron durante varios días y la solicitud de obras adicionales por parte de la Unidad de proyectos, se tuvo que realizar una extensión de tiempo al proyecto finaliza, con la finalidad de poder cumplir con la calidad de las obras del proyecto para el buen funcionamiento de la Aduana de El Guasaule.




RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS

- Modificación en el alcance del proyecto debido a las obras adicionales solicitadas, por lo que se hizo solicitud de construcción de una caseta de vigilancia y pluma vehicular, instalación de pozos de absorción, mejoramiento del sistema eléctrico de caseta de la bomba del pozo de Agua Potable y soportes metálicos

ESQUEMA

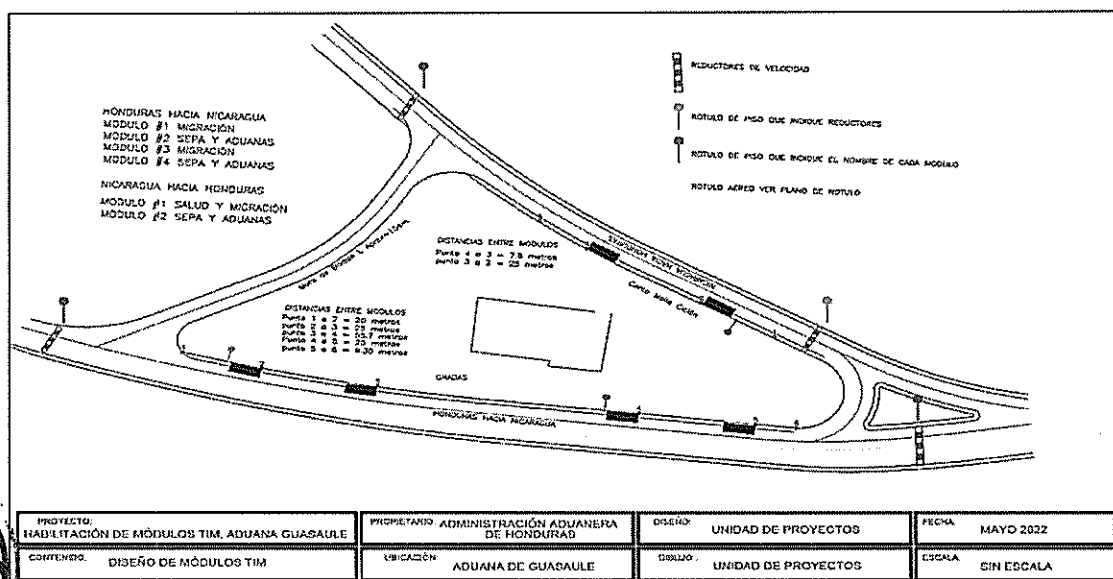

FOTOGRAFÍAS

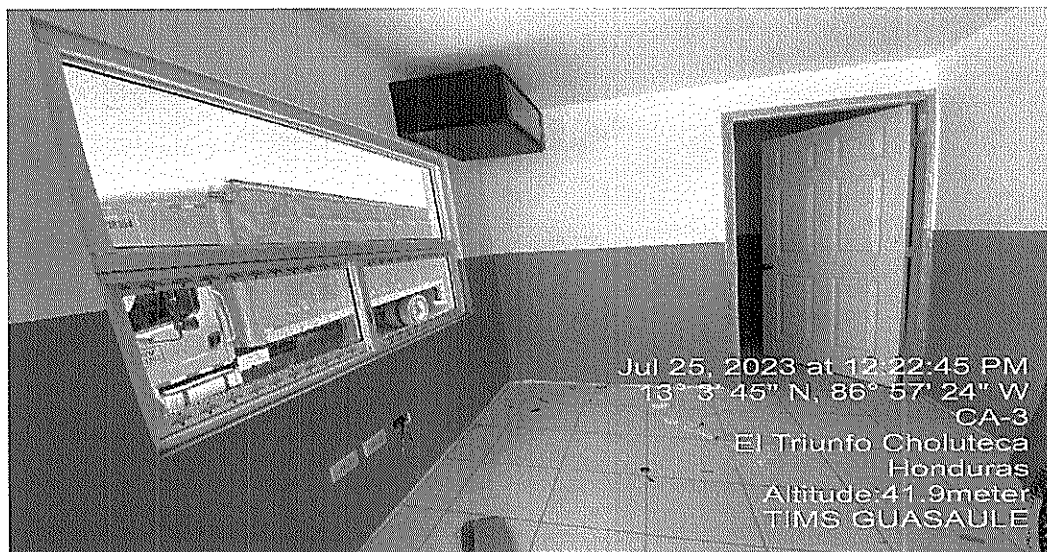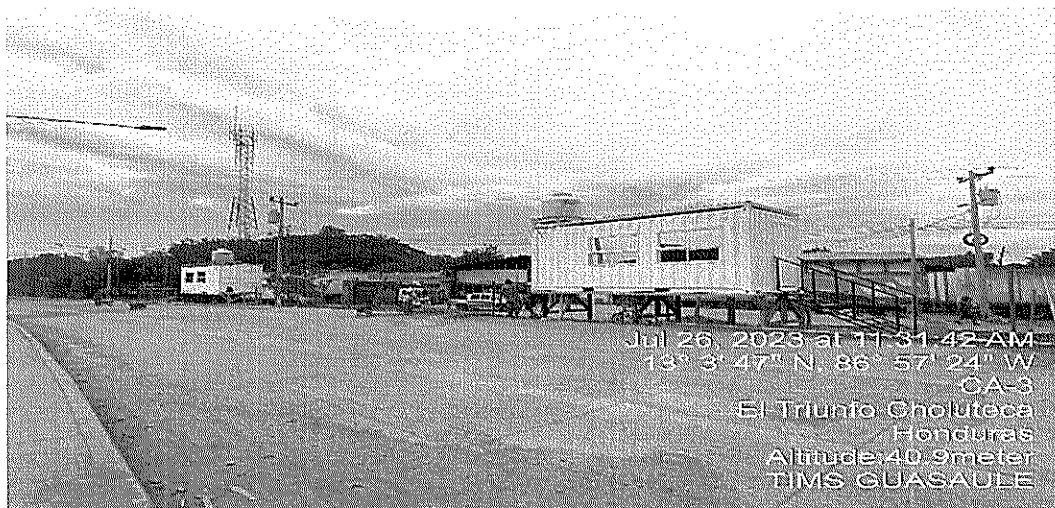

NOTA ACLARATORIA

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los lineamientos para la verificación de información pública en los portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada en el apartado Programas y proyectos instruye lo siguiente: **Actualmente se encuentra en ejecución el proyecto de construcción y habilitación de los módulos de atención TIM en la Aduana de Guasaule.**

Por lo que se adjunta la constancia de avance del proyecto que se comenzó en el mes de mayo del 2023, donde se detalla las generalidades del proyecto.

A la vez se hace mención que dicha Unidad Administradora de Proyectos de la Administración Aduanera de Honduras es únicamente gestora de proyectos, la ejecución y manejo de fondos nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera. Al momento de la ejecución de los proyectos asignados a nuestra Unidad es de nuestra responsabilidad dar el visto bueno de las actividades realizadas para proceder con el procedimiento de pago.

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los dos (02) días del mes de agosto del 2023.



Gretell Carplina Cálix Castro
Gerente Nacional de Proyectos
