


Componente 1

Proyecto: Construcción de las Obras de Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Incluye Puentes)

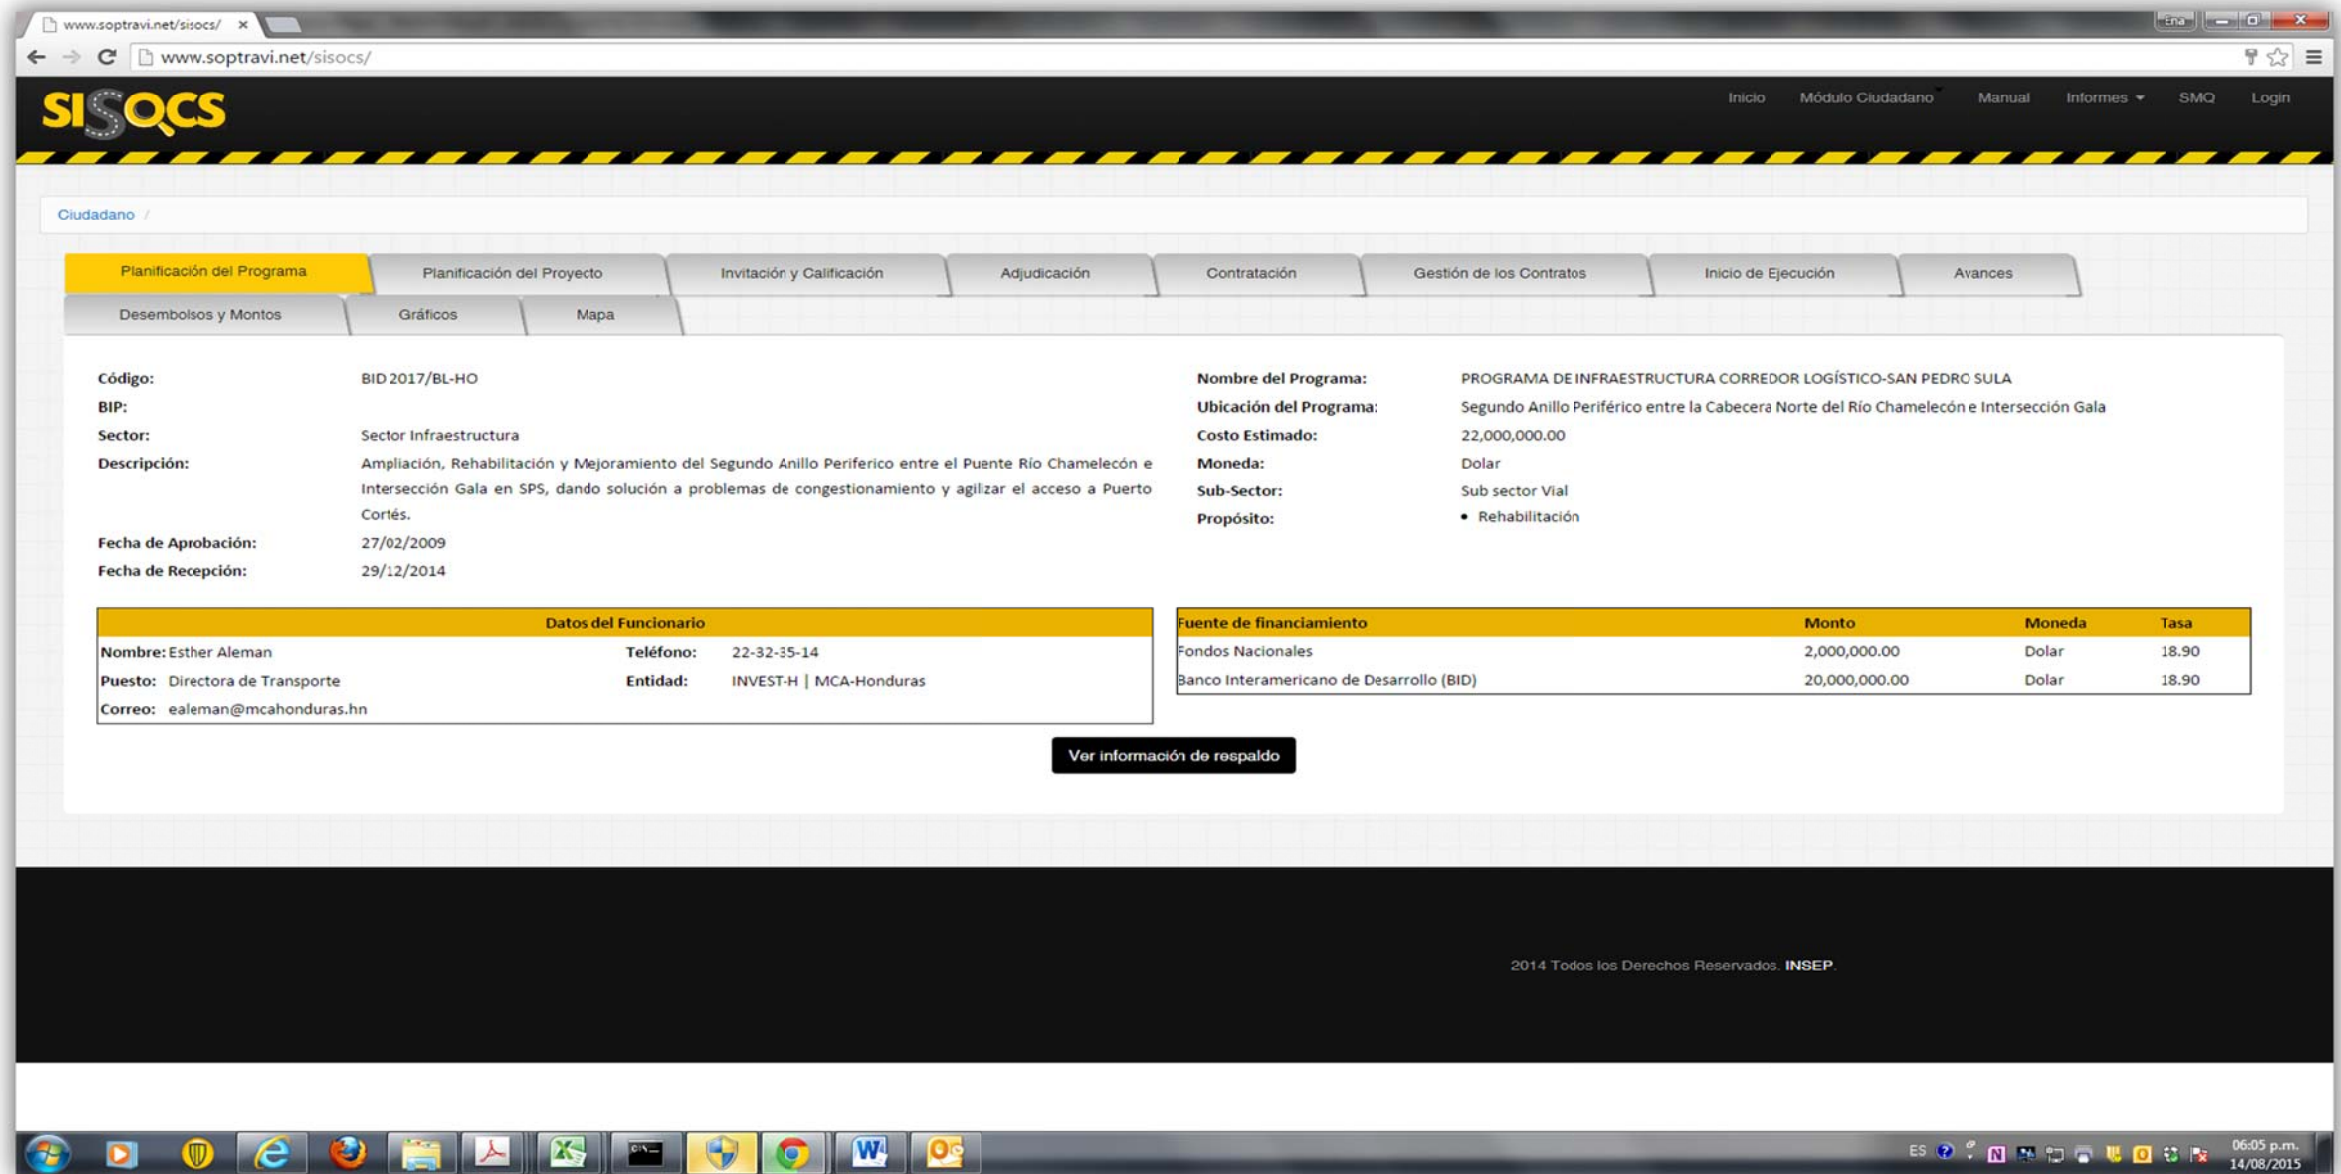

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The page header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. A breadcrumb trail indicates 'Ciudadano /'. The main navigation menu is divided into 'Planificación del Programa' (highlighted) and 'Planificación del Proyecto', with sub-items like 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The 'Planificación del Programa' section contains a series of tabs: 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. The main content area displays project details for 'BID 2017/BL-HO'. It includes fields for 'Nombre del Programa', 'Ubicación del Programa', 'Costo Estimado', 'Moneda', 'Sub-Sector', and 'Propósito'. Below this, there are two tables: 'Datos del Funcionario' and 'Fuente de financiamiento'. A 'Ver información de respaldo' button is located at the bottom of the details section. The footer of the page states '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.' The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 06:05 p.m. on 14/08/2015.

Datos del Funcionario

Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-32-35-14
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras
Correo: ealeman@mcahonduras.hn	

Fuente de financiamiento


Fuente de financiamiento	Monto	Moneda	Tasa
Fondos Nacionales	2,000,000.00	Dolar	18.90
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	20,000,000.00	Dolar	18.90

Ver información de respaldo

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Componente 1

Proyecto: Construcción de las Obras de Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Incluye Puentes)



The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. The main content area is titled 'Ciudadano /' and features a navigation menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto' (selected), 'Invitación y Calificación', 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. Below the navigation menu, there are sub-tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area displays project details for 'Componente 1: Construcción de las Obras de Mantenimiento Mayor del Tramo Existente: Cabecera Norte Puente Río Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Incluye Puentes Peatonales)'. The details include the project code (LPN-01-2017-2014), department (Cortés), and state (Publicado). The budget is L. 40,000,000.00. The description details the project scope and the works to be performed. The approval date is 27/01/2015, the reception date is 29/12/2014, and the registration date is 16/10/2014. A table shows the funding source as 'Banco Interamericano de Desarrollo (BID)' with a amount of 20,000,000.00, currency of Dolar, and a rate of 18.90. Another table shows the project location: Cortés Department, San Pedro Sula Municipality, 18 KM. A 'Ver información de respaldo' button is located at the bottom of the details section. The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 06:07 p.m. on 14/08/2015.

Código: LPN-01-2017-2014

Nombre del Proyecto: COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRAMO EXISTENTE:CABECERA NORTE PUENTE RIO CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLÍMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INCLUYE PUENTES PEATONALES)

Departamento: CORTÉS

Estado: PUBLICADO

Presupuesto: L. 40,000,000.00

Descripción: El proyecto consiste en llevar a cabo el mantenimiento mayor del tramo existente: Cabecera Norte Puente Río Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte, que corresponde al Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula, mismo que tiene una longitud de 18.00 km. Conforme al siguiente detalle: Las obras de mantenimiento mayor a ejecutar en este tramo, conforme a la priorización que define el supervisor incluyen principalmente: sellado de grietas, sustitución de losas dañadas donde el pavimento es de concreto hidráulico, bacheo y colocación de un White topping en el tramo donde el pavimento es de concreto asfáltico en los sitios que presentan mayor deterioro, mejoramiento de obras de drenaje menor, drenaje pluvial, drenaje de aguas negras, la señalización horizontal en todos los tramos con pintura termoplástica y colocación de vialitas y la construcción de dos puentes peatonales estos últimos conforme a planos.

Fecha de Aprobación: 27/01/2015

Fecha de Recepción: 29/12/2014

Fecha de Registro: 16/10/2014

Datos del Funcionario	
Nombre: Juana Lambur	Teléfono: 97770024
Puesto: Coordinador de Préstamo	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras
Correo: jlambur@mcahonduras.hn	


Fuente de financiamiento			
	Monto	Moneda	Tasa
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	20,000,000.00	Dolar	18.90

Código Departamento	Departamento	Código Municipio	Municipio	KM
05	Cortés	01	San Pedro Sula	18

[Ver información de respaldo](#)

Componente 1

Proyecto: Construcción de las Obras de Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Incluye Puentes)

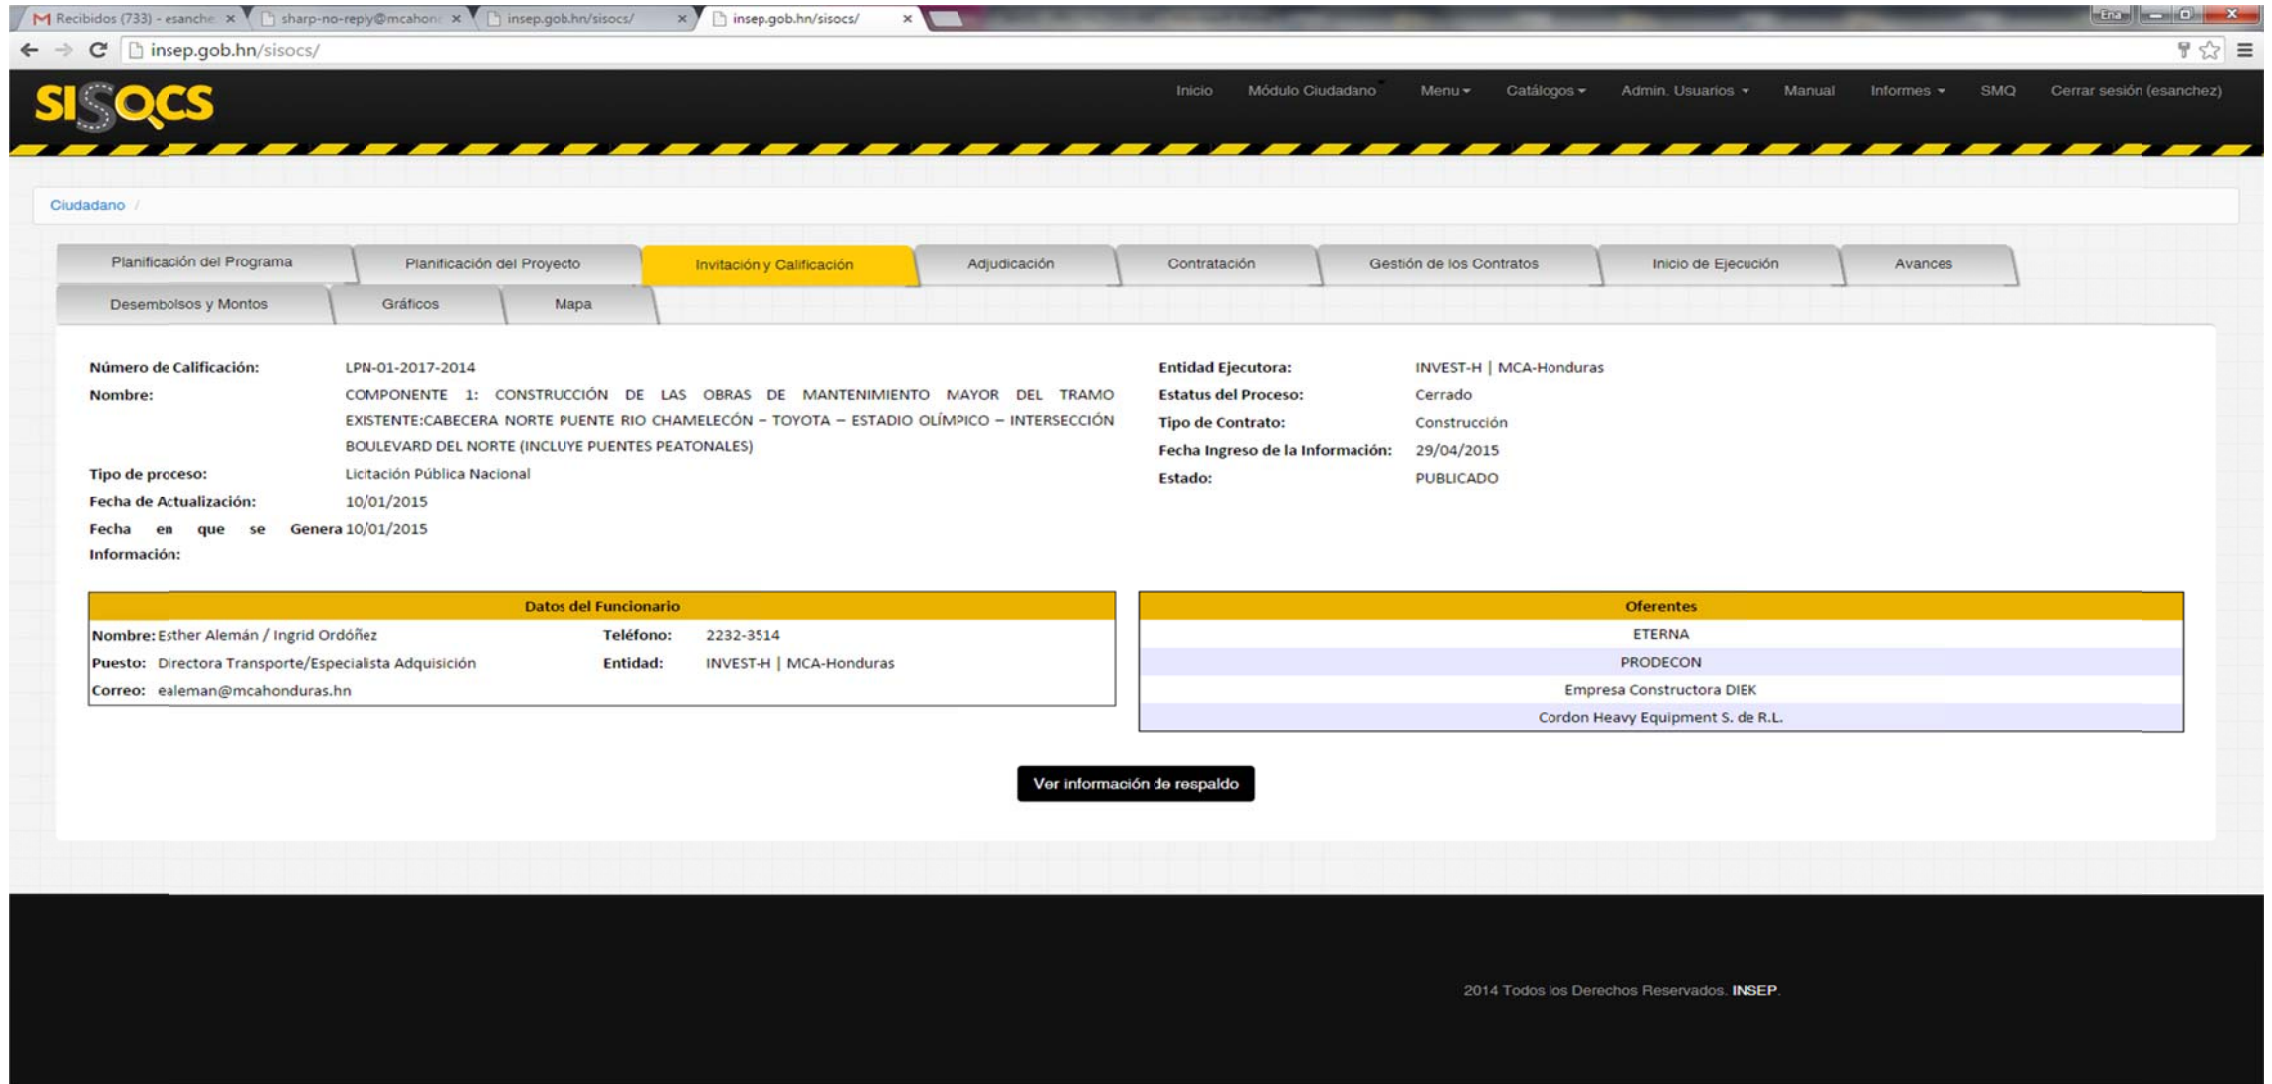

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Menu Catálogos Admin. Usuarios Manual Informes SMQ Cerrar sesión (esanchez)

Ciudadano /

Planificación del Programa | Planificación del Proyecto | **Invitación y Calificación** | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desembolsos y Montos | Gráficos | Mapa

Número de Calificación: LPN-01-2017-2014
Nombre: COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRAMO EXISTENTE: CABECERA NORTE PUENTE RIO CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLÍMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INCLUYE PUENTES PEATONALES)
Tipo de proceso: Licitación Pública Nacional
Fecha de Actualización: 10/01/2015
Fecha en que se Genera: 10/01/2015
Información:


Datos del Funcionario		Ofertantes	
Nombre: Esther Alemán / Ingrid Ordóñez	Teléfono: 2232-3514	ETERNA	
Puesto: Directora Transporte/Especialista Adquisición	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras	PRODECON	
Correo: ealeman@mcahonduras.hn		Empresa Constructora DIEK	
		Cordon Heavy Equipment S. de R.L.	

[Ver información de respaldo](#)

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Componente 1

Proyecto: Construcción de las Obras de Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Incluye Puentes)

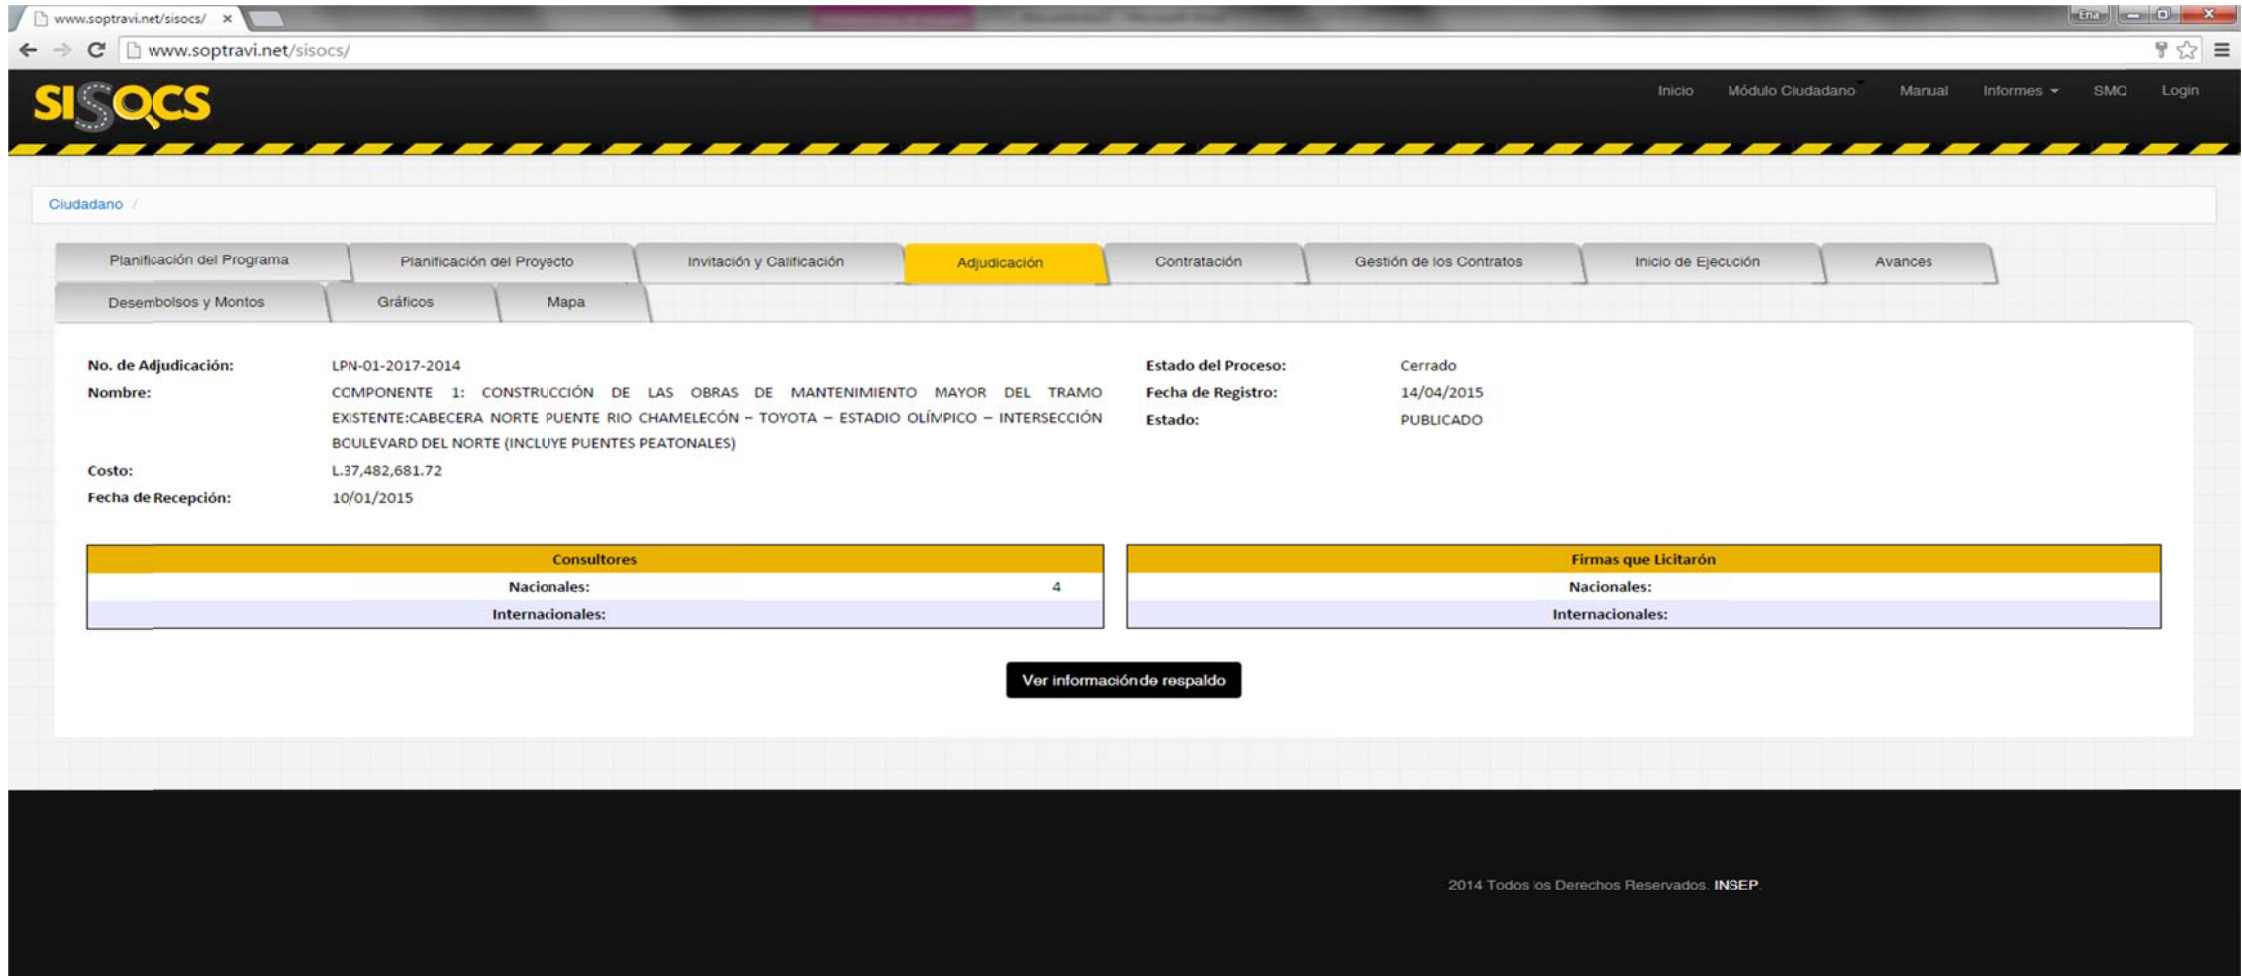

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.sopravi.net/sisocs/'. The application header includes the 'SISQCS' logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMC, and Login. The main content area is titled 'Ciudadano /' and features a horizontal menu with tabs for: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, **Adjudicación** (highlighted), Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the menu, there are sub-tabs for Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa. The main content displays the following information:

- No. de Adjudicación:** LPN-01-2017-2014
- Nombre:** CCOMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRAMO EXISTENTE:CABECERA NORTE PUENTE RIO CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLÍMPICO - INTERSECCIÓN BCULEVARD DEL NORTE (INCLUYE PUENTES PEATONALES)
- Costo:** L.37,482,681.72
- Fecha de Recepción:** 10/01/2015
- Estado del Proceso:** Cerrado
- Fecha de Registro:** 14/04/2015
- Estado:** PUBLICADO


Below this information are two summary tables:

Consultores		Firmas que Licitarón	
Nacionales:	4	Nacionales:	
Internacionales:		Internacionales:	

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the tables. At the bottom of the page, a footer states: '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.'

Componente 1

Proyecto: Construcción de las Obras de Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Incluye Puentes)

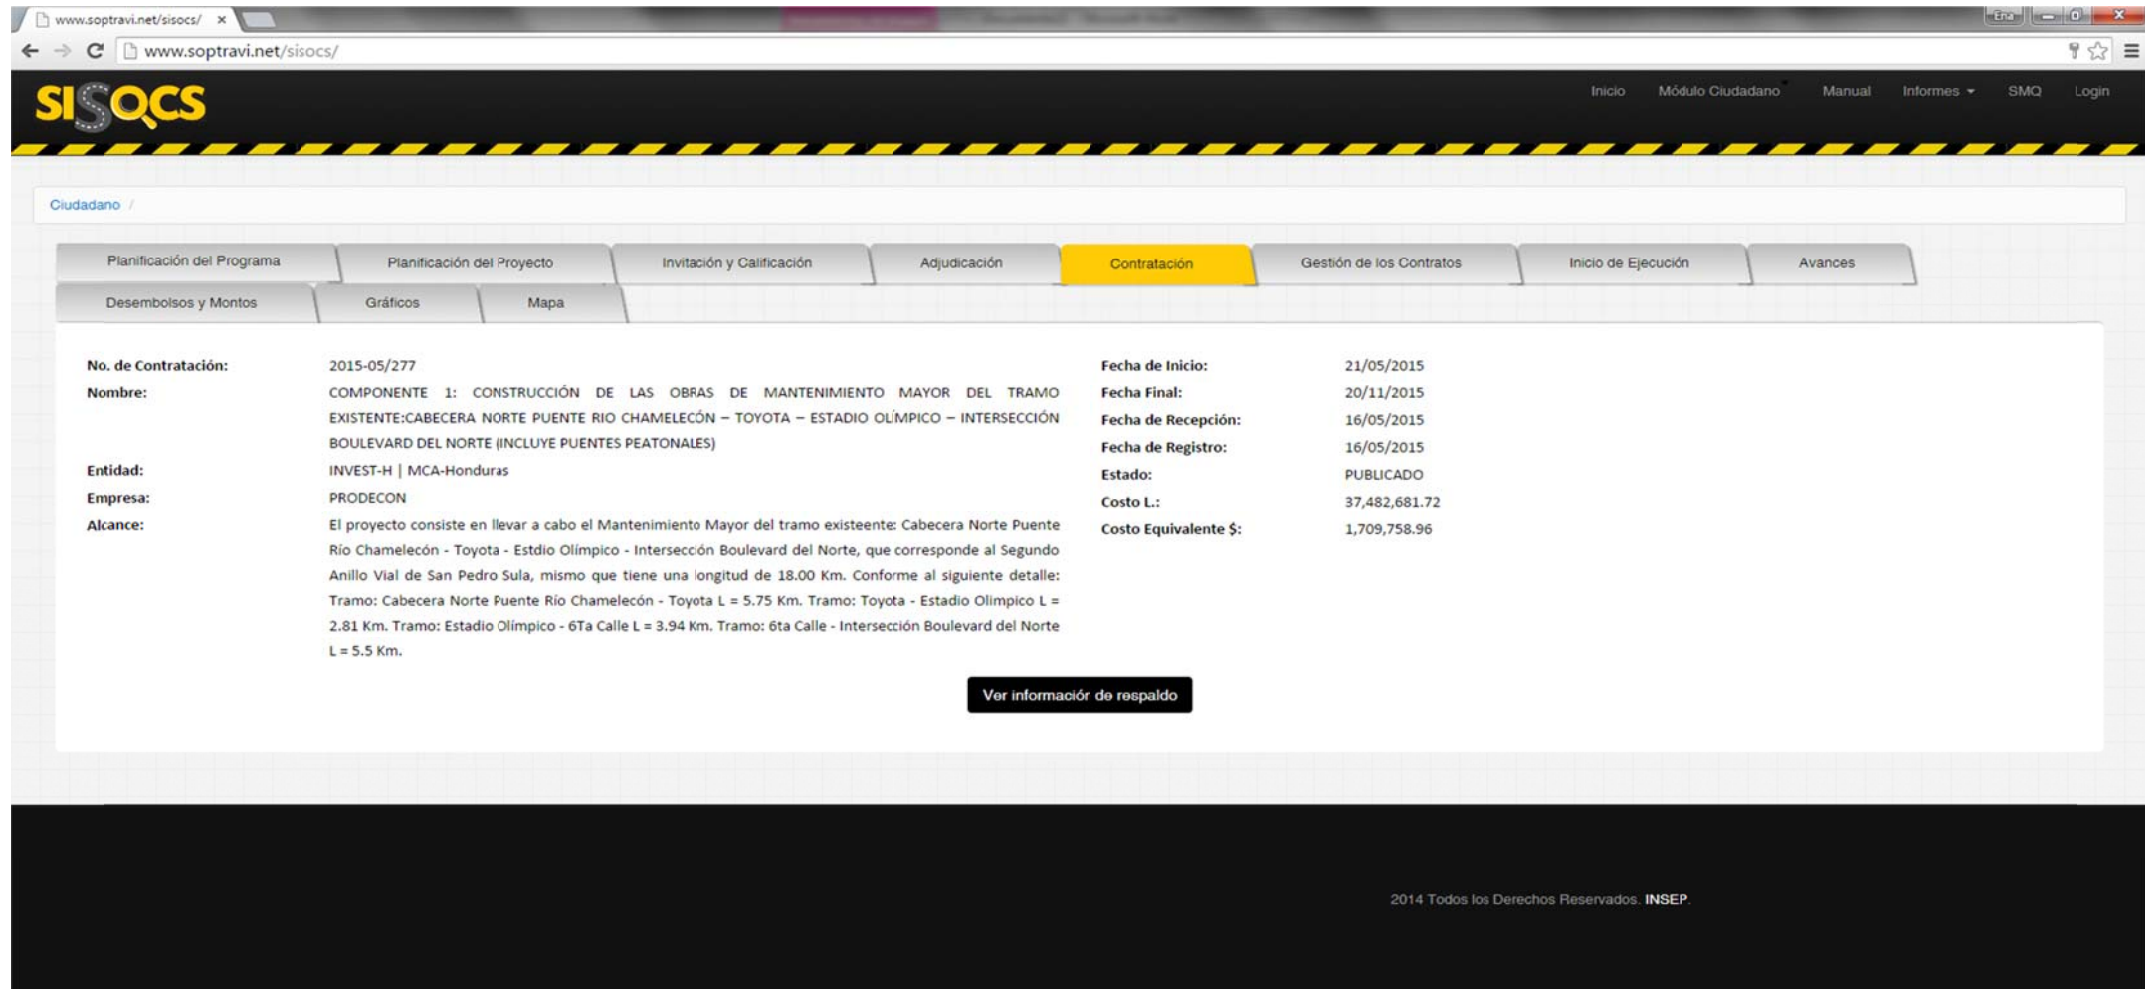


The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.sopravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. A breadcrumb trail shows 'Ciudadano /'. Below this is a horizontal menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Adjudicación', 'Contratación' (highlighted in yellow), 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. Under 'Contratación', there are sub-tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area displays the following contract details:

No. de Contratación:	2015-05/277	Fecha de Inicio:	21/05/2015
Nombre:	COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL TRAMO EXISTENTE:CABECERA NORTE PUENTE RIO CHAMELECÓN – TOYOTA – ESTADIO OLÍMPICO – INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INCLUYE PUENTES PEATONALES)	Fecha Final:	20/11/2015
Entidad:	INVEST-H MCA-Honduras	Fecha de Recepción:	16/05/2015
Empresa:	PRODECON	Fecha de Registro:	16/05/2015
Alcance:	El proyecto consiste en llevar a cabo el Mantenimiento Mayor del tramo existente: Cabecera Norte Puente Río Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte, que corresponde al Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula, mismo que tiene una longitud de 18.00 Km. Conforme al siguiente detalle: Tramo: Cabecera Norte Puente Río Chamelecón - Toyota L = 5.75 Km. Tramo: Toyota - Estadio Olímpico L = 2.81 Km. Tramo: Estadio Olímpico - 6Ta Calle L = 3.94 Km. Tramo: 6ta Calle - Intersección Boulevard del Norte L = 5.5 Km.	Estado:	PUBLICADO
		Costo L.:	37,482,681.72
		Costo Equivalente \$:	1,709,758.96

Below the details is a button labeled 'Ver información de respaldo'. At the bottom of the page, a footer reads '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP'.

Componente 1

Proyecto: Construcción de las Obras de Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Incluye Puentes)



The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. A breadcrumb trail shows 'Ciudadano /'. The main navigation menu is divided into two rows: the first row contains 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución' (highlighted in yellow), and 'Avances'; the second row contains 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area is titled 'Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto' and contains the following information:

Nombre:	Napoleón Bográn	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, No. 4002	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	2232-3965	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	cinsa@amnetgu.com	Fecha de Vencimiento:	

Below this, the 'Datos de contacto del representante del contratista' section provides the following details:

Nombre:	Sonia Gamez	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Bográn 9 calle, 300m al este del Hospital del	Monto de la Garantía:	6,877,556.28
Teléfono Fijo:	25512733	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	ingenieri@prodeconhn.com	Fecha de Vencimiento:	19/12/2015

The 'Datos de Contacto del Representante del Supervisor' section lists:


Nombre:	Amilcar René Girón	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Tepeyac B52, Lote 2 No. 1601 Calle Valle	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	22392080	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	proyectochamelecon.mca@gmail.com	Fecha de Vencimiento:	21/05/2015

Finally, the 'Datos de Ubicación del Proyecto' section shows:

Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	0.000000	Fecha de Inicio:	
Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	0.000000		

The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 06:09 p.m. on 14/08/2015.

Proyecto: Construcción de las Obras de Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Incluye Puentes)

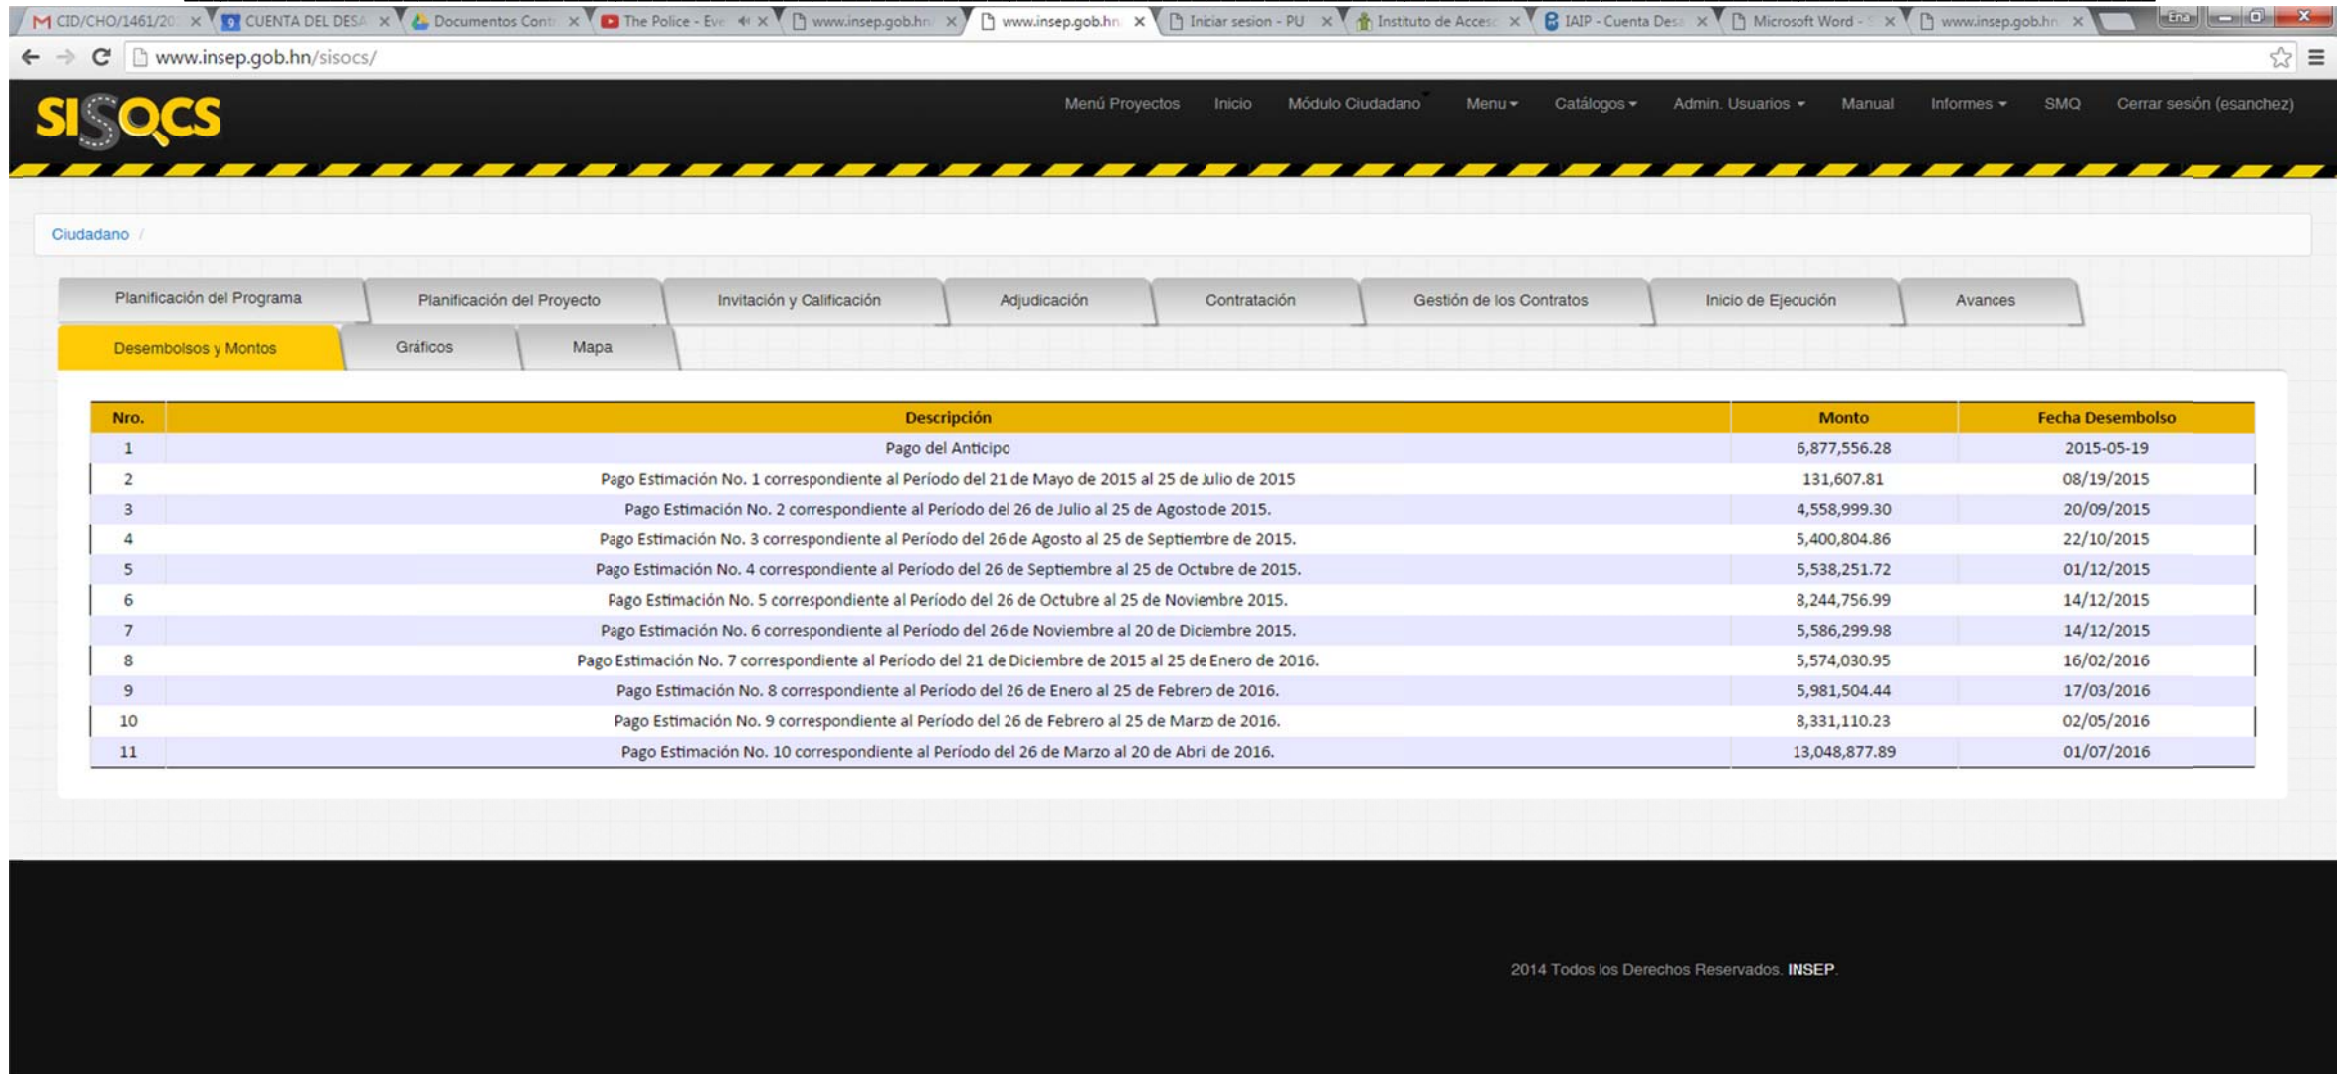


The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.insep.gob.hn/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and a navigation menu with items like 'Menú Proyectos', 'Inicio', 'Módulo Ciudadano', 'Menu', 'Catálogos', 'Admin. Usuarios', 'Manual', 'Informes', 'SMQ', and 'Cerrar sesión (esanchez)'. Below the header, there is a breadcrumb 'Ciudadano /' and a series of tabs for project stages: 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. The 'Desembolsos y Montos' tab is selected, showing a table with 11 rows of disbursement data.

Nro.	Descripción	Monto	Fecha Desembolso
1	Pago del Anticipo	5,877,556.28	2015-05-19
2	Pago Estimación No. 1 correspondiente al Período del 21 de Mayo de 2015 al 25 de Julio de 2015	131,607.81	08/19/2015
3	Pago Estimación No. 2 correspondiente al Período del 26 de Julio al 25 de Agosto de 2015.	4,558,999.30	20/09/2015
4	Pago Estimación No. 3 correspondiente al Período del 26 de Agosto al 25 de Septiembre de 2015.	5,400,804.86	22/10/2015
5	Pago Estimación No. 4 correspondiente al Período del 26 de Septiembre al 25 de Octubre de 2015.	5,538,251.72	01/12/2015
6	Pago Estimación No. 5 correspondiente al Período del 26 de Octubre al 25 de Noviembre 2015.	3,244,756.99	14/12/2015
7	Pago Estimación No. 6 correspondiente al Período del 26 de Noviembre al 20 de Diciembre 2015.	5,586,299.98	14/12/2015
8	Pago Estimación No. 7 correspondiente al Período del 21 de Diciembre de 2015 al 25 de Enero de 2016.	5,574,030.95	16/02/2016
9	Pago Estimación No. 8 correspondiente al Período del 26 de Enero al 25 de Febrero de 2016.	5,981,504.44	17/03/2016
10	Pago Estimación No. 9 correspondiente al Período del 26 de Febrero al 25 de Marzo de 2016.	3,331,110.23	02/05/2016
11	Pago Estimación No. 10 correspondiente al Período del 26 de Marzo al 20 de Abri de 2016.	13,048,877.89	01/07/2016

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Supervisión Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Industrias Gala)

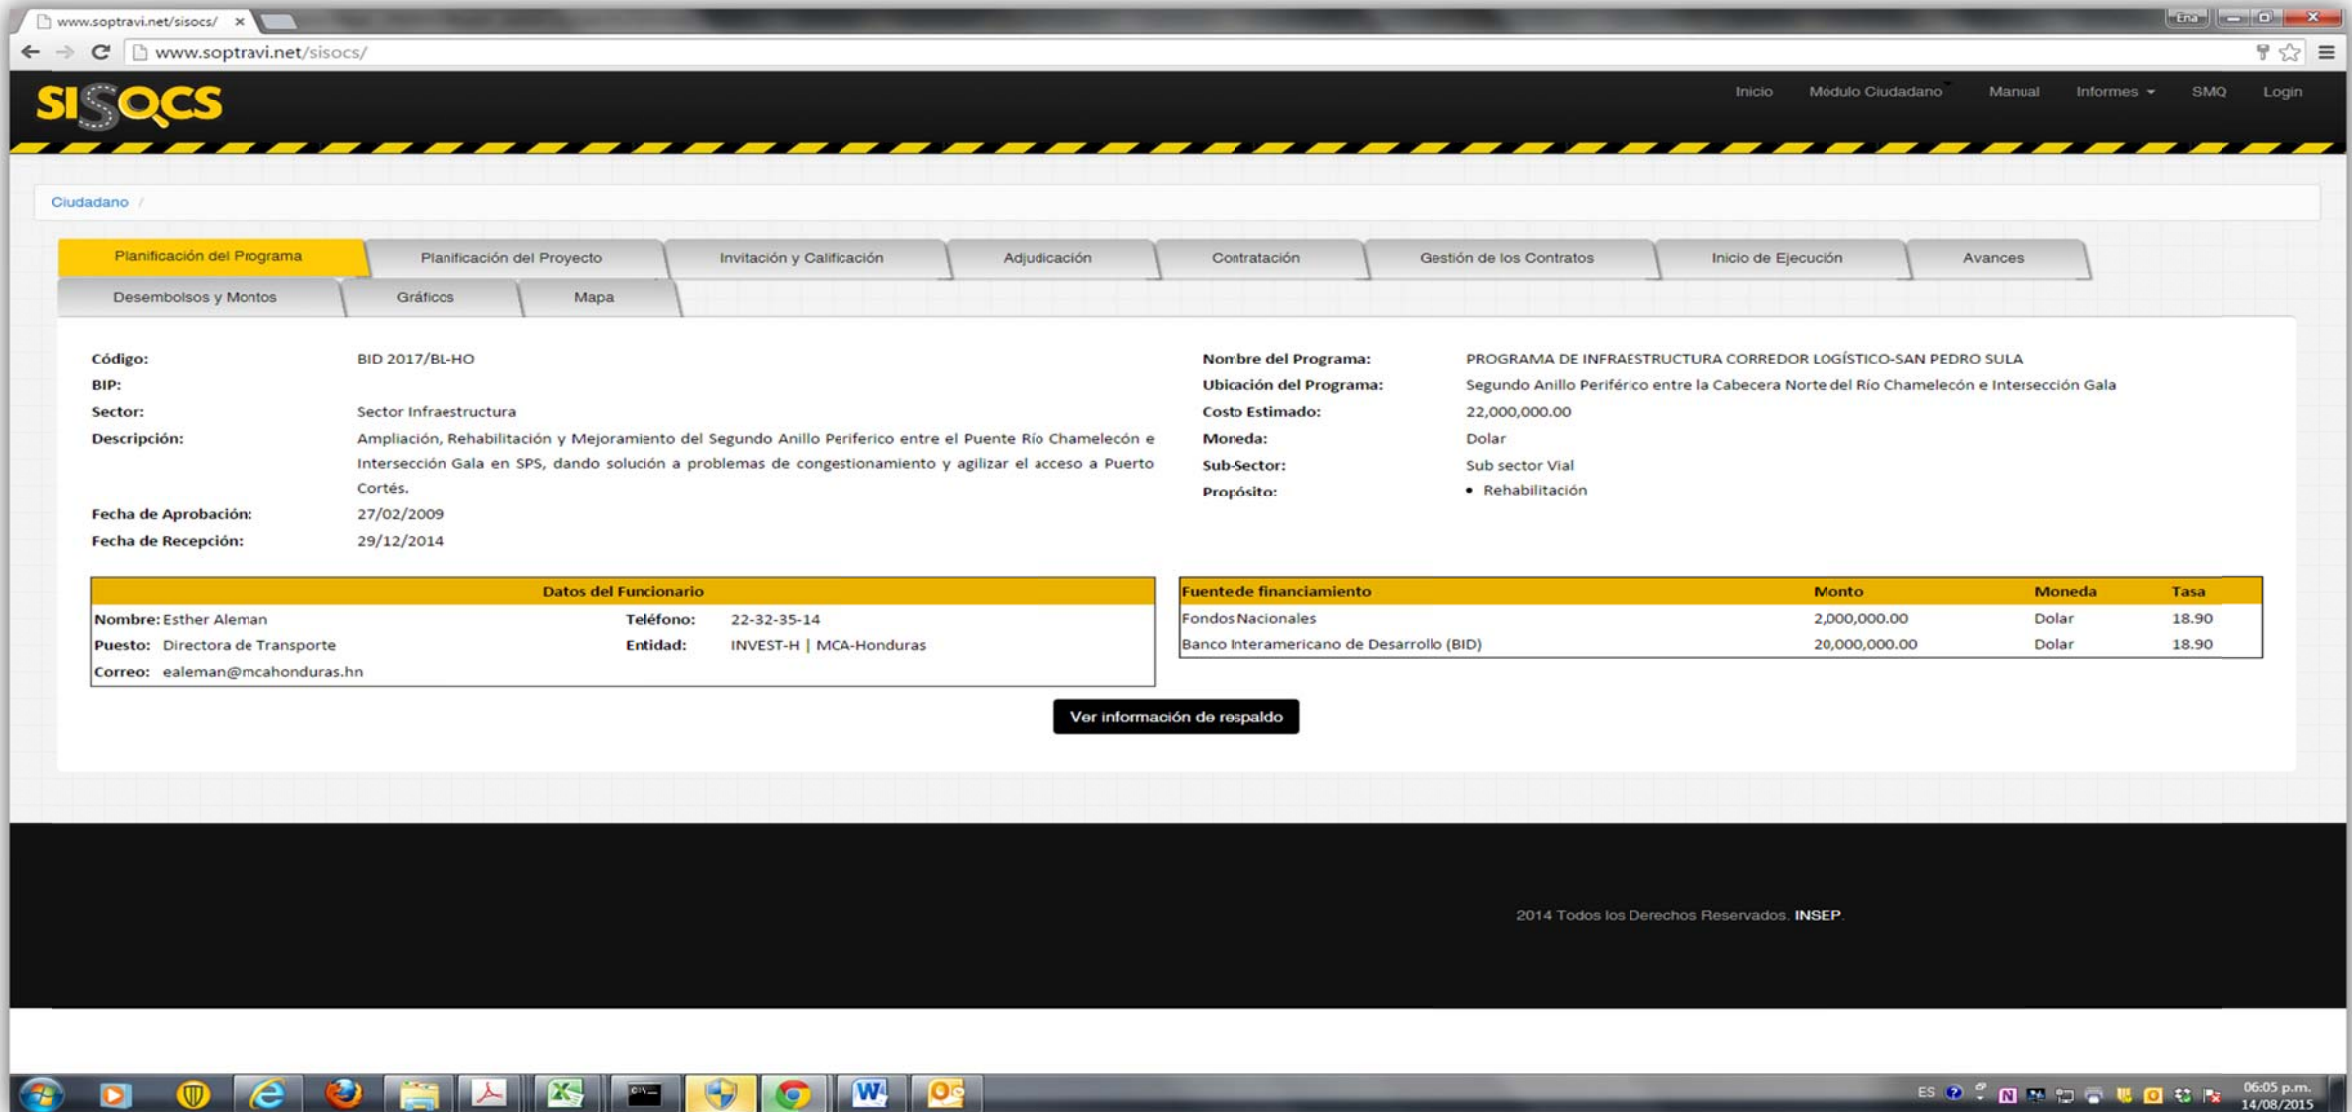

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. The main content area is titled 'Ciudadano' and features a navigation menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. Under 'Planificación del Programa', there are sub-tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area displays project details in two columns:


Código:	BID 2017/BL-HO	Nombre del Programa:	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGÍSTICO-SAN PEDRO SULA
BIP:		Ubicación del Programa:	Segundo Anillo Periférico entre la Cabecera Norte del Río Chamelecón e Intersección Gala
Sector:	Sector Infraestructura	Costo Estimado:	22,000,000.00
Descripción:	Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periferico entre el Puente Río Chamelecón e Intersección Gala en SPS, dando solución a problemas de congestonamiento y agilizar el acceso a Puerto Cortés.	Moreda:	Dolar
Fecha de Aprobación:	27/02/2009	Sub-Sector:	Sub sector Vial
Fecha de Recepción:	29/12/2014	Propósito:	• Rehabilitación

Below the details, there are two summary tables:

Datos del Funcionario		Fuente de financiamiento		
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-32-35-14	Fondos Nacionales	Monto: 2,000,000.00	Moneda: Dolar
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	Monto: 20,000,000.00	Tasa: 18.90
Correo: ealeman@mcahonduras.hn				

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the summary tables. At the bottom of the page, a footer reads '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.' The Windows taskbar at the bottom shows the system time as 06:05 p.m. on 14/08/2015.

Proyecto: Supervisión Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Industrias Gala)

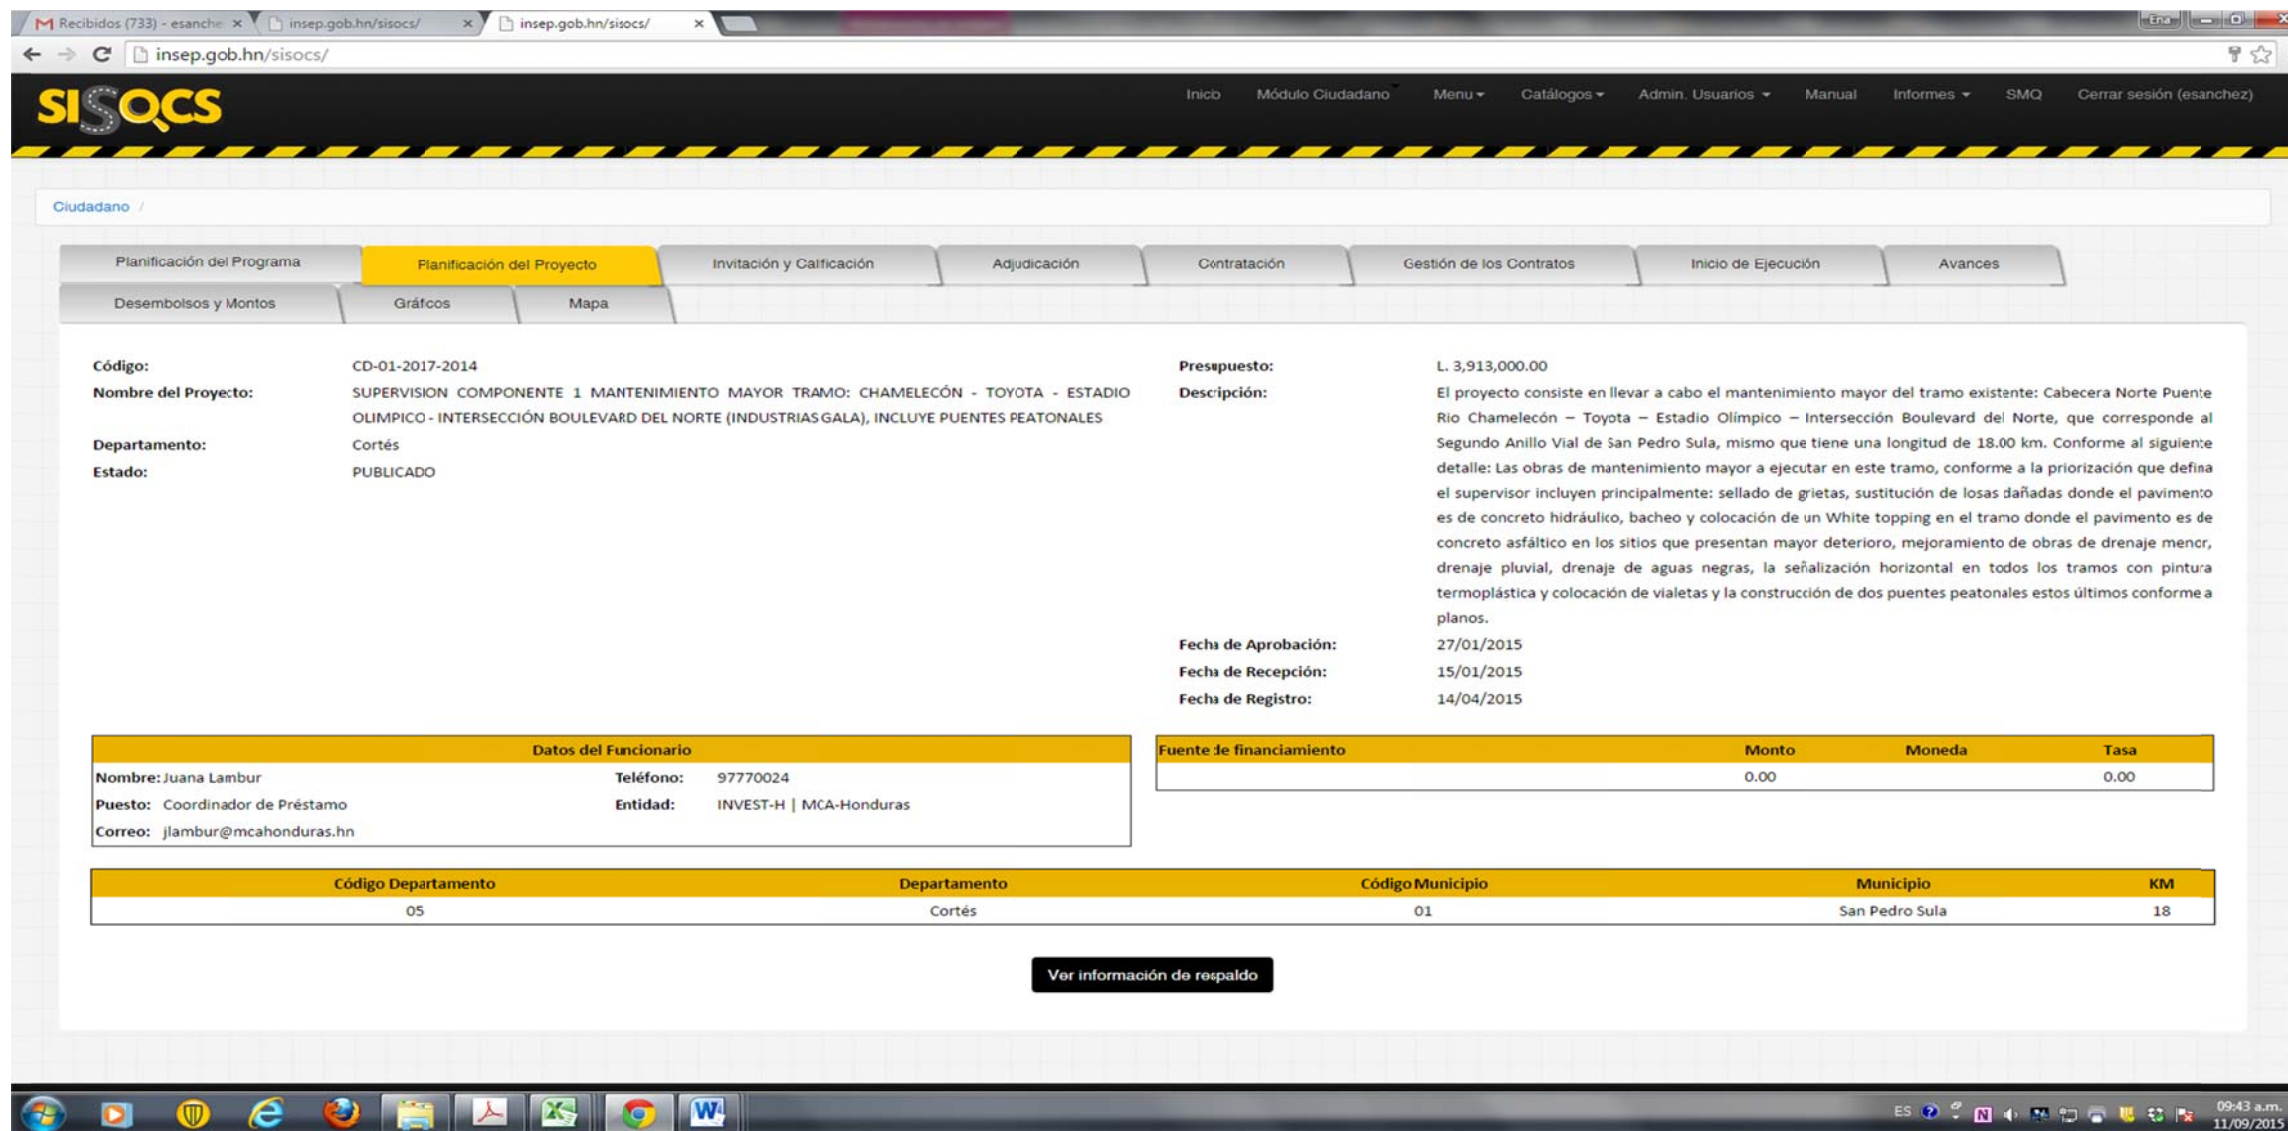

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Menu Catálogos Admin. Usuarios Manual Informes SMQ Cerrar sesión (esanchez)

Ciudadano /

Planificación del Programa **Planificación del Proyecto** Invitación y Calificación Adjudicación Contratación Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances

Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

Código: CD-01-2017-2014
Nombre del Proyecto: SUPERVISION COMPONENTE 1 MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO: CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLIMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA), INCLUYE PUENTES PEATONALES
Departamento: Cortés
Estado: PUBLICADO

Presupuesto: L. 3,913,000.00
Descripción: El proyecto consiste en llevar a cabo el mantenimiento mayor del tramo existente: Cabecera Norte Puente Rio Chamelecón – Toyota – Estadio Olímpico – Intersección Boulevard del Norte, que corresponde al Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula, mismo que tiene una longitud de 18.00 km. Conforme al siguiente detalle: Las obras de mantenimiento mayor a ejecutar en este tramo, conforme a la priorización que define el supervisor incluyen principalmente: sellado de grietas, sustitución de losas dañadas donde el pavimento es de concreto hidráulico, bacheo y colocación de un White topping en el tramo donde el pavimento es de concreto asfáltico en los sitios que presentan mayor deterioro, mejoramiento de obras de drenaje menor, drenaje pluvial, drenaje de aguas negras, la señalización horizontal en todos los tramos con pintura termoplástica y colocación de vialetas y la construcción de dos puentes peatonales estos últimos conforme a planos.

Fecha de Aprobación: 27/01/2015
Fecha de Recepción: 15/01/2015
Fecha de Registro: 14/04/2015

Datos del Funcionario	
Nombre: Juana Lambur	Teléfono: 97770024
Puesto: Coordinador de Préstamo	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras
Correo: jlambur@mcahonduras.hn	


Fuente de financiamiento	Monto	Moneda	Tasa
	0.00		0.00

Código Departamento	Departamento	Código Municipio	Municipio	KM
05	Cortés	01	San Pedro Sula	18

[Ver información de respaldo](#)

ES 09:43 a.m. 11/09/2015

Proyecto: Supervisión Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Industrias Gala)

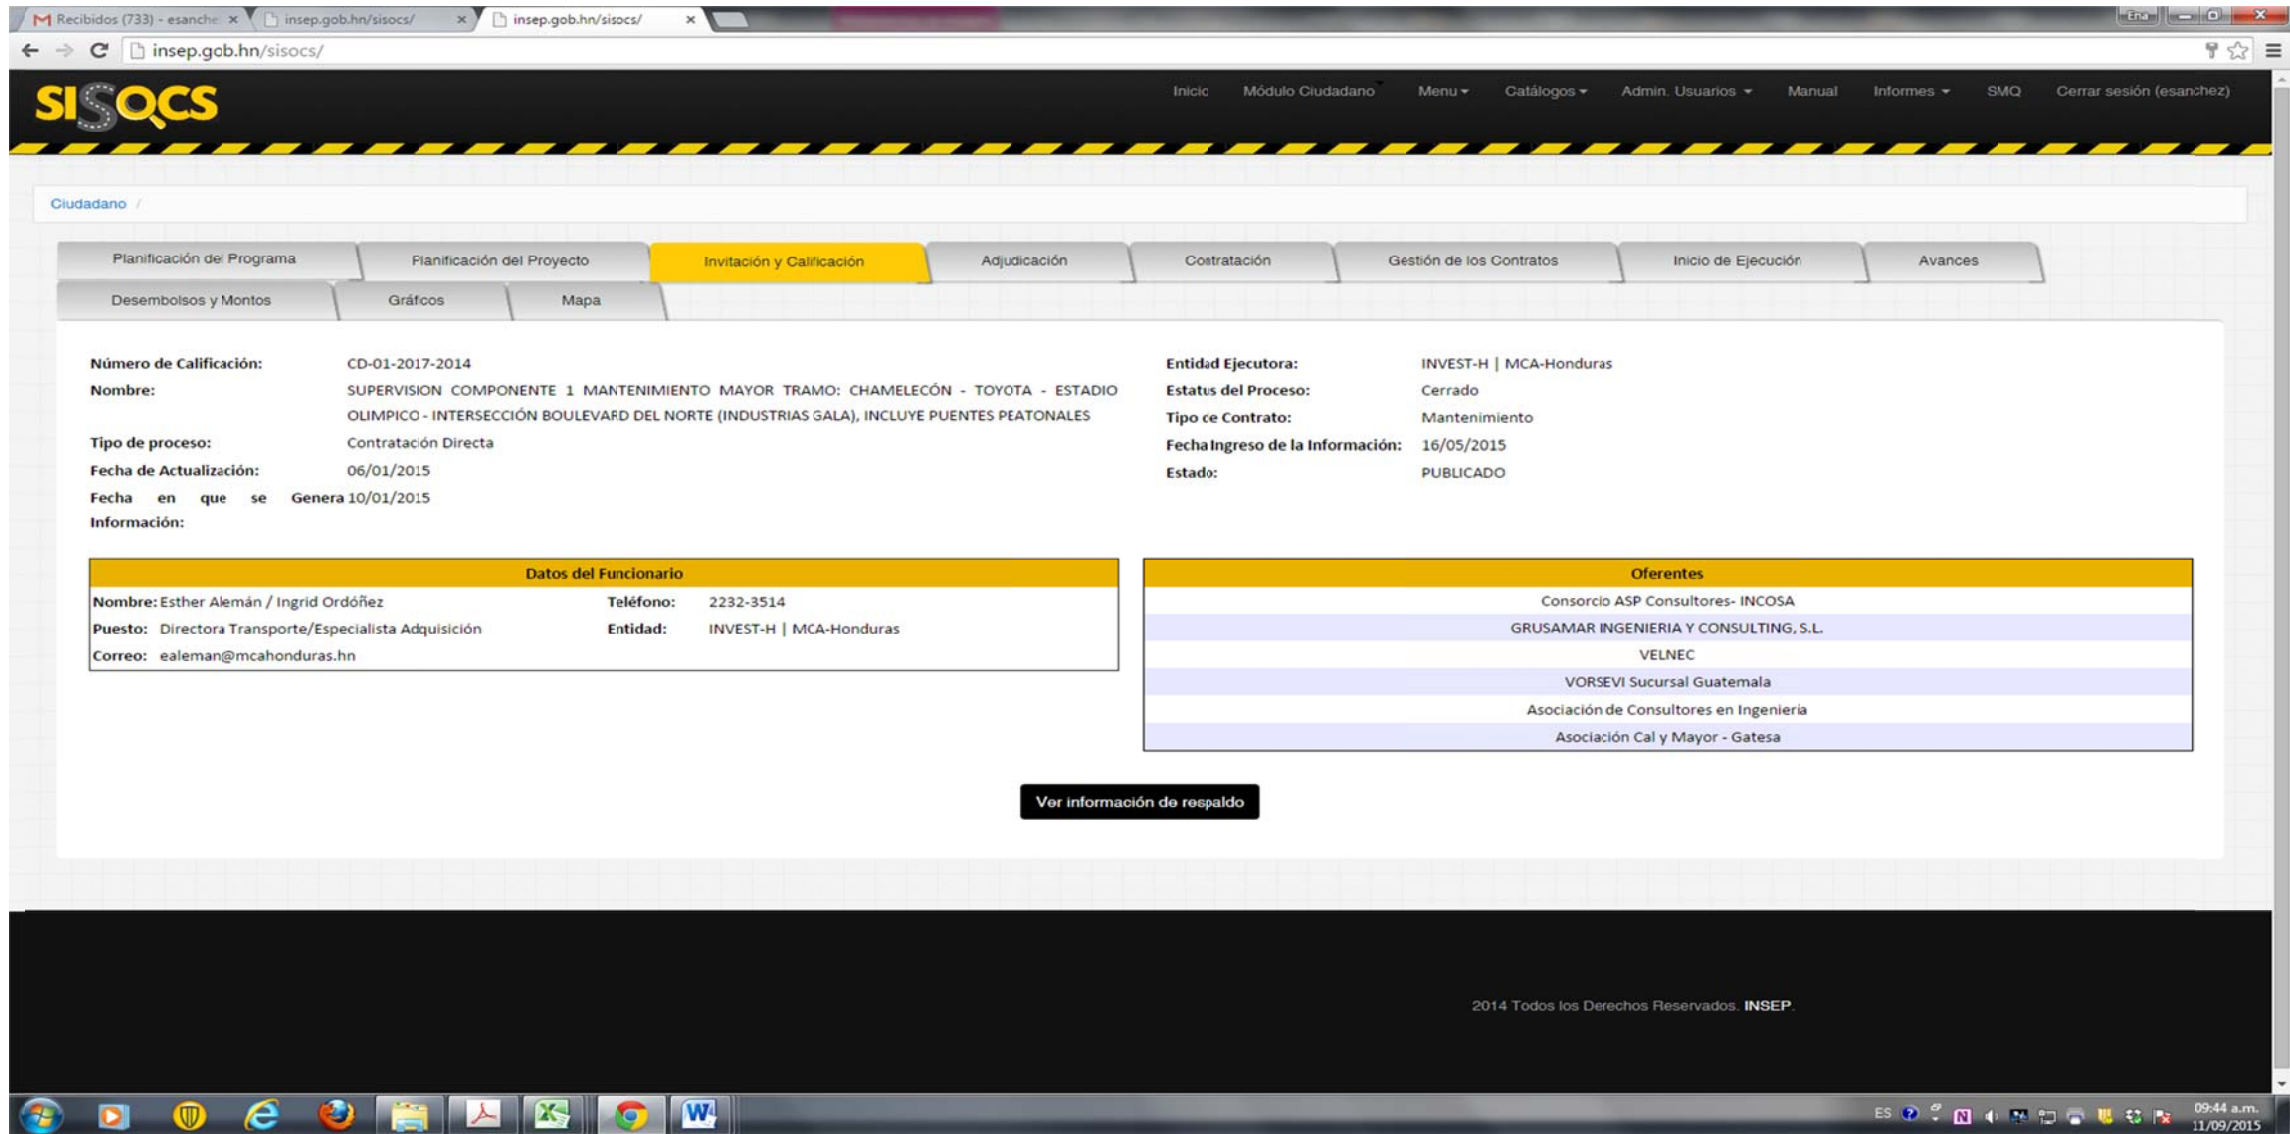

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Menu Catálogos Admin. Usuarios Manual Informes SMQ Cerrar sesión (esanchez)

Ciudadano /

Planificación del Programa Planificación del Proyecto **Invitación y Calificación** Adjudicación Contratación Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances

Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

Número de Calificación: CD-01-2017-2014
Nombre: SUPERVISION COMPONENTE 1 MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO: CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLIMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA), INCLUYE PUENTES PEATONALES
Tipo de proceso: Contratación Directa
Fecha de Actualización: 06/01/2015
Fecha en que se Genera: 10/01/2015
Información:

Entidad Ejecutora: INVEST-H | MCA-Honduras
Estatus del Proceso: Cerrado
Tipo de Contrato: Mantenimiento
Fecha Ingreso de la Información: 16/05/2015
Estado: PUBLICADO

Datos del Funcionario	
Nombre: Esther Alemán / Ingrid Ordóñez	Teléfono: 2232-3514
Puesto: Directora Transporte/Especialista Adquisición	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras
Correo: ealeman@mcahonduras.hn	


Oferentes
Consorcio ASP Consultores- INCOSA
GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING, S.L.
VELNEC
VORSEVI Sucursal Guatemala
Asociación de Consultores en Ingeniería
Asociación Cal y Mayor - Gatesa

[Ver información de respaldo](#)

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP

ES 09:44 a.m. 11/09/2015

Proyecto: Supervisión Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Industrias Gala)

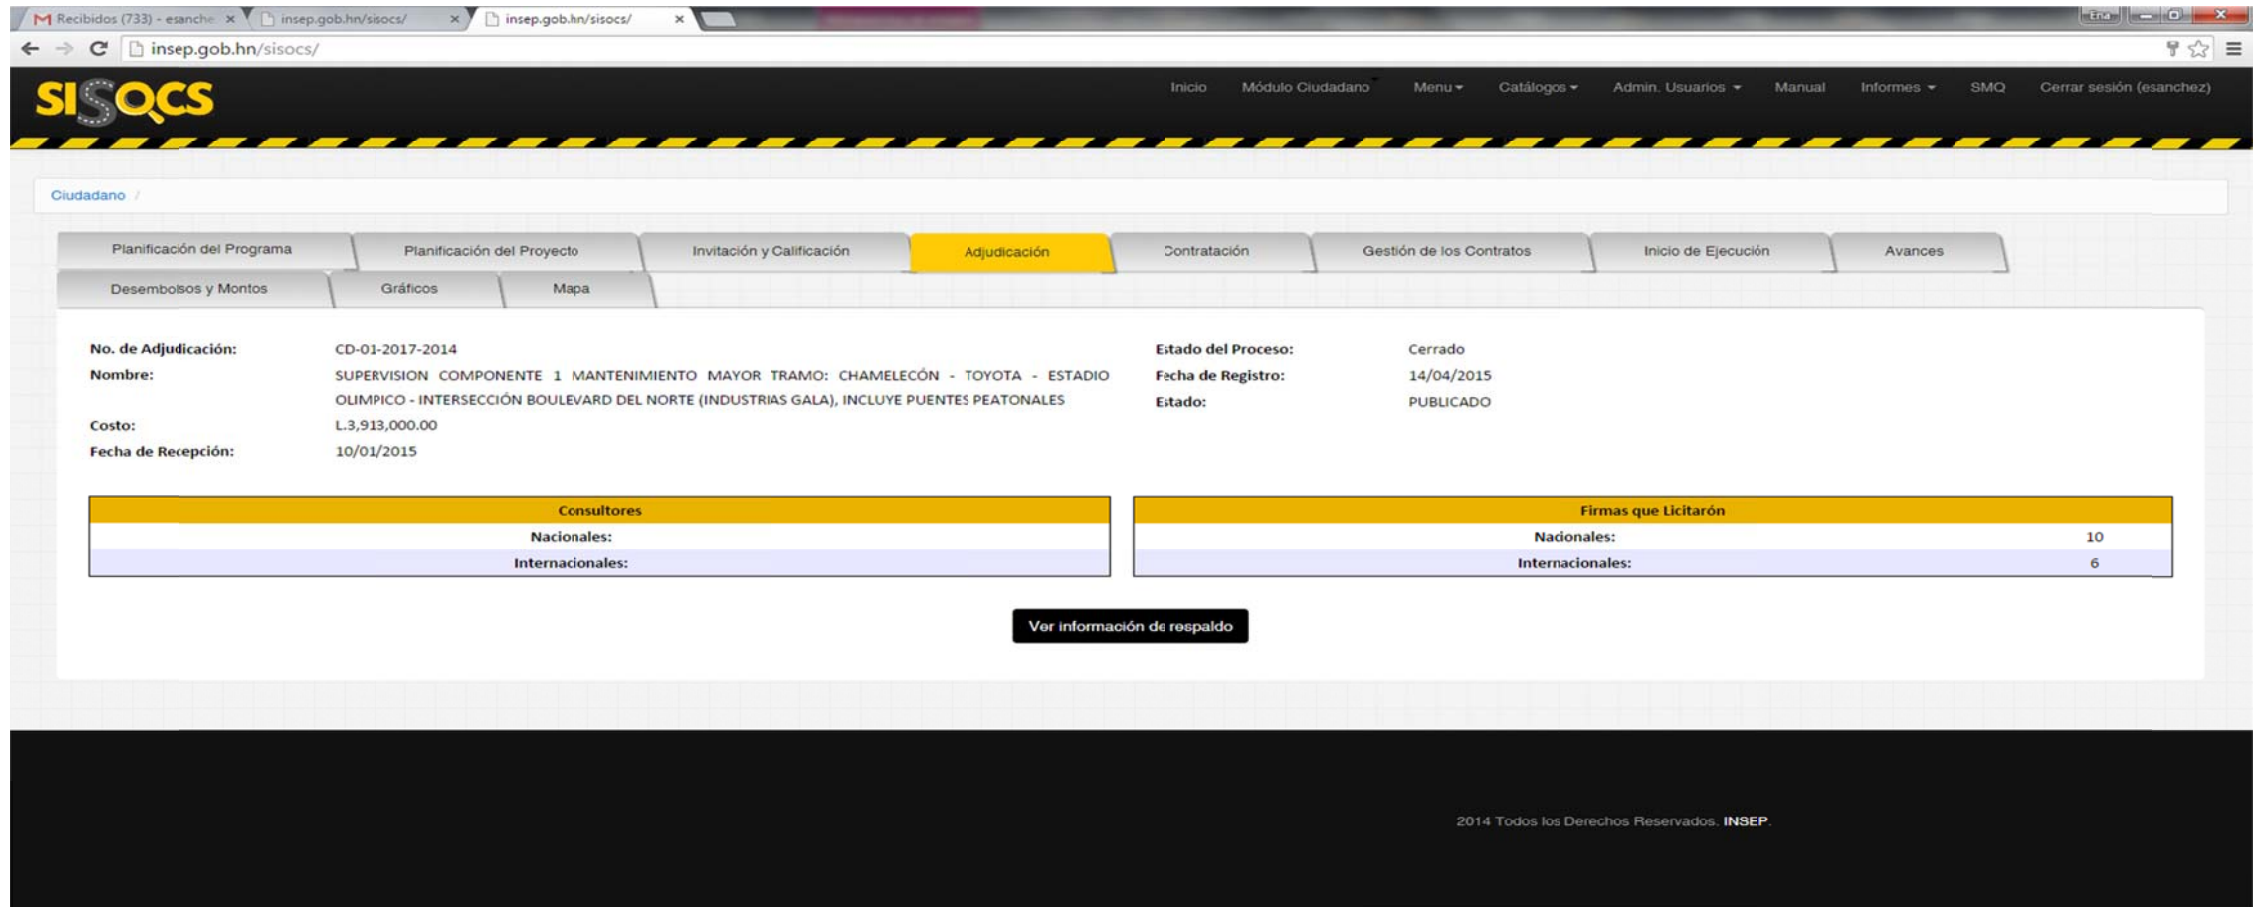

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'insep.gob.hn/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Menu, Catálogos, Admin. Usuarios, Manual, Informes, SMQ, and Cerrar sesión (esanchez). The main content area is titled 'Ciudadano' and features a navigation menu with tabs: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, **Adjudicación** (highlighted), Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the navigation menu, the project details are displayed:

No. de Adjudicación:	CD-01-2017-2014	Estado del Proceso:	Cerrado
Nombre:	SUPERVISION COMPONENTE 1 MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO: CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLIMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA), INCLUYE PUENTES PEATONALES	Fecha de Registro:	14/04/2015
Costo:	L.3,913,000.00	Estado:	PUBLICADO
Fecha de Recepción:	10/01/2015		


Below the details, there are two summary tables:

Consultores	
Nacionales:	
Internacionales:	

Firmas que Licitaron	
Nacionales:	10
Internacionales:	6

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the summary tables. At the bottom of the page, a footer reads '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.'

Proyecto: Supervisión Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Industrias Gala)

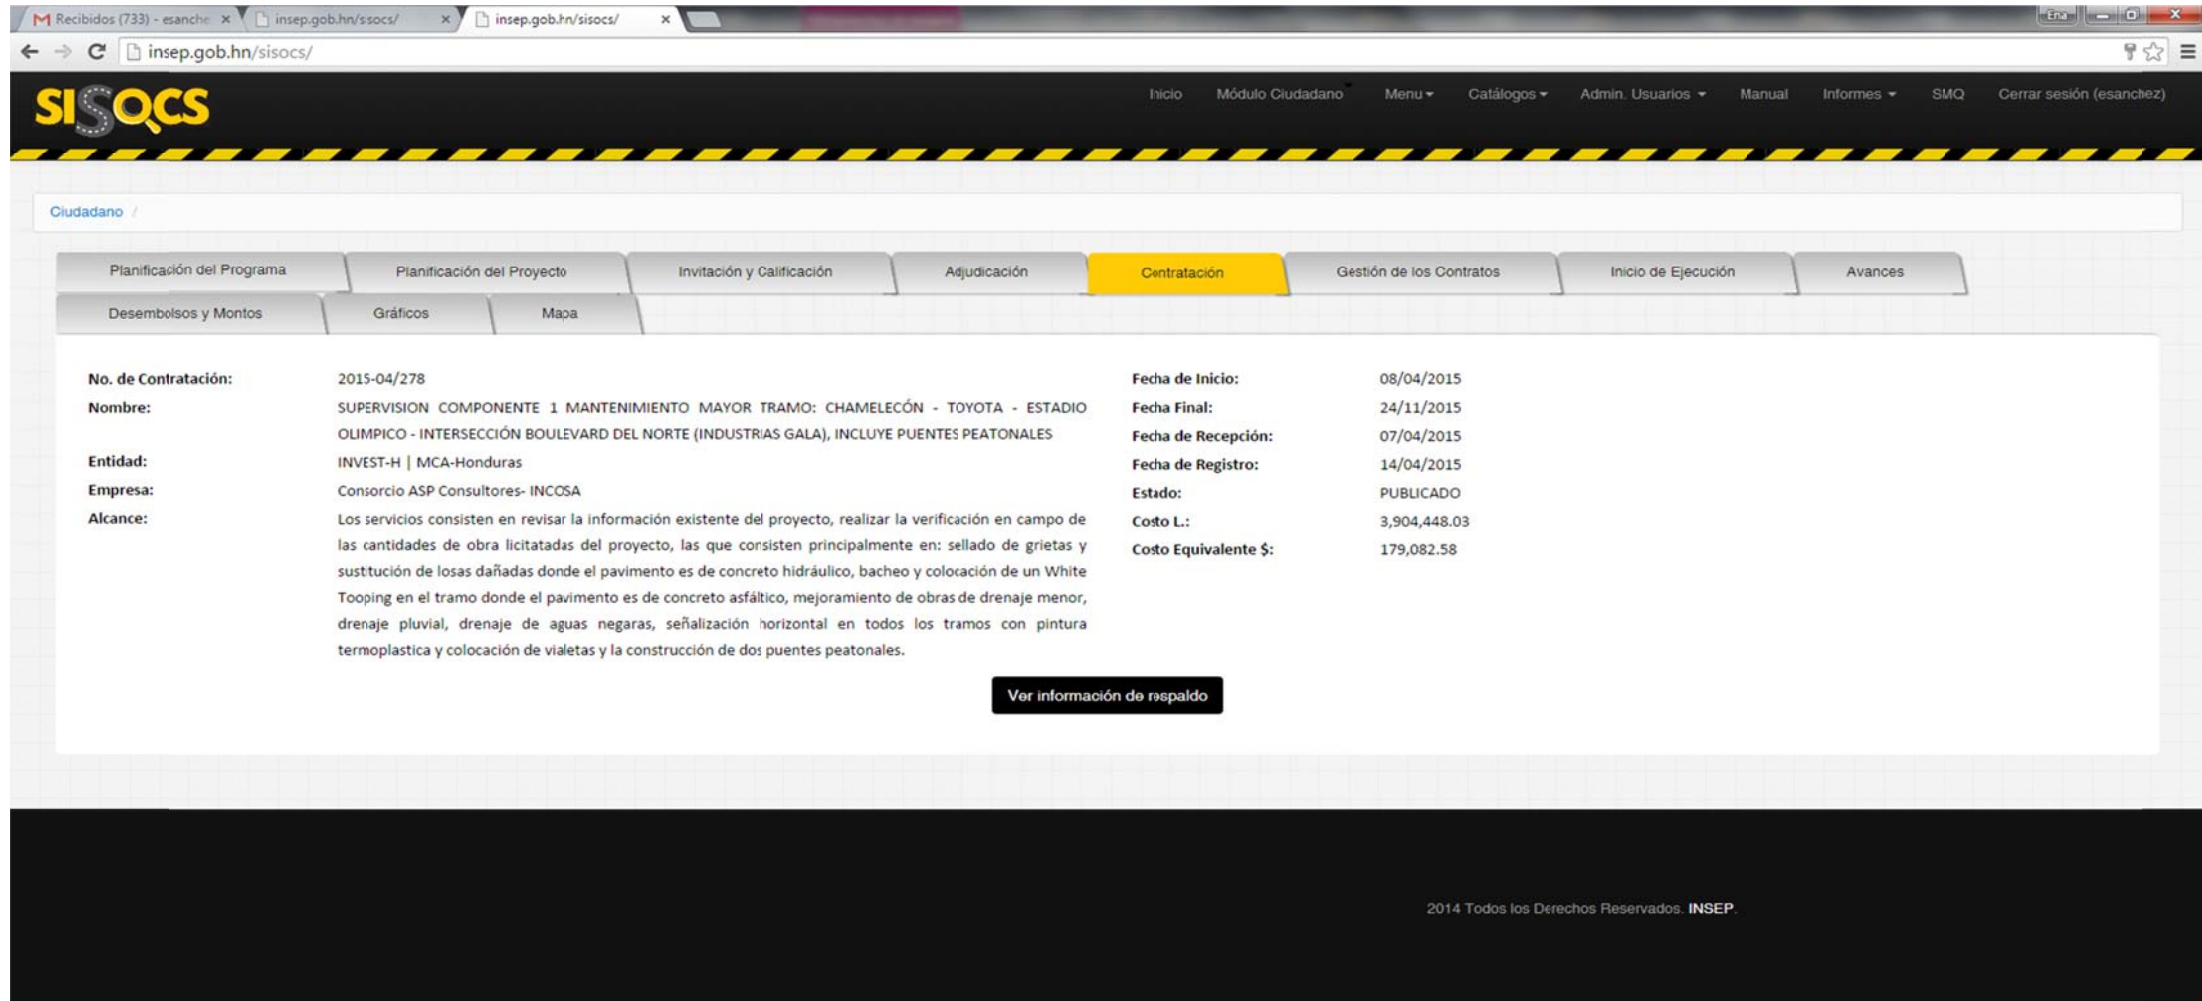

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'insep.gob.hn/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Menu, Catálogos, Admin. Usuarios, Manual, Informes, SMQ, and Cerrar sesión (esanchez). The main navigation bar is divided into several tabs: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, **Contratación** (highlighted), Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below this, there are sub-tabs: Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa. The main content area displays contract details for a specific contract.

No. de Contratación:	2015-04/278	Fecha de Inicio:	08/04/2015
Nombre:	SUPERVISION COMPONENTE 1 MANTENIMIENTO MAYOR TRAMO: CHAMELECÓN - TOYOTA - ESTADIO OLIMPICO - INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA), INCLUYE PUENTES PEATONALES	Fecha Final:	24/11/2015
Entidad:	INVEST-H MCA-Honduras	Fecha de Recepción:	07/04/2015
Empresa:	Consortio ASP Consultores- INCOSA	Fecha de Registro:	14/04/2015
Alcance:	Los servicios consisten en revisar la información existente del proyecto, realizar la verificación en campo de las cantidades de obra licitadas del proyecto, las que consisten principalmente en: sellado de grietas y sustitución de losas dañadas donde el pavimento es de concreto hidráulico, bacheo y colocación de un White Toping en el tramo donde el pavimento es de concreto asfáltico, mejoramiento de obras de drenaje menor, drenaje pluvial, drenaje de aguas negras, señalización horizontal en todos los tramos con pintura termoplástica y colocación de vialitas y la construcción de dos puentes peatonales.	Estado:	PUBLICADO
		Costo L.:	3,904,448.03
		Costo Equivalente \$:	179,082.58

[Ver información de respaldo](#)

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP

Proyecto: Supervisión Mantenimiento Mayor Tramo Chamelecón - Toyota - Estadio Olímpico - Intersección Boulevard del Norte (Industrias Gala)

Resultados de la búsqueda x www.insep.gob.hn/sisocs/ x www.insep.gob.hn/sisocs/ x

www.insep.gob.hn/sisocs/

SISQCS Menú Proyectos Inicio Módulo Ciudadano Menu Catálogos Admin. Usuarios Manual Infomes SMQ Cerrar sesión (esanchez)

Ciudadano /


Planificación del Programa Planificación del Proyecto Invitación y Calificación Adjudicación Contratación Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances

Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

Nro.	Descripción	Monto	Fecha Desembolso
1	Pago No. 1 correspondiente al Informe Inicial de Proyecto (Mayo 2015).	390,444.80	26/05/2015
2	Pago No. 2 correspondiente al Informe de Progreso No. 1 (Junio 2015).	488,056.00	05/08/2015
3	Pago No. 3 correspondiente al Informe de Progreso No. 2 (Julio 2015).	488,056.00	11/09/2015
4	Pago No. 4 correspondiente al Informe de Progreso No. 3 (Agosto 2015).	488,056.00	30/09/2015
5	Pago No. 5 correspondiente al Informe de Progreso No. 4 (Septiembre 2015).	488,056.00	22/10/2015
6	Pago No. 6 correspondiente al Informe de Progreso No. 5 (Octubre 2015).	488,056.00	01/12/2015
7	Pago No. 7 correspondiente al Informe de Progreso No. 6 (Noviembre 2015).	488,056.00	14/12/2015
8	Pago No. 8 correspondiente al Informe de Progreso No. 7 (Diciembre 2015).	619,676.00	01/03/2016
9	Pago No. 9 correspondiente al Informe de Progreso No. 8 (Enero 2016).	619,676.00	02/03/2016
10	Pago No. 10 correspondiente al Informe de Progreso No. 9 (Febrero 2016).	619,676.00	28/03/2016
11	Pago No. 11 correspondiente al Informe de Progreso No. 10 (Marzo 2016).	619,676.00	09/05/2016
12	Pago No. 12 correspondiente al Informe de Progreso No. 11 (Abril 2016).	619,676.00	24/05/2016
13	Pago No. 13 correspondiente al Informe Final de Supervisión de Proyecto (Mayo 2016).	1,071,139.20	05/08/2016

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)-Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

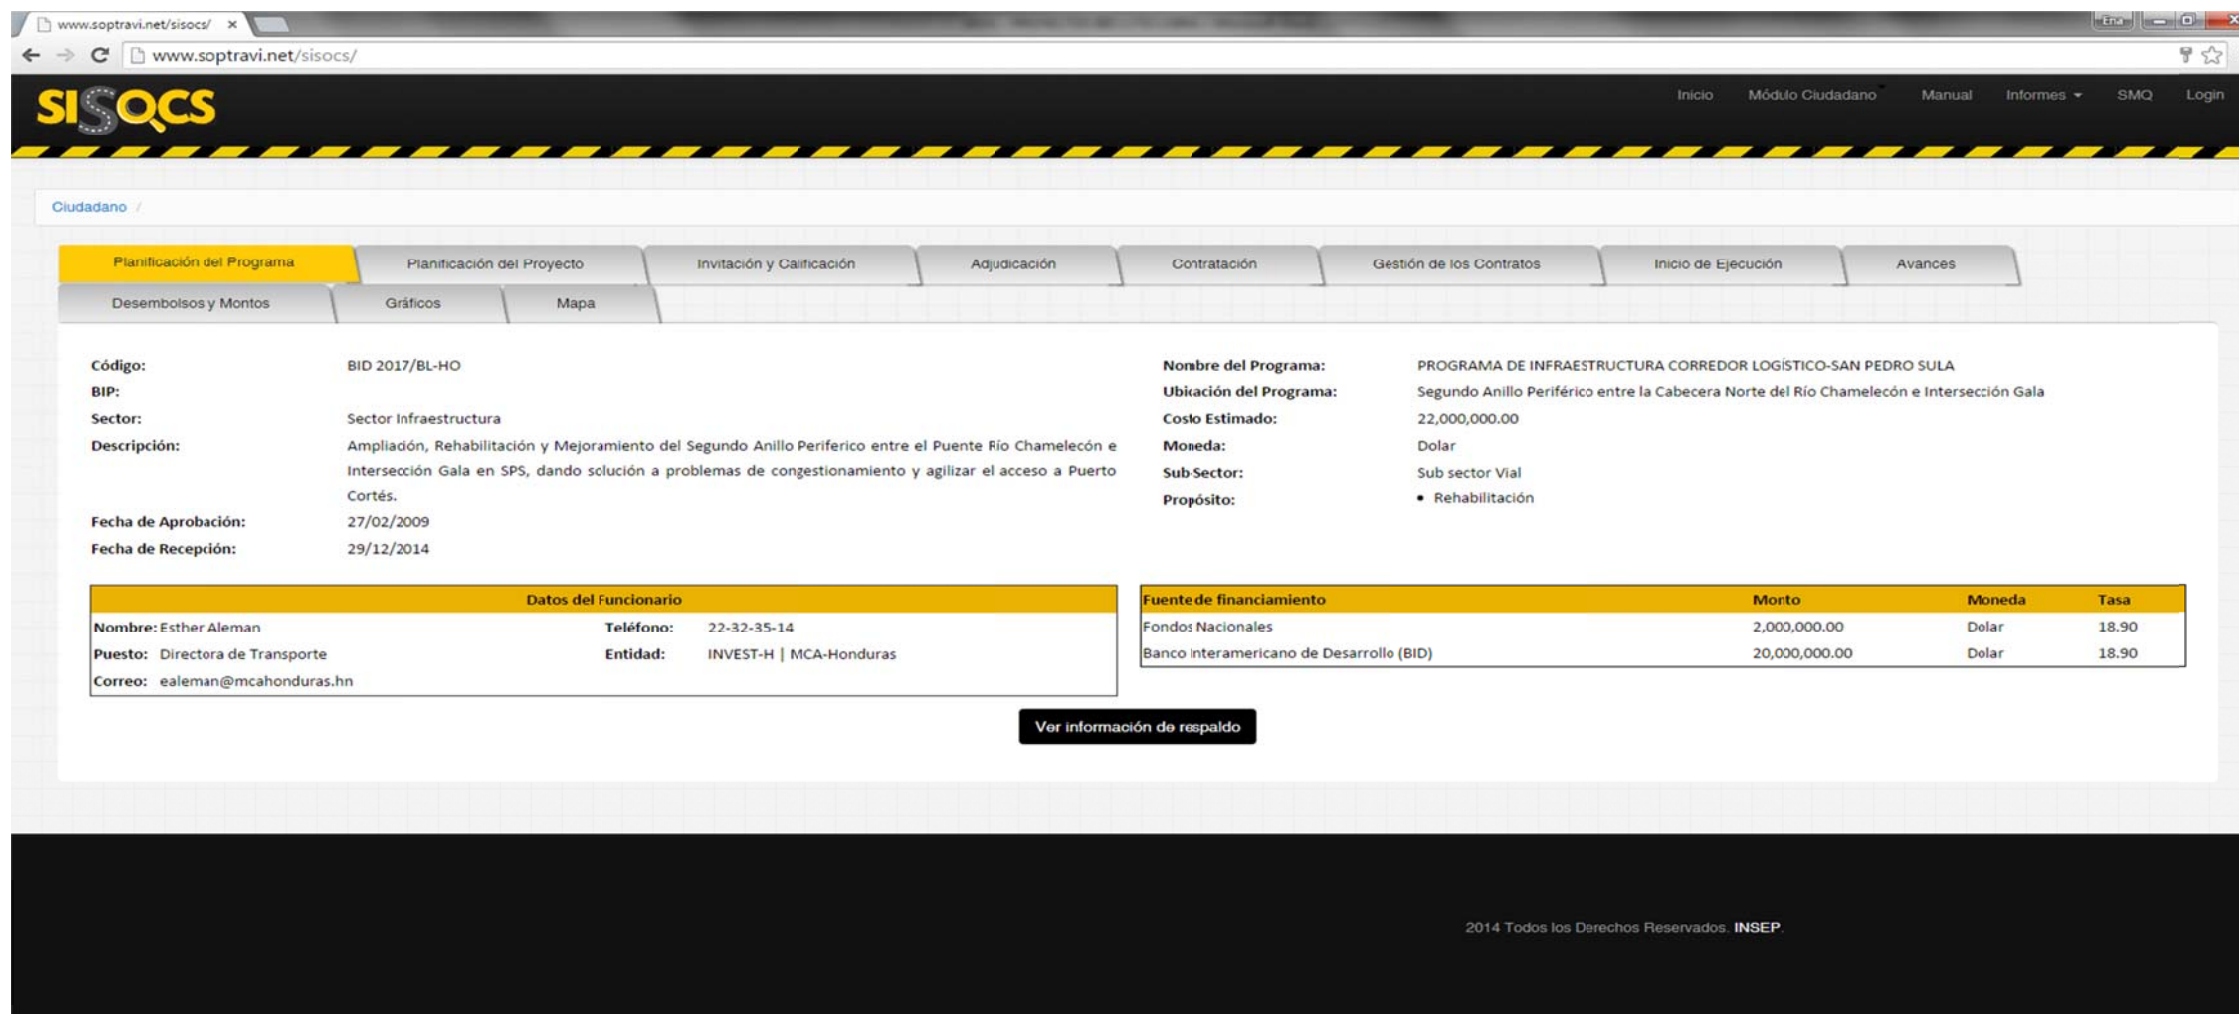

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. A breadcrumb trail shows 'Ciudadano /'. Below this is a horizontal menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. Under 'Planificación del Programa', there are sub-tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area displays project details in two columns:

Código:	BID 2017/BL-HO	Nombre del Programa:	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGÍSTICO-SAN PEDRO SULA		
BIP:		Ubicación del Programa:	Segundo Anillo Periférico entre la Cabecera Norte del Río Chamelecón e Intersección Gala		
Sector:	Sector Infraestructura	Coslo Estimado:	22,000,000.00		
Descripción:	Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periferico entre el Puente Río Chamelecón e Intersección Gala en SPS, dando solución a problemas de congestamiento y agilizar el acceso a Puerto Cortés.	Moneda:	Dolar		
Fecha de Aprobación:	27/02/2009	Sub Sector:	Sub sector Vial		
Fecha de Recepción:	29/12/2014	Propósito:	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación 		


Below the details are two summary tables:

Datos del Funcionario		Fuente de financiamiento			
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-32-35-14		Monto	Moneda	Tasa
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras	Fondos Nacionales	2,000,000.00	Dolar	18.90
Correo: ealeman@mcahonduras.hn		Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	20,000,000.00	Dolar	18.90

[Ver información de respaldo](#)

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)-Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

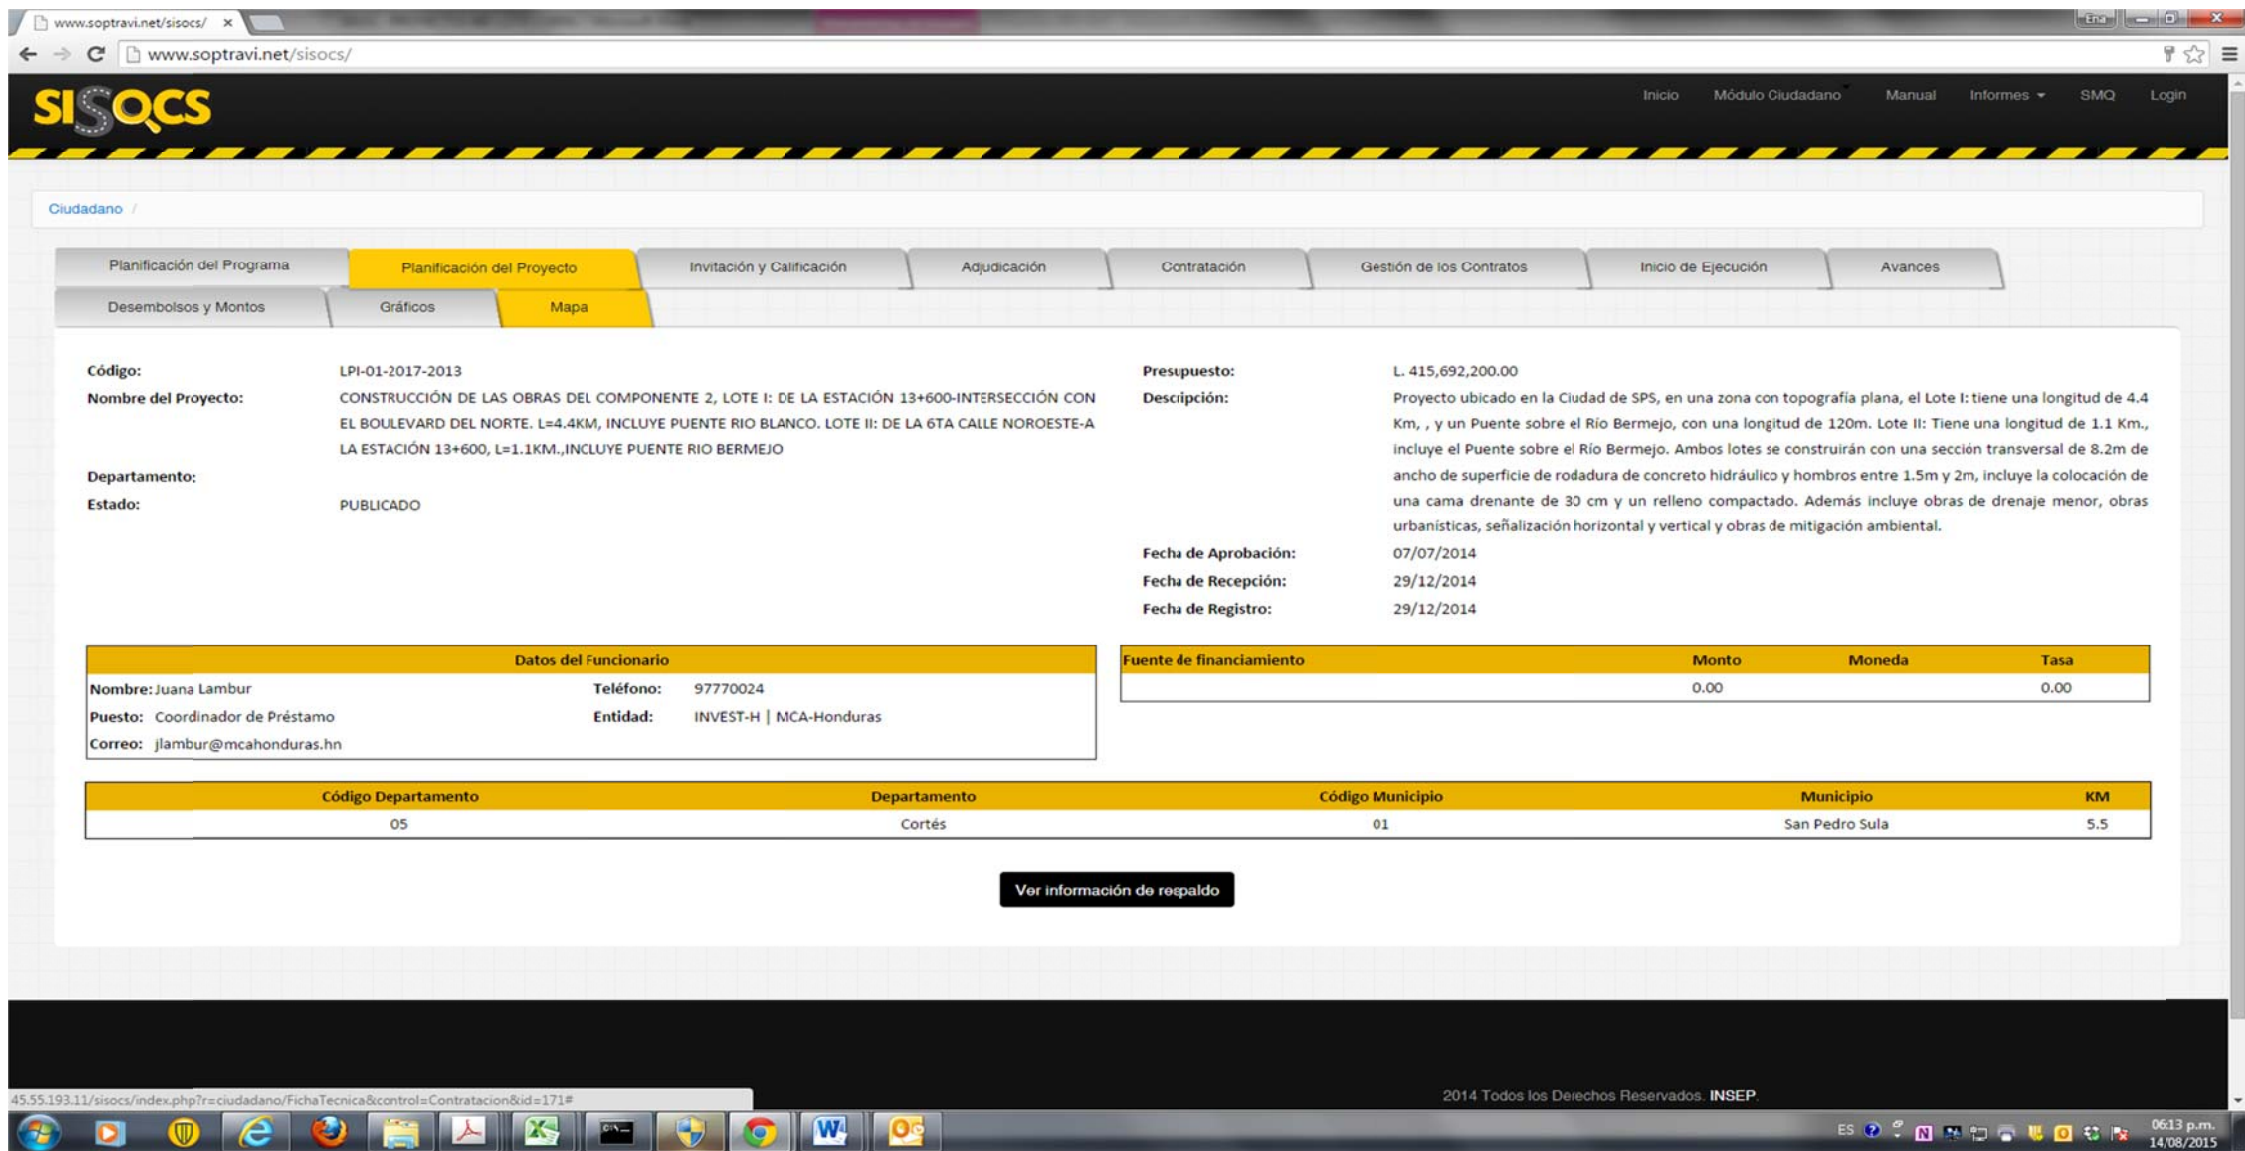

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMQ Login

Ciudadano /

Planificación del Programa | **Planificación del Proyecto** | Invitación y Calificación | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desembolsos y Montos | Gráficos | **Mapa**

Código: LPI-01-2017-2013
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE. L=4.4KM, INCLUYE PUENTE RIO BLANCO. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM.,INCLUYE PUENTE RIO BERMEJO
Departamento:
Estado: PUBLICADO

Presupuesto: L. 415,692,200.00
Descripción: Proyecto ubicado en la Ciudad de SPS, en una zona con topografía plana, el Lote I: tiene una longitud de 4.4 Km, , y un Puente sobre el Río Bermejo, con una longitud de 120m. Lote II: Tiene una longitud de 1.1 Km., incluye el Puente sobre el Río Bermejo. Ambos lotes se construirán con una sección transversal de 8.2m de ancho de superficie de rodadura de concreto hidráulico y hombros entre 1.5m y 2m, incluye la colocación de una cama drenante de 30 cm y un relleno compactado. Además incluye obras de drenaje menor, obras urbanísticas, señalización horizontal y vertical y obras de mitigación ambiental.
Fecha de Aprobación: 07/07/2014
Fecha de Recepción: 29/12/2014
Fecha de Registro: 29/12/2014


Datos del Funcionario		Fuente de financiamiento		
Nombre: Juana Lambur	Teléfono: 97770024	Monto	Moneda	Tasa
Puesto: Coordinador de Préstamo	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras	0.00		0.00
Correo: jlambur@mcahonduras.hn				

Código Departamento	Departamento	Código Municipio	Municipio	KM
05	Cortés	01	San Pedro Sula	5.5

[Ver información de respaldo](#)

45.55.193.11/sisocs/index.php?r=ciudadano/FichaTecnica&control=Contratacion&id=171# 2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP. ES 0613 p.m. 14/08/2015

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)-Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

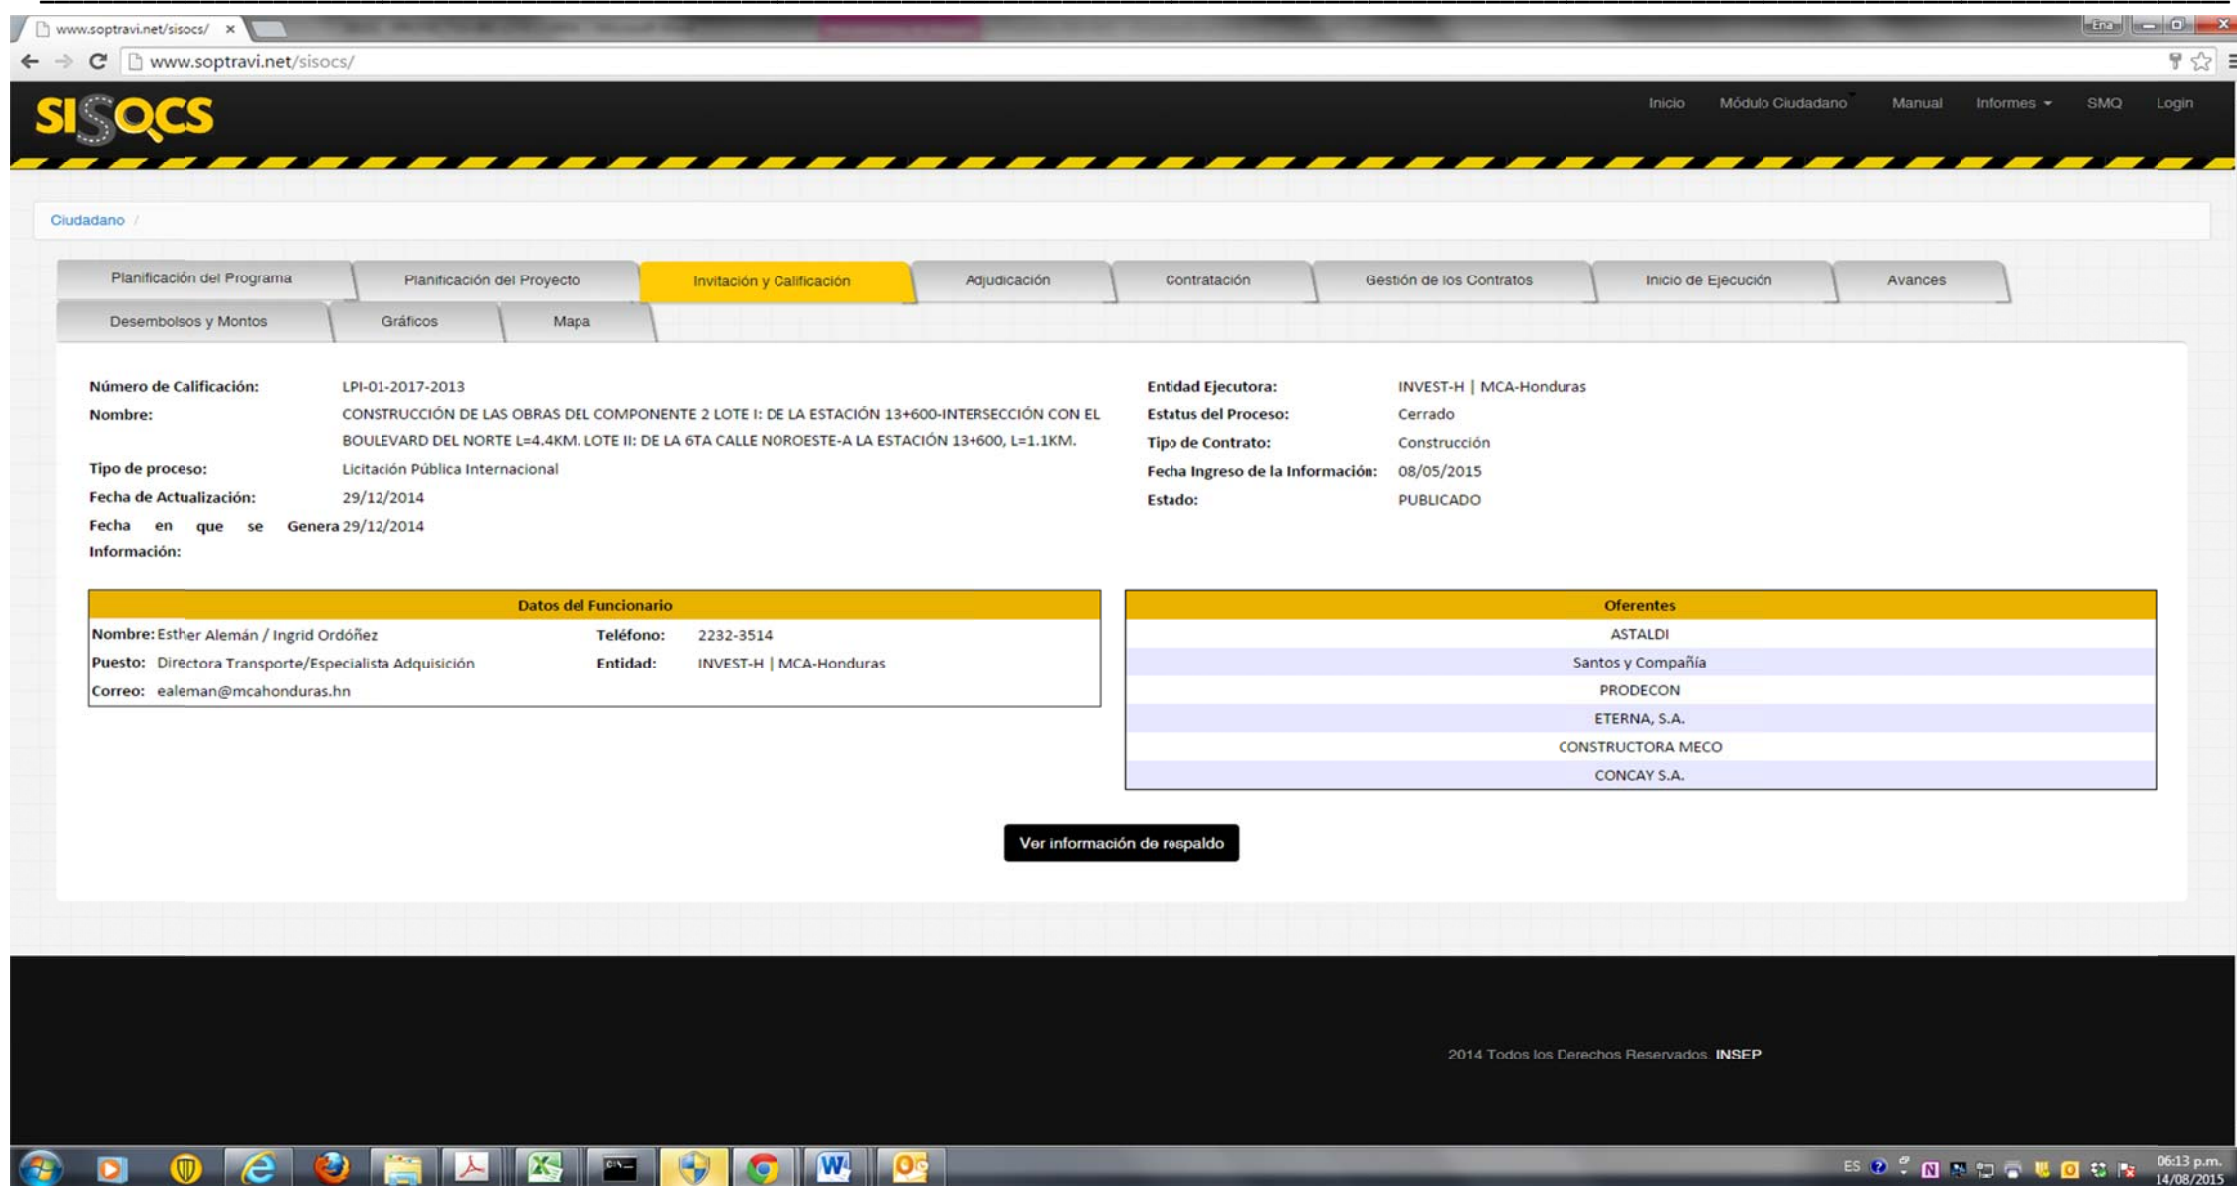

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMO, and Login. The main content area is titled 'Ciudadano /' and features a navigation menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación' (highlighted), 'Ajudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. Below the navigation menu, there are sub-tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area displays project details for 'Invitación y Calificación'.

Número de Calificación:	LPI-01-2017-2013	Entidad Ejecutora:	INVEST-H MCA-Honduras
Nombre:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE L=4.4KM. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM.	Estatus del Proceso:	Cerrado
Tipo de proceso:	Licitación Pública Internacional	Tipo de Contrato:	Construcción
Fecha de Actualización:	29/12/2014	Fecha Ingreso de la Información:	08/05/2015
Fecha en que se Genera	29/12/2014	Estado:	PUBLICADO

Información:

Datos del Funcionario	
Nombre: Esther Alemán / Ingrid Ordóñez	Teléfono: 2232-3514
Puesto: Directora Transporte/Especialista Adquisición	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras
Correo: ealeman@mcahonduras.hn	


Oferentes
ASTALDI
Santos y Compañía
PRODECON
ETERNA, S.A.
CONSTRUCTORA MECO
CONCAY S.A.

[Ver información de respaldo](#)

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP

06:13 p.m.
14/08/2015

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)-Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

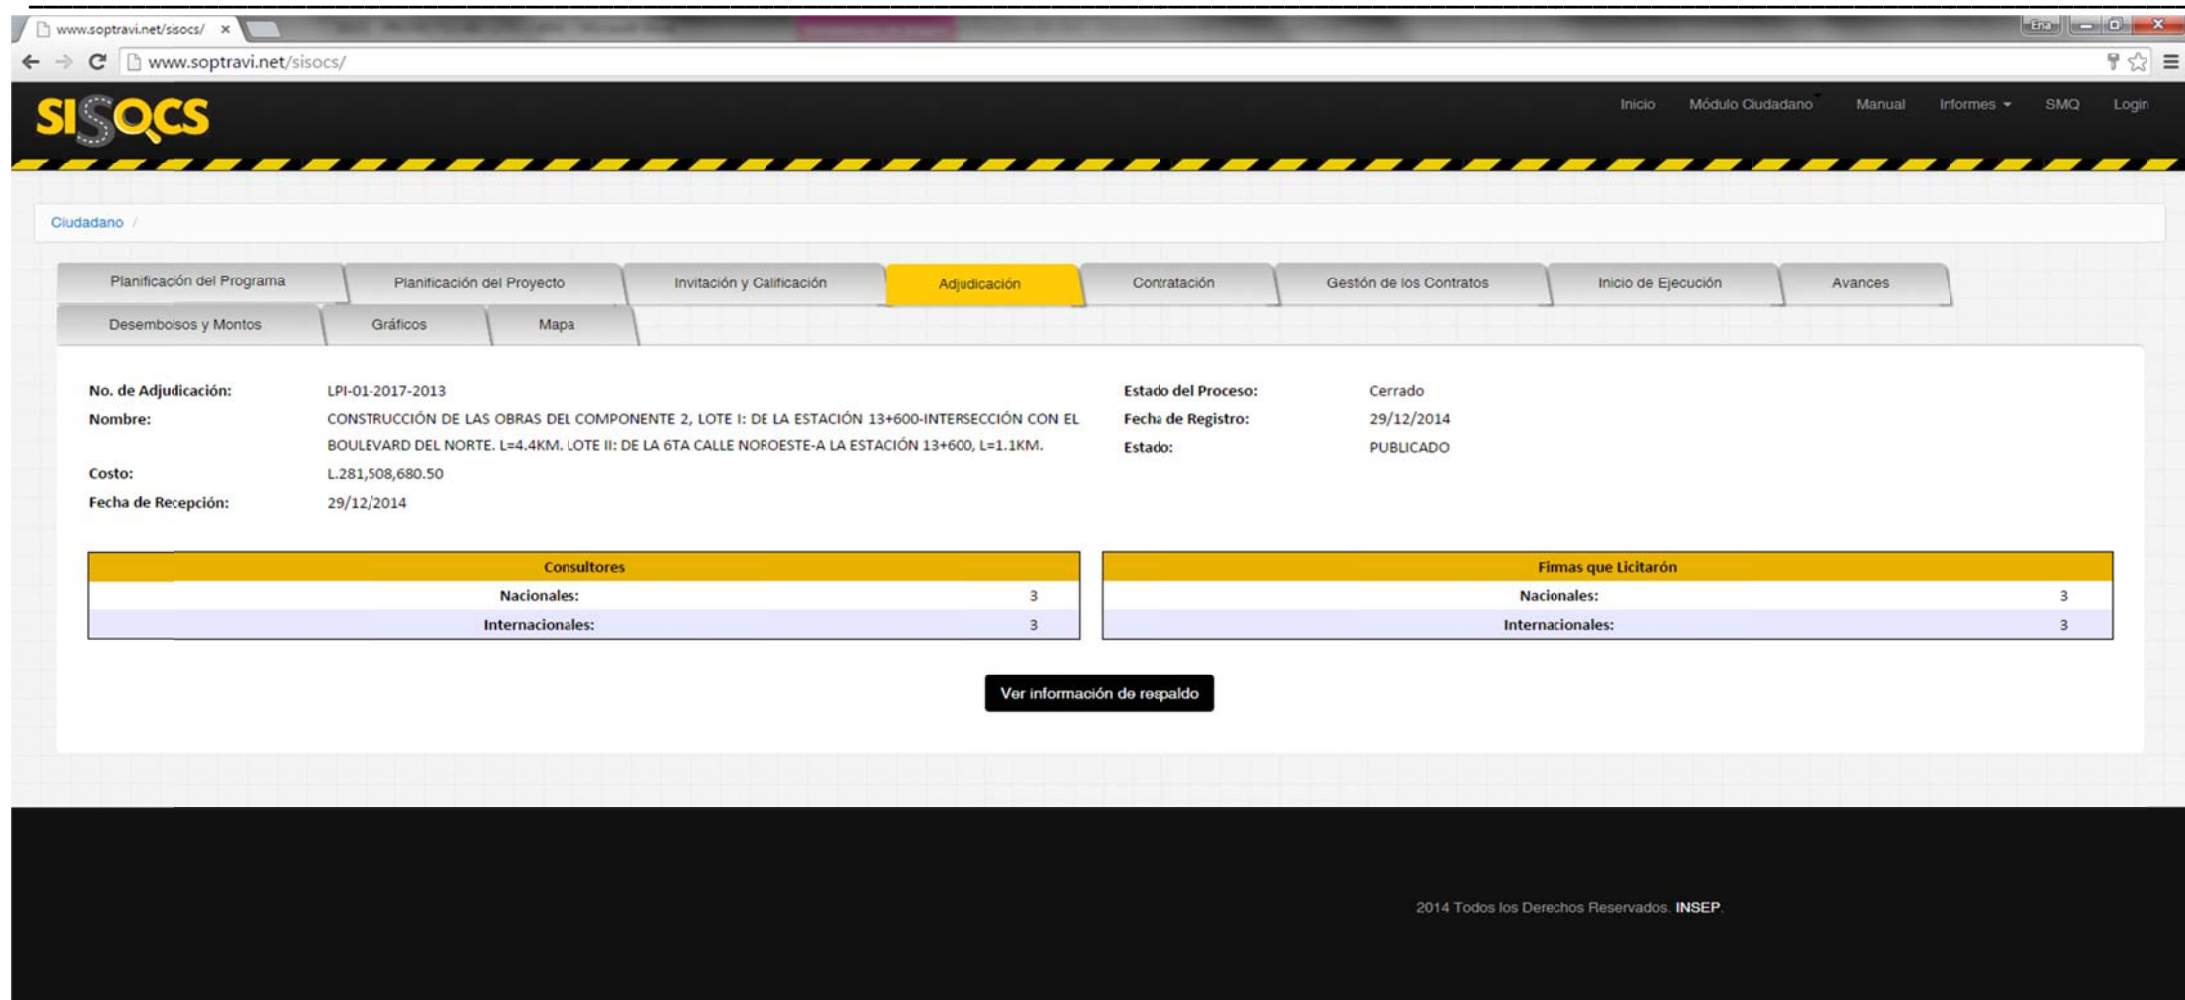

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. The main content area is titled 'Ciudadano' and features a navigation menu with tabs for: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación (highlighted), Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the menu, project details are displayed:

- No. de Adjudicación:** LPI-01-2017-2013
- Nombre:** CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE. L=4.4KM. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOFOESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM.
- Costo:** L.281,508,680.50
- Fecha de Recepción:** 29/12/2014
- Estado del Proceso:** Cerrado
- Fecha de Registro:** 29/12/2014
- Estado:** PUBLICADO


Two summary tables are provided:

Consultores	
Nacionales:	3
Internacionales:	3

Firmas que Licitaron	
Nacionales:	3
Internacionales:	3


A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the tables. At the bottom of the page, a footer reads '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP'.

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)-Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

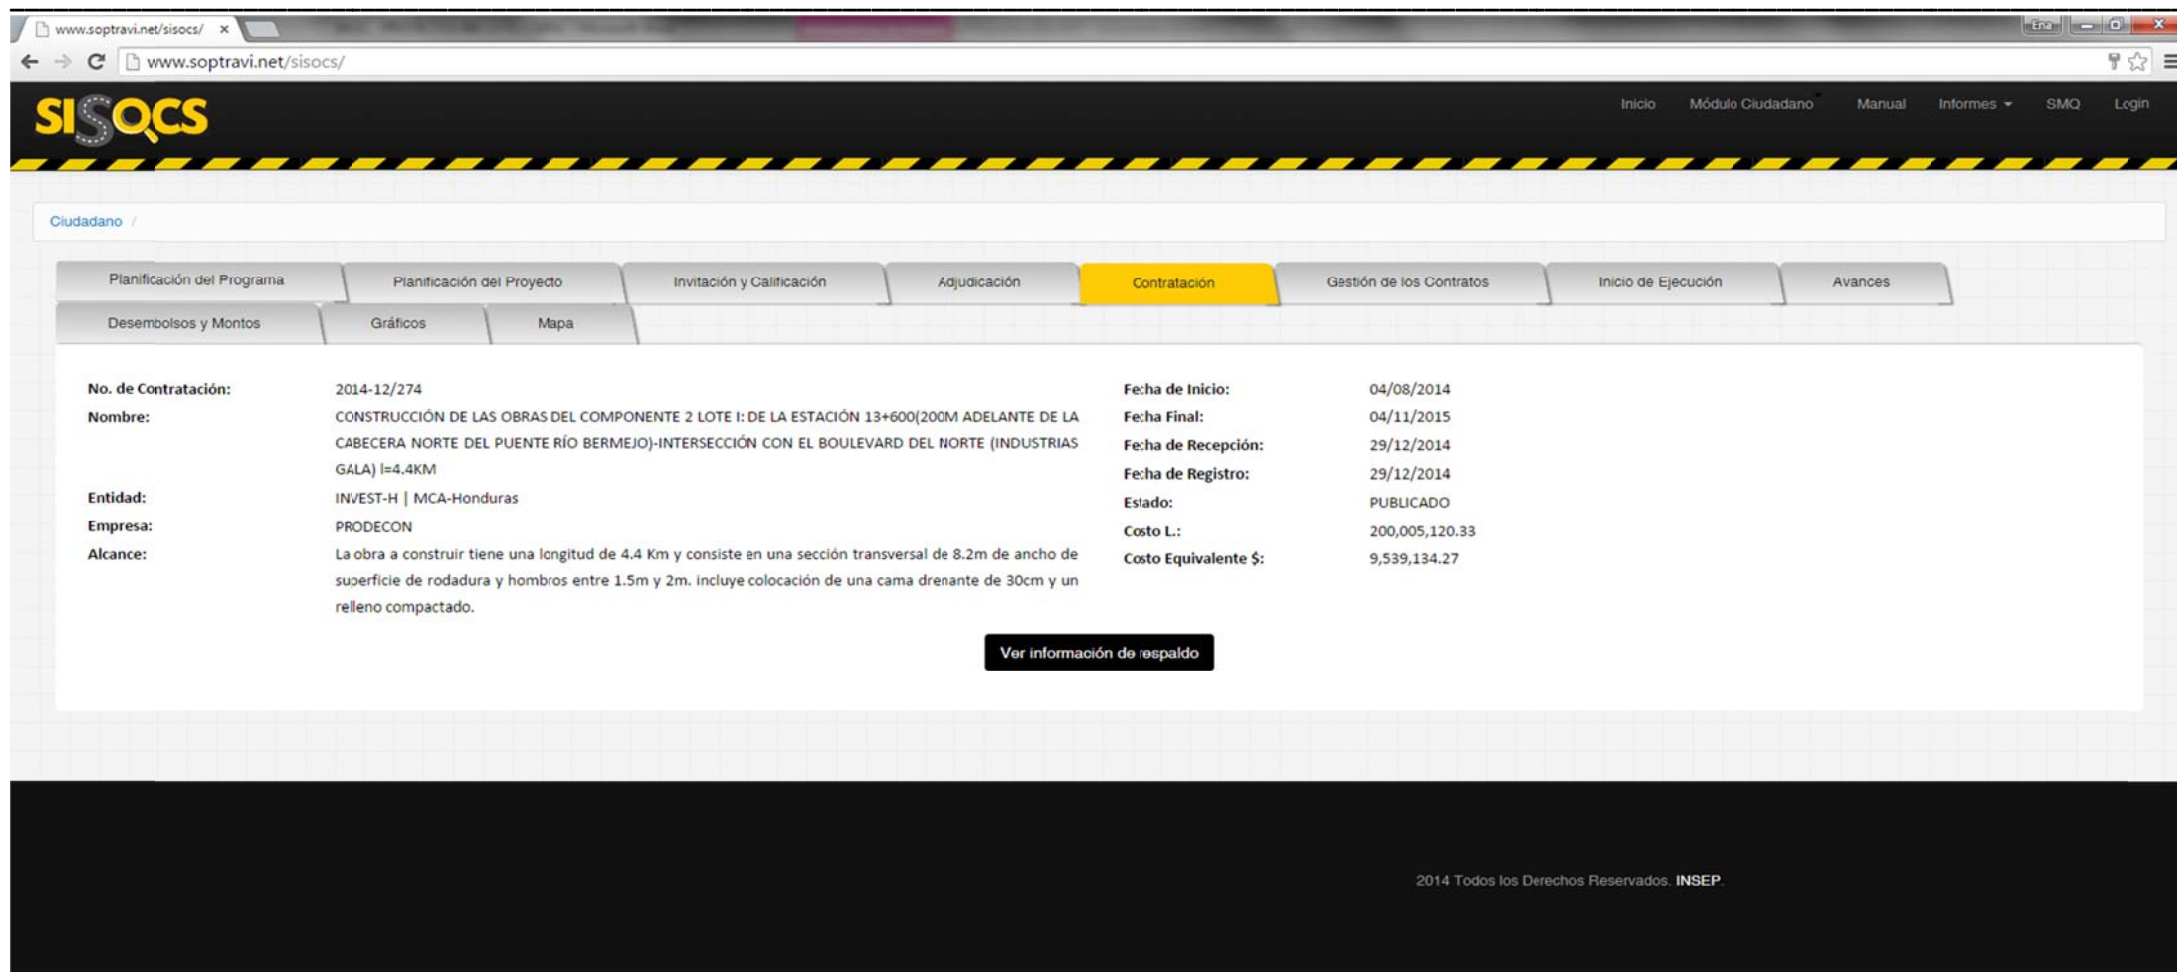

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.sopravi.net/sisocs/'. The application header includes the 'SISQCS' logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. The main content area is titled 'Ciudadano /' and features a horizontal menu with tabs: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, **Contratación** (highlighted), Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the menu, there are sub-tabs: Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa. The main content displays contract details for 'No. de Contratación: 2014-12/274'. The contract name is 'CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600(200M ADELANTE DE LA CABECERA NORTE DEL PUENTE RÍO BERMEJO)-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA) l=4.4KM'. The entity is 'INVEST-H | MCA-Honduras' and the company is 'PRODECON'. The contract start date is '04/08/2014', the final date is '04/11/2015', and the reception date is '29/12/2014'. The registration date is also '29/12/2014'. The status is 'PUBLICADO', the cost is '200,005,120.33', and the equivalent cost is '9,539,134.27'. A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the details. At the bottom of the page, a footer reads '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.'

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)-Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

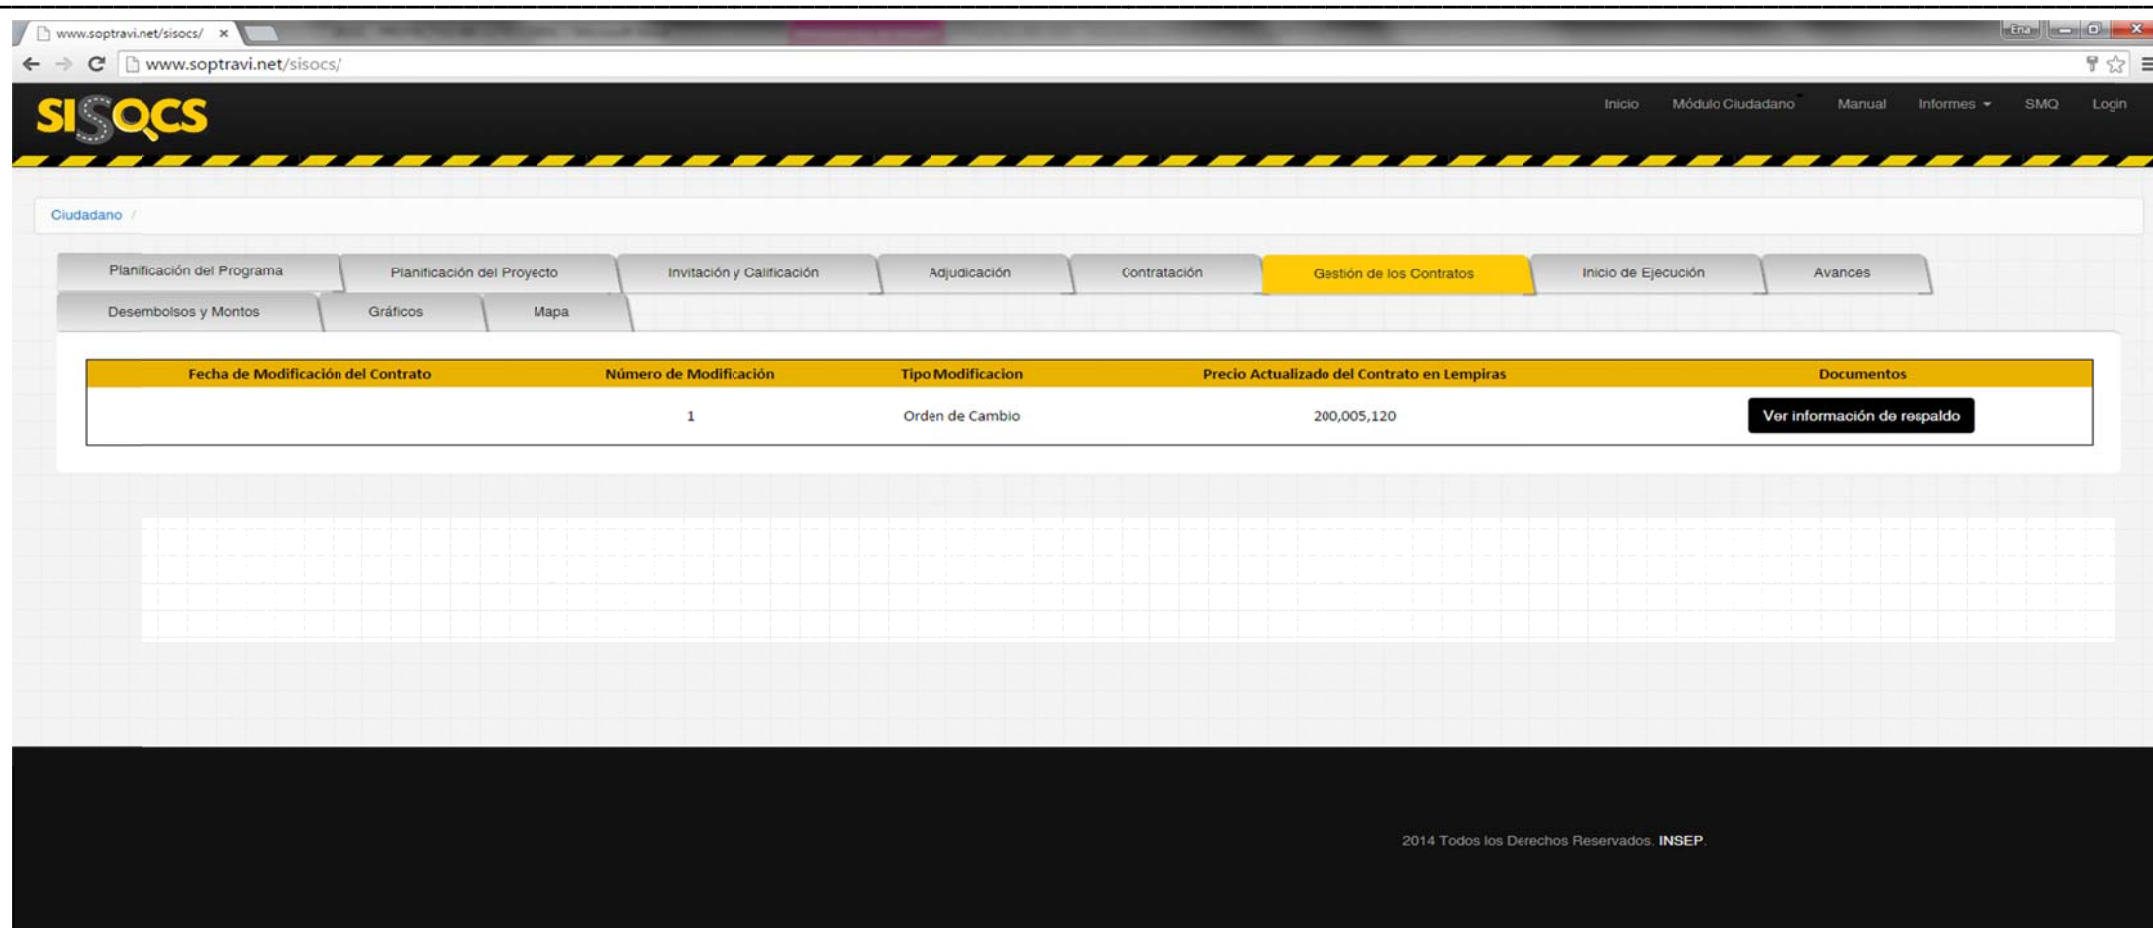

The screenshot shows the SISQCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SISQCS logo and menu items: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: Ciudadano / .


The main content area features a series of tabs for project management stages: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, Contratación, **Gestión de los Contratos** (highlighted), Inicio de Ejecución, and Avances. Below these tabs are sub-tabs: Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa.

The central part of the interface displays a table with contract modification data:

Fecha de Modificación del Contrato	Número de Modificación	Tipo Modificación	Precio Actualizado del Contrato en Lempiras	Documentos
	1	Orden de Cambio	200,005,120	Ver información de respaldo

At the bottom of the page, there is a footer with the text: 2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)-Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

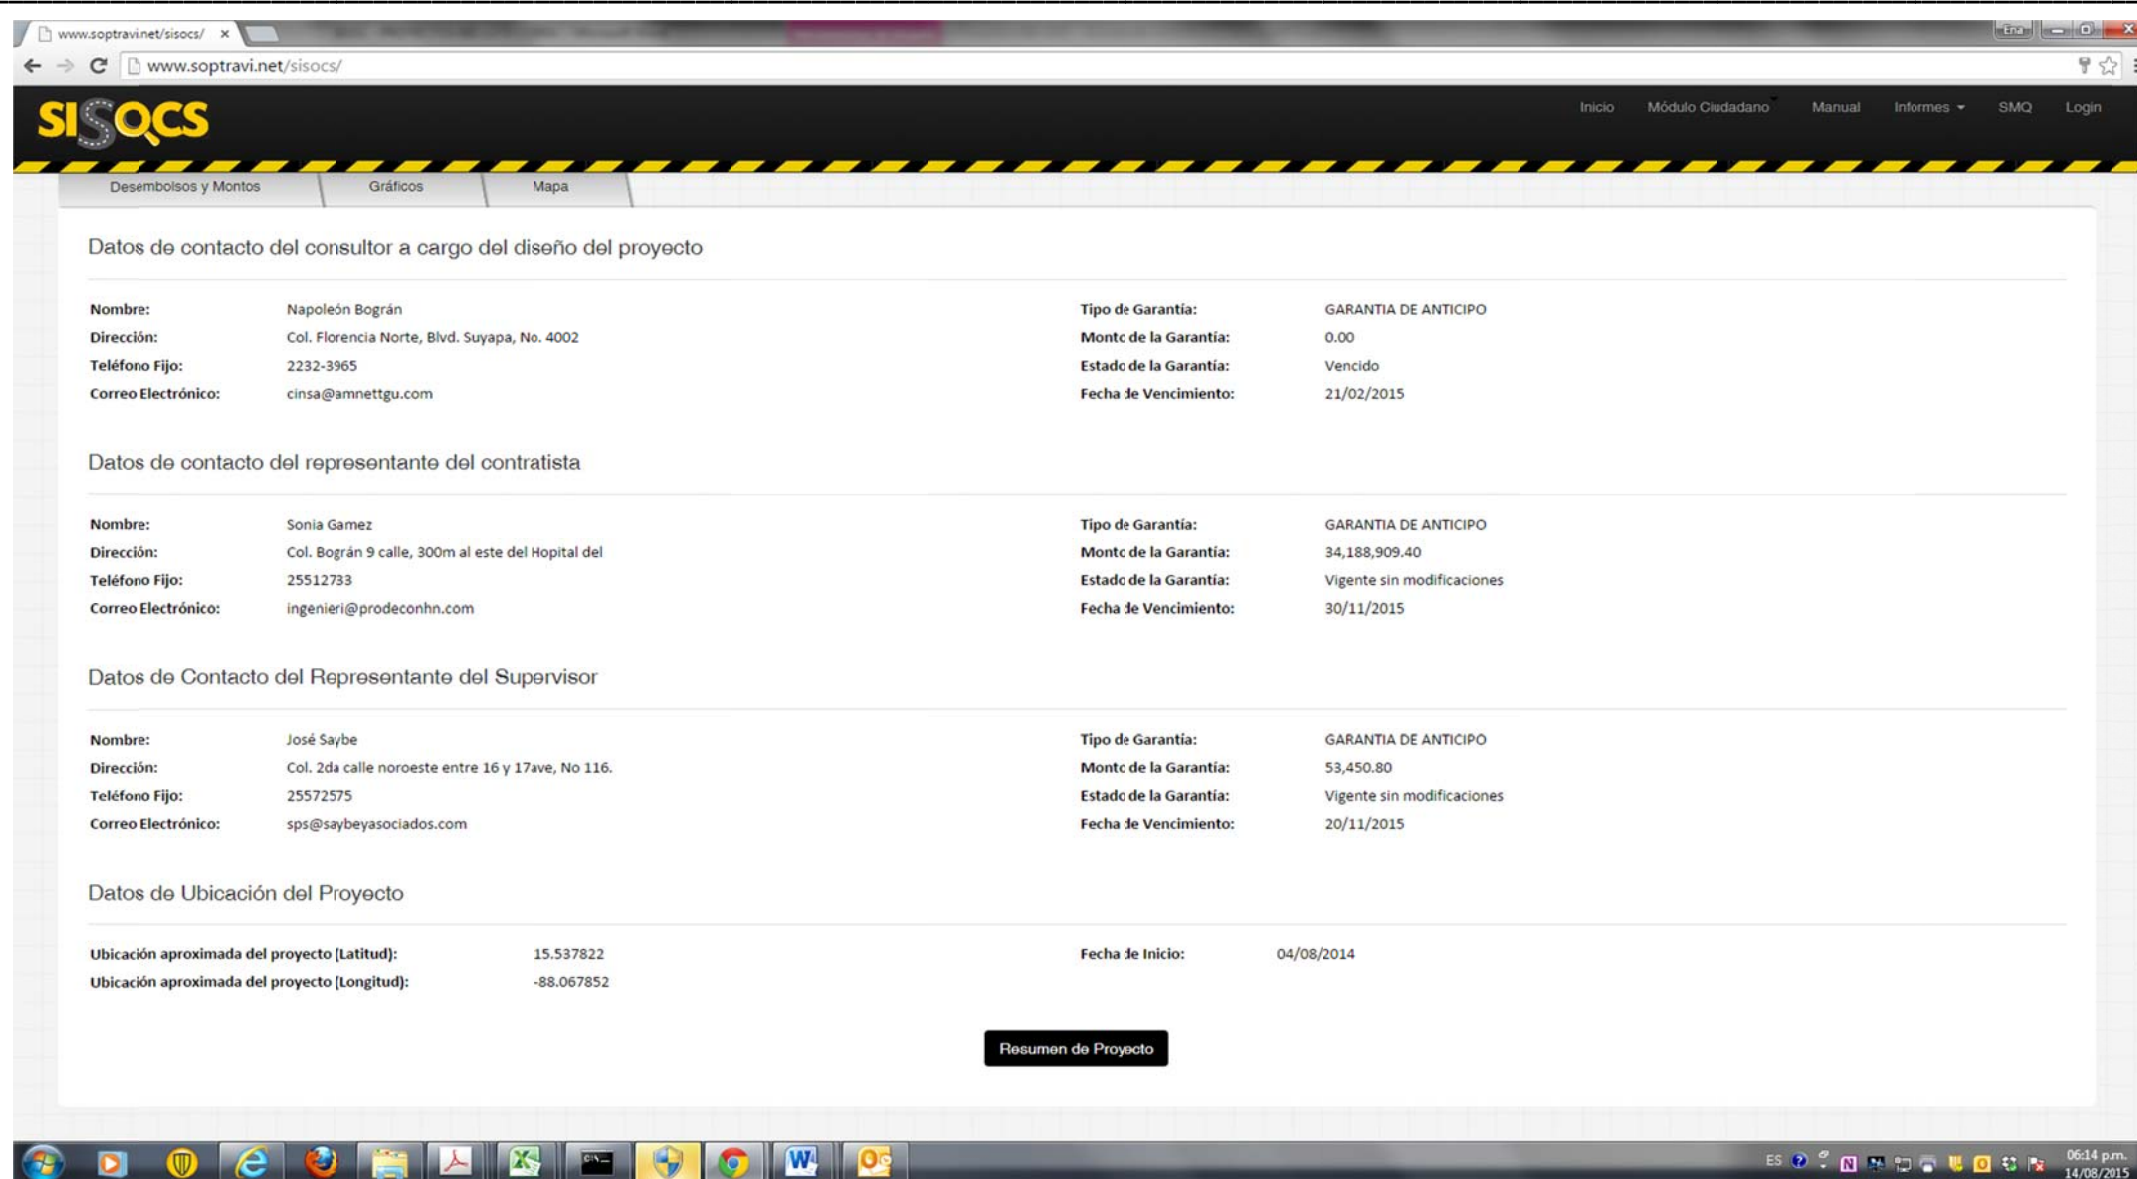

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the 'SISQCS' logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. Below the header, there are tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area is divided into four sections:

- Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto:**

Nombre:	Napoleón Bográn	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, No. 4002	Monte de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	2232-3965	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	cinsa@amnettgu.com	Fecha de Vencimiento:	21/02/2015
- Datos de contacto del representante del contratista:**

Nombre:	Sonia Gamez	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Bográn 9 calle, 300m al este del Hospital del	Monte de la Garantía:	34,188,909.40
Teléfono Fijo:	25512733	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	ingenieri@prodeconhn.com	Fecha de Vencimiento:	30/11/2015
- Datos de Contacto del Representante del Supervisor:**

Nombre:	José Saybe	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. 2da calle noroeste entre 16 y 17ave, No 116.	Monte de la Garantía:	53,450.80
Teléfono Fijo:	25572575	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	sps@saybeyasociados.com	Fecha de Vencimiento:	20/11/2015
- Datos de Ubicación del Proyecto:**

Ubicación aproximada del proyecto [Latitud]:	15.537822	Fecha de Inicio:	04/08/2014
Ubicación aproximada del proyecto [Longitud]:	-88.067852		

At the bottom of the page, there is a button labeled 'Resumen de Proyecto'.

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)-Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

www.insep.gov.hn/sisocs/

Inicio Módulo Ciudadano Menu Catálogos Admin. Usuarios Manual Informes SMQ Cerrar sesión (esanchez)

Ciudadano /

Planificación del Programa Planificación del Proyecto Invitación y Calificación Adjudicación Contratación Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances


Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

Nro.	Descripción	Monto	Fecha Desembolso
1	Pago del Anticipo del Proyecto	341,888,909.43	23/07/2014
2	Estimación No. 1 correspondiente al Período del 04 de Agosto al 25 de Septiembre de 2014.	1,806,349.74	11/12/2014
3	Estimación No. 2 correspondiente al Período del 26 de Septiembre al 25 de Octubre de 2014.	9,760,528.94	11/12/2014
4	Estimación No. 3 correspondiente al Período del 26 de Octubre al 25 de Noviembre de 2014.	10,455,356.55	13/12/2014
5	Estimación No. 4a correspondiente al Período del 26 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2014.	5,919,461.02	13/12/2014
6	Estimación No. 4b correspondiente al Período del 11 al 25 de Diciembre de 2014.	4,542,548.75	05/02/2015
7	Estimación No. 5 correspondiente al Período del 26 de Diciembre de 2014 al 25 de Enero de 2015.	9,094,534.73	12/03/2015
8	Estimación No. 6 correspondiente al Período del 26 de Enero al 25 de Febrero de 2015.	11,252,315.67	25/03/2015
9	Estimación No. 7 correspondiente al Período del 26 de Febrero al 25 de Marzo de 2015.	15,146,605.41	30/04/2015
10	Estimación No. 8 correspondiente al Período del 26 de Marzo al 25 de Abril de 2015.	8,069,365.84	25/05/2015
11	Estimación No. 9 correspondiente al Período del 26 de Abril al 25 de Mayo de 2015.	10,179,587.40	29/06/2015
12	Estimación No. 10 correspondiente al Período del 26 de Mayo al 25 de Junio de 2015.	5,170,250.62	07/08/2015
13	Estimación No. 11 correspondiente al Período del 26 de Junio al 25 de Julio de 2015.	3,888,851.01	02/09/2015
14	Estimación No. 12 correspondiente al Período del 26 de Julio al 25 de Agosto de 2015.	5,666,138.26	19/10/2015
15	Estimación No. 13 correspondiente al Período del 26 de Agosto al 25 de Septiembre de 2015.	7,053,007.65	11/11/2015
16	Estimación No. 14 correspondiente al Período del 26 de Septiembre al 25 de Octubre de 2015.	11,041,746.70	11/12/2015
17	Estimación No. 15 correspondiente al Período del 26 de Octubre al 03 de Noviembre de 2015.	4,854,440.08	14/12/2015
18	Devolución 50% de Retención de Calidad (Primer Pago).	8,782,802.55	14/12/2015
19	Devolución 50% de Retención de Calidad (Segundo Pago).	8,782,802.55	14/12/2015

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

05:21 p.m. 12/02/2016

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)- Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

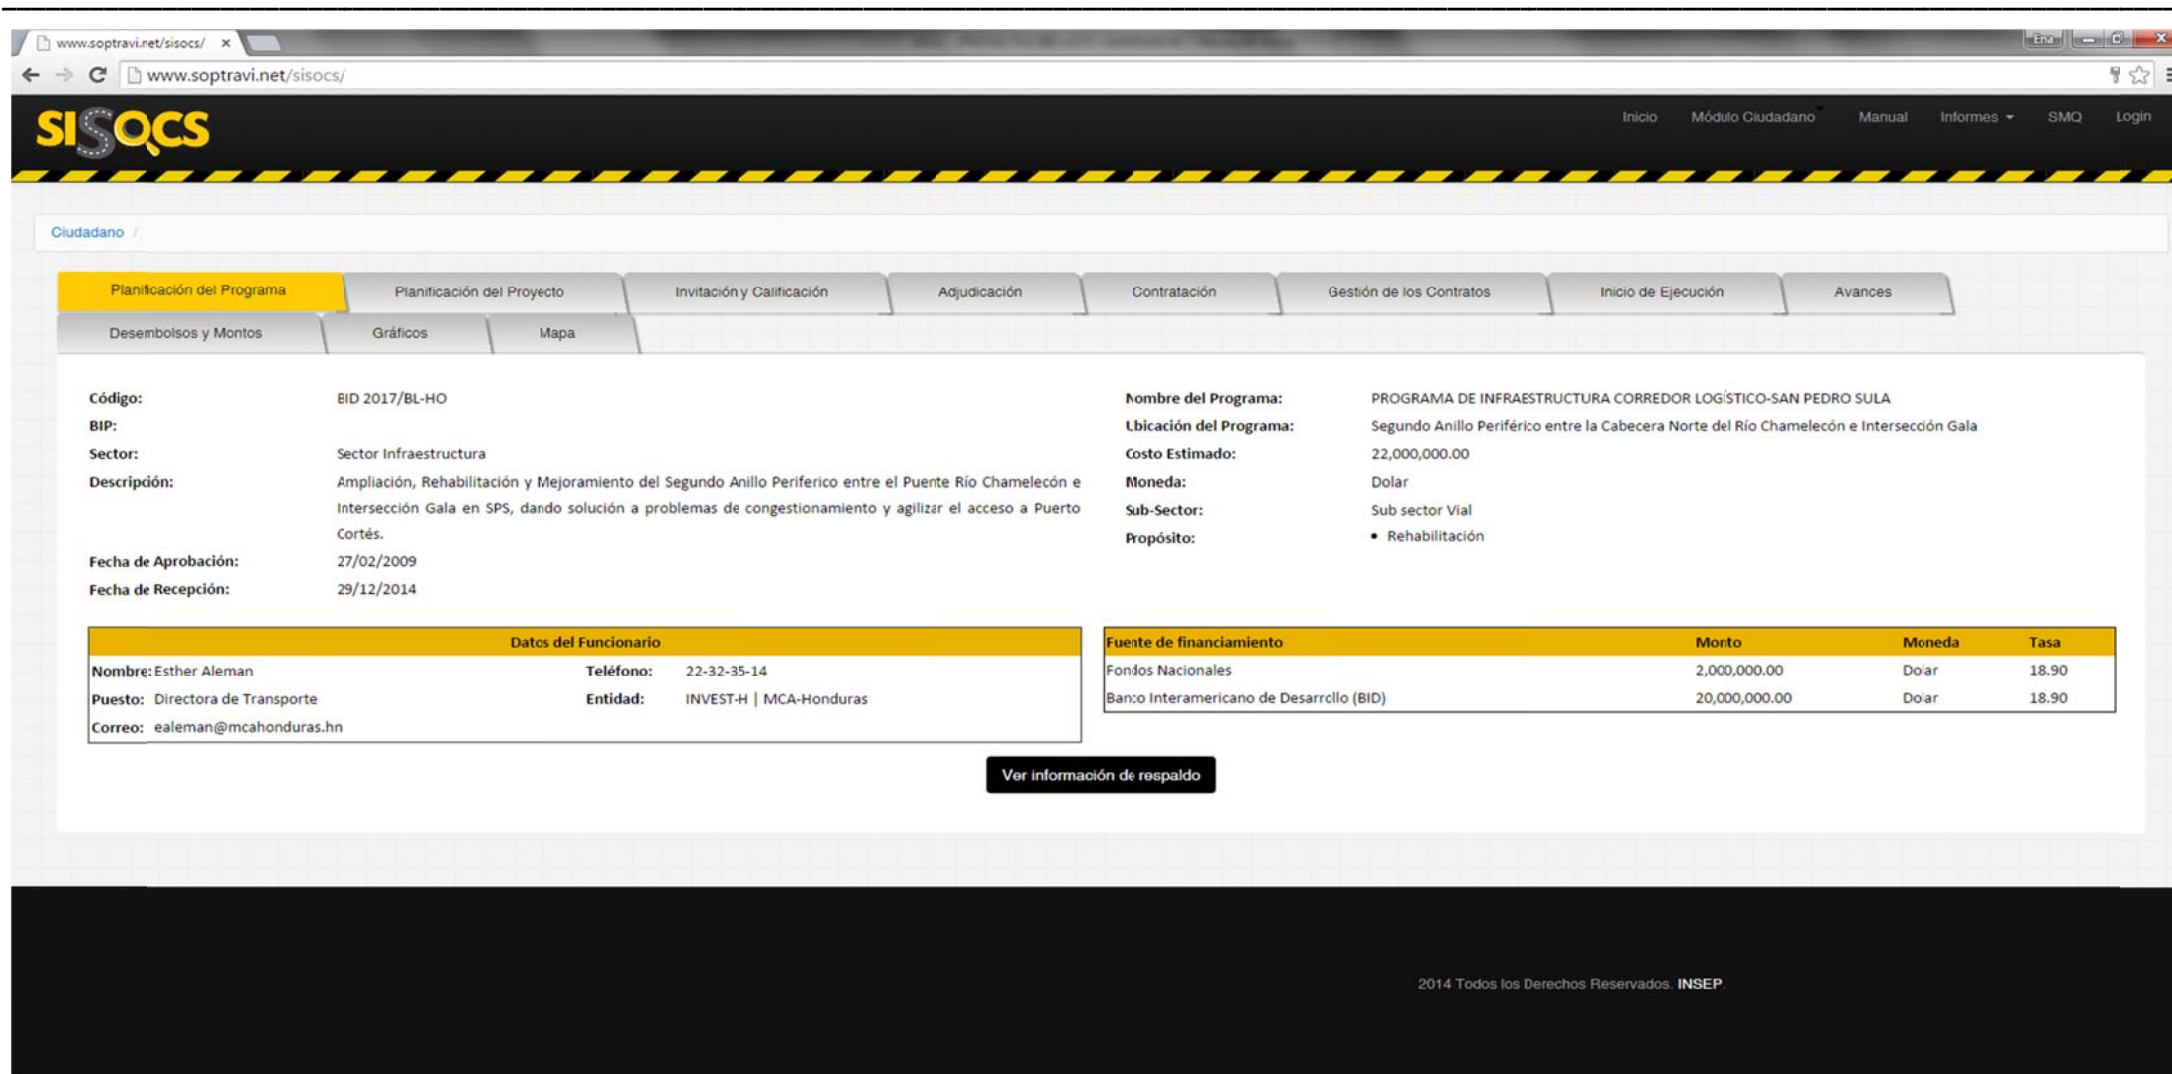

The screenshot shows the SISQCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SISQCS logo and menu items: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: Ciudadano / Planificación del Programa. The main content area is divided into several sections:


- Planificación del Programa** (highlighted): Includes sub-sections for Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa.
- Project Details:**
 - Código:** BID 2017/BL-HO
 - BIP:** (blank)
 - Sector:** Sector Infraestructura
 - Descripción:** Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periferico entre el Puente Río Chamelecón e Intersección Gala en SPS, dando solución a problemas de congestamiento y agilizar el acceso a Puerto Cortés.
 - Fecha de Aprobación:** 27/02/2009
 - Fecha de Recepción:** 29/12/2014
- Program Information:**
 - Nombre del Programa:** PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGÍSTICO-SAN PEDRO SULA
 - Ubicación del Programa:** Segundo Anillo Periférico entre la Cabecera Norte del Río Chamelecón e Intersección Gala
 - Costo Estimado:** 22,000,000.00
 - Moneda:** Dolar
 - Sub-Sector:** Sub sector Vial
 - Propósito:**
 - Rehabilitación
- Datos del Funcionario:**
 - Nombre:** Esther Aleman
 - Puesto:** Directora de Transporte
 - Correo:** ealeman@mcahonduras.hn
 - Teléfono:** 22-32-35-14
 - Entidad:** INVEST-H | MCA-Honduras
- Fuente de financiamiento:**

Fuente de financiamiento	Monto	Moneda	Tasa
Fondos Nacionales	2,000,000.00	Dolar	18.90
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	20,000,000.00	Dolar	18.90

At the bottom of the main content area, there is a button labeled "Ver información de respaldo".

At the bottom of the page, there is a footer: "2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP".

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)- Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

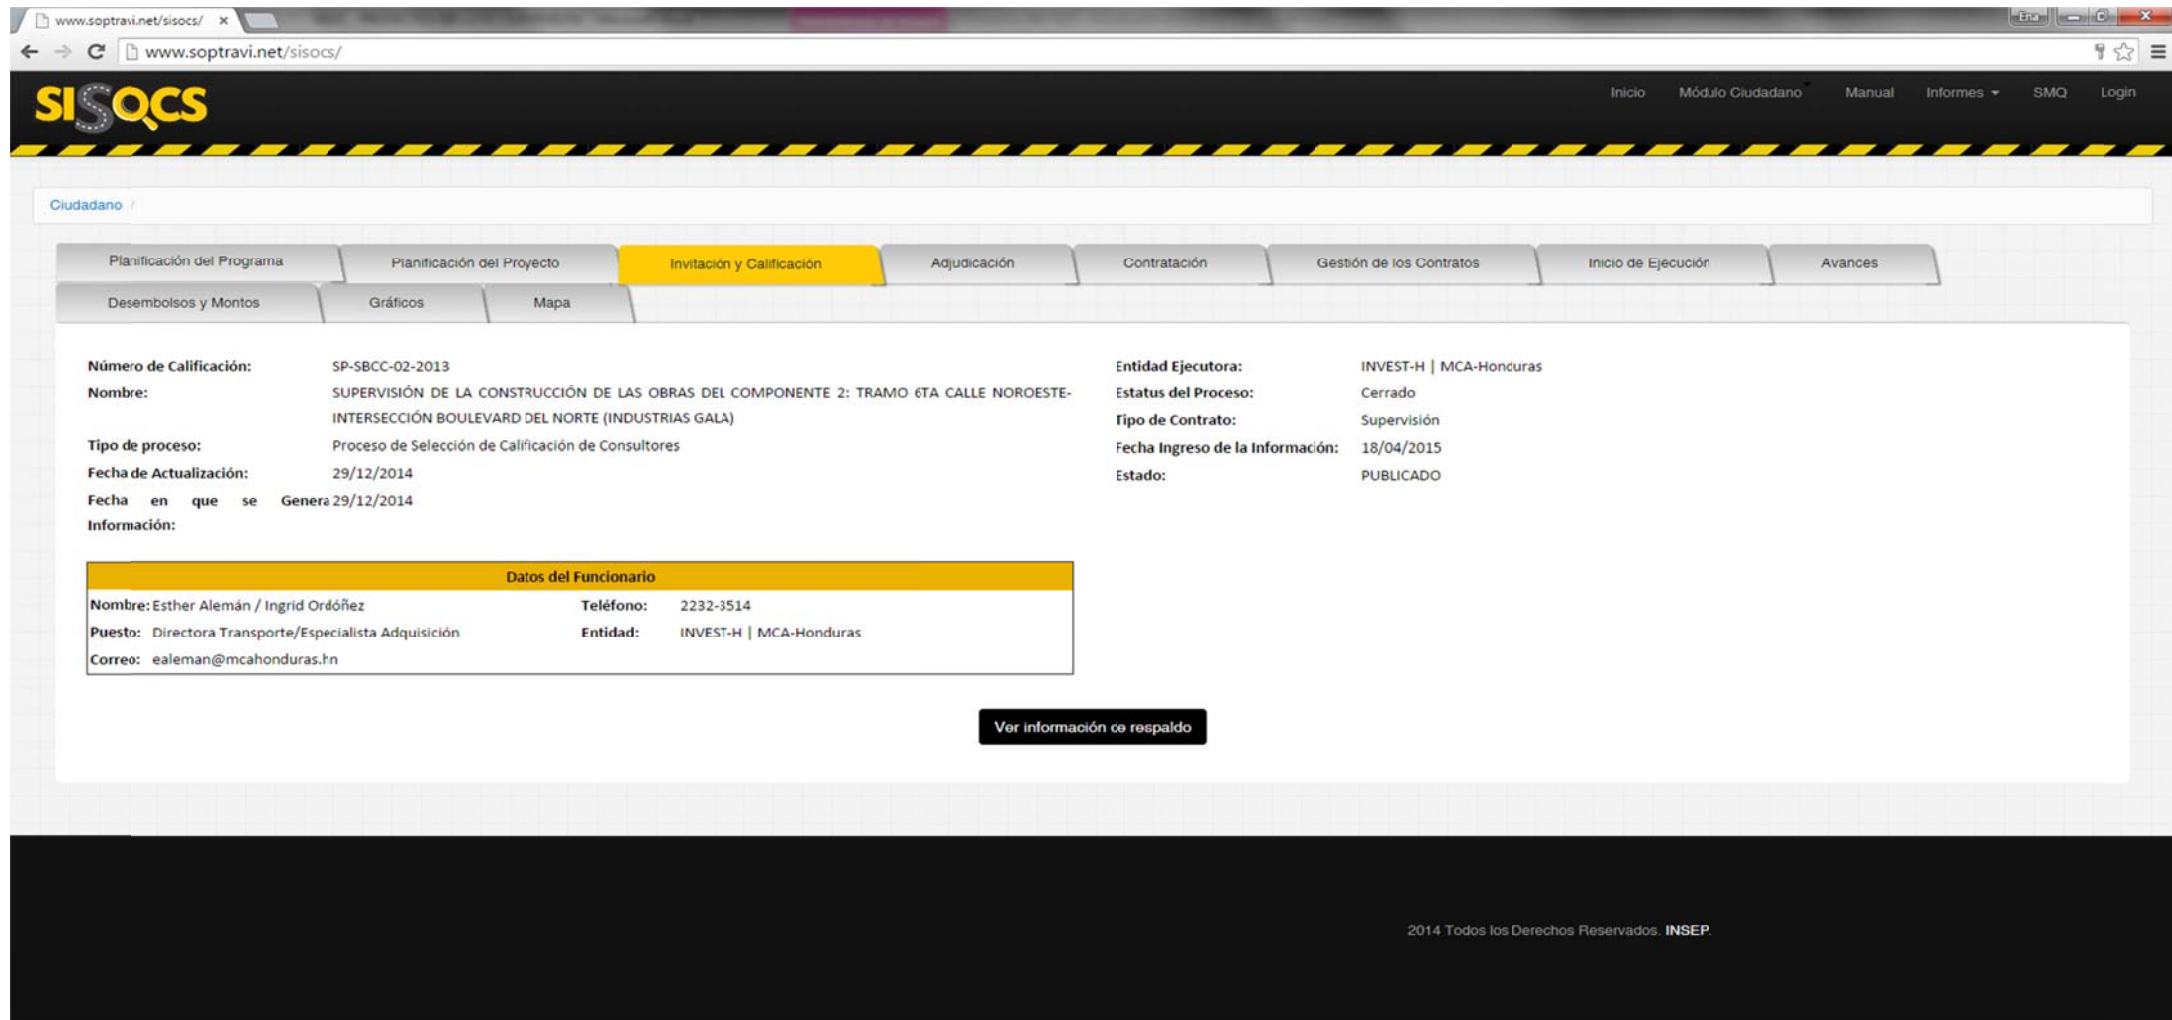

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The page header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. A breadcrumb trail shows 'Ciudadano /'. A horizontal menu contains tabs for: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, **Invitación y Calificación** (highlighted), Adjudicación, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below this, a sub-menu includes Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa. The main content area displays the following information:

Número de Calificación:	SP-SBCC-02-2013	Entidad Ejecutora:	INVEST-H MCA-Honduras
Nombre:	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2: TRAMO 6TA CALLE NOROESTE- INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA)	Estatus del Proceso:	Cerrado
Tipo de proceso:	Proceso de Selección de Calificación de Consultores	Tipo de Contrato:	Supervisión
Fecha de Actualización:	29/12/2014	Fecha Ingreso de la Información:	18/04/2015
Fecha en que se Genera:	29/12/2014	Estado:	PUBLICADO


Información:

Datos del Funcionario	
Nombre: Esther Alemán / Ingrid Ordóñez	Teléfono: 2232-3514
Puesto: Directora Transporte/Especialista Adquisición	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras
Correo: ealeman@mcahonduras.hn	

Ver información de respaldo

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)- Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

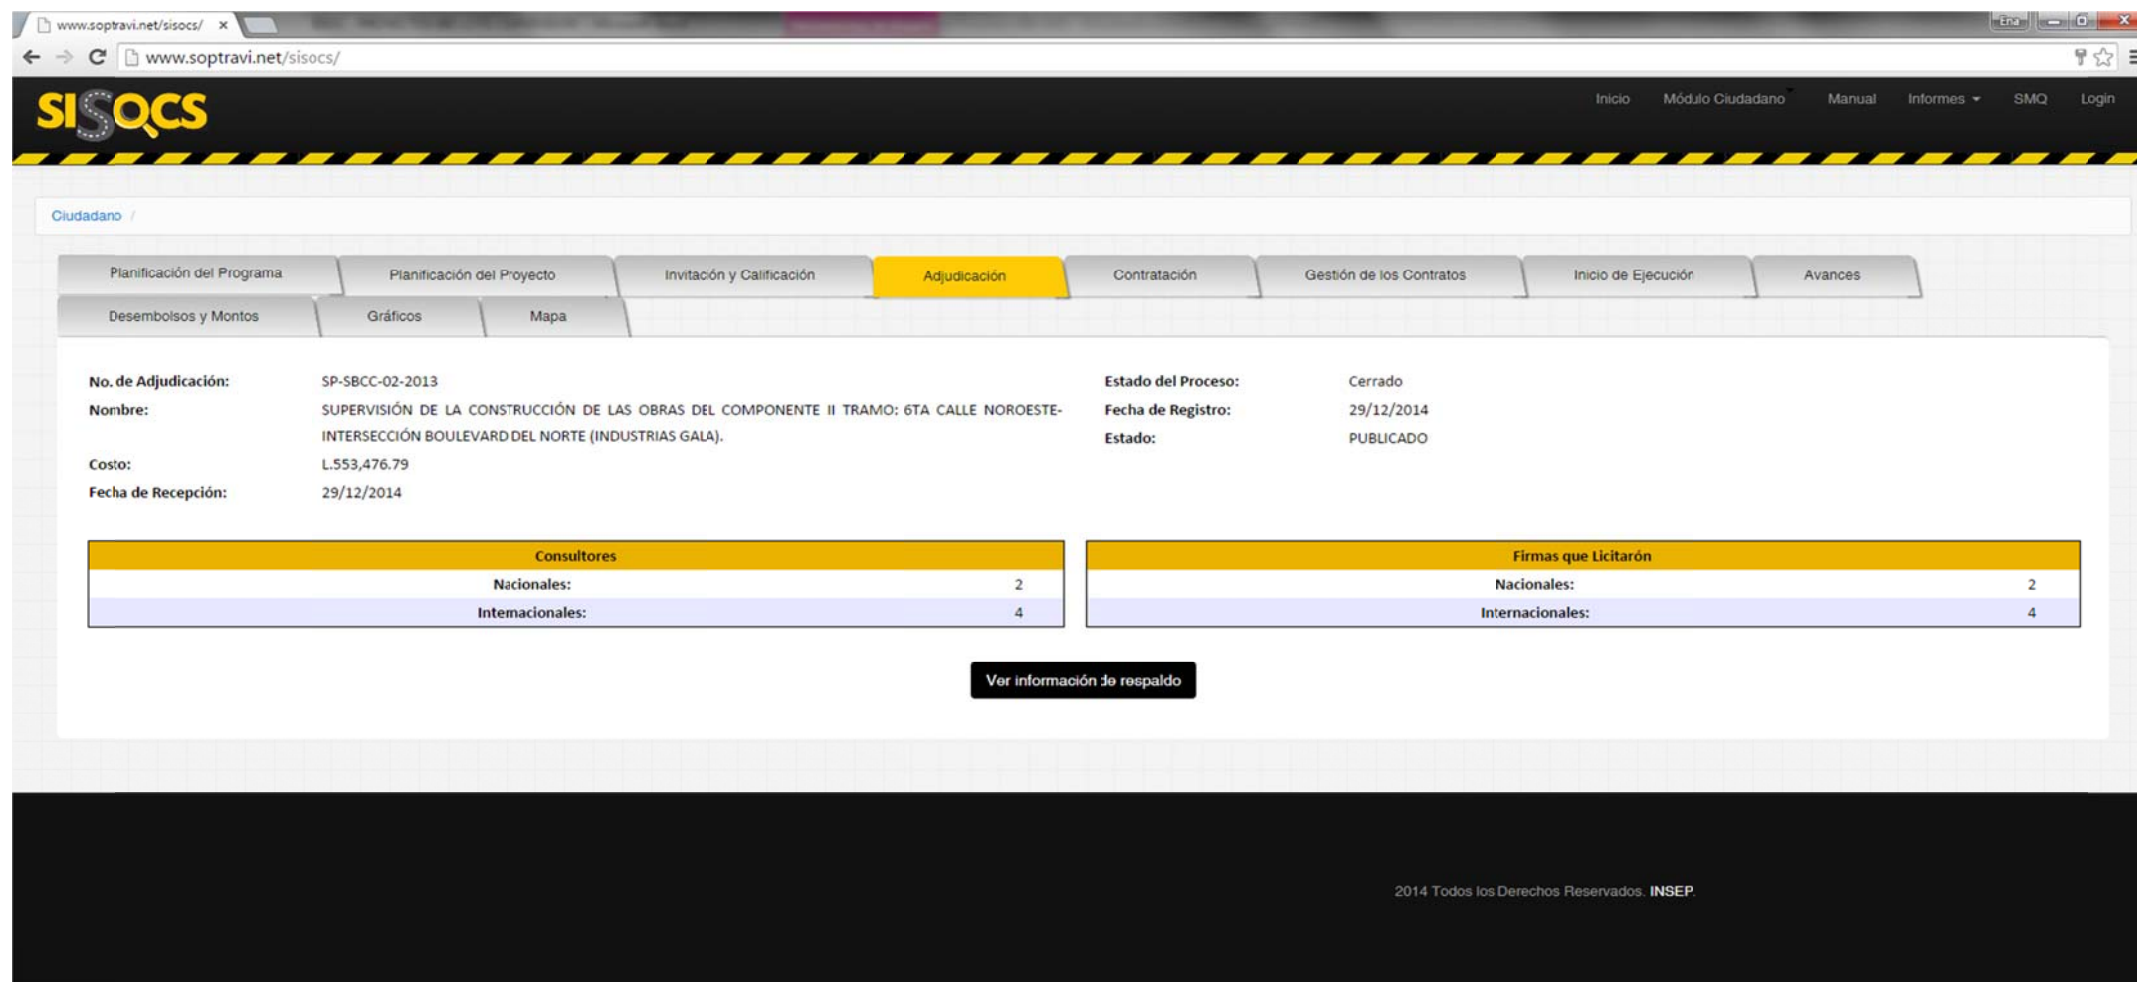

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. The main content area is titled 'Ciudadano /' and features a horizontal menu with tabs: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación (highlighted), Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the menu, there are sub-tabs: Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa. The main content area displays project details for the 'Adjudicación' phase:

No. de Adjudicación:	SP-SBCC-02-2013	Estado del Proceso:	Cerrado
Nombre:	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE II TRAMO: 6TA CALLE NOROESTE- INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA).	Fecha de Registro:	29/12/2014
Costo:	L.553,476.79	Estado:	PUBLICADO
Fecha de Recepción:	29/12/2014		


Below the details, there are two summary tables:

Consultores	
Nacionales:	2
Internacionales:	4

Firmas que Licitaron	
Nacionales:	2
Internacionales:	4

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the summary tables. At the bottom of the page, a footer reads '2014 Todos los Derechos Reservados INSEP'.

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)- Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

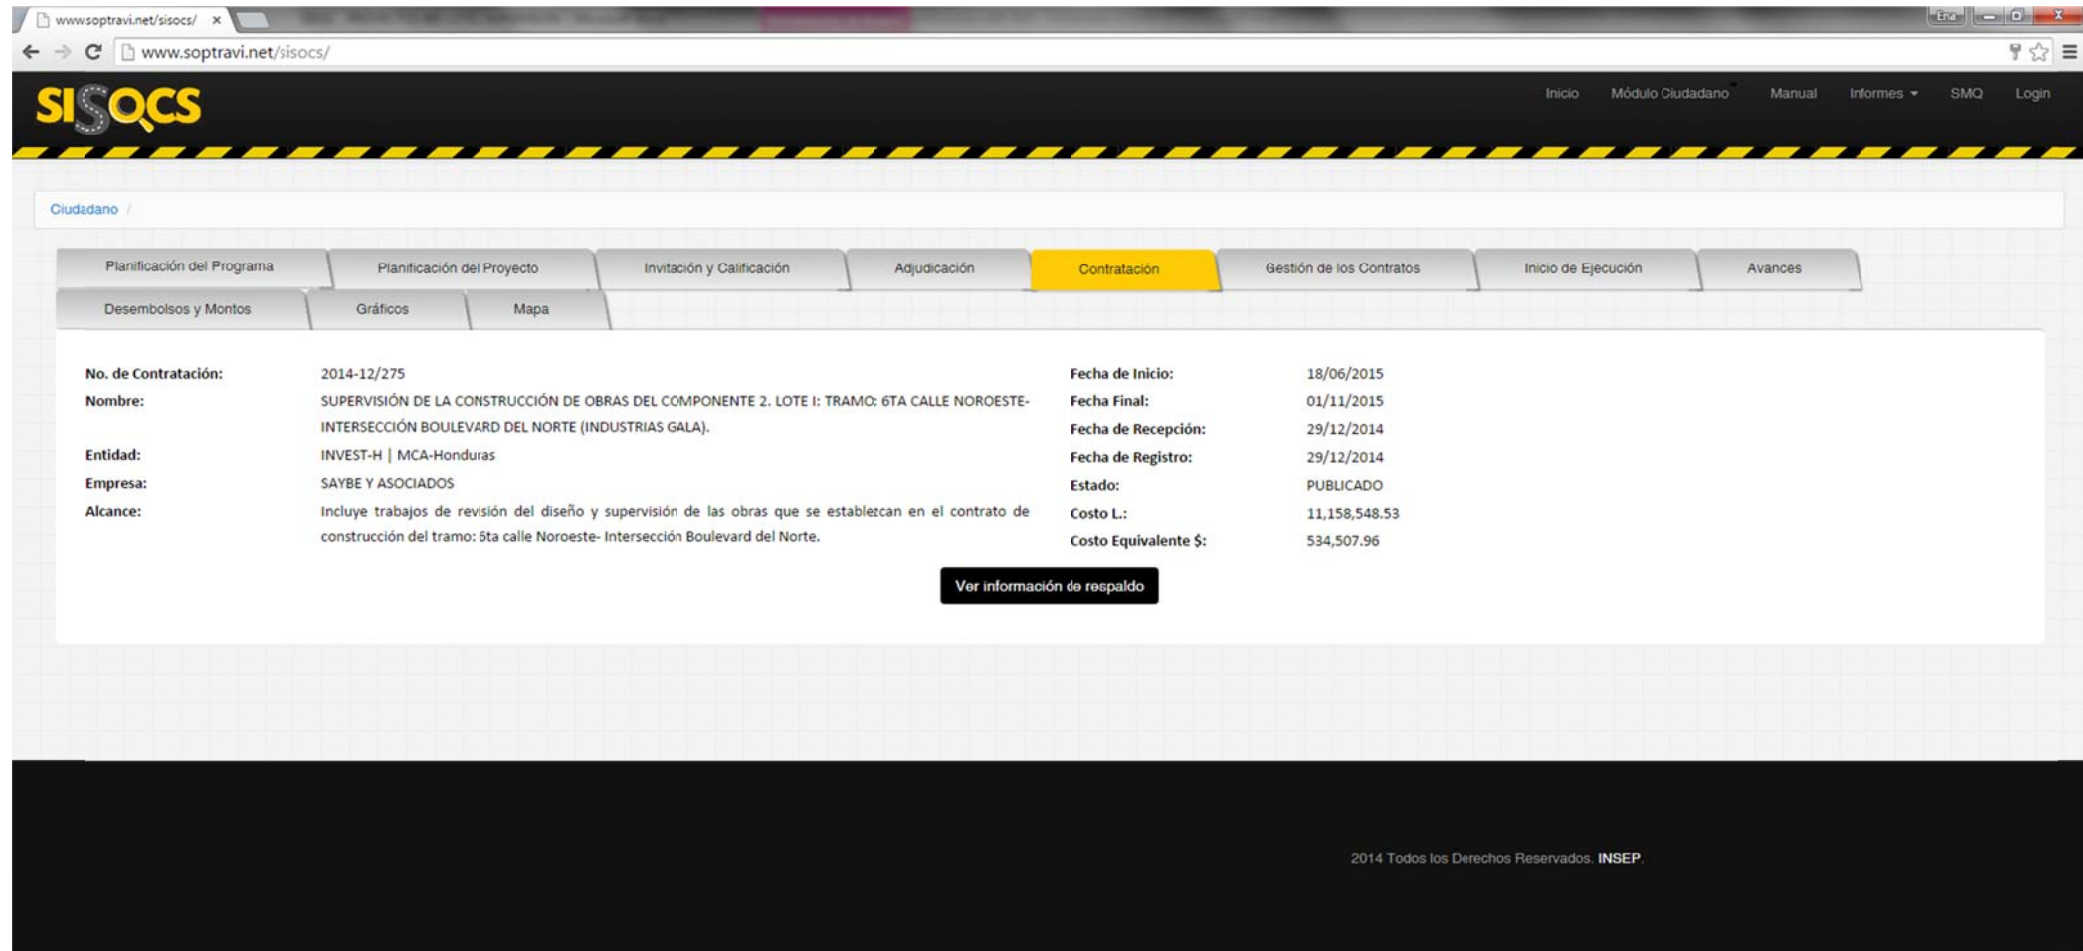


The screenshot shows the SISQCS web application interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Módulo Ciudadano', 'Manual', 'Informes', 'SMQ', and 'Login'. The main content area displays a breadcrumb 'Ciudadano /' and a series of tabs for project stages: 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Ajudicación', 'Contratación' (highlighted), 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. Below these tabs, a detailed view of a contract is shown with the following information:

No. de Contratación:	2014-12/275	Fecha de Inicio:	18/06/2015
Nombre:	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL COMPONENTE 2. LOTE I: TRAMO: 6TA CALLE NOROESTE- INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA).	Fecha Final:	01/11/2015
Entidad:	INVEST-H MCA-Honduras	Fecha de Recepción:	29/12/2014
Empresa:	SAYBE Y ASOCIADOS	Fecha de Registro:	29/12/2014
Alcance:	Incluye trabajos de revisión del diseño y supervisión de las obras que se establezcan en el contrato de construcción del tramo: 5ta calle Noroeste- Intersección Boulevard del Norte.	Estado:	PUBLICADO
		Costo L.:	11,158,548.53
		Costo Equivalente \$:	534,507.96

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the contract details.

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)- Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

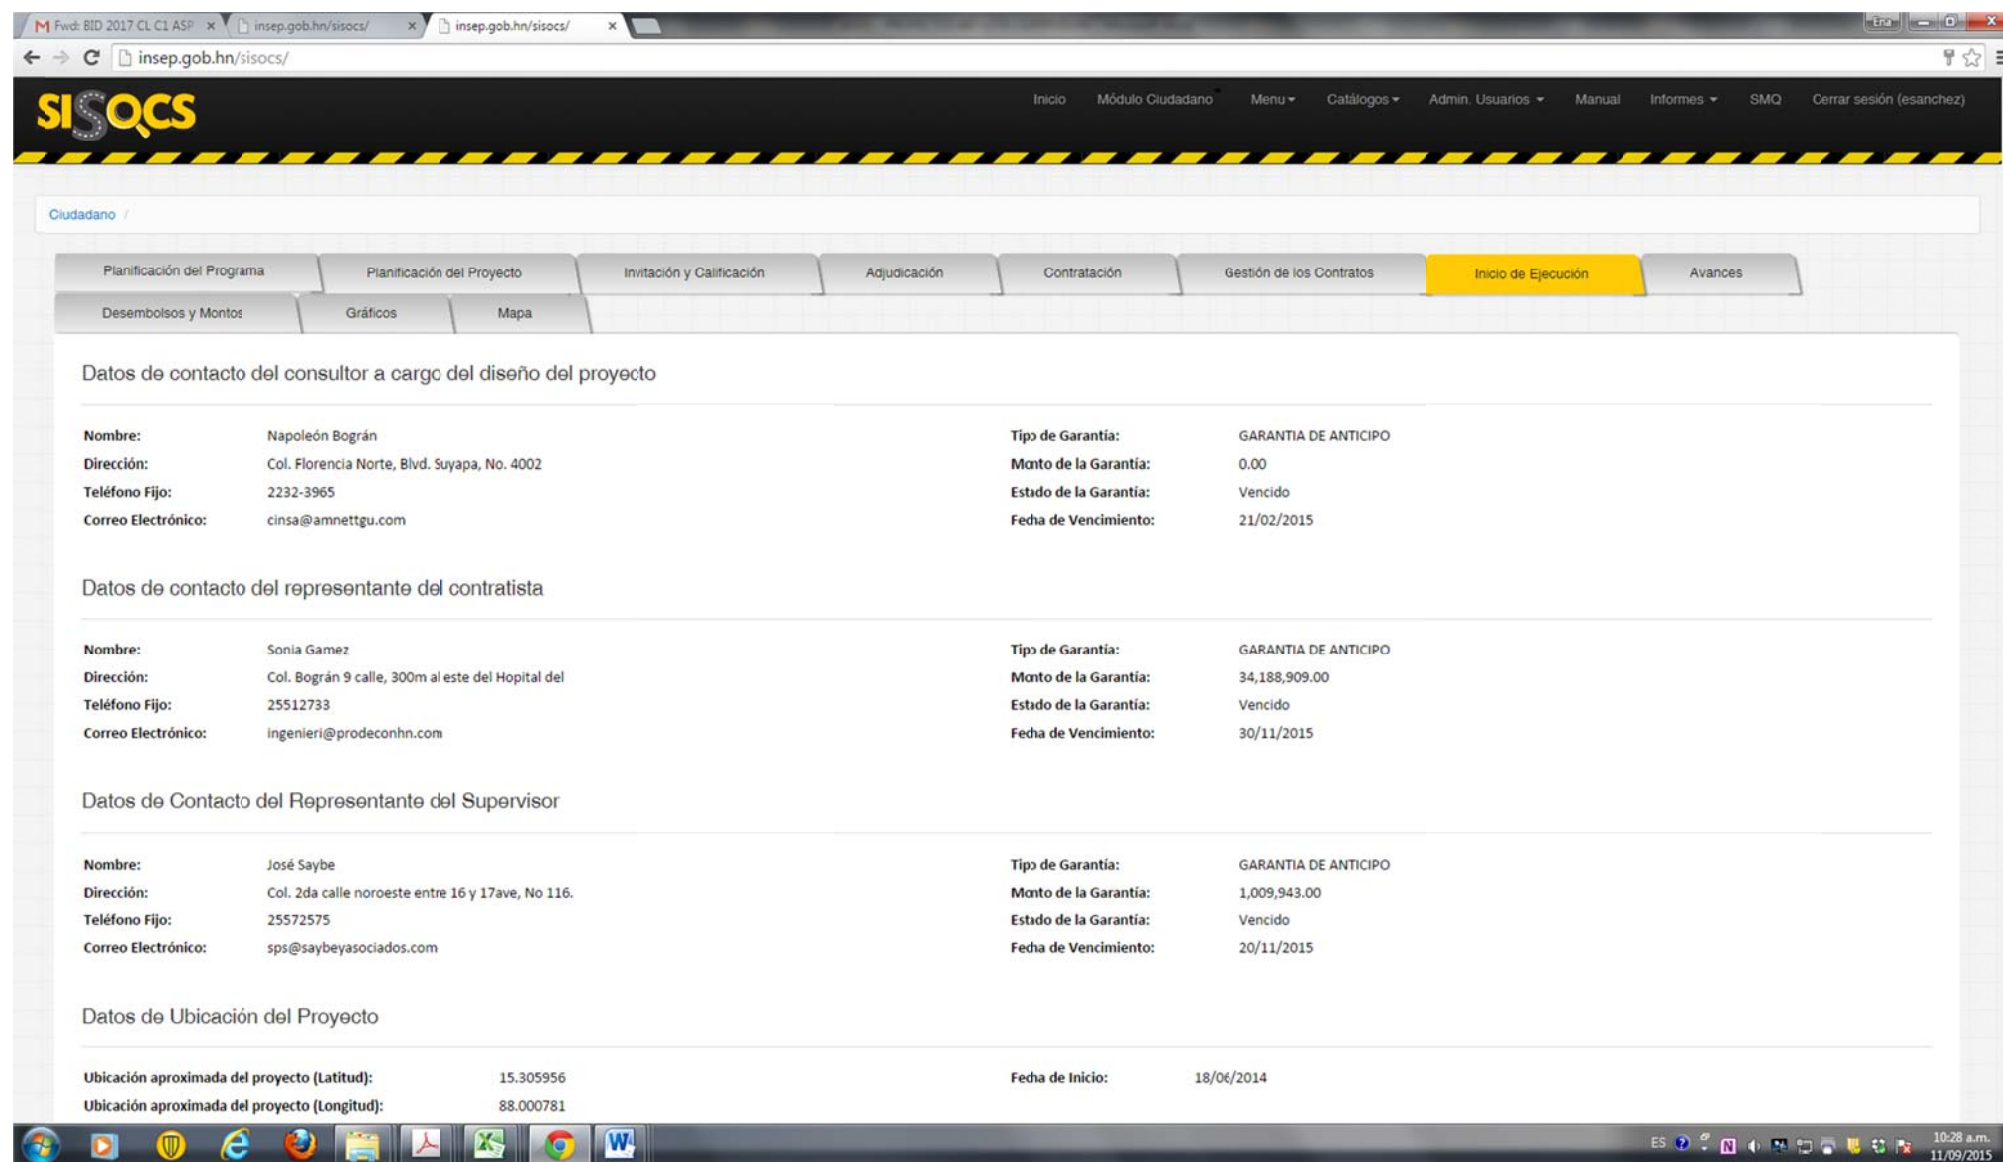

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'insep.gob.hn/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Menu, Catálogos, Admin. Usuarios, Manual, Informes, SMO, and Cerrar sesión (esanchez). Below the header is a navigation bar with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Ajudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución' (highlighted), and 'Avances'. Under 'Inicio de Ejecución', there are sub-tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area is titled 'Ciudadano /' and contains three sections of contact information:

Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto

Nombre:	Napoleón Bográn	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, No. 4002	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	2232-3965	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	cinsa@amnettgu.com	Fecha de Vencimiento:	21/02/2015

Datos de contacto del representante del contratista

Nombre:	Sonia Gamez	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Bográn 9 calle, 300m al este del Hospital del	Monto de la Garantía:	34,188,909.00
Teléfono Fijo:	25512733	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	ingenieri@prodeconhn.com	Fecha de Vencimiento:	30/11/2015

Datos de Contacto del Representante del Supervisor

Nombre:	José Saybe	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. 2da calle noroeste entre 16 y 17ave, No 116.	Monto de la Garantía:	1,009,943.00
Teléfono Fijo:	25572575	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	sps@saybeyasociados.com	Fecha de Vencimiento:	20/11/2015

Datos de Ubicación del Proyecto

Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	15.305956	Fecha de Inicio:	18/06/2014
Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	88.000781		

The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 10:28 a.m. on 11/09/2015.

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote I: De la Estación 13+600 (200 M. delante de la Cabecera Norte del Puente Río Bermejo)- Intersección con el Boulevard del Norte (Industrias Gala) L= 4.4 Km.

www.insep.gob.hn/sisocs/

SISQCS Menú Proyectos Inicio Módulo Ciudadano Menu Catálogos Admin. Usuarios Manual Informes SMQ Cerrar sesión (esanchez)


Ciudadano /

Planificación del Programa Planificación del Proyecto Invitación y Calificación Adjudicación Contratación Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances

Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

Nro.	Descripción	Monto	Fecha Desembolso
1	Pago de Anticipo del Proyecto.	1,119,943.92	13/06/2014
2	Pago No. 1 correspondiente al Informe Inicial del Proyecto.	1,019,440.06	23/09/2014
3	Pago No. 2 correspondiente al Informe No. 1 (Mes de Julio/2014) e Informe No. 2 (Mes de Agosto/2014).	1,028,203.00	25/11/2014
4	Pago No. 3 correspondiente al Informe No. 3 (Mes de Septiembre/2014) e Informe No. 4 (Mes de Octubre/2014).	1,028,203.00	25/11/2014
5	Pago No. 4 correspondiente al Informe No. 5 (Mes de Noviembre/2014) e Informe No. 6 (Mes de Diciembre/2014).	1,031,718.57	13/12/2014
6	Pago No. 5 correspondiente al Informe No. 7 (Mes de Enero/2015) e Informe No. 8 (Mes de Febrero/2015).	1,050,015.10	09/04/2015
7	Pago No. 6 correspondiente al Informe No. 9 (Mes de Marzo/2015) e Informe No. 10 (Mes de Abril/2015).	1,049,950.15	05/06/2015
8	Pago No. 7 correspondiente al Informe No. 11 (Mes de Mayo/2015) e Informe No. 12 (Mes de Junio/2015).	1,051,638.66	28/07/2015
9	Pago No. 8 correspondiente al Informe No. 13 (Mes de Julio/2015) e Informe No. 14 (Mes de Agosto/2015).	1,055,063.31	15/10/2015
10	Pago No. 9 correspondiente al Informe No. 15 (Mes de Septiembre/2015) e Informe No. 16 (Mes de Octubre/2015).	531,616.55	01/12/2015
11	Pago Complementario presentación del Informe de Diseños y Reparaciones.	356,153.93	22/02/2016
12	Pago Complementario No. 1 presentación del Anexo al Informe Mensual No. 16.	158,400.90	22/02/2016
13	Pago No. 10 correspondiente a la presentación del Borrador del Informe Final del Proyecto Componente 2 Lote I.	677,775.00	11/05/2016
14	Pago No. 11 correspondiente a la presentación del Informe Final del Proyecto Componente 2 Lote I.	947,264.89	29/06/2016

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

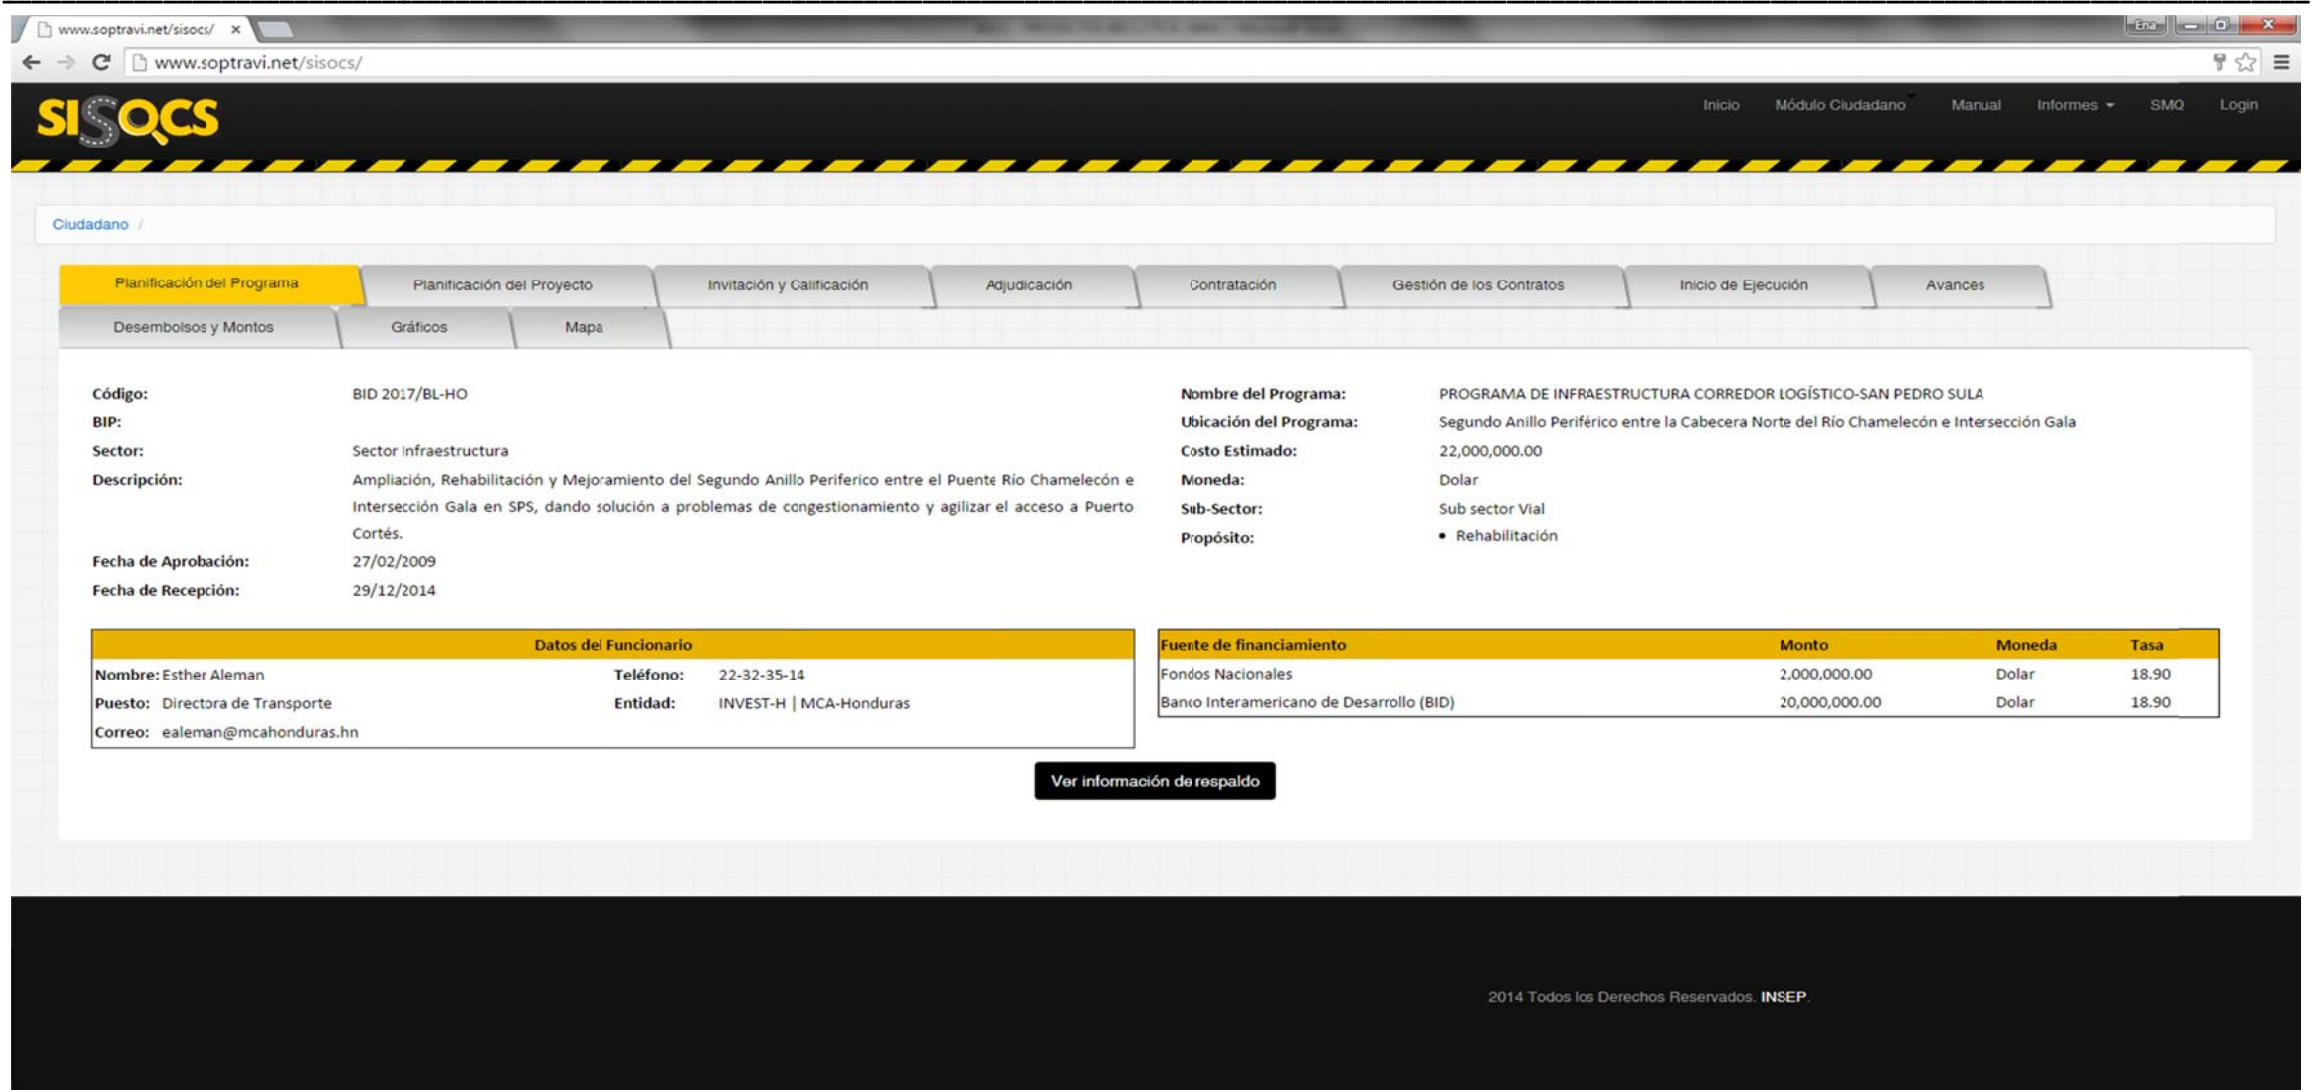

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. The main content area is titled 'Ciudadano /' and features a series of tabs for project management stages: Planificación del Programa (selected), Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below these tabs are sub-tabs for Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa. The main content area displays project details in two columns:

Código:	BID 2017/BL-HO	Nombre del Programa:	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGÍSTICO-SAN PEDRO SULA
BIP:		Ubicación del Programa:	Segundo Anillo Periférico entre la Cabecera Norte del Río Chamelecón e Intersección Gala
Sector:	Sector infraestructura	Costo Estimado:	22,000,000.00
Descripción:	Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periférico entre el Puente Río Chamelecón e Intersección Gala en SPS, dando solución a problemas de congestionamiento y agilizar el acceso a Puerto Cortés.	Moneda:	Dolar
Fecha de Aprobación:	27/02/2009	Sub-Sector:	Sub sector Vial
Fecha de Recepción:	29/12/2014	Propósito:	• Rehabilitación


Below the details are two tables:

Datos del Funcionario	
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-32-35-14
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras
Correo: ealeman@mcahonduras.hn	

Fuente de financiamiento	Monto	Moneda	Tasa
Fonós Nacionales	2,000,000.00	Dolar	18.90
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	20,000,000.00	Dolar	18.90

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the tables. The footer of the application states '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.'

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

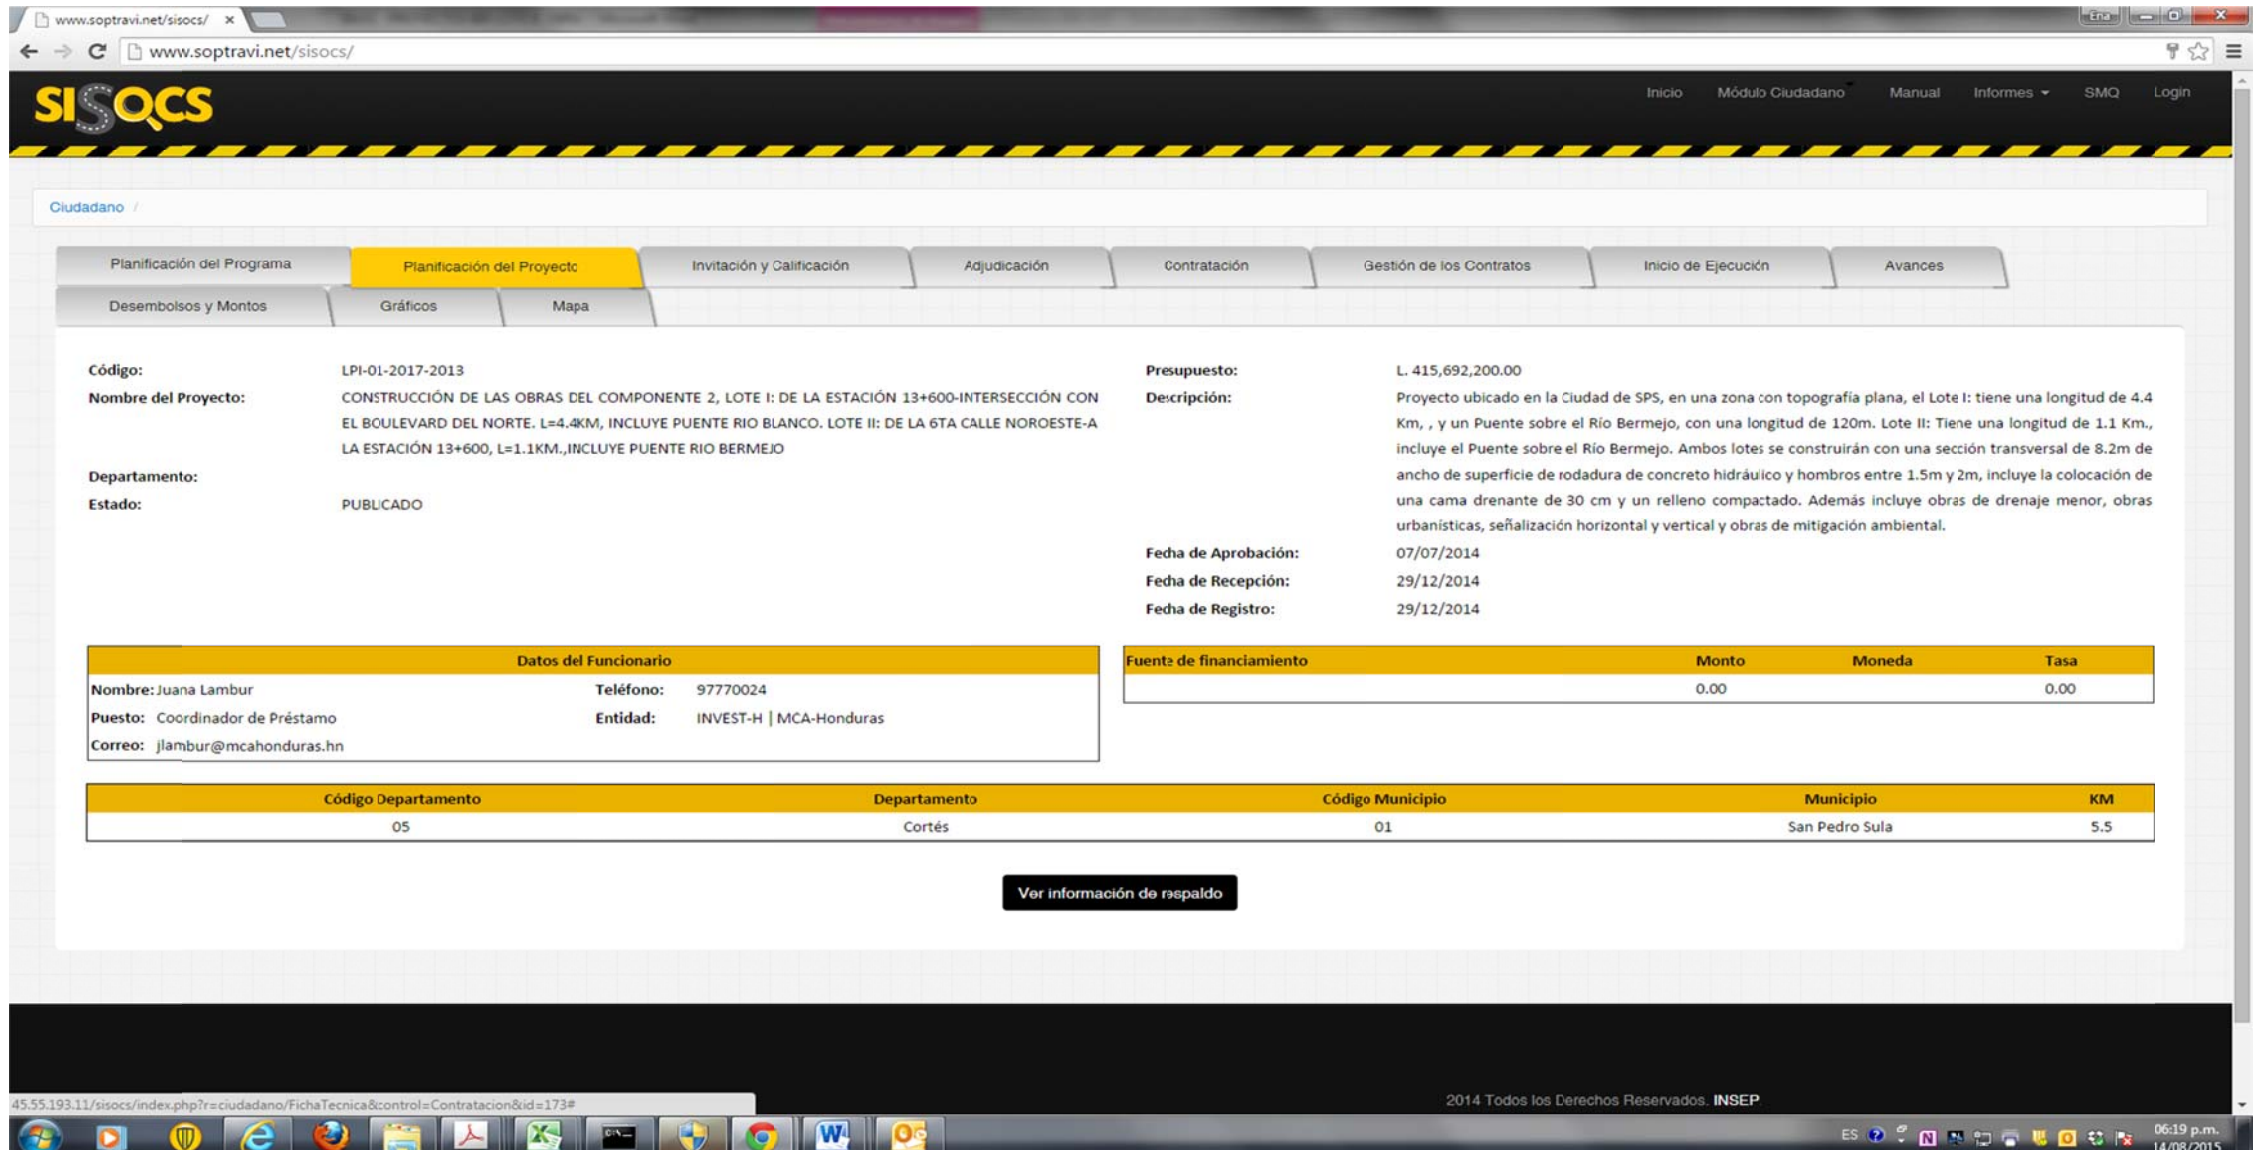

www.soptravi.net/sisocs/

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMQ Login

Ciudadano /

Planificación del Programa | **Planificación del Proyecto** | Invitación y Calificación | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desembolsos y Montos | Gráficos | Mapa

Código: LPI-01-2017-2013
Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE. L=4.4KM, INCLUYE PUENTE RIO BLANCO. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM.,INCLUYE PUENTE RIO BERMEJO
Departamento:
Estado: PUBLICADO

Presupuesto: L. 415,692,200.00
Descripción: Proyecto ubicado en la Ciudad de SPS, en una zona con topografía plana, el Lote I: tiene una longitud de 4.4 Km, , y un Puente sobre el Río Bermejo, con una longitud de 120m. Lote II: Tiene una longitud de 1.1 Km., incluye el Puente sobre el Río Bermejo. Ambos lotes se construirán con una sección transversal de 8.2m de ancho de superficie de rodadura de concreto hidráulico y hombros entre 1.5m y 2m, incluye la colocación de una cama drenante de 30 cm y un relleno compactado. Además incluye obras de drenaje menor, obras urbanísticas, señalización horizontal y vertical y obras de mitigación ambiental.
Fecha de Aprobación: 07/07/2014
Fecha de Recepción: 29/12/2014
Fecha de Registro: 29/12/2014

Datos del Funcionario		Fuente de financiamiento		
Nombre: Juana Lambur	Teléfono: 97770024	Monto	Moneda	Tasa
Puesto: Coordinador de Préstamo	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras	0.00		0.00
Correo: jlambur@mcahonduras.hn				

Código Departamento	Departamento	Código Municipio	Municipio	KM
05	Cortés	01	San Pedro Sula	5.5


[Ver información de respaldo](#)

45.55.193.11/sisocs/index.php?r=ciudadano/FichaTecnica&control=Contratacion&id=173#

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP


ES 06:19 p.m. 14/08/2015

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

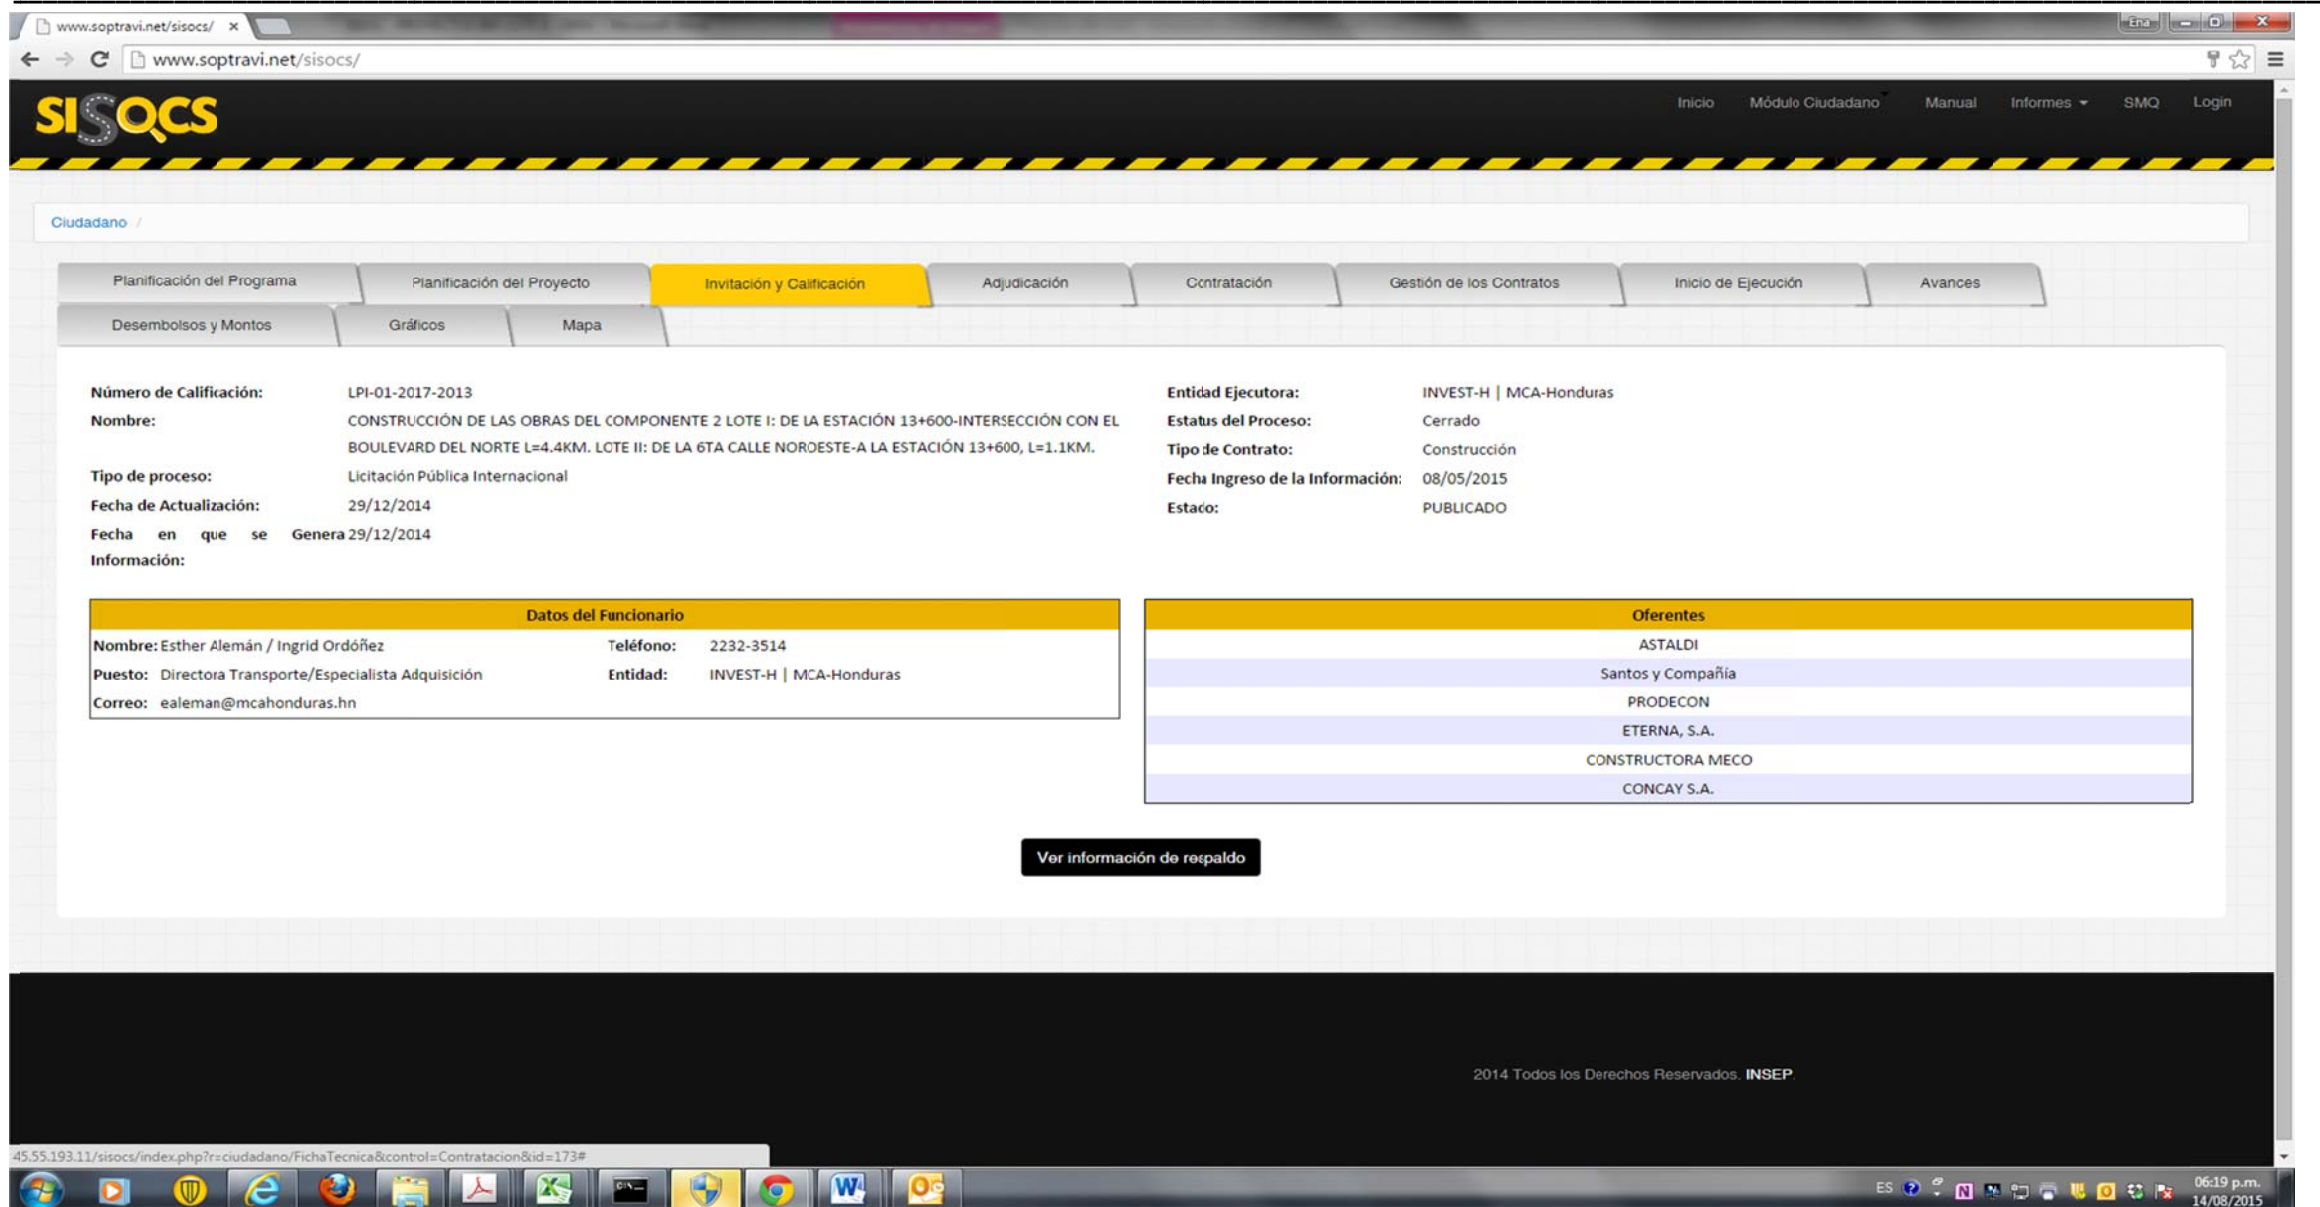

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMO, and Login. The main navigation menu is divided into two rows of tabs. The first row includes 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación' (highlighted), 'Adjudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. The second row includes 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. Below the navigation, the 'Ciudadano /' breadcrumb is visible. The main content area displays project details for the 'Invitación y Calificación' phase. On the left, a list of fields includes: 'Número de Calificación: LPI-01-2017-2013', 'Nombre: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE L=4.4KM. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM.', 'Tipo de proceso: Licitación Pública Internacional', 'Fecha de Actualización: 29/12/2014', and 'Fecha en que se Genera 29/12/2014'. On the right, details for the executing entity are shown: 'Entidad Ejecutora: INVEST-H | MCA-Honduras', 'Estatus del Proceso: Cerrado', 'Tipo de Contrato: Construcción', 'Fecha Ingreso de la Información: 08/05/2015', and 'Estado: PUBLICADO'. Below these details are two tables. The first table, 'Datos del Funcionario', lists: 'Nombre: Esther Alemán / Ingrid Ordóñez', 'Teléfono: 2232-3514', 'Puesto: Directora Transporte/Especialista Adquisición', 'Entidad: INVEST-H | MCA-Honduras', and 'Correo: ealeman@mcahonduras.hn'. The second table, 'Ofertantes', lists: 'ASTALDI', 'Santos y Compañía', 'PRODECON', 'ETERNA, S.A.', 'CONSTRUCTORA MECO', and 'CONCAY S.A.'. A 'Ver información de respaldo' button is located below the tables. The footer of the application states '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP'. The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 06:19 p.m. on 14/08/2015.

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

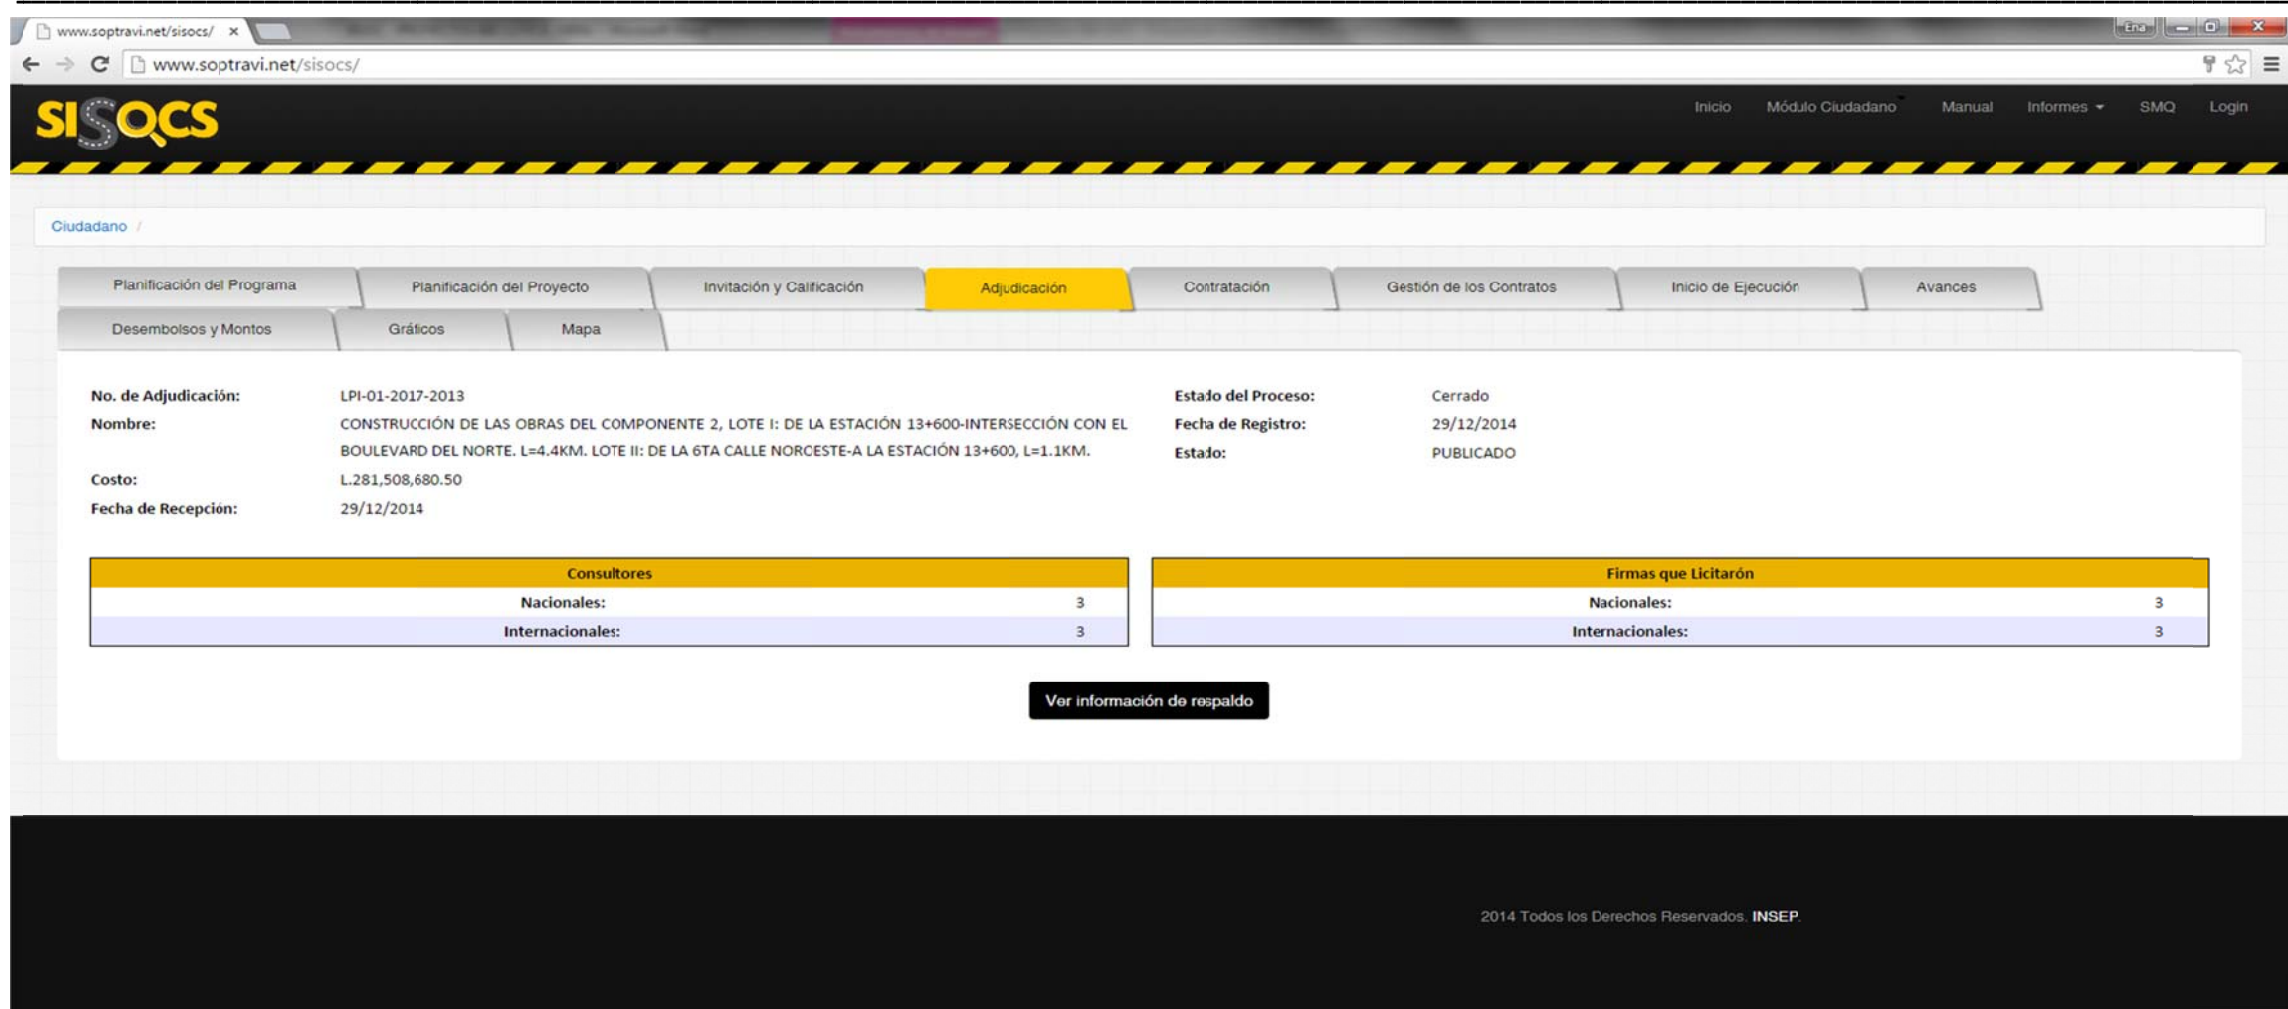

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. The main navigation menu is divided into two rows of tabs. The first row includes 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Adjudicación' (highlighted in yellow), 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. The second row includes 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. Below the navigation, the 'Ciudadano' section displays project details for the 'Adjudicación' phase:

- No. de Adjudicación:** LPI-01-2017-2013
- Nombre:** CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE. L=4.4KM. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NORCESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM.
- Costo:** L.281,508,680.50
- Fecha de Recepción:** 29/12/2014
- Estado del Proceso:** Cerrado
- Fecha de Registro:** 29/12/2014
- Estado:** PUBLICADO


Below the details, there are two summary tables:

Consultores	
Nacionales:	3
Internacionales:	3

Firmas que Licitarón	
Nacionales:	3
Internacionales:	3

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the tables. At the bottom of the page, a footer states '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.'

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

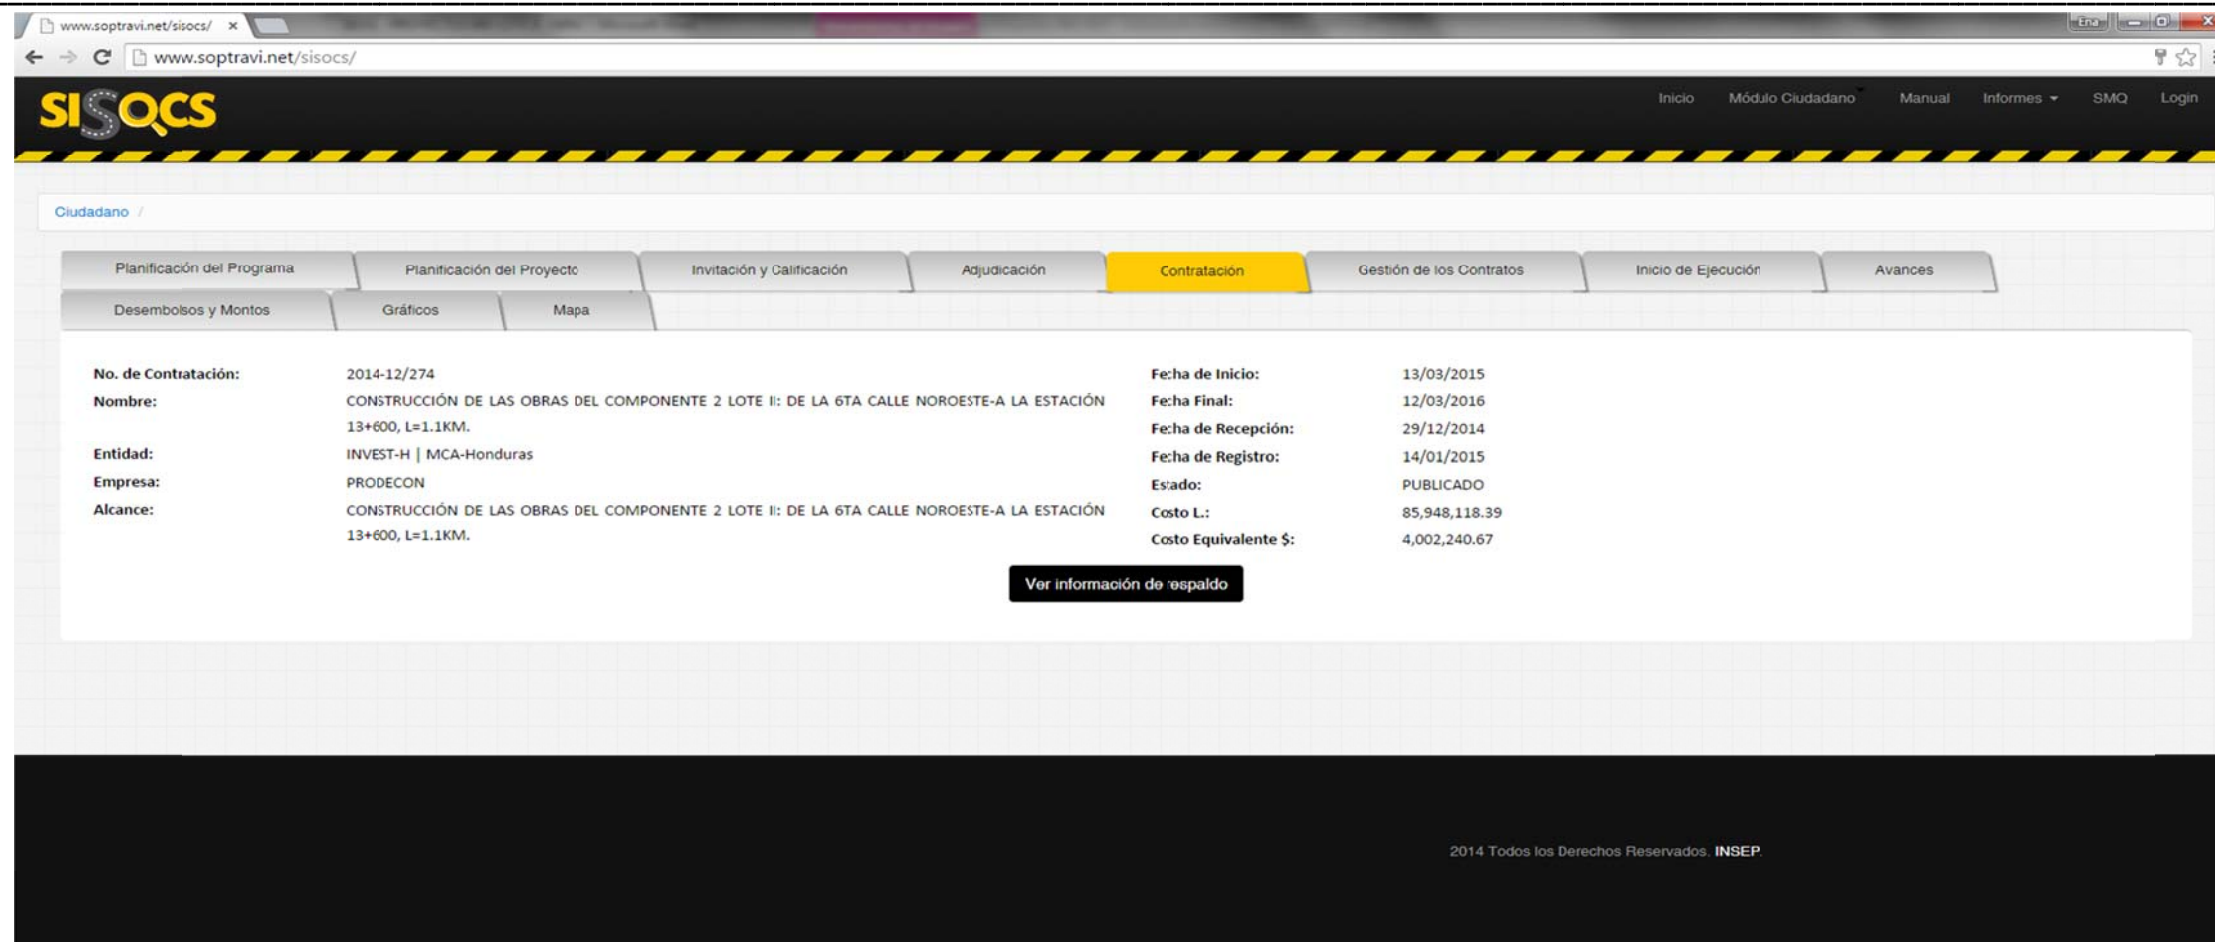

www.soptravi.net/sisocs/

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMQ Login

Ciudadano /

Planificación del Programa Planificación del Proyecto Invitación y Calificación Adjudicación **Contratación** Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances


Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

No. de Contratación:	2014-12/274	Fecha de Inicio:	13/03/2015
Nombre:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM.	Fecha Final:	12/03/2016
Entidad:	INVEST-H MCA-Honduras	Fecha de Recepción:	29/12/2014
Empresa:	PRODECON	Fecha de Registro:	14/01/2015
Alcance:	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM.	Estado:	PUBLICADO
		Costo L.:	85,948,118.39
		Costo Equivalente \$:	4,002,240.67

[Ver información de respaldo](#)

2014 Todos los Derechos Reservados INSEP

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

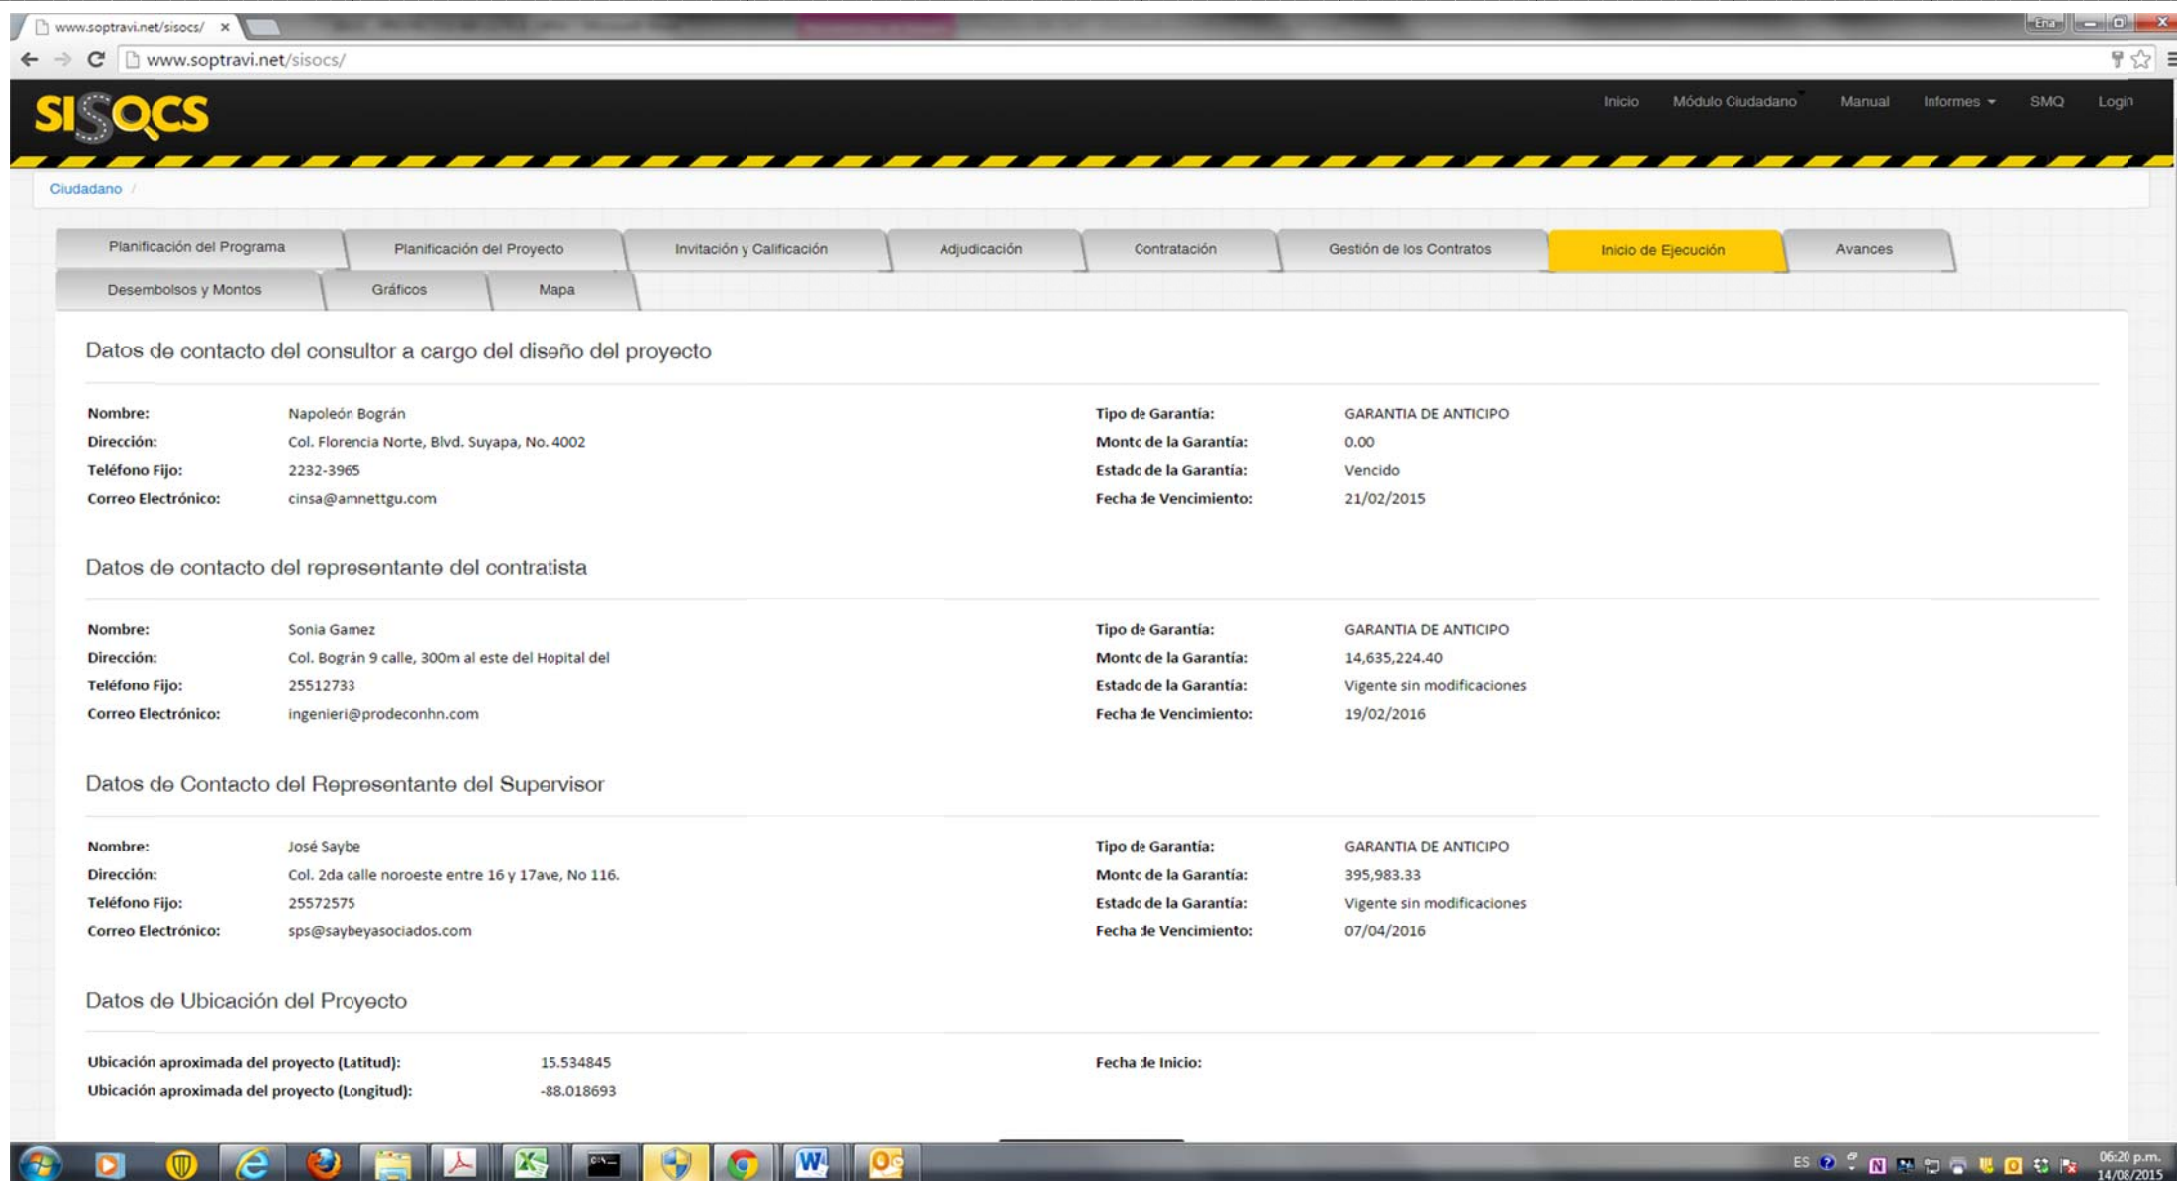

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the 'SISQCS' logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMO, and Login. A breadcrumb trail shows 'Ciudadano /'. Below the header is a navigation menu with tabs for: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, Contratación, Gestión de los Contratos, **Inicio de Ejecución** (highlighted), and Avances. Under 'Inicio de Ejecución', there are sub-tabs for Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa.

The main content area is titled 'Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto'. It contains the following information:

Nombre:	Napoleón Bográn	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, No. 4002	Monte de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	2232-3965	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	cinsa@annettgu.com	Fecha de Vencimiento:	21/02/2015

Below this is the section 'Datos de contacto del representante del contratista' with the following information:

Nombre:	Sonia Gamez	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Bográn 9 calle, 300m al este del Hospital del	Monte de la Garantía:	14,635,224.40
Teléfono Fijo:	25512733	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	ingenieri@prodeconhn.com	Fecha de Vencimiento:	19/02/2016

Next is 'Datos de Contacto del Representante del Supervisor' with the following information:


Nombre:	José Saybe	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. 2da calle noroeste entre 16 y 17ave, No 116.	Monte de la Garantía:	395,983.33
Teléfono Fijo:	25572575	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	sps@saybeyasociados.com	Fecha de Vencimiento:	07/04/2016

The final section is 'Datos de Ubicación del Proyecto' with the following information:

Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	15.534845	Fecha de Inicio:	
Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	-88.018693		

The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 06:20 p.m. on 14/08/2015.

Proyecto: Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

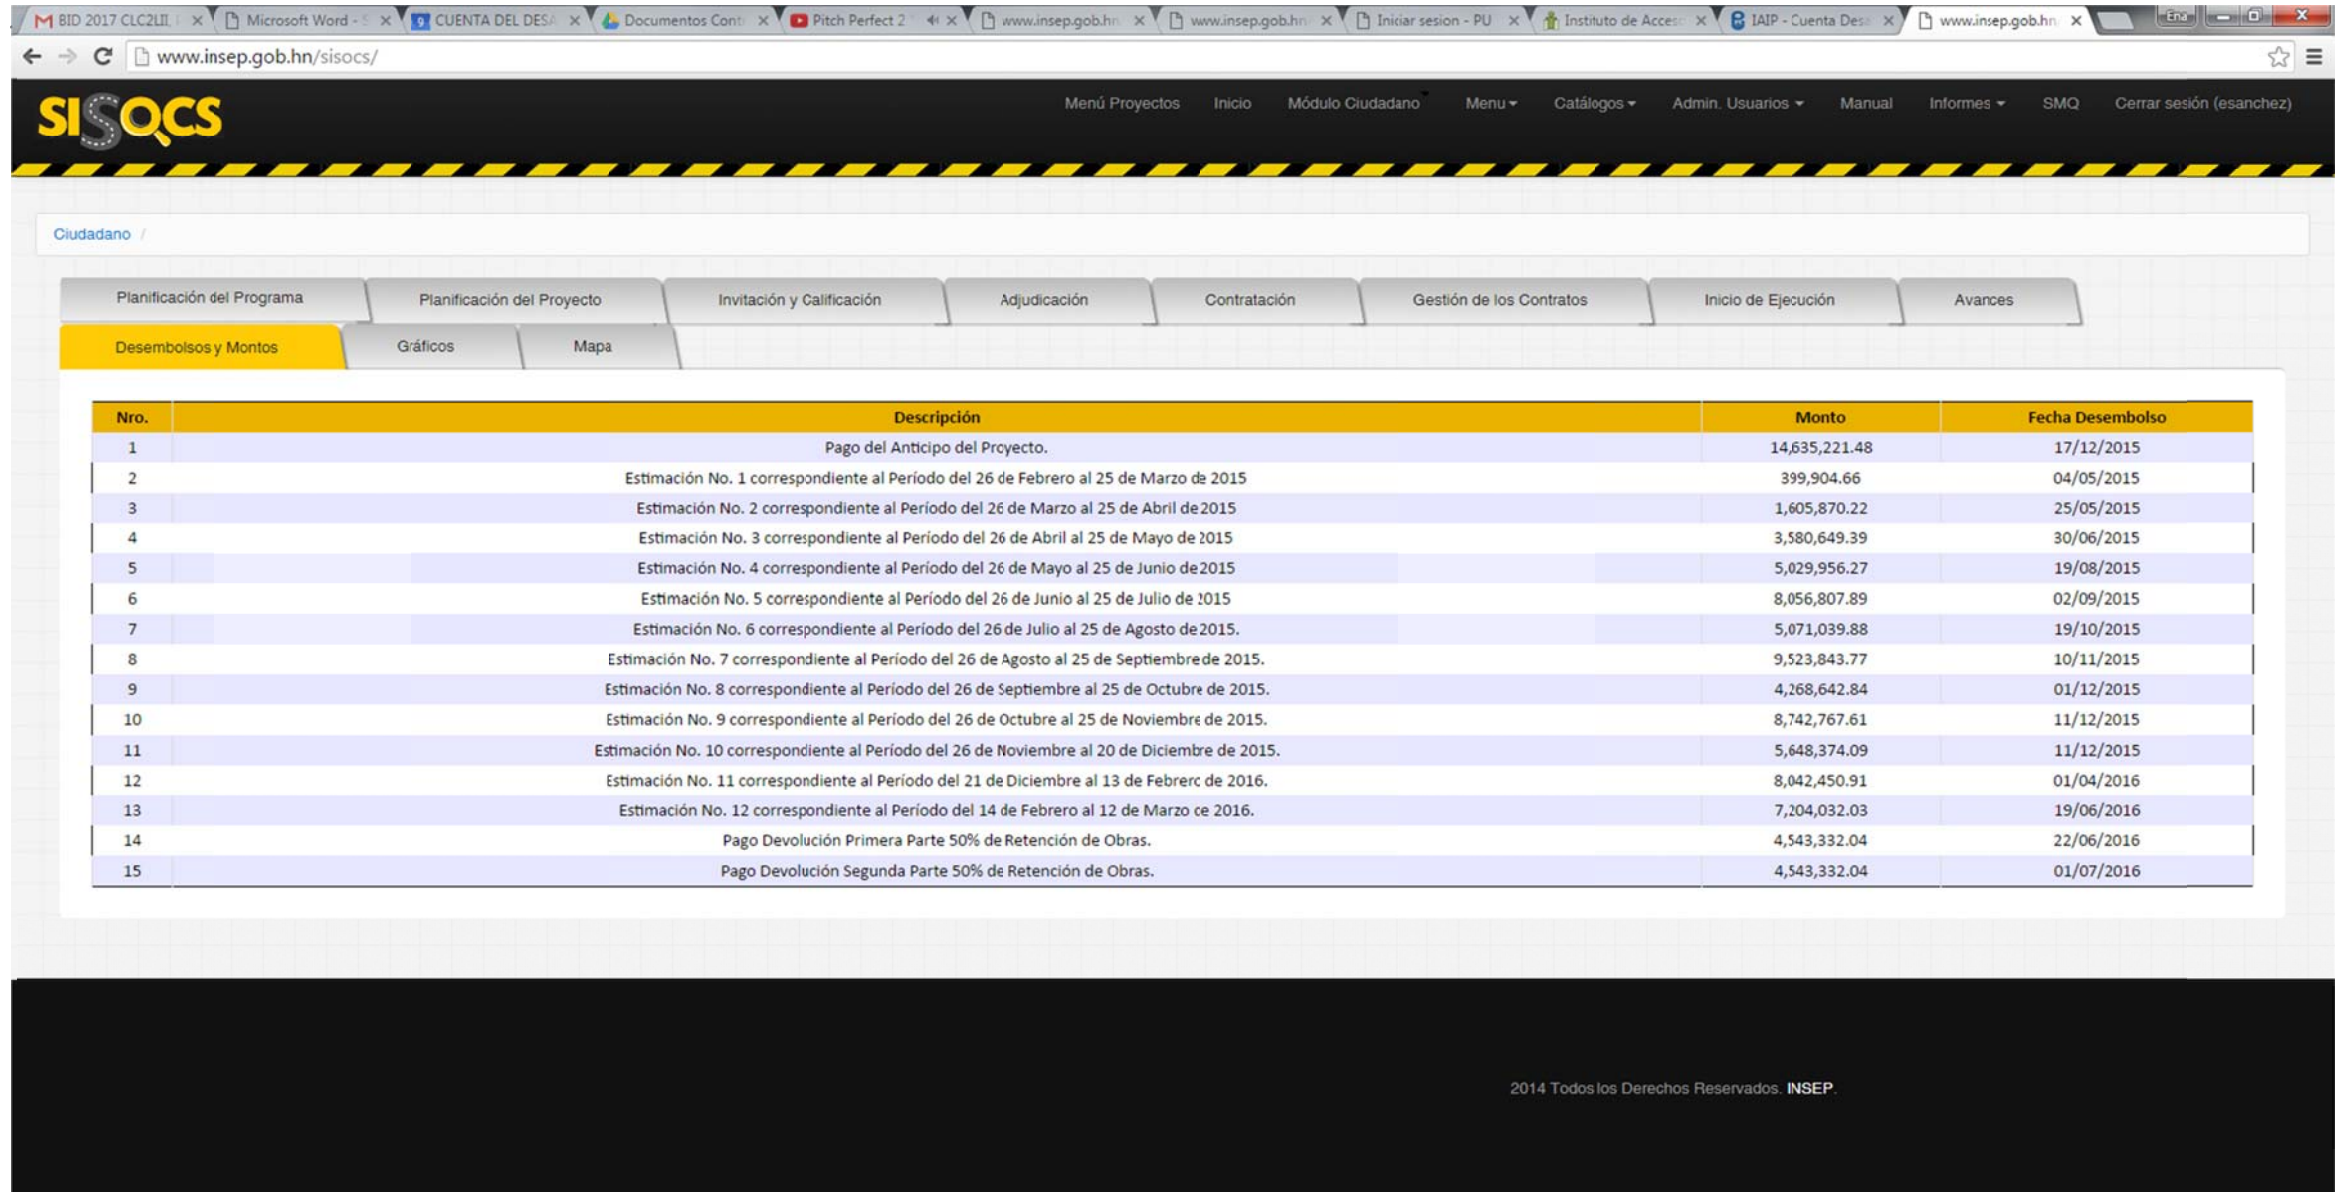


The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays www.insep.gov.hn/sisocs/. The application header includes the SISQCS logo and a navigation menu with items: Menú Proyectos, Inicio, Módulo Ciudadano, Menu, Catálogos, Admin. Usuarios, Manual, Informes, SMQ, and Cerrar sesión (esanchez). Below the header, there is a breadcrumb trail: Ciudadano / . A series of tabs represents the project lifecycle: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. The 'Desembolsos y Montos' tab is selected, showing a sub-menu with 'Gráficos' and 'Mapa'. The main content area displays a table with the following data:

Nro.	Descripción	Monto	Fecha Desembolso
1	Pago del Anticipo del Proyecto.	14,635,221.48	17/12/2015
2	Estimación No. 1 correspondiente al Período del 26 de Febrero al 25 de Marzo de 2015	399,904.66	04/05/2015
3	Estimación No. 2 correspondiente al Período del 26 de Marzo al 25 de Abril de 2015	1,605,870.22	25/05/2015
4	Estimación No. 3 correspondiente al Período del 26 de Abril al 25 de Mayo de 2015	3,580,649.39	30/06/2015
5	Estimación No. 4 correspondiente al Período del 26 de Mayo al 25 de Junio de 2015	5,029,956.27	19/08/2015
6	Estimación No. 5 correspondiente al Período del 26 de Junio al 25 de Julio de 2015	8,056,807.89	02/09/2015
7	Estimación No. 6 correspondiente al Período del 26 de Julio al 25 de Agosto de 2015.	5,071,039.88	19/10/2015
8	Estimación No. 7 correspondiente al Período del 26 de Agosto al 25 de Septiembre de 2015.	9,523,843.77	10/11/2015
9	Estimación No. 8 correspondiente al Período del 26 de Septiembre al 25 de Octubre de 2015.	4,268,642.84	01/12/2015
10	Estimación No. 9 correspondiente al Período del 26 de Octubre al 25 de Noviembre de 2015.	8,742,767.61	11/12/2015
11	Estimación No. 10 correspondiente al Período del 26 de Noviembre al 20 de Diciembre de 2015.	5,648,374.09	11/12/2015
12	Estimación No. 11 correspondiente al Período del 21 de Diciembre al 13 de Febrer de 2016.	8,042,450.91	01/04/2016
13	Estimación No. 12 correspondiente al Período del 14 de Febrero al 12 de Marzo de 2016.	7,204,032.03	19/06/2016
14	Pago Devolución Primera Parte 50% de Retención de Obras.	4,543,332.04	22/06/2016
15	Pago Devolución Segunda Parte 50% de Retención de Obras.	4,543,332.04	01/07/2016

At the bottom of the page, there is a footer: 2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

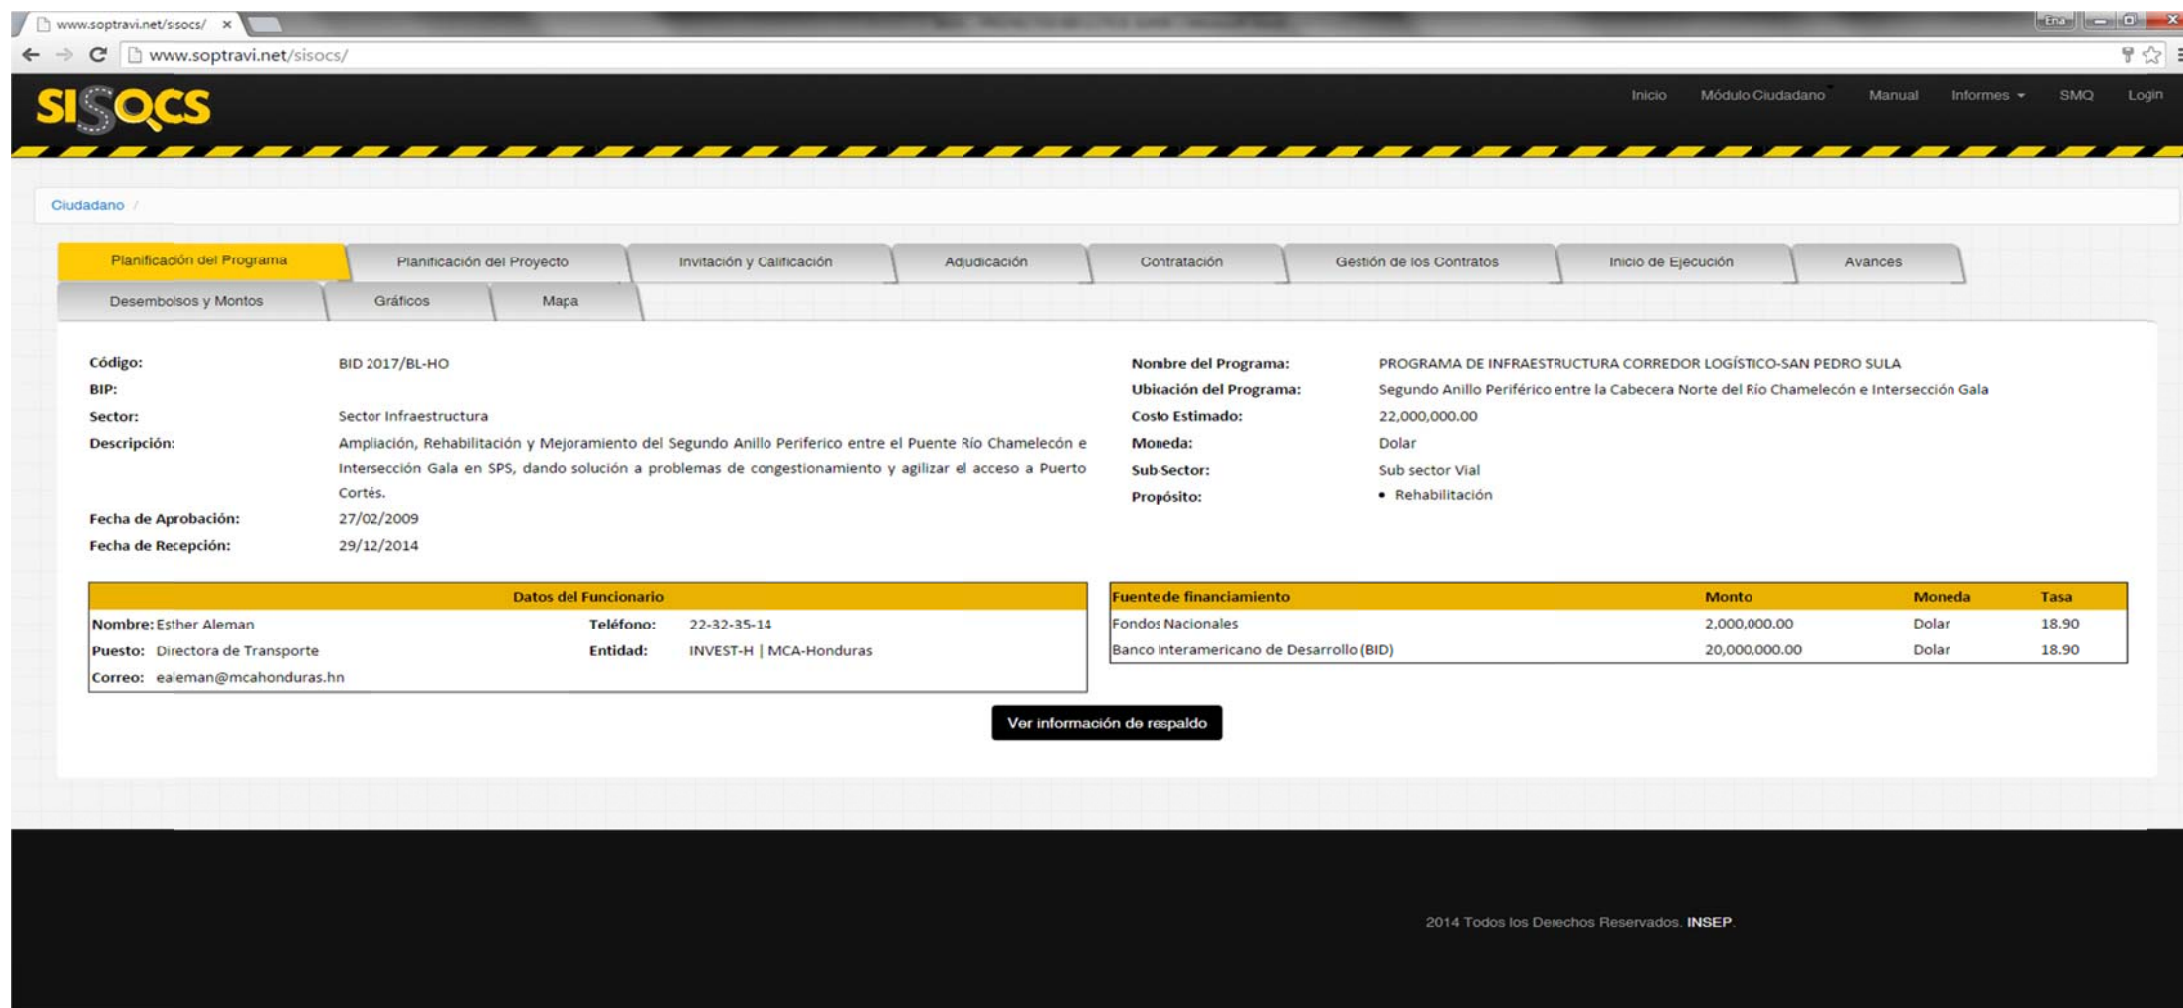

www.soptravi.net/ssocs/

Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMO Login

Ciudadano /

Planificación del Programa | Planificación del Proyecto | Invitación y Calificación | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desembolsos y Montos | Gráficos | Mapa

Código: BID 2017/BL-HO

BIP:

Sector: Sector Infraestructura

Descripción: Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento del Segundo Anillo Periferico entre el Puente Río Chamelecón e Intersección Gala en SPS, dando solución a problemas de congestonamiento y aglizar el acceso a Puerto Cortés.

Fecha de Aprobación: 27/02/2009

Fecha de Recepción: 29/12/2014

Nombre del Programa: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR LOGÍSTICO-SAN PEDRO SULA

Ubicación del Programa: Segundo Anillo Periférico entre la Cabecera Norte del Río Chamelecón e Intersección Gala

Costo Estimado: 22,000,000.00

Moneda: Dolar

Sub Sector: Sub sector Vial

Propósito:


- Rehabilitación

Datos del Funcionario		Fuente de financiamiento		
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-32-35-14	Fondos Nacionales	Monto	Moneda
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	2,000,000.00	Dolar
Correo: eaaleman@mcahonduras.hn			20,000,000.00	Dolar
				Tasa
				18.90
				18.90

Ver información de respaldo

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

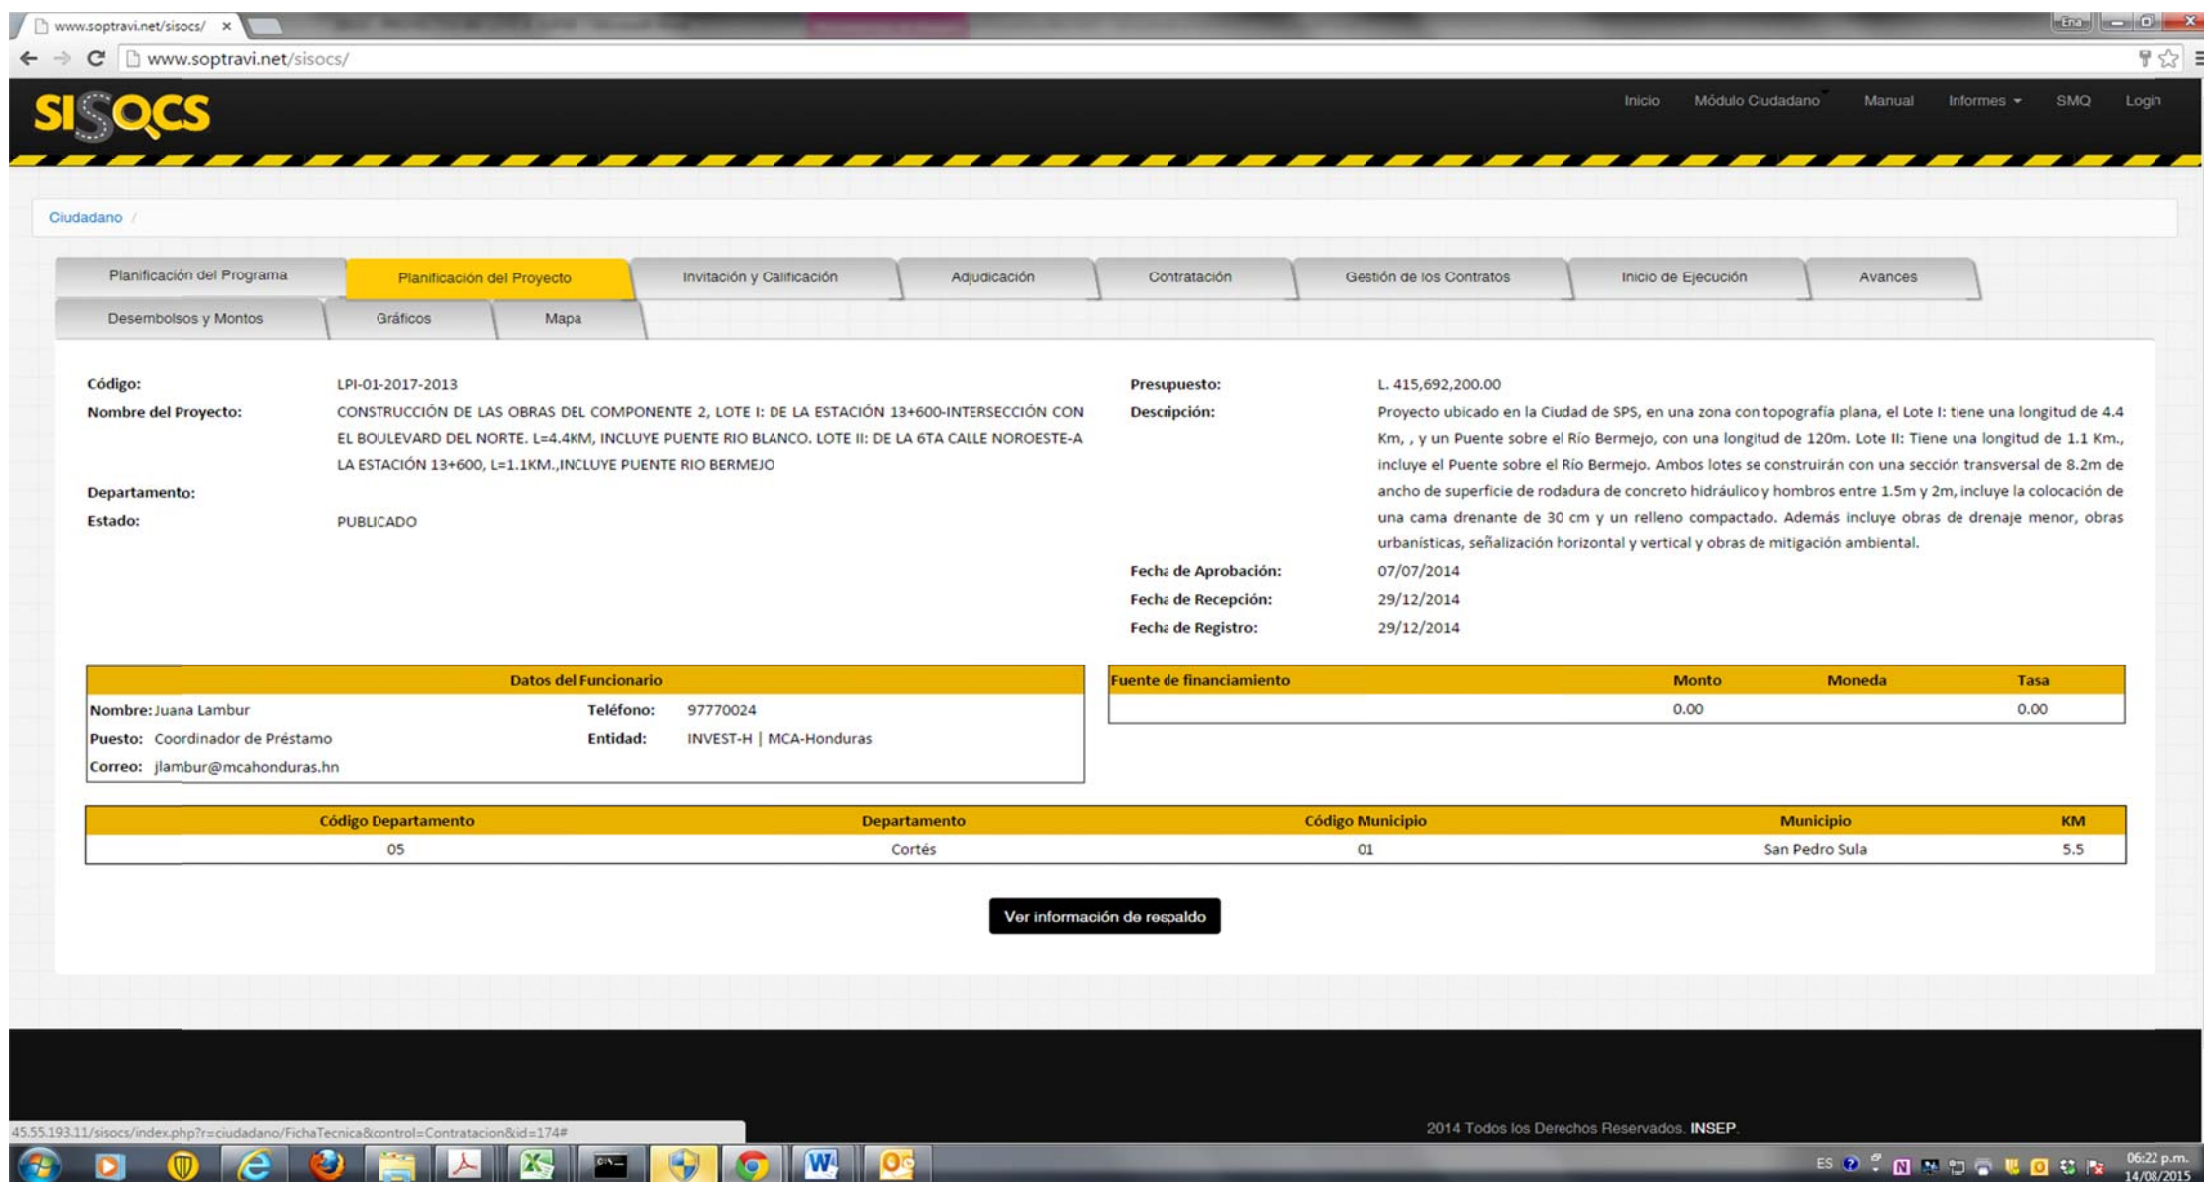

www.soptravi.net/sisocs/

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMO Log

Ciudadano /

Planificación del Programa | **Planificación del Proyecto** | Invitación y Calificación | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desembolsos y Montos | Gráficos | Mapa

Código: LPI-01-2017-2013

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2, LOTE I: DE LA ESTACIÓN 13+600-INTERSECCIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE. L=4.4KM, INCLUYE PUENTE RIO BLANCO. LOTE II: DE LA 6TA CALLE NOROESTE-A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM.,INCLUYE PUENTE RIO BERMEJO

Departamento:

Estado: PUBLICADO

Presupuesto: L. 415,692,200.00

Descripción: Proyecto ubicado en la Ciudad de SP5, en una zona con topografía plana, el Lote I: tiene una longitud de 4.4 Km, , y un Puente sobre el Río Bermejo, con una longitud de 120m. Lote II: Tiene una longitud de 1.1 Km., incluye el Puente sobre el Río Bermejo. Ambos lotes se construirán con una sección transversal de 8.2m de ancho de superficie de rodadura de concreto hidráulico y hombros entre 1.5m y 2m, incluye la colocación de una cama drenante de 30 cm y un relleno compactado. Además incluye obras de drenaje menor, obras urbanísticas, señalización horizontal y vertical y obras de mitigación ambiental.

Fecha de Aprobación: 07/07/2014

Fecha de Recepción: 29/12/2014

Fecha de Registro: 29/12/2014

Datos del Funcionario			
Nombre: Juana Lambur	Teléfono: 97770024		
Puesto: Coordinador de Préstamo	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras		
Correo: jlambur@mcahonduras.hn			

Fuente de financiamiento	Monto	Moneda	Tasa
	0.00		0.00

Código Departamento	Departamento	Código Municipio	Municipio	KM
05	Cortés	01	San Pedro Sula	5.5


[Ver información de respaldo](#)

45.55.193.11/sisocs/index.php?r=ciudadano/FichaTecnica&control=Contratacion&id=174#

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

ES 06:22 p.m. 14/08/2015

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

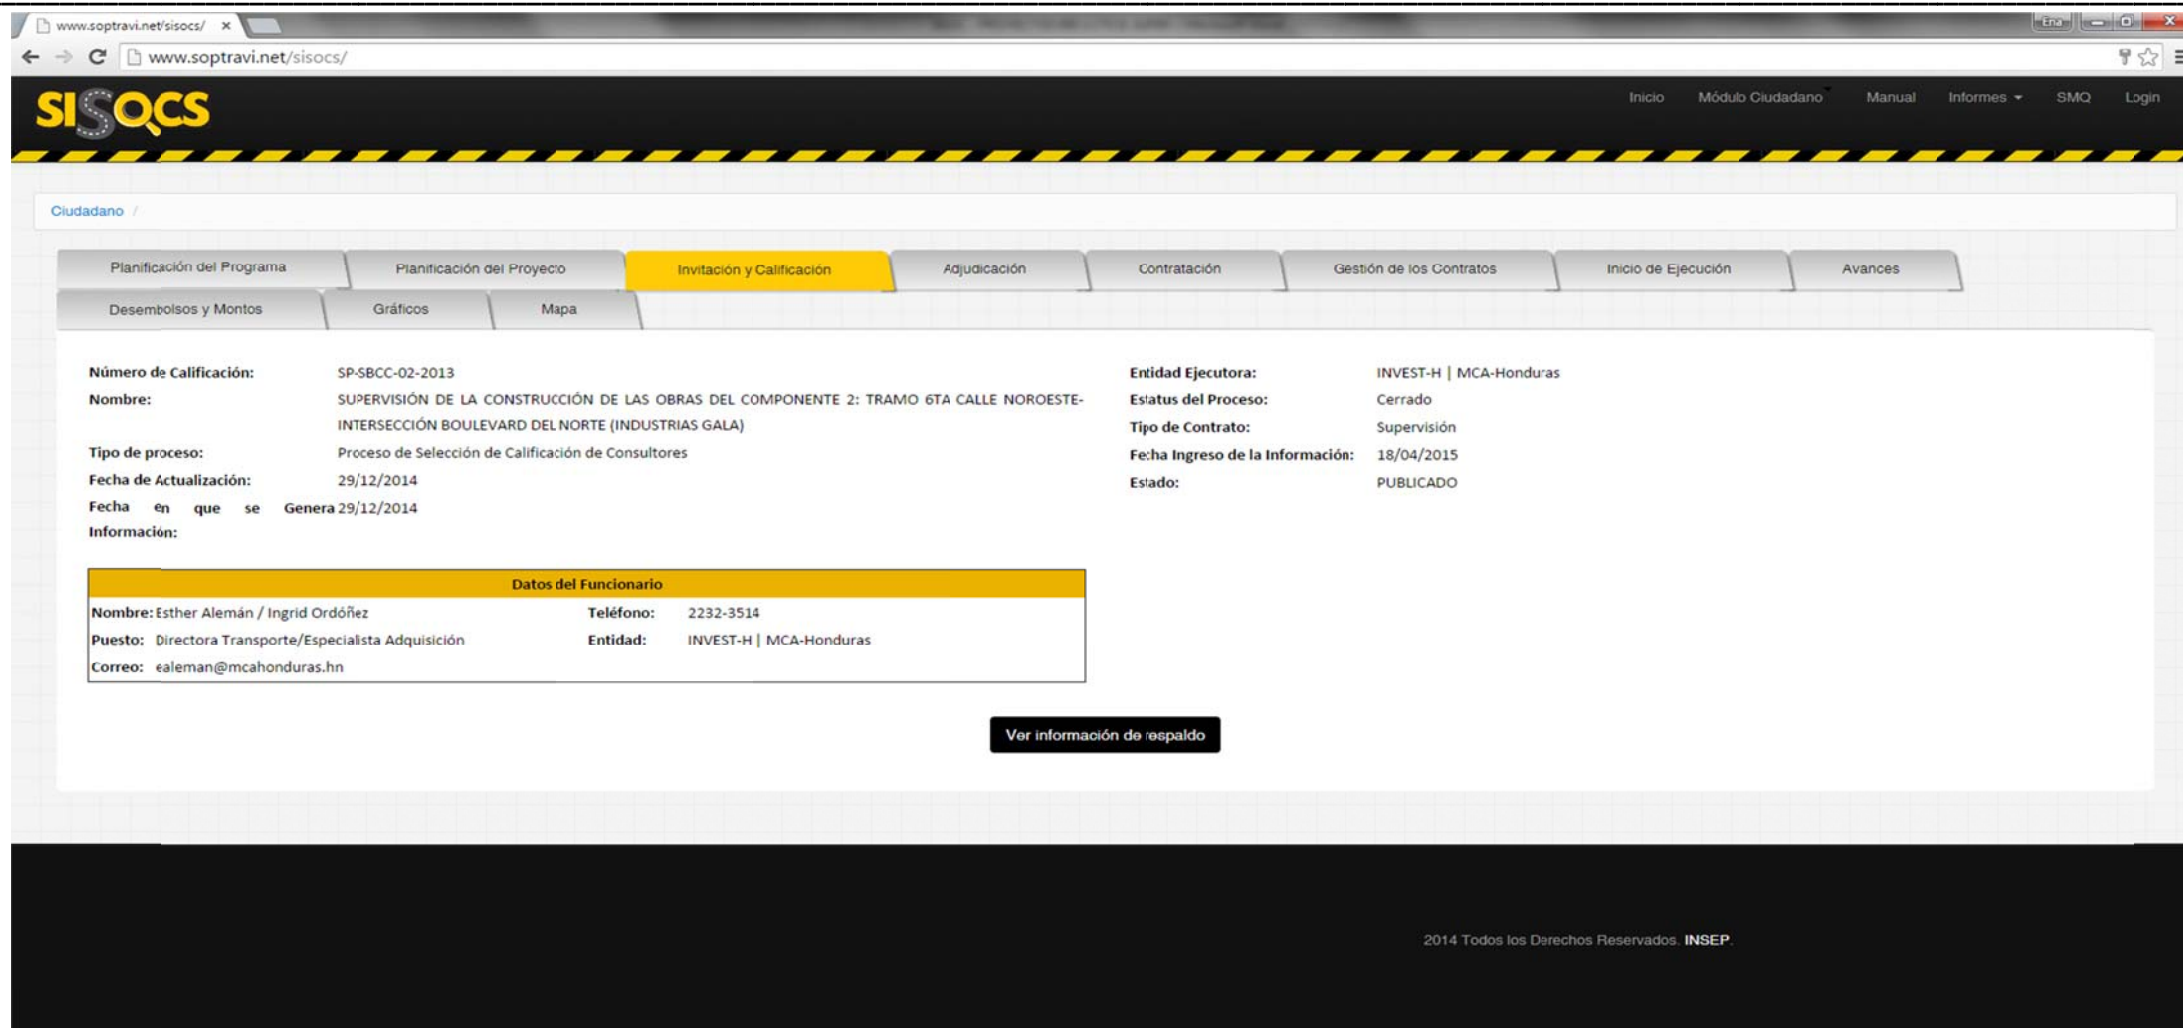

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. A breadcrumb trail shows 'Ciudadano /'. A horizontal menu contains several tabs: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, **Invitación y Calificación** (highlighted), Adjudicación, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below this menu, there are sub-tabs: Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa. The main content area displays the following information:


Número de Calificación:	SP-SBCC-02-2013	Entidad Ejecutora:	INVEST-H MCA-Honduras
Nombre:	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2: TRAMO 6TA CALLE NOROESTE- INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA)	Estatus del Proceso:	Cerrado
Tipo de proceso:	Proceso de Selección de Calificación de Consultores	Tipo de Contrato:	Supervisión
Fecha de Actualización:	29/12/2014	Fecha Ingreso de la Información:	18/04/2015
Fecha en que se Genera:	29/12/2014	Estado:	PUBLICADO

Below the table, there is a section titled 'Datos del Funcionario' with the following details:

Nombre:	Esther Alemán / Ingrid Ordóñez	Teléfono:	2232-3514
Puesto:	Directora Transporte/Especialista Adquisición	Entidad:	INVEST-H MCA-Honduras
Correo:	ealeman@mcahonduras.hn		

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the 'Datos del Funcionario' table. At the bottom of the page, a footer reads '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.'

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

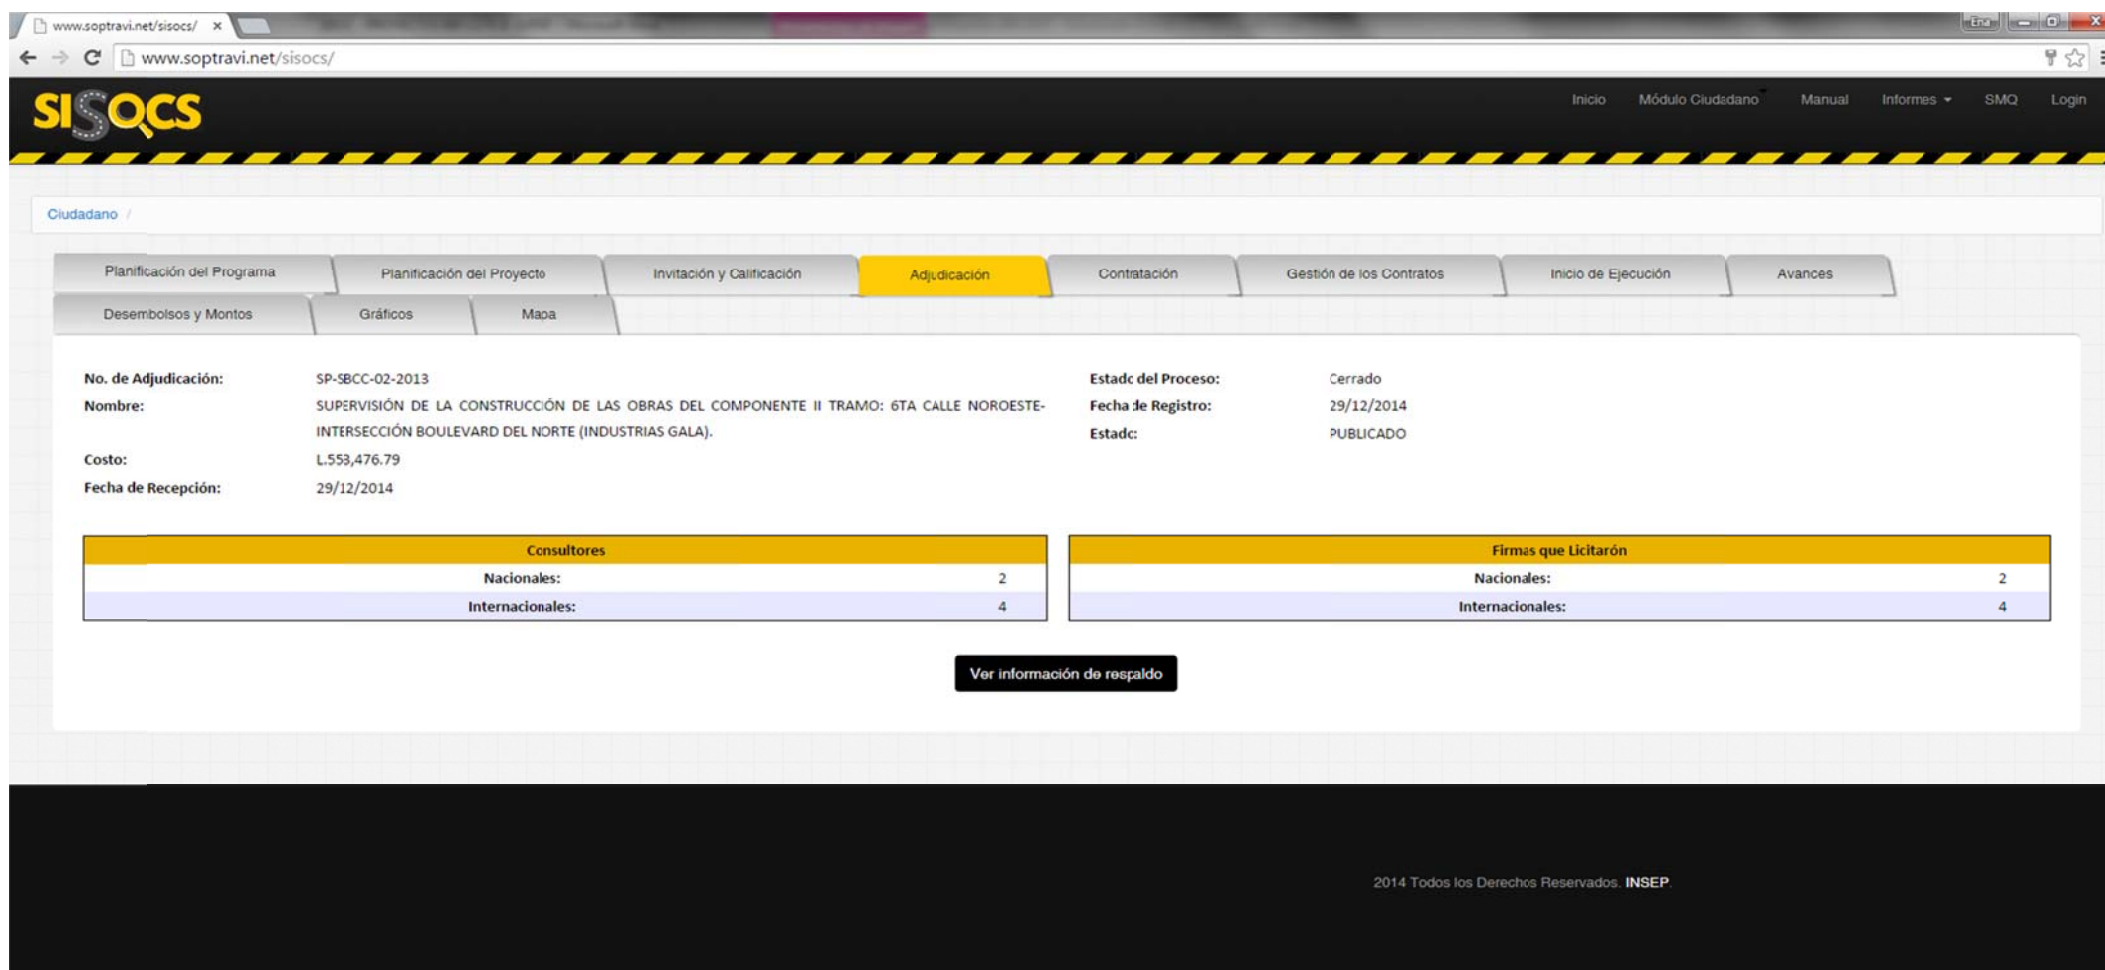

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the 'SISQCS' logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. The main content area is titled 'Ciudadano /' and features a horizontal menu with tabs: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, **Adjudicación** (highlighted), Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the menu, there are sub-tabs: Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa. The main content displays project details for the 'Adjudicación' phase:


- No. de Adjudicación:** SP-SBCC-02-2013
- Nombre:** SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE II TRAMO: 6TA CALLE NOROESTE- INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA).
- Costo:** L.553,476.79
- Fecha de Recepción:** 29/12/2014
- Estado del Proceso:** Cerrado
- Fecha de Registro:** 29/12/2014
- Estado:** PUBLICADO

Below the details, there are two summary tables:

Consultores		Firmas que Licitaron	
Nacionales:	2	Nacionales:	2
Internacionales:	4	Internacionales:	4

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the tables. At the bottom of the application, a footer reads '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP'.

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

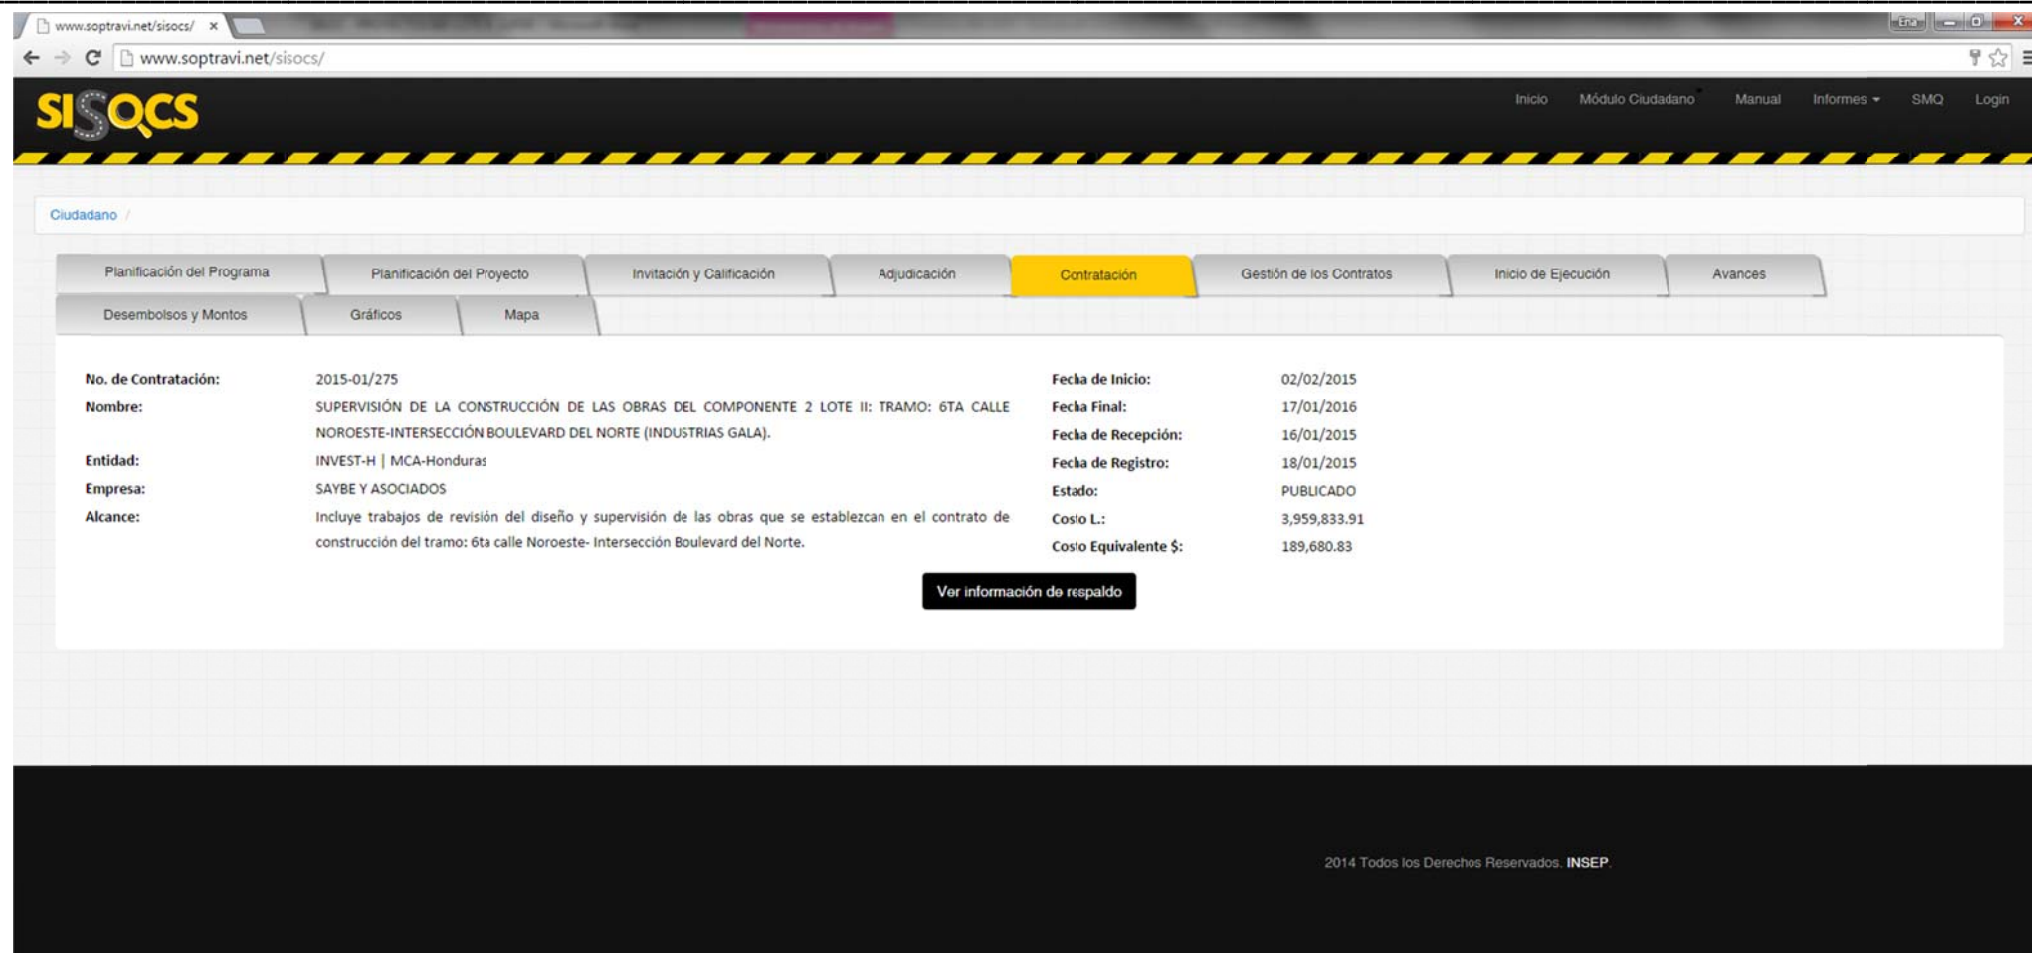


The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. A breadcrumb trail shows 'Ciudadano /'. A horizontal menu contains several tabs: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, **Contratación** (highlighted), Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below this menu, there are sub-tabs: Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa. The main content area displays contract details for ID 2015-01/275. A 'Ver información de respaldo' button is located at the bottom of the details section.

No. de Contratación:	2015-01/275	Fecha de Inicio:	02/02/2015
Nombre:	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE II: TRAMO: 6TA CALLE NOROESTE-INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIAS GALA).	Fecha Final:	17/01/2016
Entidad:	INVEST-H MCA-Honduras	Fecha de Recepción:	16/01/2015
Empresa:	SAYBE Y ASOCIADOS	Fecha de Registro:	18/01/2015
Alcance:	Incluye trabajos de revisión del diseño y supervisión de las obras que se establezcan en el contrato de construcción del tramo: 6ta calle Noroeste- Intersección Boulevard del Norte.	Estado:	PUBLICADO
		Cosio L.:	3,959,833.91
		Cosio Equivalente \$:	189,680.83

[Ver información de respaldo](#)

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

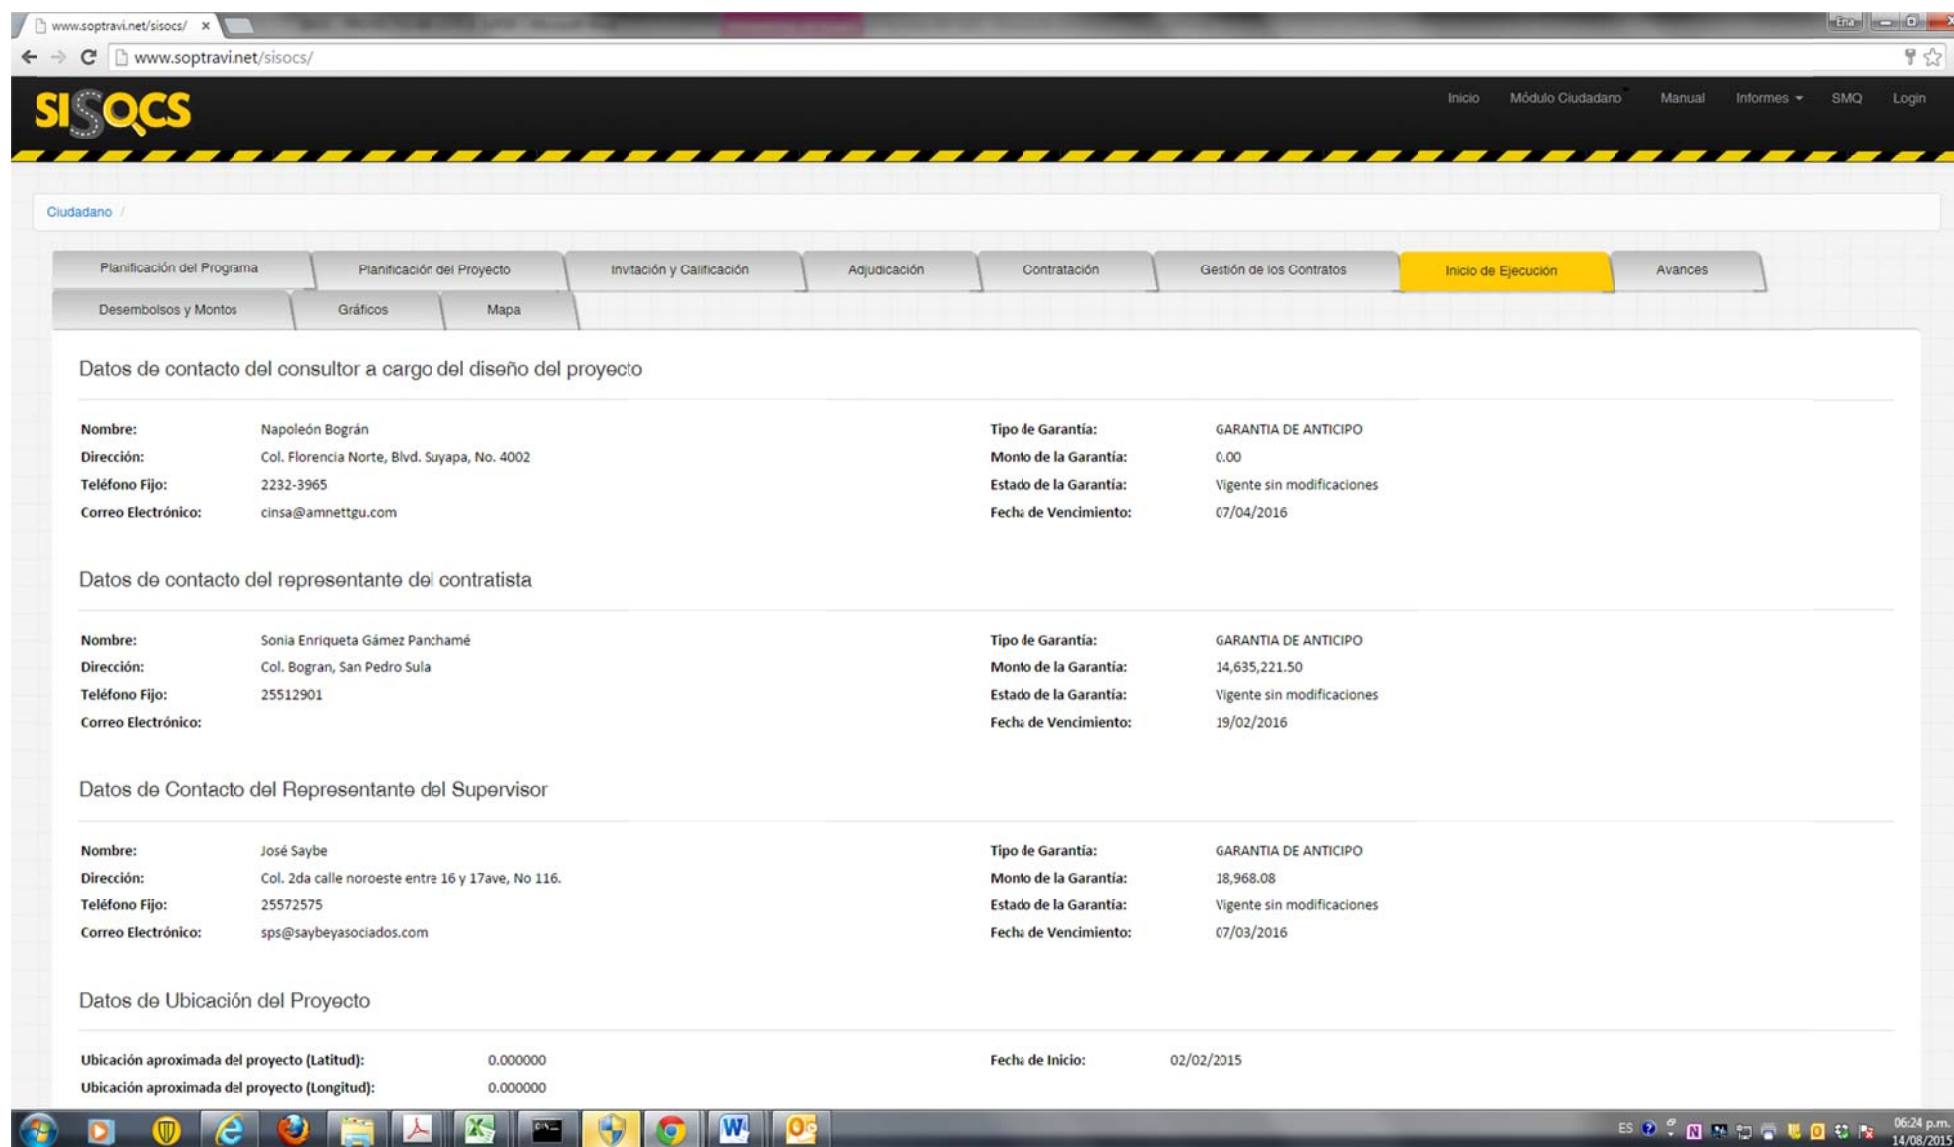

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravinet.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. A breadcrumb trail shows 'Ciudadano /'. Below the header is a navigation menu with tabs for 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Ajudicación', 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución' (highlighted in yellow), and 'Avances'. Under 'Inicio de Ejecución', there are sub-tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area is titled 'Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto' and contains the following information:


Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto		Datos de contacto del representante del contratista	
Nombre:	Napoleón Bográn	Nombre:	Sonia Enriqueta Gámez Panchamé
Dirección:	Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, No. 4002	Dirección:	Col. Bogran, San Pedro Sula
Teléfono Fijo:	2232-3965	Teléfono Fijo:	25512901
Correo Electrónico:	cinsa@amnetgu.com	Correo Electrónico:	
Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Monto de la Garantía:	0.00	Monto de la Garantía:	14,635,221.50
Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Fecha de Vencimiento:	07/04/2016	Fecha de Vencimiento:	19/02/2016

Below this, there is a section for 'Datos de Contacto del Representante del Supervisor' and 'Datos de Ubicación del Proyecto':

Datos de Contacto del Representante del Supervisor		Datos de Ubicación del Proyecto	
Nombre:	José Saybe	Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	0.000000
Dirección:	Col. 2da calle noroeste entre 16 y 17ave, No 116.	Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	0.000000
Teléfono Fijo:	25572575	Fecha de Inicio:	02/02/2015
Correo Electrónico:	sps@saybeyasociados.com		

The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 06:24 p.m. on 14/08/2015.

Proyecto: Supervisión de la Construcción de las Obras del Componente 2 San Pedro Sula, Lote II: De la 6ta. Calle Nor Este – a la Estación 13 +600, L= 1.1 Km., Incluye el Puente sobre Río Bermejo con una Longitud de 120 M.

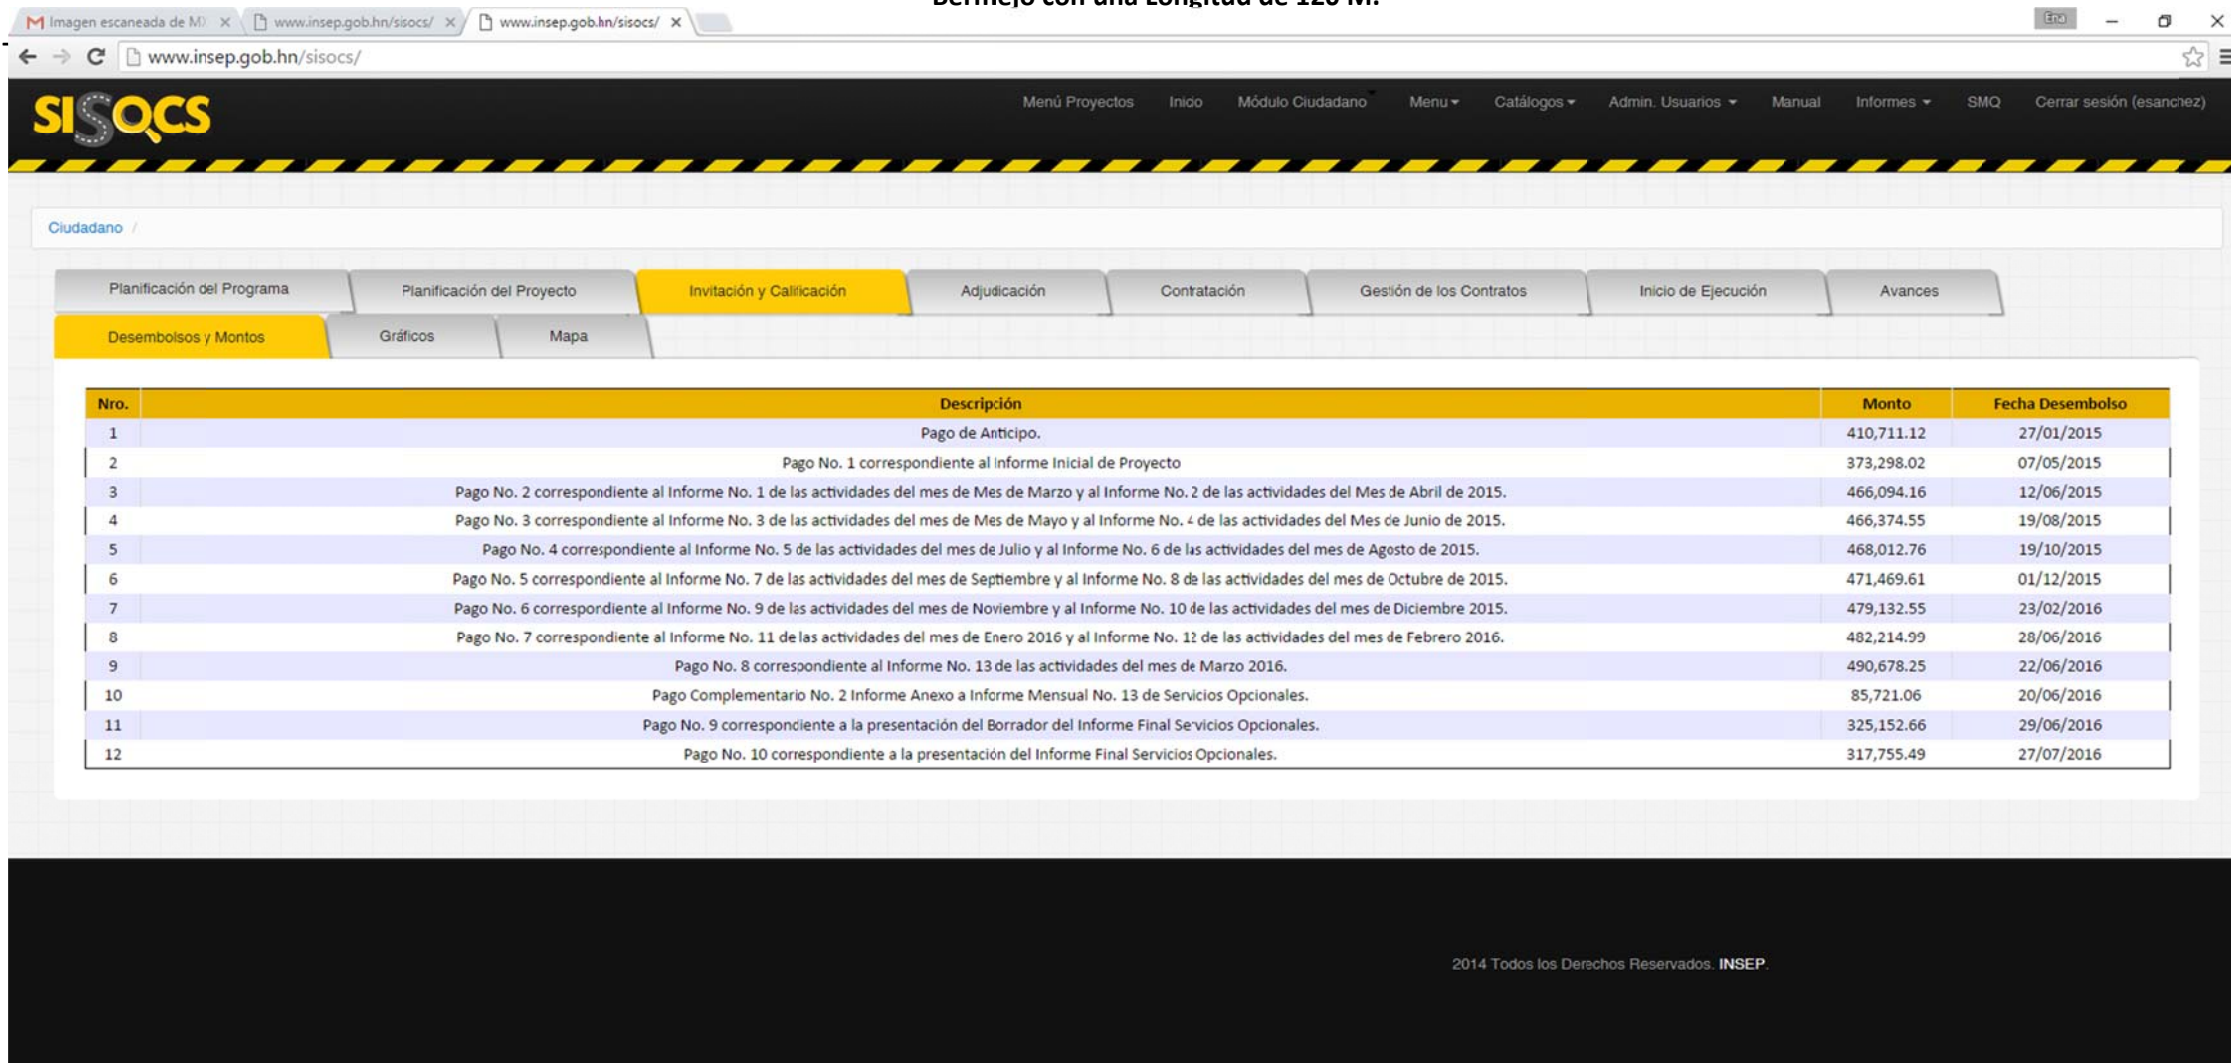


The screenshot shows the SISQCS web application interface. The navigation menu includes: Menú Proyectos, Inicio, Módulo Ciudadano, Menú, Catálogos, Admin. Usuarios, Manual, Informes, SMQ, and Cerrar sesión (esanchez). The main content area is titled 'Ciudadano /' and features a series of tabs: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, **Invitación y Calificación**, Adjudicación, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Under the 'Invitación y Calificación' tab, there are sub-tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The 'Desembolsos y Montos' sub-tab is active, displaying a table with the following data:

Nro.	Descripción	Monto	Fecha Desembolso
1	Pago de Anticipo.	410,711.12	27/01/2015
2	Pago No. 1 correspondiente al informe Inicial de Proyecto	373,298.02	07/05/2015
3	Pago No. 2 correspondiente al Informe No. 1 de las actividades del mes de Mes de Marzo y al Informe No. 2 de las actividades del Mes de Abril de 2015.	466,094.16	12/06/2015
4	Pago No. 3 correspondiente al Informe No. 3 de las actividades del mes de Mes de Mayo y al Informe No. 4 de las actividades del Mes de Junio de 2015.	466,374.55	19/08/2015
5	Pago No. 4 correspondiente al Informe No. 5 de las actividades del mes de Julio y al Informe No. 6 de las actividades del mes de Agosto de 2015.	468,012.76	19/10/2015
6	Pago No. 5 correspondiente al Informe No. 7 de las actividades del mes de Septiembre y al Informe No. 8 de las actividades del mes de Octubre de 2015.	471,469.61	01/12/2015
7	Pago No. 6 correspondiente al Informe No. 9 de las actividades del mes de Noviembre y al Informe No. 10 de las actividades del mes de Diciembre 2015.	479,132.55	23/02/2016
8	Pago No. 7 correspondiente al Informe No. 11 de las actividades del mes de Enero 2016 y al Informe No. 12 de las actividades del mes de Febrero 2016.	482,214.99	28/06/2016
9	Pago No. 8 correspondiente al Informe No. 13 de las actividades del mes de Marzo 2016.	490,678.25	22/06/2016
10	Pago Complementario No. 2 Informe Anexo a Informe Mensual No. 13 de Servicios Opcionales.	85,721.06	20/06/2016
11	Pago No. 9 correspondiente a la presentación del Borrador del Informe Final Servicios Opcionales.	325,152.66	29/06/2016
12	Pago No. 10 correspondiente a la presentación del Informe Final Servicios Opcionales.	317,755.49	27/07/2016

At the bottom of the page, it states: 2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Construcción de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

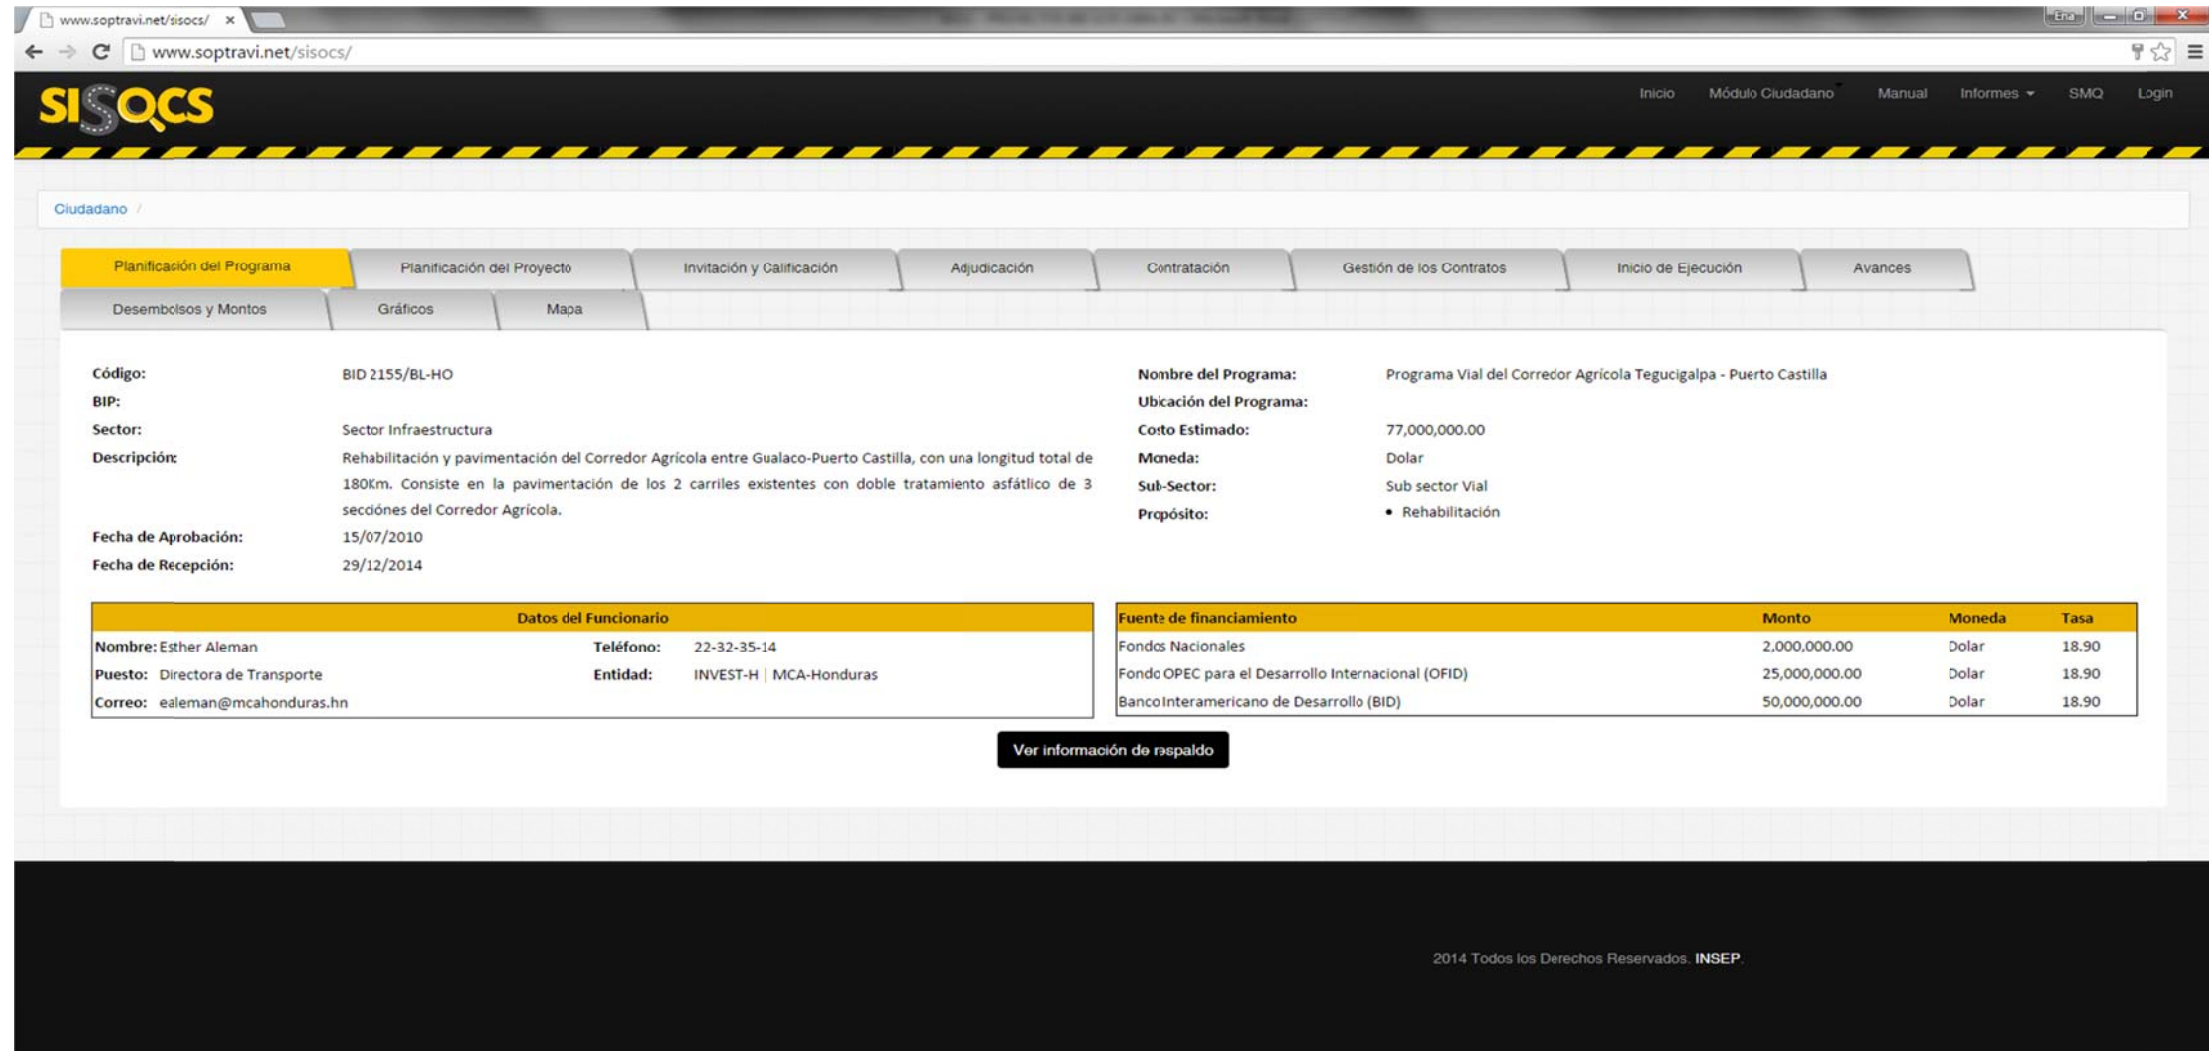

www.soptravi.net/sisocs/

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMO Login

Ciudadano /

Planificación del Programa | Planificación del Proyecto | Invitación y Calificación | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desembolsos y Montos | Gráficos | Mapa

Código: BID 2155/BL-HO
BIP:
Sector: Sector Infraestructura
Descripción: Rehabilitación y pavimentación del Corredor Agrícola entre Gualaco-Puerto Castilla, con una longitud total de 180km. Consiste en la pavimentación de los 2 carriles existentes con doble tratamiento asfáltico de 3 secciones del Corredor Agrícola.
Fecha de Aprobación: 15/07/2010
Fecha de Recepción: 29/12/2014

Nombre del Programa: Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa - Puerto Castilla
Ubicación del Programa:
Costo Estimado: 77,000,000.00
Moneda: Dolar
Sub-Sector: Sub sector Vial
Propósito: • Rehabilitación

Datos del Funcionario		Fuente de financiamiento		
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-32-35-14	Fondos Nacionales	2,000,000.00	Dolar 18.90
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras	Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID)	25,000,000.00	Dolar 18.90
Correo: ealeman@mcahonduras.hn		Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	50,000,000.00	Dolar 18.90

[Ver información de respaldo](#)

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP

Proyecto: Construcción de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

www.soptravi.net/sisocs/

← → ↻ www.soptravi.net/sisocs/

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMQ Login

Ciudadano /

Planificación del Programa | **Planificación del Proyecto** | Invitación y Calificación | Adjudicación | Contratación | Gestión de los Contratos | Inicio de Ejecución | Avances

Desembolsos y Montos | Gráficos | Mapa

Código: LPI-01-2155-2014
Nombre del Proyecto: Rehabilitación de la carretera Gualaco - Bonito Oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental
Departamento: Colón
Estado: PUBLICADO

Presupuesto: L. 425,139,750.00
Descripción: Comprende excavación común, subrasante mejorada con cemento, colocación de base triturada, pavimentación con Doble Tratamiento Superficial Asfáltico, remoción de derrumbes, pequeñas obras de estabilización y contención de laderas, mejoramiento del sistema de drenaje, construcción de tres cajas puentes, limpieza de alcantarillas, cunetas, construcción de muros de mampostería, muros de tierra mecánicamente estabilizados, control de la erosión, señalamiento horizontal y vertical, entre otras. Además, incluye obras de seguridad vial para control de velocidad y protección a los usuarios de la carretera y obras de mitigación ambiental.
Fecha de Aprobación: 01/12/2011
Fecha de Recepción:
Fecha de Registro: 22/12/2014


Datos del funcionario		Fuente de financiamiento		
Nombre: Vicente Arturo Zúñiga González	Teléfono: 95148430	Fuente de financiamiento	Monto	Moneda
Puesto: Coordinador de Prestamo BID	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras	Fondo CPEC para el Desarrollo Interracional (OFID)	22,500,000.00	Dolar
Correo: vzuniga@mcahonduras.hn				Tasa
				18.90

Código Departamento	Departamento	Código Municipio	Municipio	KM
02	Colón	10	Bonito Oriental	20
15	Olancho	17	San Esteban	25.67

[Ver información de rescaldo](#)

ES 06:26 p.m. 14/08/2015

Proyecto: Construcción de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

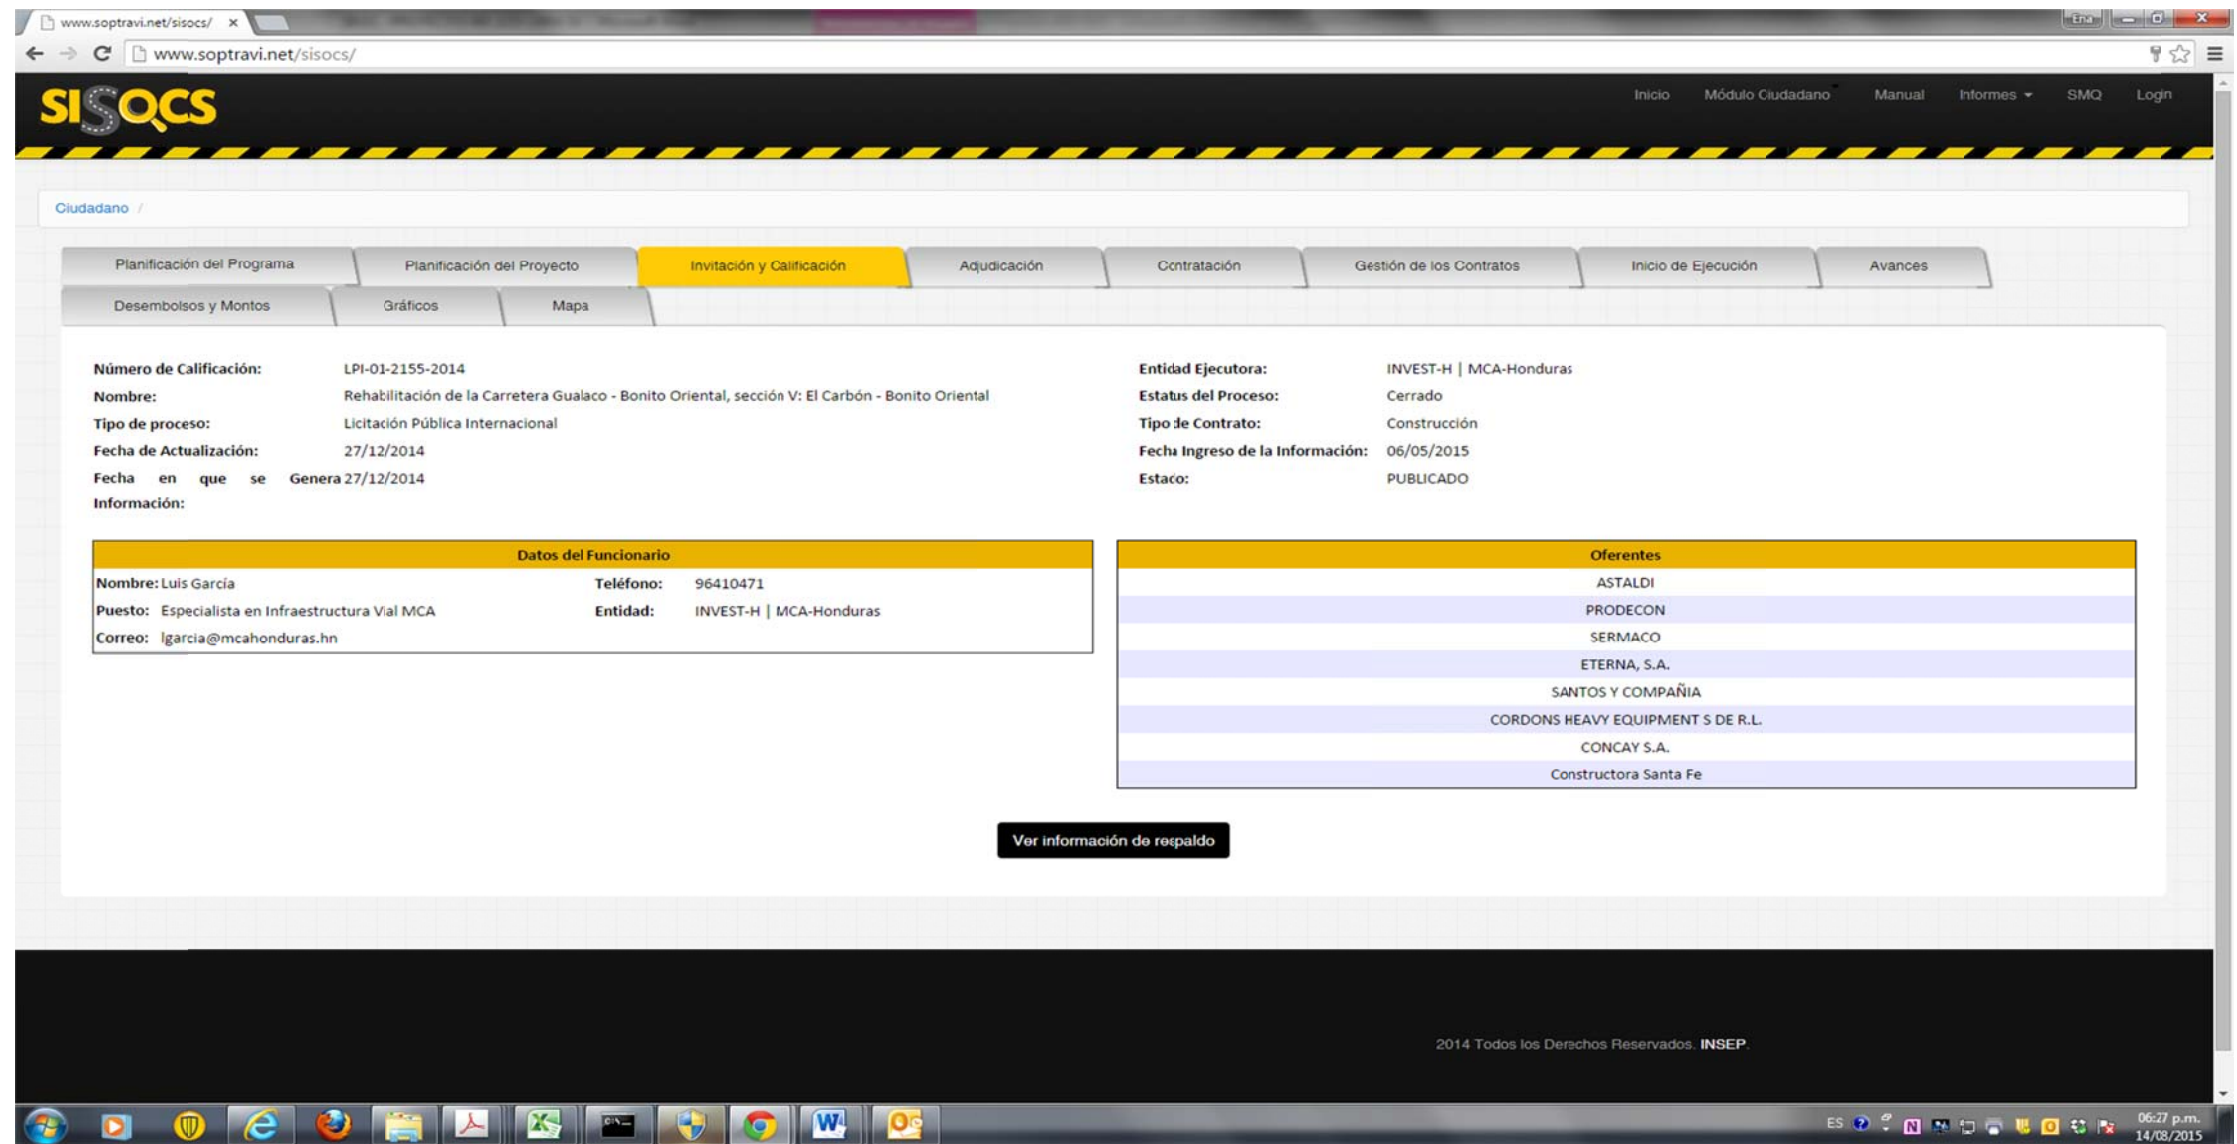

www.soptravi.net/sisocs/

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMQ Logn

Ciudadano /

Planificación del Programa Planificación del Proyecto **Invitación y Calificación** Adjudicación Contratación Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances

Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

Número de Calificación: LPI-01-2155-2014
Nombre: Rehabilitación de la Carretera Gualaco - Bonito Oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental
Tipo de proceso: Licitación Pública Internacional
Fecha de Actualización: 27/12/2014
Fecha en que se Genera: 27/12/2014
Información:

Entidad Ejecutora: INVEST-H | MCA-Honduras
Estatus del Proceso: Cerrado
Tipo de Contrato: Construcción
Fecha Ingreso de la Información: 06/05/2015
Estaco: PUBLICADO

Datos del Funcionario	
Nombre: Luis García	Teléfono: 96410471
Puesto: Especialista en Infraestructura Vial MCA	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras
Correo: lgarcia@mcahonduras.hn	


Oferentes
ASTALDI
PRODECON
SERMACO
ETERNA, S.A.
SANTOS Y COMPAÑIA
CORDONS HEAVY EQUIPMENT S DE R.L.
CONCAY S.A.
Constructora Santa Fe

[Ver información de respaldo](#)

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

ES 06:27 p.m. 14/08/2015

Proyecto: Construcción de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

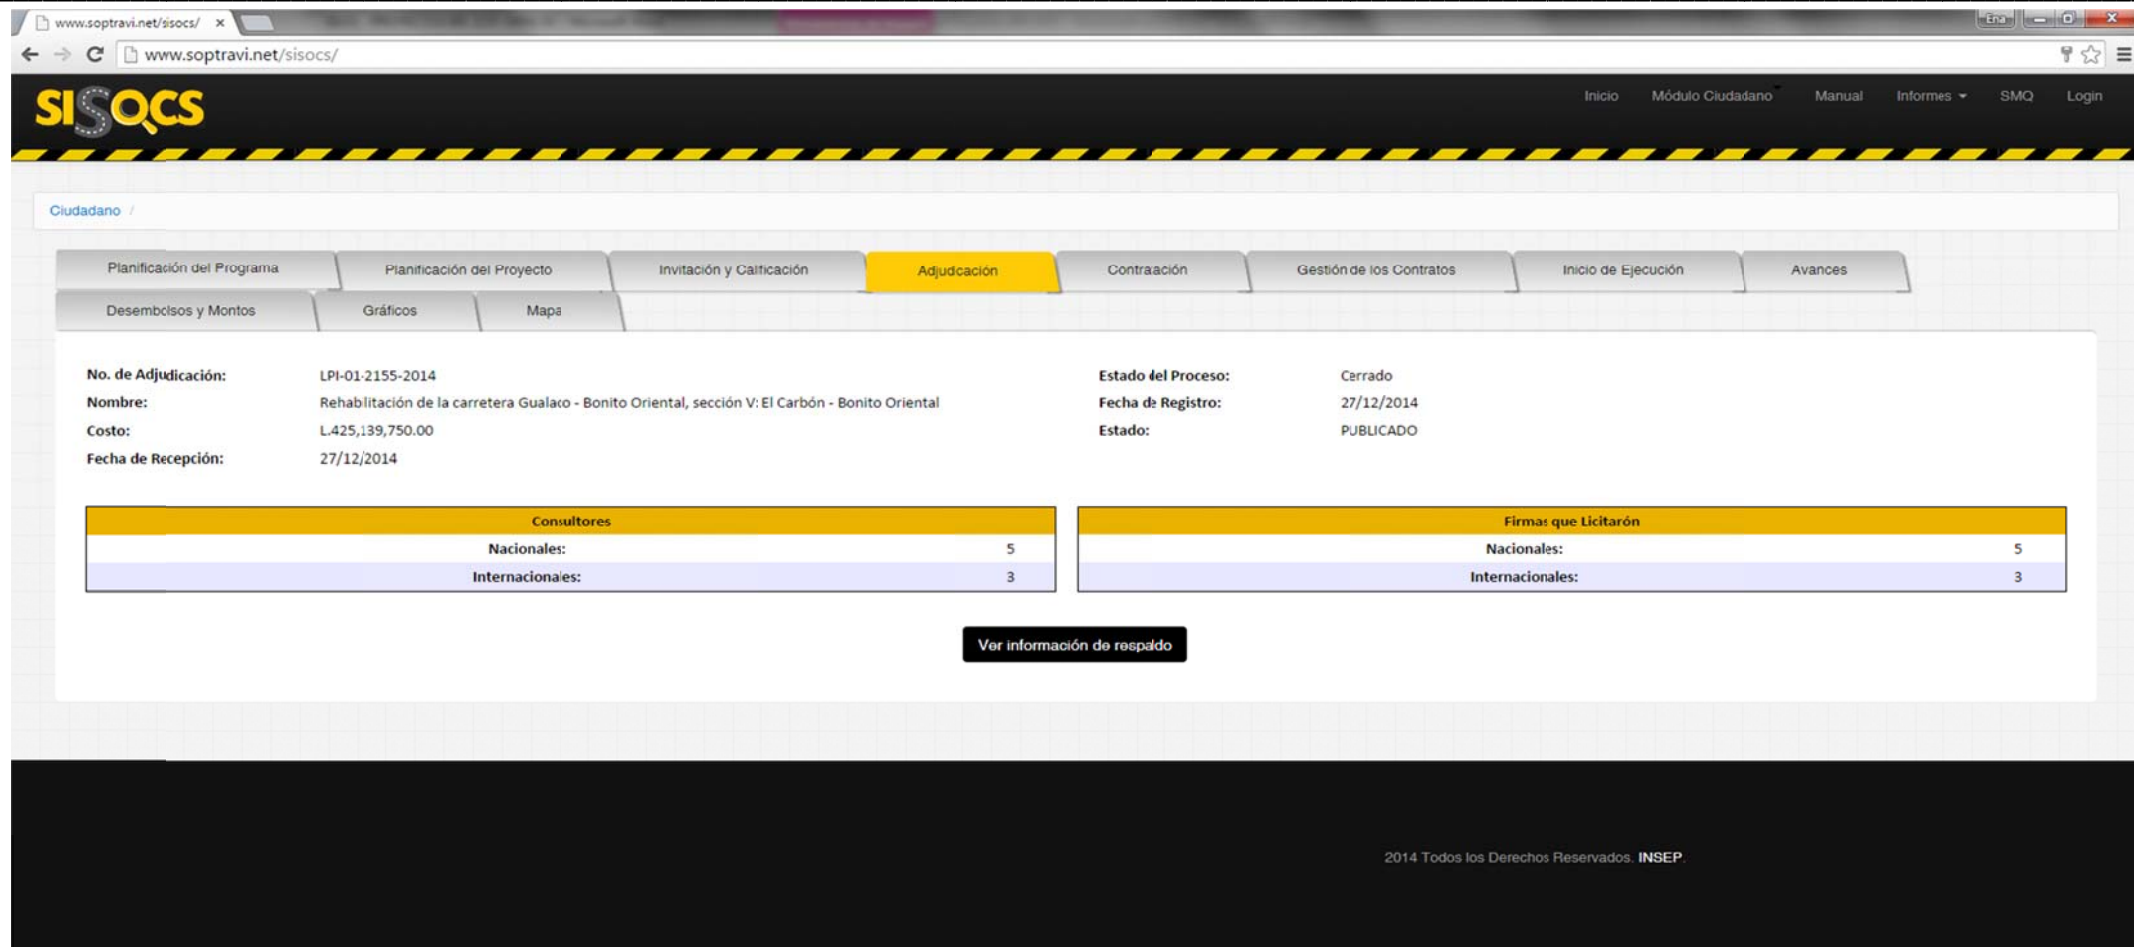

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. The main content area is titled 'Ciudadano /' and features a horizontal menu with the following items: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, **Adjudicación** (highlighted), Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the menu, there are sub-sections for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main data area displays the following information:

No. de Adjudicación:	LPI-01-2155-2014	Estado del Proceso:	Cerrado
Nombre:	Rehabilitación de la carretera Gualaco - Bonito Oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental	Fecha de Registro:	27/12/2014
Costo:	L.425,139,750.00	Estado:	PUBLICADO
Fecha de Recepción:	27/12/2014		


Below this information, there are two summary tables:

Consultores	
Nacionales:	5
Internacionales:	3

Firmas que Licitarón	
Nacionales:	5
Internacionales:	3

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below these tables. At the bottom of the page, a footer reads '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.'

Proyecto: Construcción de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

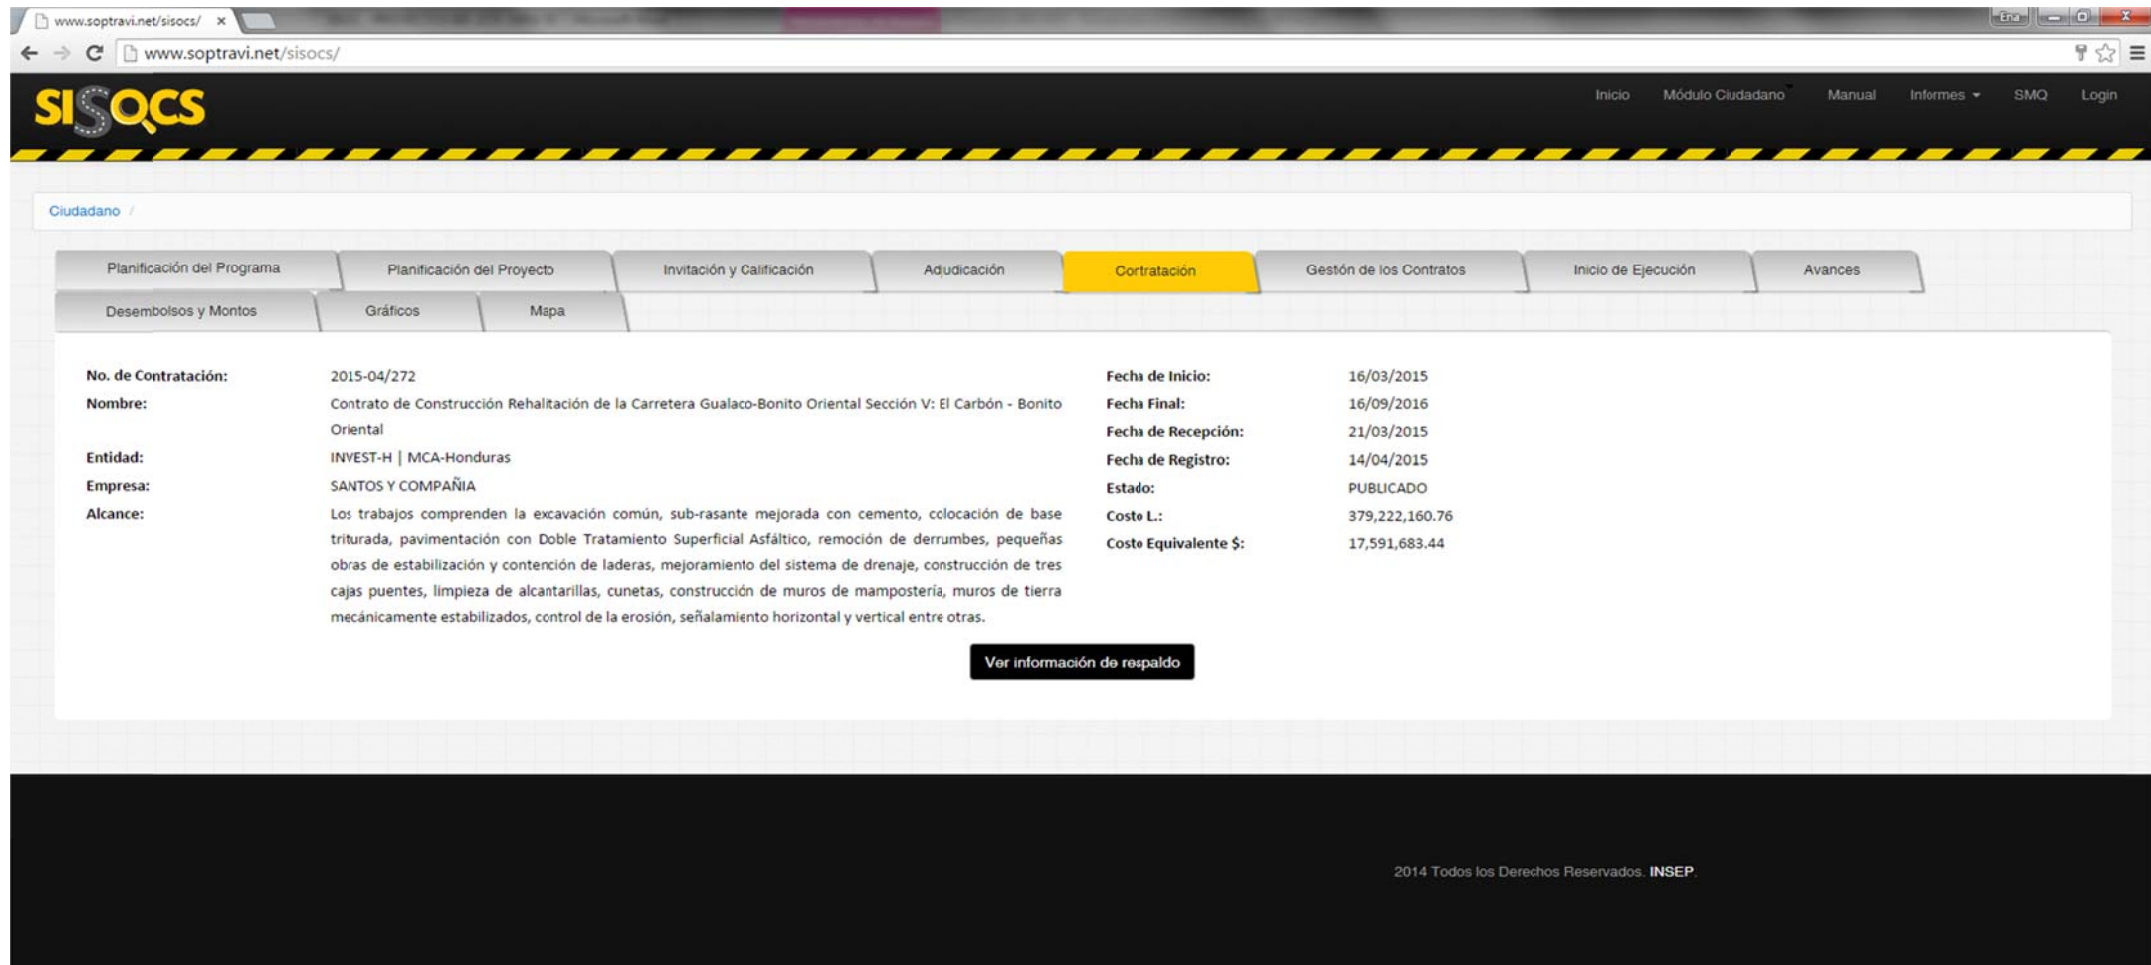


The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.soptravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMO, and Login. A breadcrumb trail shows 'Ciudadano /'. A horizontal menu contains several tabs: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, **Contratación** (highlighted), Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below this menu, there are sub-tabs for Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa. The main content area displays contract details in two columns:

No. de Contratación:	2015-04/272	Fecha de Inicio:	16/03/2015
Nombre:	Contrato de Construcción Rehalitación de la Carretera Gualaco-Bonito Oriental Sección V: El Carbón - Bonito Oriental	Fecha Final:	16/09/2016
Entidad:	INVEST-H MCA-Honduras	Fecha de Recepción:	21/03/2015
Empresa:	SANTOS Y COMPAÑIA	Fecha de Registro:	14/04/2015
Alcance:	Los trabajos comprenden la excavación común, sub-rasante mejorada con cemento, cclocación de base triturada, pavimentación con Doble Tratamiento Superficial Asfáltico, remoción de derrumbes, pequeñas obras de estabilización y contención de laderas, mejoramiento del sistema de drenaje, construcción de tres cajas puentes, limpieza de alcantarillas, cunetas, construcción de muros de mampostería, muros de tierra mecánicamente estabilizados, control de la erosión, señalamiento horizontal y vertical entre otras.	Estado:	PUBLICADO
		Costo L.:	379,222,160.76
		Costo Equivalente \$:	17,591,683.44

Below the details, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'. At the bottom of the page, a footer reads '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.'

Proyecto: Construcción de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

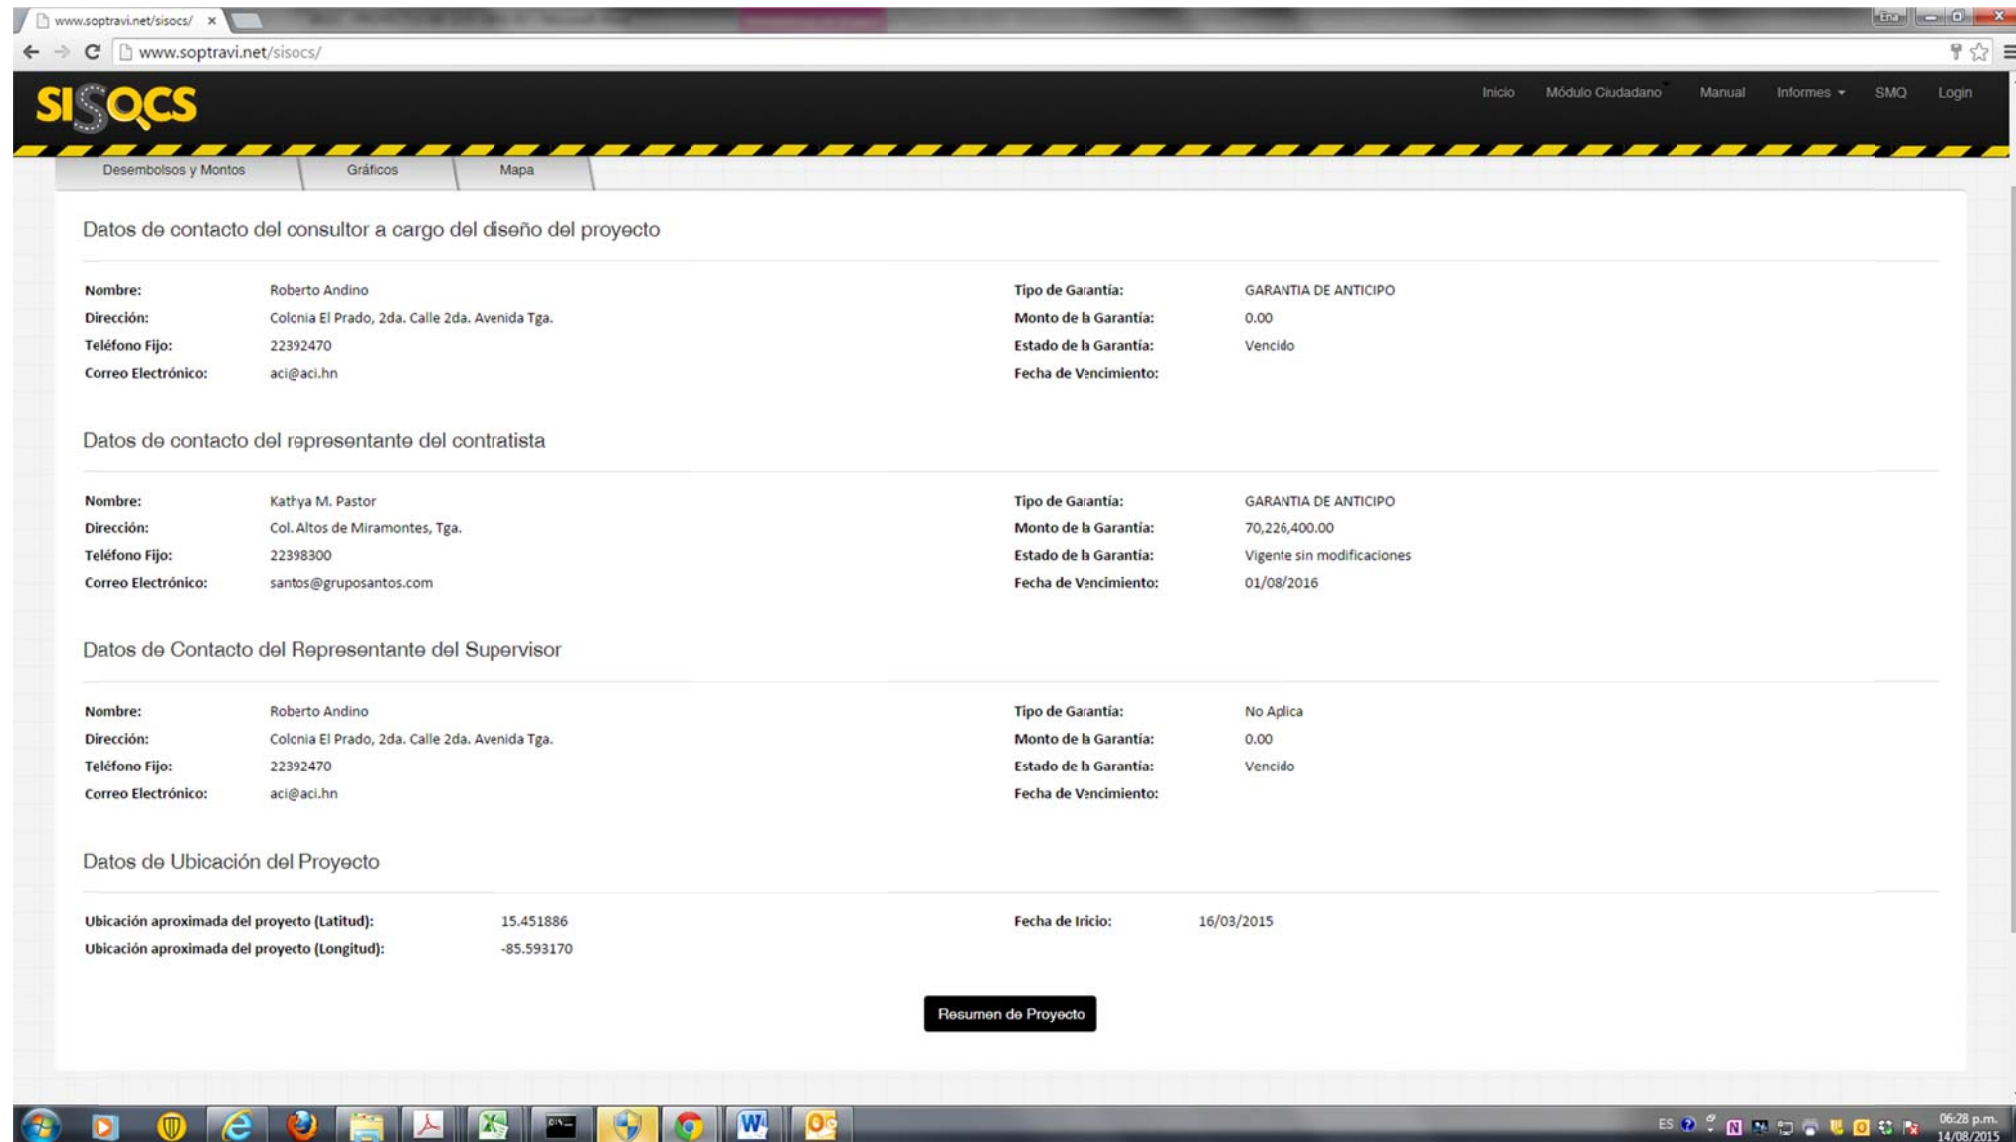

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.sopravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMO, and Login. Below the header, there are tabs for 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area is divided into sections for contact information and project location details.

Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto

Nombre:	Roberto Andino	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Colonia El Prado, 2da. Calle 2da. Avenida Tga.	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	22392470	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	aci@aci.hn	Fecha de Vencimiento:	

Datos de contacto del representante del contratista

Nombre:	Kathya M. Pastor	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Altos de Miramontes, Tga.	Monto de la Garantía:	70,226,400.00
Teléfono Fijo:	22398300	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	santos@gruposantos.com	Fecha de Vencimiento:	01/08/2016

Datos de Contacto del Representante del Supervisor

Nombre:	Roberto Andino	Tipo de Garantía:	No Aplica
Dirección:	Colonia El Prado, 2da. Calle 2da. Avenida Tga.	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	22392470	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	aci@aci.hn	Fecha de Vencimiento:	

Datos de Ubicación del Proyecto

Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	15.451886	Fecha de Inicio:	16/03/2015
Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	-85.593170		

[Resumen de Proyecto](#)

The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 06:28 p.m. on 14/08/2015.

Proyecto: Construcción de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

www.insep.gov.hn/sisocs/

SISQCS Menú Proyectos Inicio Módulo Ciudadano Menu Catálogos Admin. Usuarios Manual Informes SMQ Cerrar sesión (esanchez)

Ciudadano /

Planificación del Programa Planificación del Proyecto Invitación y Calificación Adjudicación Contratación Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances


Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

Nro.	Descripción	Monto	Fecha Desembolso
1	Pago de Anticipo del Proyecto.	70,226,326.00	02/03/2015
2	Estimación No. 1 correspondiente al Período del 16 de Marzo al 20 de Abril de 2015.	601,458.93	04/06/2015
3	Estimación No. 2 correspondiente al Período del 21 de Abril al 20 de Mayo de 2015.	2,633,503.21	25/06/2015
4	Estimación No. 3 correspondiente al Período del 21 de Mayo al 20 de Junio de 2015.	3,939,741.07	13/07/2015
5	Estimación No. 4 correspondiente al Período del 21 de Junio al 20 de Julio de 2015.	4,274,019.87	07/08/2015
6	Estimación No. 5 correspondiente al Período del 21 de Julio al 20 de Agosto de 2015.	8,268,804.79	12/09/2015
7	Estimación No. 6 correspondiente al Período del 21 de Agosto al 20 de Septiembre de 2015.	8,775,702.62	26/10/2015
8	Estimación No. 7 correspondiente al Período del 21 de Septiembre al 20 de Octubre de 2015.	6,166,889.07	11/11/2015
9	Estimación No. 8 correspondiente al Período del 21 de Octubre al 20 de Noviembre de 2015.	13,902,208.54	03/12/2015
10	Estimación No. 9A correspondiente al Período del 21 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2015.	11,539,865.35	08/12/2015
11	Estimación No. 9B correspondiente al Período del 06 al 20 de Diciembre de 2015.	2,722,013.51	03/02/2016
12	Estimación No. 10 correspondiente al Período del 21 de Diciembre al 20 de Enero de 2016.	10,688,308.31	16/02/2016
13	Estimación No. 11 correspondiente al Período del 21 de Enero al 20 de Febrero de 2016.	8,425,766.73	10/03/2016
14	Estimación No. 12 correspondiente al Período del 21 de Febrero al 20 de Marzo de 2016.	10,011,933.88	18/04/2016
15	Estimación No. 13 correspondiente al Período del 21 de Marzo al 20 de Abril de 2016.	17,689,714.98	04/05/2016
16	Estimación No. 14 correspondiente al Período del 21 de Abril al 20 de Mayo de 2016.	13,395,629.22	03/06/2016
17	Estimación No. 15 correspondiente al Período del 21 de Mayo al 20 de Junio de 2016.	17,821,357.92	12/07/2016
18	Estimación No. 16 correspondiente al Período del 21 de Junio al 20 de Julio de 2016.	13,647,667.59	11/08/2016
19	Estimación No. 17 correspondiente al Período del 21 de Julio al 20 de Agosto de 2016.	11,103,487.19	05/09/2016
20	Devolución del 50% de la Retención por Calidad de Obra realizada hasta la Estimación No. 17 que comprende el Período del 21 de Julio al 20 de Agosto.	12,166,385.12	22/09/2016

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

17:59 13/10/2016

Proyecto: Supervisión de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

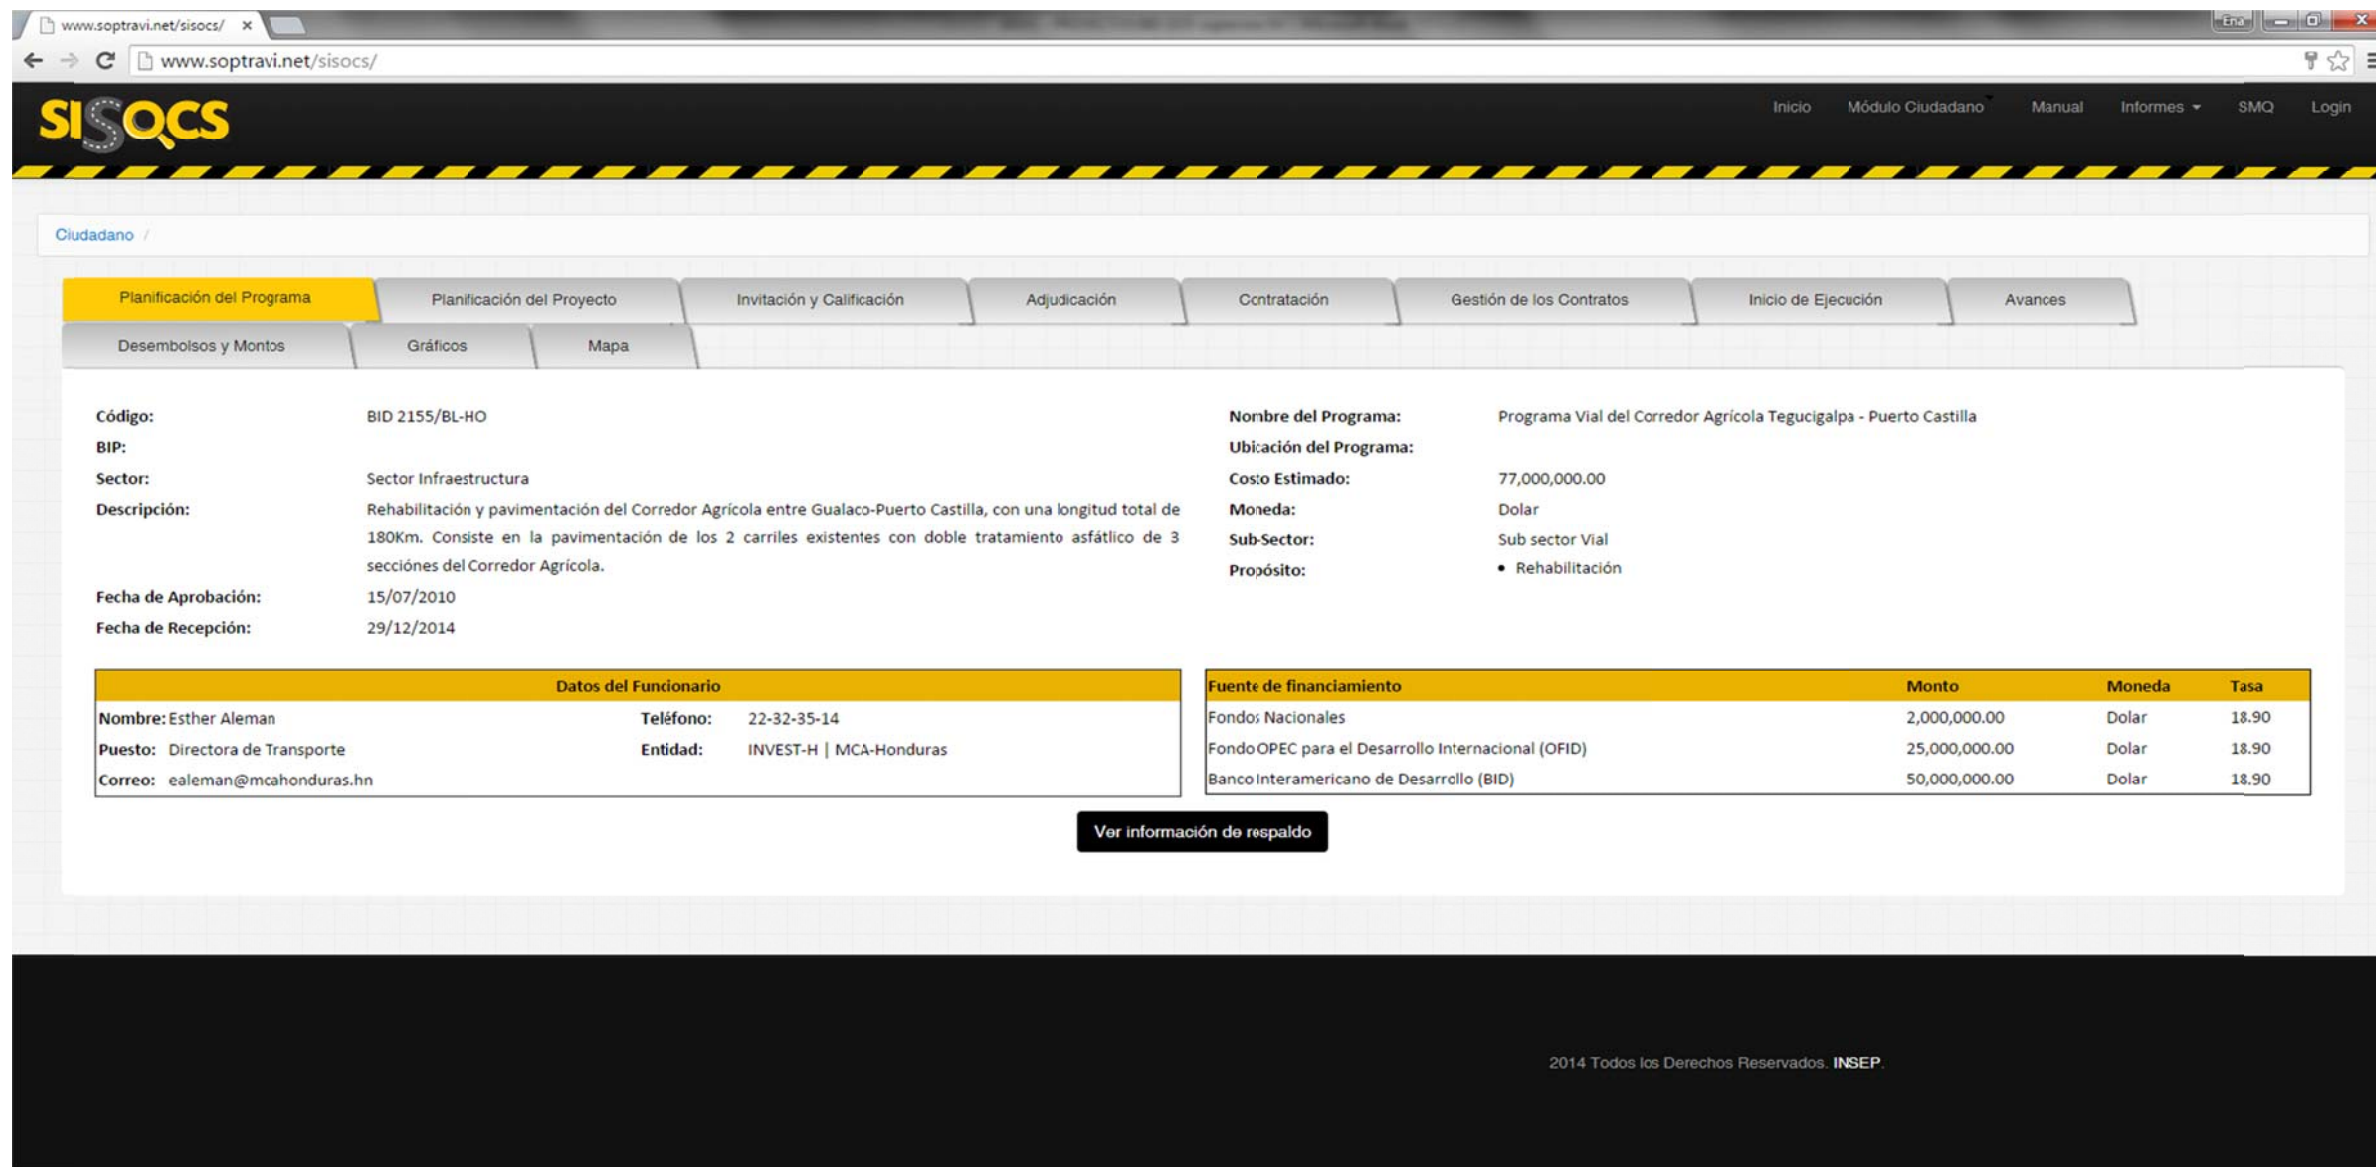

The screenshot shows the SISQCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SISQCS logo and menu items: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: Ciudadano / .

The main content area features a series of tabs for project management stages: Planificación del Programa (highlighted), Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación, Adjudicación, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Under the 'Planificación del Programa' tab, there are sub-tabs: Desembolsos y Montos, Gráficos, and Mapa.

The project details are displayed in two columns:

- Código:** BID 2155/BL-HO
- BIP:**
- Sector:** Sector Infraestructura
- Descripción:** Rehabilitación y pavimentación del Corredor Agrícola entre Gualaco-Puerto Castilla, con una longitud total de 180Km. Consiste en la pavimentación de los 2 carriles existentes con doble tratamiento asfáltico de 3 secciones del Corredor Agrícola.
- Fecha de Aprobación:** 15/07/2010
- Fecha de Recepción:** 29/12/2014
- Nombre del Programa:** Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa - Puerto Castilla
- Ubicación del Programa:**
- Costo Estimado:** 77,000,000.00
- Moneda:** Dolar
- Sub-Sector:** Sub sector Vial
- Propósito:**
 - Rehabilitación

Below the details, there are two tables:

Datos del Funcionario	
Nombre: Esther Aleman	Teléfono: 22-32-35-14
Puesto: Directora de Transporte	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras
Correo: ealeman@mcahonduras.hn	

Fuente de financiamiento	Monto	Moneda	Tasa
Fondo: Nacionales	2,000,000.00	Dolar	18.90
Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID)	25,000,000.00	Dolar	18.90
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	50,000,000.00	Dolar	18.90

At the bottom of the main content area, there is a button labeled "Ver información de respaldo".

The footer of the page contains the text: "2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP."

Proyecto: Supervisión de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

www.soptravi.net/sisocs/

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMQ Login

Ciudadano /

Planificación del Programa **Planificación del Proyecto** Invitación y Calificación Adjudicación Contratación Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances

Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

Código: LPI-01-2155-2014 **Piesupuesto:** L. 425,139,750.00

Nombre del Proyecto: Rehabilitación de la carretera Gualaco - Bonito Oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental **Descripción:** Comprende excavación común, subrasante mejorada con cemento, colocación de base triturada, pavimentación con Doble Tratamiento Superficial Asfáltico, remoción de derrumbes, pequeñas obras de estabilización y contención de laderas, mejoramiento del sistema de drenaje, construcción de tres cajas puentes, limpieza de alcantarillas, cunetas, construcción de muros de mampostería, muros de tierra mecánicamente estabilizados, control de la erosión, señalamiento horizontal y vertical, entre otras. Además, incluye obras de seguridad vial para control de velocidad y protección a los usuarios de la carretera y obras de mitigación ambiental.

Departamento: Colón **Fecha de Aprobación:** 01/12/2011

Estado: PUBLICADO **Fecha de Recepción:**

Fecha de Registro: 22/12/2014

Datos del Funcionario		Fuente de financiamiento		
Nombre: Vicente Arturo Zúñiga González	Teléfono: 95148430	Monto	Moneda	Tasa
Puesto: Coordinador de Prestamo BID	Entidad: INVEST-H MCA-Honduras	Fonco OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID)	22,500,000.00	Dolar 18.90
Correo: vzuniga@mcahonduras.hn				


Código Departamento	Departamento	Código Municipio	Municipio	KM
02	Colón	10	Bonito Oriental	20
15	Olancho	17	San Esteban	25.67

[Ver información de respaldo](#)

45.55.193.11/sisocs/index.php?r=ciudadano/FichaTecnica&control=Contratacion&id=170#

ES 06:29 p.m. 14/08/2015

Proyecto: Supervisión de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

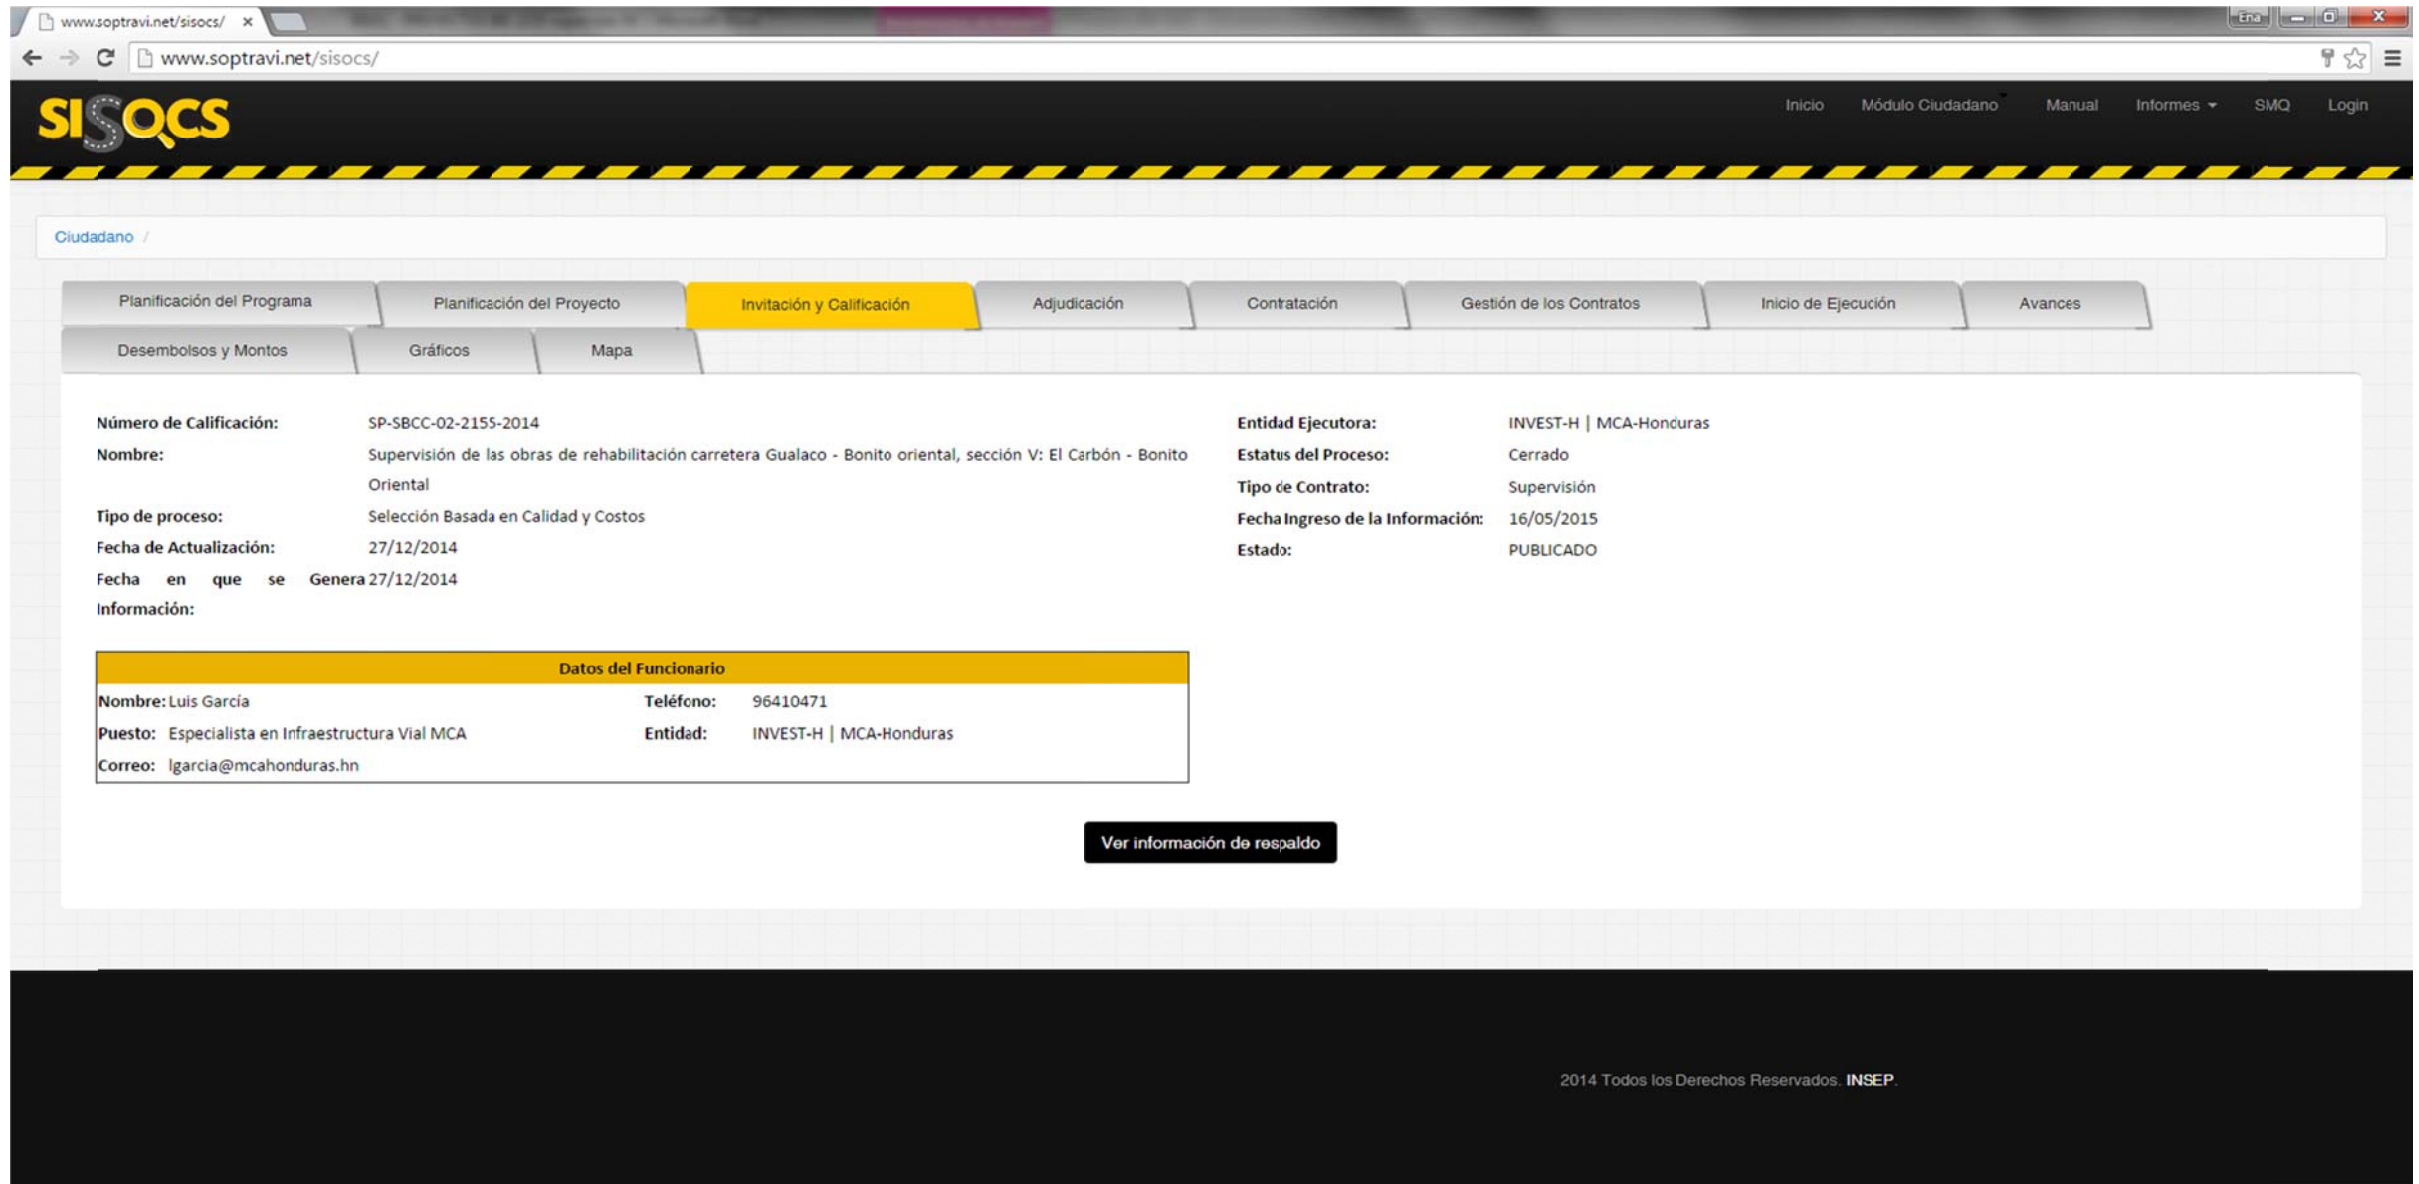

The screenshot shows the SISQCS web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SISQCS logo and menu items: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. Below the navigation bar is a breadcrumb trail: Ciudadano / . A horizontal menu contains several tabs: Planificación del Programa, Planificación del Proyecto, Invitación y Calificación (highlighted in yellow), Adjudicación, Contratación, Gestión de los Contratos, Inicio de Ejecución, and Avances. Below the tabs, there are two columns of information. The left column contains: Número de Calificación: SP-SBCC-02-2155-2014; Nombre: Supervisión de las obras de rehabilitación carretera Gualaco - Bonito oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental; Tipo de proceso: Selección Basada en Calidad y Costos; Fecha de Actualización: 27/12/2014; Fecha en que se Genera: 27/12/2014; Información: (with a sub-section for 'Datos del Funcionario'). The right column contains: Entidad Ejecutora: INVEST-H | MCA-Honduras; Estatus del Proceso: Cerrado; Tipo de Contrato: Supervisión; Fecha Ingreso de la Información: 16/05/2015; Estado: PUBLICADO. At the bottom of the information area, there is a button labeled 'Ver información de respaldo'. The footer of the page reads: 2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

www.soptravi.net/sisocs/

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMQ Login

Ciudadano /

Planificación del Programa Planificación del Proyecto **Invitación y Calificación** Adjudicación Contratación Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances

Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

Número de Calificación: SP-SBCC-02-2155-2014
Nombre: Supervisión de las obras de rehabilitación carretera Gualaco - Bonito oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental
Tipo de proceso: Selección Basada en Calidad y Costos
Fecha de Actualización: 27/12/2014
Fecha en que se Genera: 27/12/2014
Información:

Entidad Ejecutora: INVEST-H | MCA-Honduras
Estatus del Proceso: Cerrado
Tipo de Contrato: Supervisión
Fecha Ingreso de la Información: 16/05/2015
Estado: PUBLICADO


Datos del Funcionario

Nombre: Luis García **Teléfono:** 96410471
Puesto: Especialista en Infraestructura Vial MCA **Entidad:** INVEST-H | MCA-Honduras
Correo: lgarcia@mcahonduras.hn

[Ver información de respaldo](#)

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Supervisión de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

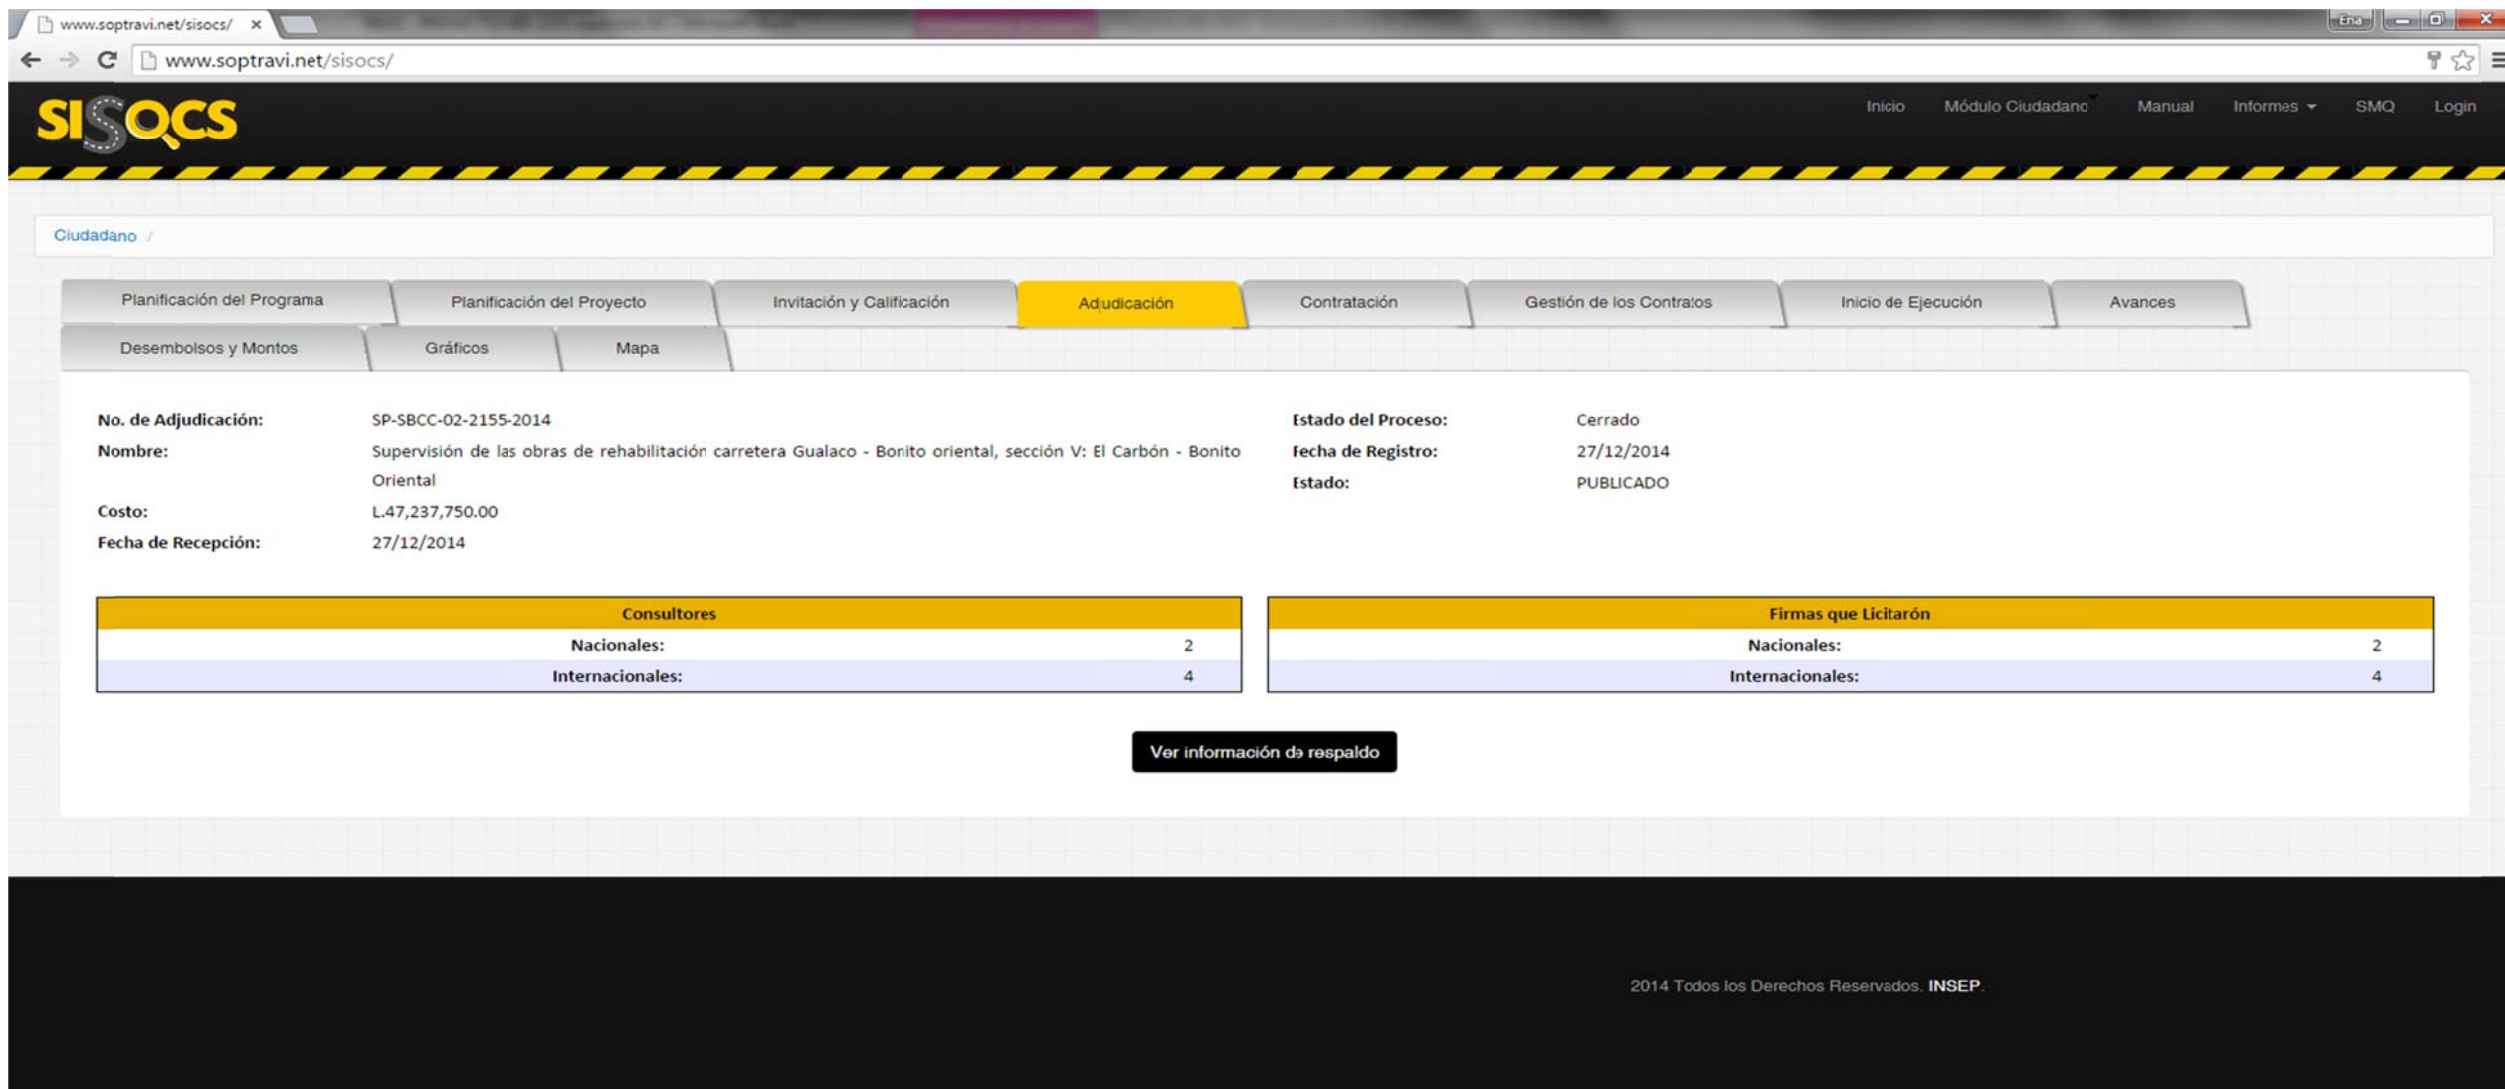

www.soptravi.net/sisocs/

SISQCS Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMQ Login

Ciudadano /

Planificación del Programa Planificación del Proyecto Invitación y Calificación **Adjudicación** Contratación Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances

Desembolsos y Montos Gráficos Mapa


No. de Adjudicación: SP-SBCC-02-2155-2014 **Estado del Proceso:** Cerrado
Nombre: Supervisión de las obras de rehabilitación carretera Gualaco - Bonito oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental **fecha de Registro:** 27/12/2014
Costo: L.47,237,750.00 **Estado:** PUBLICADO
Fecha de Recepción: 27/12/2014

Consultores		Firmas que Licitaron	
Nacionales:	2	Nacionales:	2
Internacionales:	4	Internacionales:	4

[Ver información de respaldo](#)

2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.

Proyecto: Supervisión de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

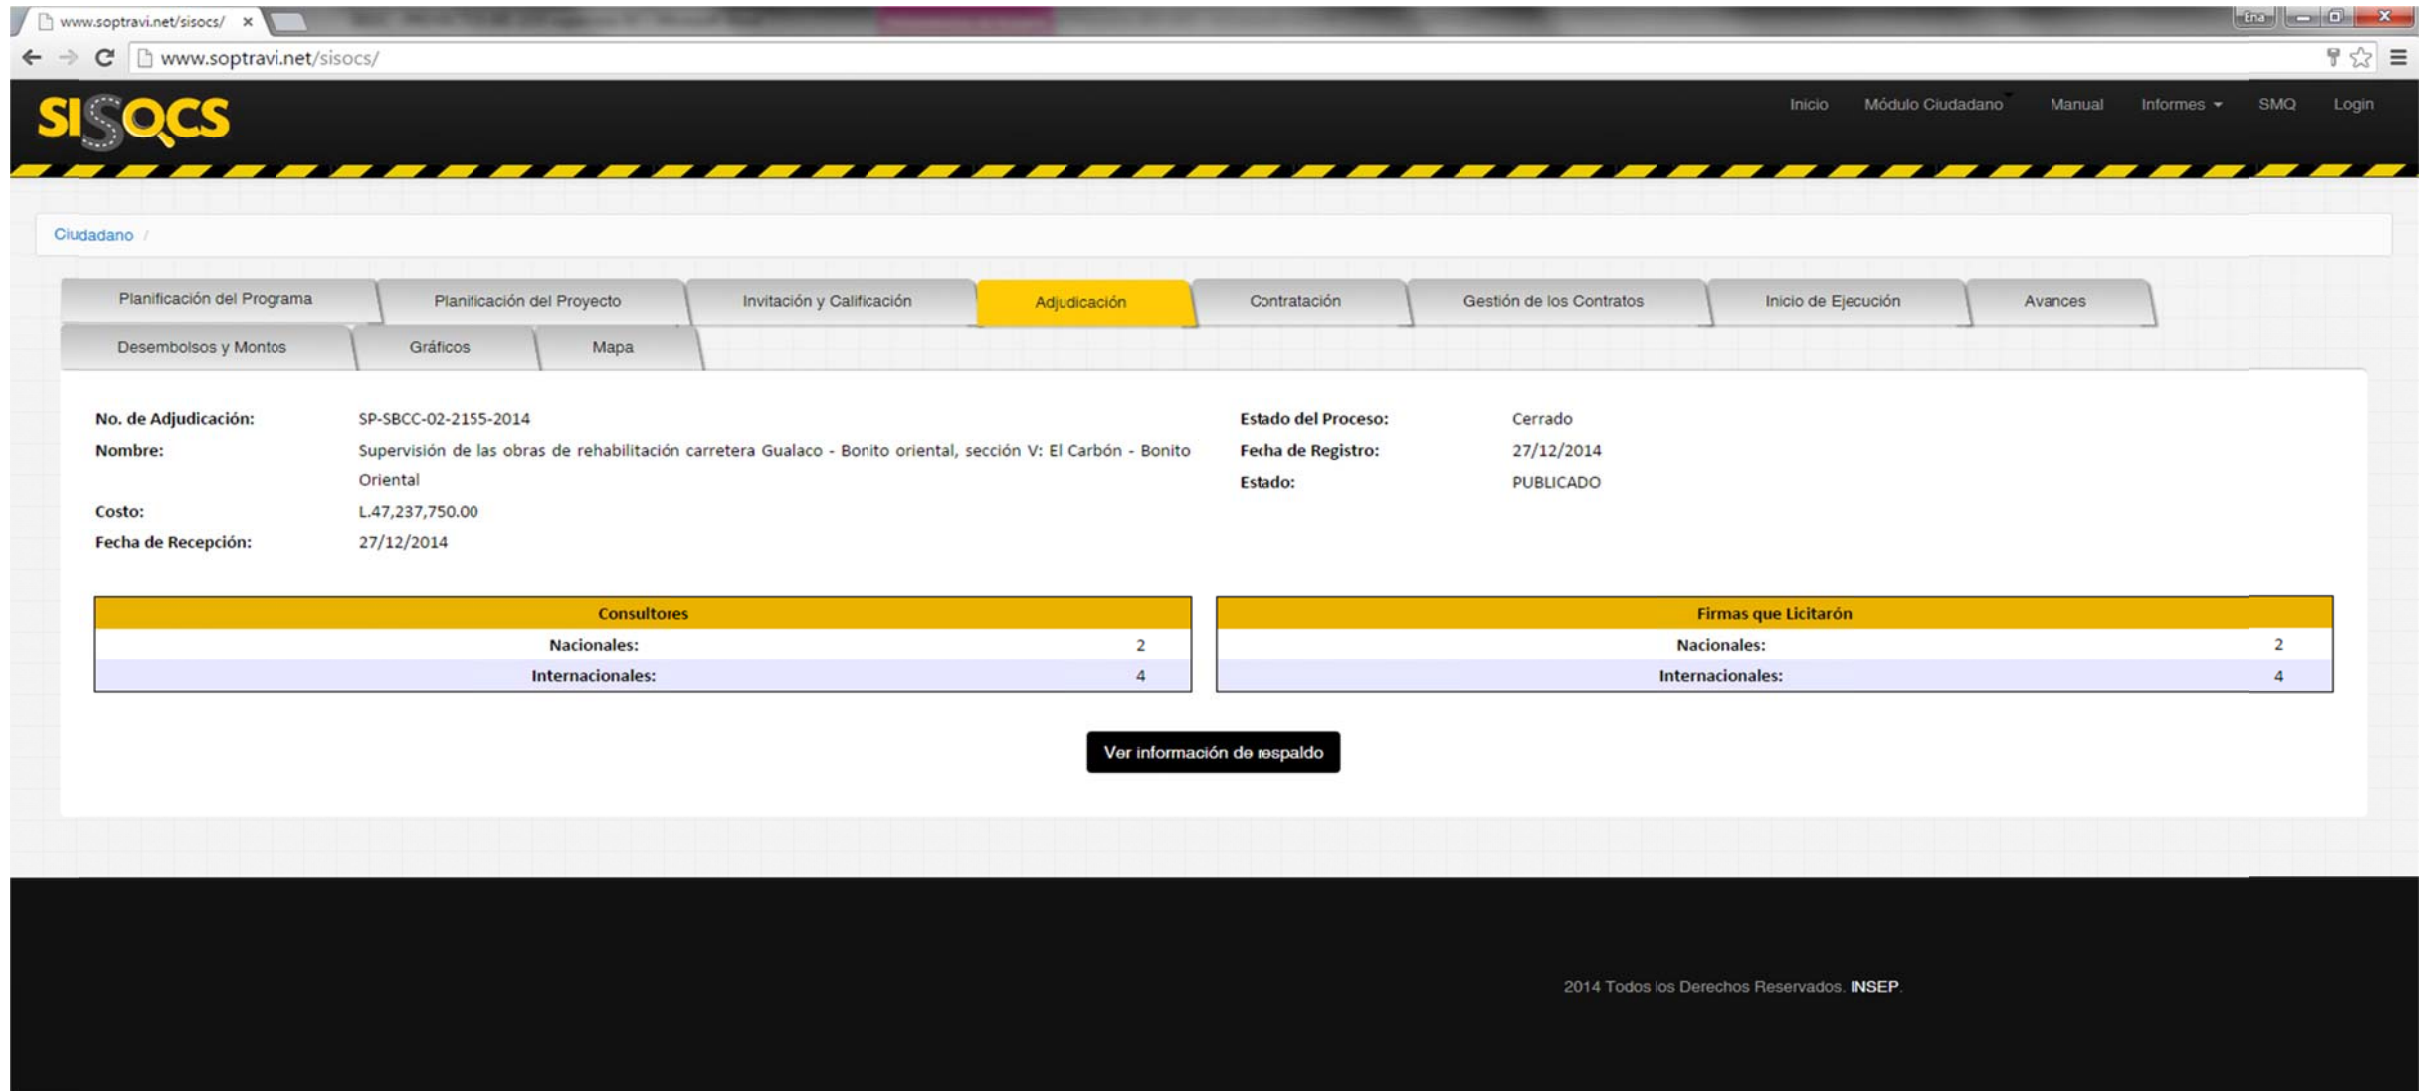

The screenshot shows the SISQCS web application interface. The browser address bar displays 'www.sopravi.net/sisocs/'. The application header includes the SISQCS logo and navigation links: Inicio, Módulo Ciudadano, Manual, Informes, SMQ, and Login. A breadcrumb trail shows 'Ciudadano /'. The main navigation menu is divided into two rows of tabs. The first row includes 'Planificación del Programa', 'Planificación del Proyecto', 'Invitación y Calificación', 'Adjudicación' (highlighted in yellow), 'Contratación', 'Gestión de los Contratos', 'Inicio de Ejecución', and 'Avances'. The second row includes 'Desembolsos y Montos', 'Gráficos', and 'Mapa'. The main content area displays the following information:

- No. de Adjudicación:** SP-SBCC-02-2155-2014
- Nombre:** Supervisión de las obras de rehabilitación carretera Gualaco - Bonito oriental, sección V: El Carbón - Bonito Oriental
- Costo:** L.47,237,750.00
- Fecha de Recepción:** 27/12/2014
- Estado del Proceso:** Cerrado
- Fecha de Registro:** 27/12/2014
- Estado:** PUBLICADO

Below this information are two summary tables:

Consultores	
Nacionales:	2
Internacionales:	4

Firmas que Licitaron	
Nacionales:	2
Internacionales:	4

A button labeled 'Ver información de respaldo' is located below the tables. At the bottom of the page, a footer reads '2014 Todos los Derechos Reservados. INSEP.'

Proyecto: Supervisión de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

www.soptravi.net/sisocs/ x

www.soptravi.net/sisocs/ Inicio Módulo Ciudadano Manual Informes SMQ Login

SISQCS

Ciudadano /

Planificación del Programa Planificación del Proyecto Invitación y Calificación Adjudicación Contratación Gestión de los Contratos **Inicio de Ejecución** Avances

Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

Datos de contacto del consultor a cargo del diseño del proyecto

Nombre:	Roberto Andino	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Colonia El Prado, 2da. Calle 2da. Avenida Tga.	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	22392470	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	aci@aci.hn	Fecha de Vencimiento:	17/04/2015

Datos de contacto del representante del contratista

Nombre:	Kathya M. Pastor	Tipo de Garantía:	GARANTIA DE ANTICIPO
Dirección:	Col. Altos de Miramontes, Tga.	Monto de la Garantía:	70,226,400.00
Teléfono Fijo:	22398300	Estado de la Garantía:	Vigente sin modificaciones
Correo Electrónico:	santos@gruposantos.com	Fecha de Vencimiento:	01/08/2016

Datos de Contacto del Representante del Supervisor

Nombre:	Roberto Andino	Tipo de Garantía:	N/A
Dirección:	Colonia El Prado, 2da. Calle 2da. Avenida Tga.	Monto de la Garantía:	0.00
Teléfono Fijo:	22392470	Estado de la Garantía:	Vencido
Correo Electrónico:	aci@aci.hn	Fecha de Vencimiento:	01/08/2016

Datos de Ubicación del Proyecto

Ubicación aproximada del proyecto (Latitud):	15.451886	Fecha de Inicio:	16/01/2015
Ubicación aproximada del proyecto (Longitud):	-85.593170		

ES 06:31 p.m. 14/08/2015

Proyecto: Supervisión de las Obras de Rehabilitación de la Carretera Gualaco – Bonito Oriental, Sección V: El Carbón – Bonito Oriental

www.insep.gob.hn/sisocs/

Menú Proyectos Inicio Módulo Ciudadano Menu Catálogos Admin Usuarios Manual Informes SMQ Cerrar sesión (esanchez)


Ciudadano



Planificación del Programa Planificación del Proyecto Invitación y Calificación Adjudicación Contratación Gestión de los Contratos Inicio de Ejecución Avances

Desembolsos y Montos Gráficos Mapa

Nro.	Descripción	Monto	Fecha Desembolso
1	Pago No. 1 correspondiente al Informe Inicial y de Revisión.	3,597,966.26	12/03/2015
2	Pago No. 2 correspondiente al Informe Mensual de Supervisión No. 1 (Marzo/2015).	1,027,990.17	15/04/2015
3	Pago No. 3 correspondiente al Informe Mensual de Supervisión No. 2 (Abril/2015).	1,027,990.17	19/05/2015
4	Pago No. 4 correspondiente al Informe Mensual de Supervisión No. 3 (Mayo/2015).	1,032,267.64	25/06/2015
5	Pago No. 5 correspondiente al Informe Mensual de Supervisión No. 4 (Junio/2015).	1,031,900.19	10/07/2015
6	Pago No. 6 correspondiente al Informe Mensual de Supervisión No. 5 (Julio/2015).	1,035,329.70	24/08/2015
7	Pago No. 7 correspondiente al Informe de Supervisión No. 6 (Agosto/2015).	1,035,588.79	28/09/2015
8	Pago No. 8 correspondiente al Informe de Supervisión No. 7 (Septiembre/2015).	1,040,054.69	30/10/2015
9	Pago No. 9 correspondiente al Informe de Supervisión No. 8 (Octubre/2015).	1,048,915.82	23/11/2015
10	Pago No. 10 correspondiente al Informe de Supervisión No. 9 (Noviembre/2015).	1,048,915.82	08/12/2015
11	Pago No. 11 correspondiente al Informe de Supervisión No. 10 (Diciembre/2015).	1,063,623.13	03/02/2016
12	Pago No. 12 correspondiente al Informe de Supervisión No. 11 (Enero/2016).	1,065,158.87	01/03/2016
13	Pago No. 13 correspondiente al Informe de Supervisión No. 12 (Febrero/2016).	1,066,346.01	29/03/2016
14	Pago No. 14 correspondiente al Informe de Supervisión No. 13 (Marzo/2016).	1,063,872.80	27/04/2016
15	Pago No. 15 correspondiente al Informe de Supervisión No. 14 (Abril/2016).	1,067,307.03	19/05/2016
16	Pago No. 16 correspondiente al Informe de Supervisión No. 15 (Mayo/2016).	1,072,752.78	27/06/2016
17	Pago No. 17 correspondiente al Informe de Supervisión No. 16 (Junio/2016).	1,078,189.12	08/08/2016
18	Pago No. 18 correspondiente al Informe de Supervisión No. 17 (Julio/2016).	1,078,495.33	08/08/2016
19	Pago No. 19 correspondiente al Informe de Supervisión No. 18 (Agosto/2016).	1,082,315.83	13/09/2016

Resolviendo host...



Responsable: Ena Mercedes Sánchez García
Asistente Administrativo Cartera BID de la Dirección de Transporte INVEST-H / MCA-H
Actualizado al 30 de Septiembre de 2016.
