



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	06
Construcción y Mantenimiento de pozos para agua potable		Plan del Ocotal	1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto:			Cargo del Supervisor(a)			
Infraestructura agua y saneamiento			Jefe de la Unidad Técnica Municipal			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: 14.8033	Long: - 88.6066	Fecha de Inicio de la obra	Julio 2023	Fecha de inicio del reporte:	Diciembre 2023
Coordenadas del final de la obra:	Lat: 14°51'23.31	Long: -- 88°16'49.47		Número telefónico:		
Empleos Directos:	2			9946-5694	Fecha de final del reporte:	Diciembre 2023
Empleos Indirectos:	5			Correo Electrónico		
Duración del Proyecto:	Cuatro meses		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com			

4. Situación de Campo			5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto :	Si	☒	El proyecto en cuestión, esta con altas afectaciones a raíz de los desastres naturales y otras causadas por el hombre, dicho proyecto fue construido en el periodo del ex alcalde Prof. Lucio Argueta. Durante casi 15 años, el proyecto nunca más fue atendido y tampoco se le dio el debido mantenimiento por parte de la comunidad, el pozo del cual se almacena el agua, se le construyo una pila, la misma está en mal estado y se espera ser reemplazada por un tanque de menor rango, colocar nueva tubería PVC para almacenar agua en un tanque ya existente, habilitar los baños públicos y construirle el respectivo techo.	
Estado del tiempo:	Lluvioso			
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	20km			
6. Recursos Presentes en Obra				
Personal/Mano de Obra:	Adecuada	☒	Suficiente	☒
Materiales:	Adecuada	☒	Suficiente	☒
Equipos y herramientas:	Adecuado	☒	Suficiente	☒





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

Para la supervisión realizada se hicieron las siguientes observaciones:

1. Elaboración de tres puertas para baños
2. Se levantó la minuta para techo de estructura metálica.
3. Minuta para la cerca perimetral de la parte frontal, para la cual también se dieron instrucciones de cómo se debía hacer.
4. Se revisaron los accesorios de material policloruro de vinilo de los cuales hacían falta varios accesorios para completar algunas obras y se trajo para cambio dos T de 1 ½ pulga, ASTM D2466 SCH40, estas se estarían cambiando por una cruz de policloruro de vinilo de 1 pulga y 1 tapón de 1 pulga.
5. Y hizo la sugerencia que las estructuras solo fueran arenilladas ya que estas se van a pintar.
6. Se socializo la elaboración del techo y las puertas de base metálica con el contratista que hará el trabajo para ver precios y materiales.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**


8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Levantamiento de medidas del área del techo de la toda la obra.



Descripción: Líderes comunitarios y representación de la municipalidad a cargo del proyecto.

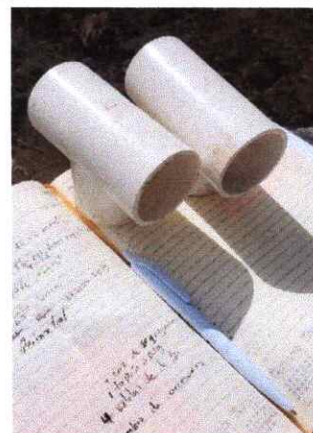

Descripción: T de cambio 1 ½

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte		
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiaria	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	06	
Construcción de tanque para proyecto de agua potable		El Supte, Santa Rita	1313-1998-00298				
Tipo de Proyecto:			Cargo del Supervisor(a)				
Infraestructura, Agua y Saneamiento		Jefe de la Unidad Técnica Municipal		Fecha de inicio del reporte:		Dic. 2023	
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: 14.81959715 Long: - 88.64716893	Fecha de Inicio de la obra	Septiembre 2023		Fecha de final del reporte:		Dic. 2023
Coordenadas del final de la obra:	Lat: 14.81959715 Long: - 88.64716893		Número telefónico:				
Empleos Directos:	2		9946-5694		Fecha de final del reporte:	Dic. 2023	
Empleos Indirectos:	30		Correo Electrónico				
Duración del Proyecto:	Cuatro meses		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com				

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto de:	Si ☐ NO ☒	Construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de agua para distribución en el B° el supte. El tanque tendrá una altura del 1.50mts. Para un almacenamiento de 3,000.00 galones de agua potable.	
Estado del tiempo:	Lluvioso		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	21km		
6. Recursos Presentes en Obra			
Personal/Mano de Obra:	Adecuada ☒	Suficiente ☒	
Materiales:	Adecuado ☒	Suficiente ☒	
Equipos y herramientas:	Adecuado ☒	Suficiente ☒	






7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

No se realizó inspección al proyecto de manera concluyente, porque el proyecto aún sigue en la fase de la quinta inspección, en primer lugar porque se había contemplado el cambio de ladrillo y el proveedor no cumplió en tiempo y forma la entrega del mismo causando el retraso de la obra, por otro lado se solicitaron materiales de ferreteros y estos no fueron cotizados y comprados en el tiempo solicitado, solo se pudo entregar cemento, en los próximos 15 días del mes hubo cierre de mes y cambio de personal en las unidades de compras y suministros y el técnico supervisor a cargo de la obra estuvo de vacaciones. El proyecto se ha retomado en el mes de enero 2024.

Mediante un monitoreo realizado, el maestro de obra indico que estarían en el sitio de la obra a partir del día 08 de enero 2024, lo que nos está permitiendo el acarreo de materiales para evitar atrasos en esa semana de la ejecución.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto

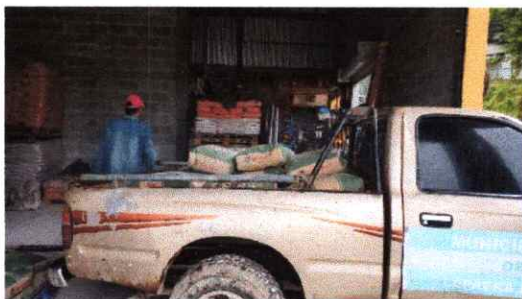

Descripción: Acarreo de cemento de la Bodega Reyes al proyecto de la comunidad del Supte-Algodonal Santa Rita



Describeión: Entrega del cemento.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	02
Alumbrado del Campo de Fútbol		JAGUA	1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto: Infraestructura, social			Cargo del Supervisor(a)			
Jefe de la Unidad Técnica Municipal		Fecha de inicio del reporte:		Diciembre 2023		
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: 14.88745088	Long: - 88.54960108	Noviembre 2023		Fecha de inicio del reporte:	
Coordenadas del final de la obra:	Lat: 14.88745088	Long: - 88.54960108	Número telefónico:		Fecha de final del reporte:	
Empleos Directos:	2		9946-5694		Diciembre 2023	
Empleos Indirectos:	10		Correo Electrónico		Fecha de final del reporte:	
Duración del Proyecto:	Tres meses		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com		Diciembre 2023	

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto de:	Si ☐ NO ☒	El proyecto consiste en la iluminación del campo de fútbol, mismo que beneficiara toda la zona numero 3 ya que se cuenta con un amplio espacio utilizado para practicar deportes, para fomentar la participación comunitaria es necesario contar con una infraestructura adecuada para realizar acciones sociales recreativas, el área del campo no posee instalación eléctrica para realizar ese tipo de actividades en horas nocturnas, por tal motivo se está llevando a cabo la gestión del proyecto. El alumbrado para locales deportivos se debe procurar tener en las mejores condiciones de visibilidad para los deportistas, árbitros y entrenadores, la calidad del alumbrado influye de manera directa en el rendimiento de visual, concentración, seguridad, y el bienestar del jugador.	
Estado del tiempo:	Lluvioso		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	12km		
6. Recursos Presentes en Obra			
Personal/Mano de Obra:	Adecuado ☒ Suficiente ☒		
Materiales:	Adecuado ☒ Suficiente ☒		
Equipos y herramientas:	Adecuado ☒ Suficiente ☒		





7. Diagnóstico de Avance del Proyecto


En la inspección realizada se determinaron las siguientes obras a ejecutar:

1. Suministro e instalación de postes de madera 40FT, los cuales ya están el sitio de la obra.
2. Suministro e instalación de reflectores de 800WTS LED.
3. Suministro e instalación de extensión de línea primaria, transformador de 15Kva y accesorios.
4. Suministro e instalación de cable subterráneo con su correspondiente tubería.
5. Suministro e instalación de panel de control de iluminación.
6. Construcción de una caseta para guardar materiales.
7. Perforación de agujeros para sentar los postes de madera 40FT.

Todas las obras antes mencionadas, a excepción, de la primera ninguna otra se ha realizado, esto debido a dos razones, 1. Simultáneamente se dio este proyecto junto con la construcción del parque infantil, las mismas personas estarían trabajando en ambas obras siendo el recurso humano insuficiente para hacer el trabajo con calidad y eficiencia, 2. Para la apertura de los agujeros el clima era lluvioso imposibilitando poder perforarlos ya que esto producía mucho lodo. Por eso se optó primero en terminar el parque el cual ya fue finalizado y entregado, para retomar este proyecto en la semana en curso.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto

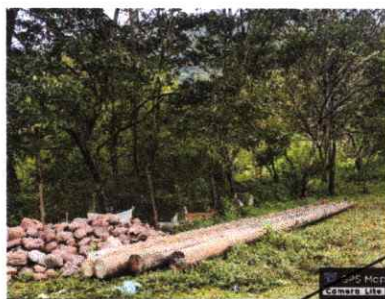

Descripción: Entrega de postes de madera 40FT

Descripción: Materiales eléctricos.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR

