



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Nombre Del Proyecto: ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED
ALDEA: LA CRUZ Y CERRO CHATO
MUNICIPIO: AGUANQUETERIQUE
DEPARTAMENTO: LA PAZ

EJECUTOR: Diseño Y Construcciones Electromecánicas Y Civiles
DICONELEC S. DE R.L

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.

A excepción de las actividades o correcciones abajo indicadas:

Y se acuerda la recepción final para el día: 13 de febrero del 2024

Lugar y fecha de recepción Provisional: Aguanqueterique La Paz a los 6 de febrero de 2024


Erlin Omar Rodriguez Ramos
Alcalde Municipal


Javier Fermin Calix Manulez
Contratista


Abner Israel Perdomo
Técnico Municipal Aguanqueterique



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Nombre Del Proyecto: ELECTRIFICACION RURAL CON
INTERCONEXION A LA RED

ALDEA: LA CRUZ Y CERRO CHATO

MUNICIPIO: AGUANQUETERIQUE

DEPARTAMENTO: LA PAZ

EJECUTOR: Diseño Y Construcciones Electromecánicas Y Civiles
DICONELEC S. DE R.L

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, y el solicitante asume con la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida

Y entregada al mismo, y contactar con la institución y que asuma la responsabilidad que le corresponde.

En fe de lo anterior se firma la presente acta dando por concluida la obra.
Y se firma el acta

Aguanqueterique, La Paz
Lugar y fecha


Erlin Omar Rodriguez Ramos
Alcalde Municipal


Javier Fermin Cortez Manuéllez
Contratista


Abner Israel Pardo
Técnico Utr Aguanqueterique

ESTIMACION NO. 3
MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED
 UBICACIÓN: LA CRUZ Y CERRO CHATO MUNICIPIO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.
 EJECUTOR : DICONELEC S. DE R.L.
 ESTIMACION No. 3



Periodo: del 5 de diciembre de 2023 AL 24 DE ENERO DE 2024

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO LA CRUZ	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
						CANT	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
1	ESTRUCTURA A-II-5 (p/34.5 KV)	C/U	4.00	7,828.00	L. 31,312.00	4.00	31,312.00		0.00	4.00	31,312.00	100.00	
2	ESTRUCTURA A-II-1 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	3,090.00	L. 6,180.00	2.00	6,180.00		0.00	2.00	6,180.00	100.00	
3	ESTRUCTURA A-II-2 (p/34.5 KV)	C/U	4.00	5,253.00	L. 21,012.00	4.00	21,012.00		0.00	4.00	21,012.00	100.00	
4	ESTRUCTURA A-II-4 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	5,047.00	L. 10,094.00	2.00	10,094.00		0.00	2.00	10,094.00	100.00	
5	ESTRUCTURA A-I-6 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	8,858.00	L. 8,858.00	1.00	8,858.00		0.00	1.00	8,858.00	100.00	
6	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	6.00	1,478.05	L. 8,868.30	6.00	8,868.30		0.00	6.00	8,868.30	100.00	
7	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	9.00	1,648.92	L. 14,840.28	9.00	14,840.28		0.00	9.00	14,840.28	100.00	
8	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	1.00	2,417.37	L. 2,417.37	1.00	2,417.37		0.00	1.00	2,417.37	100.00	
9	ESTRUCTURA B-II-1A	C/U	1.00	1,385.16	L. 1,385.16	1.00	1,385.16		0.00	1.00	1,385.16	100.00	
10	ESTRUCTURA B-II-8B	C/U	1.00	2,614.97	L. 2,614.97	1.00	2,614.97		0.00	1.00	2,614.97	100.00	
11	DETALLE DE NEUTRO B-I-3	C/U	3.00	1,198.92	L. 3,596.76	3.00	3,596.76		0.00	3.00	3,596.76	100.00	
12	DETALLE DE NEUTRO B-I-4	C/U	4.00	599.58	L. 2,398.33	4.00	2,398.33		0.00	4.00	2,398.33	100.00	
13	DETALLE DE NEUTRO B-I-1	C/U	2.00	556.20	L. 1,112.40	2.00	1,112.40		0.00	2.00	1,112.40	100.00	
14	RETENIDA E-I-2 (SOLO CABLE DE EI2)	C/U	20.00	978.50	L. 19,570.00	20.00	19,570.00		0.00	20.00	19,570.00	100.00	
15	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	6.00	949.34	L. 5,696.04	6.00	5,696.04		0.00	6.00	5,696.04	100.00	
16	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	13.00	3,193.00	L. 41,509.00		0.00	13.00	41,509.00	13.00	41,509.00	100.00	
17	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	2,642.00	47.38	L. 125,177.96	2,642.00	125,177.96		0.00	2,642.00	125,177.96	100.00	
18	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	4,110.00	50.47	L. 207,431.70	4,110.00	207,431.70		0.00	4,110.00	207,431.70	100.00	
19	CABLE # 1/0 AWG, TW	ML	1,526.00	51.5	L. 78,589.00	1,526.00	78,589.00		0.00	1,526.00	78,589.00	100.00	
20	TRANSFOR. DE 15 KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	2.00	67,079.01	L. 134,158.02		0.00	2.00	134,158.02	2.00	134,158.02	100.00	
21	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	2.00	9,373.00	L. 18,746.00		0.00	2.00	18,746.00	2.00	18,746.00	100.00	
SUB TOTALCOSTO DIRECTO					L. 745,567.30		551,154.28		194,413.02		745,567.30	100.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS					L. 44,734.04		33,069.26	-	11,664.78		44,734.04	100.00	
UTILIDAD DEL PROYECTO					L. 74,556.73		55,115.43		19,441.30		74,556.73	100.00	
TOTAL TRAMO LA CRUZ					-	864,858.07		639,338.97		225,519.10		864,858.07	100.00
1	ESTRUCTURA A-II-5 (p/34.5 KV)	C/U	9.00	7,828.00	70,452.00	9	70,452.00		0.00	9.00	70,452.00	100%	
2	ESTRUCTURA A-II-1 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	3,090.00	3,090.00	1	3,090.00		0.00	1.00	3,090.00	100%	
3	ESTRUCTURA A-II-2 (p/34.5 KV)	C/U	5.00	5,253.00	26,265.00	5	26,265.00		0.00	5.00	26,265.00	100%	
4	ESTRUCTURA A-II-4 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	5,047.00	10,094.00	2	10,094.00		0.00	2.00	10,094.00	100%	
5	ESTRUCTURA A-II-6 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	8,858.00	8,858.00	1	8,858.00		0.00	1.00	8,858.00	100%	
6	ESTRUCTURA A-I-5 (p/34.5 KV)	C/U	3.00	4,537.15	13,611.45	3	13,611.45		0.00	3.00	13,611.45	100%	
7	ESTRUCTURA A-I-1 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	1,751.00	3,502.00	2	3,502.00		0.00	2.00	3,502.00	100%	
8	ESTRUCTURA A-I-2 (p/34.5 KV)	C/U	14.00	3,113.94	43,595.12	14	43,595.12		0.00	14.00	43,595.12	100%	
9	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	2,996.24	5,992.48	2	5,992.48		0.00	2.00	5,992.48	100%	
10	ESTRUCTURA A-I-6 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	5,195.61	5,195.61	1	5,195.61		0.00	1.00	5,195.61	100%	
11	ESTRUCTURA B-II-2A	C/U	4.00	979.41	3,917.63	4	3,917.63		0.00	4.00	3,917.63	100%	
12	ESTRUCTURA B-II-5A	C/U	1.00	1,099.24	1,099.24	1	1,099.24		0.00	1.00	1,099.24	100%	
13	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	14.00	1,478.05	20,692.70	14	20,692.70		0.00	14.00	20,692.70	100%	

14	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	27.00	1,648.92	44,520.75	27	44,520.75		0.00	27.00	44,520.75	100%
15	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	4.00	2,417.37	9,669.48	4	9,669.48		0.00	4.00	9,669.48	100%
16	ESTRUCTURA B-II-1A	C/U	5.00	1,385.16	6,925.82	5	6,925.82		0.00	5.00	6,925.82	100%
17	ESTRUCTURA B-II-8B	C/U	1.00	2,614.97	2,614.97	1	2,614.97		0.00	1.00	2,614.97	100%
18	DETALLE DE NEUTRO B-I-3 COM GRAPA	C/U	5.00	1,198.92	5,994.60	5	5,994.60		0.00	5.00	5,994.60	100%
19	DETALLE DE NEUTRO B-I-4	C/U	6.00	599.58	3,597.50	6	3,597.50		0.00	6.00	3,597.50	100%
20	DETALLE DE NEUTRO B-I-1	C/U	2.00	556.20	1,112.40	2	1,112.40		0.00	2.00	1,112.40	100%
21	RETENIDA E-I-i	C/U	18.00	3,619.21	65,145.85	18	65,145.85		0.00	18.00	65,145.85	100%
22	RETENIDA E-I-2	C/U	46.00	3,892.58	179,058.50	46	179,058.50		0.00	46.00	179,058.50	100%
23	RETENIDA E-I-2 SOLO CABLE E2	C/U	15.00	978.50	14,677.50	15	14,677.50		0.00	15.00	14,677.50	100%
24	RETENIDA E-I-3	C/U	1.00	10,818.09	10,818.09	1	10,818.09	0	0.00	1.00	10,818.09	100%
25	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	14.00	949.34	13,290.77	14	13,290.77	0	0.00	14.00	13,290.77	100%
26	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	30.00	3,193.00	95,790.00		0.00	30	95,790.00	30.00	95,790.00	100%
27	CABLE # 2 ACSR S/F	ML	4,804.00	47.38	227,613.52	4,804	227,613.52		0.00	4,804.00	227,613.52	100%
28	CABLE # 1/0 ACSR S/F	ML	5,621.00	50.47	283,691.87	5,621	283,691.87		0.00	5,621.00	283,691.87	100%
29	CABLE # 1/0 AWG,TW	ML	5,861.00	51.5	301,841.50	5,861	301,841.50		0.00	5,861.00	301,841.50	100%
30	TRANSFOR. DE 15 KVA, 34.5/19.9KV-240-120V	C/U	5.00	67,079.01	335,395.05		0.00	5	335,395.05	5.00	335,395.05	100%
31	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)	C/U	2.00	9,373.00	18,746.00		0.00	2	18,746.00	2.00	18,746.00	100%
SUB TOTALCOSTO DIRECTO CERRO CHATO					1836,869.39		1386,938.34		449,931.05		1836,869.39	100%
GASTOS ADMINISTRATIVOS					110,212.16		83,216.30		26,995.86		110,212.16	100%
UTILIDAD DEL PROYECTO					183,686.94		138,693.83		44,993.11		183,686.94	100%
TOTAL TRAMO CERRO CHATO					2130,768.50		1608,848.48		521,920.02		2130,768.50	100%
TOTAL LA CRUZ Y CERRO CHATO					2995,626.57		2248,187.44		747,439.12		2995,626.57	100%

DESCRIPCIÓN	Acumulado Anterior	Ejecutado Actual	Acumulado Total
MONTO ESTIMADO	2248,187.44	747,439.14	2995,626.59
Retención por Anticipo	415,914.68	33,429.31	449,343.98
Retención por I.S.R.		0.00	0.00
Retención por calidad de obra		0.00	0.00
Resumen	1832,272.76	826,419.20	2546,282.61
Neto a Pagar en esta estimación		826,419.20	

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponde a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo la presente.

CONTRATISTA	SUPERVISOR UTM	VISTO BUENO ALCALDE MUNICIPAL
		
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ING. JAVIER CALIX	NOMBRE: ABNER ISRAEL PERDOMO	NOMBRE: ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS
FECHA: 24/1/24	FECHA: 24/1/24	FECHA: 24/1/24



**ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ
UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL**

“INFORME”

Informe De Supervisión

**PROYECTO: ELECTRIFICACION RURAL CON
INTERCONEXION A LA RED
UBICADO EN LA CRUZ Y CERRO CHATO MUNICIPIO DE
AGUANQUETERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

**Contratista:
DICONELEC S. DE R.L.**

**Alcalde Municipal
Señor. Erlin Omar Rodríguez Ramos**

Aguanqueterique La Paz, 24 de enero de 2024



**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**



Aguanqueterique La Paz, miércoles 24 de enero de 2024

**Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal de Aguanqueterique La Paz**

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: Electrificación rural con interconexión a la red;

UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ Y CERRO CHATO, estando este ejecutado al 100% de su totalidad

Por lo tanto, doy paso a los respectivos encargados(as) de los departamentos de Contabilidad y Presupuesto y departamento de Tesorería realizar el trámite correspondiente al pago de **TERCER ESTIMACION POR UN VALOR DE OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.826,419.20)**

A Favor de CONSTRUCTORA DICONELEC S. DE R.L. representada legalmente por el gerente general Javier Fermín Calix

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.



Abner Israel Perdomo Medina
Unidad de Supervisión Municipal
Técnico de Proyectos Alcaldía Municipal de Aguanqueterique



**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**



Aguanqueterique La Paz, miércoles 24 de enero de 2024

**Depto. Presupuesto y Contabilidad
Depto. Tesorería**

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: Electrificación rural con interconexión a la red;

UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ Y CERRO CHATO , estando este ejecutado al 100% de su totalidad

Por lo tanto, doy paso a los respectivos encargados(as) de los departamentos de Contabilidad y Presupuesto y departamento de Tesorería realizar el trámite correspondiente al pago de **TERCER ESTIMACION POR UN VALOR DE OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.826,419.20)**

A Favor de CONSTRUCTORA DICONELEC S. DE R.L. representada legalmente por el gerente general Javier Fermín Calix

Agradezco su compromiso en los procesos de

Agradeciendo su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.

Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal De Aguanqueterique



Antecedentes

El Municipio de Aguanqueterique La Paz, se encuentra ubicado en la zona baja del canal seco, Por su ubicación Aguanqueterique este municipio se encuentra en la zona sur del departamento de La Paz y además cuenta con alto nivel de vulnerabilidad. Ya que la población carece del servicio de energía eléctrica.

En repetidas ocasiones la comunidad manifiesta haber realizado la solicitud para que las autoridades prioricen el desarrollo de un proyecto eléctrico. Sin embargo, hasta hoy no había sido posible.

Descripción del proyecto

En este tipo de proyecto, se pretende dar respuestas a la necesidad del servicio de energía eléctrica en esta comunidad, para lo cual según las especificaciones técnicas y contractuales el proyecto consta de las siguientes actividades:



1.- Resumen de la situación actual:

NOMBRE: ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED

UBICADO EN: LA CRUZ Y CERRO CHATO MUNICIPIO DE

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

beneficiarios: La comunidad **LA CRUZ Y CERRO CHATO**, consta de unas 80 familias y en total se encuentran unas 240 personas, según se ha entrevistado con miembros de la comunidad.

Comunidad Solicitante: miembros de patronato y del comité coordinador para solicitar dicho proyecto.

Duración: 120 Días.

Situación Actual del Proyecto: ejecutado en un 100%.

Costo Total del Proyecto Presupuestado: L. 2,995,626.57

Monto Solicitado por esta estimación: L. 826,419.20

Fuente Financiera: Municipalidad de Aguanqueterique 100%

1. Conclusiones y recomendaciones:

- El proyecto está ejecución al 100 % y presenta muy buena calidad de obra, por lo que se adjunta el cuadro de estimación, para dar fe.
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se recomienda a la comunidad hacer vigilancia para evitar pérdidas y daños a las obras previo la recepción por parte de la alcaldía.



**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**




- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y buena calidad de las obras.




REGISTRO FOTOGRAFICO

EN EL SECTOR DE LA CRUZ SE OBSERVA INSTALACIONES AL 100%


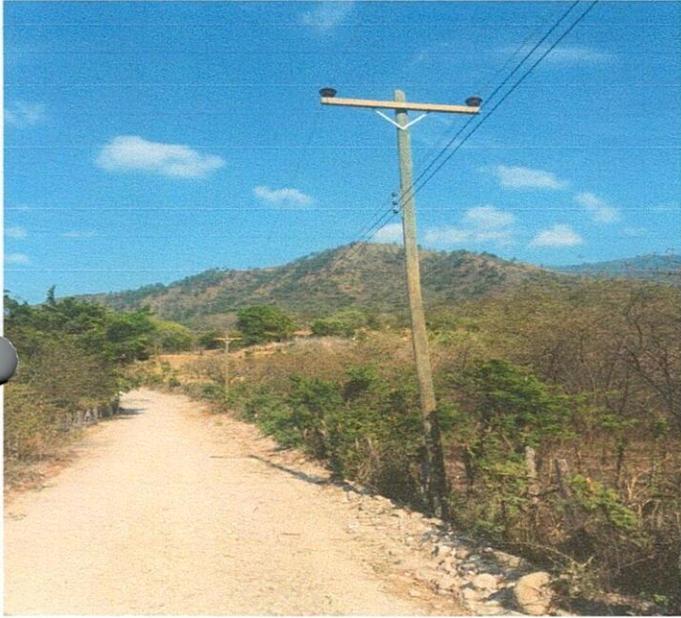


SE OBSERVA TRANSFORMADOR Y LUMINARIA EN LA CRUZ

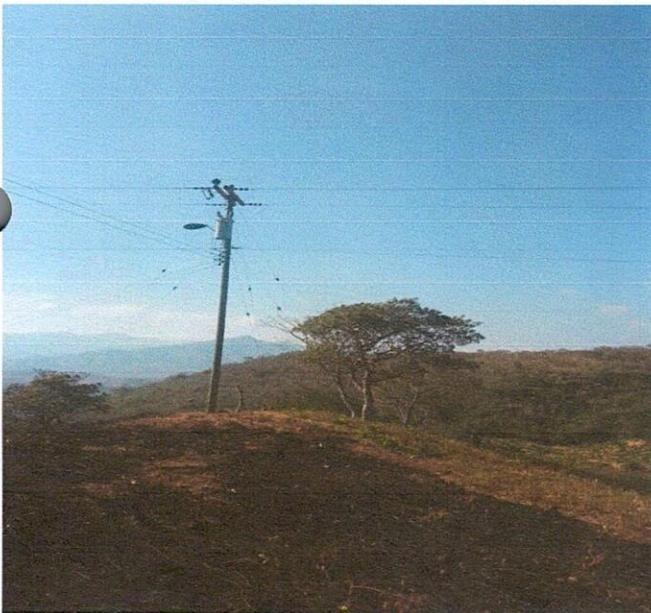




TRANSFORMADOR YA FUNCIONANDO

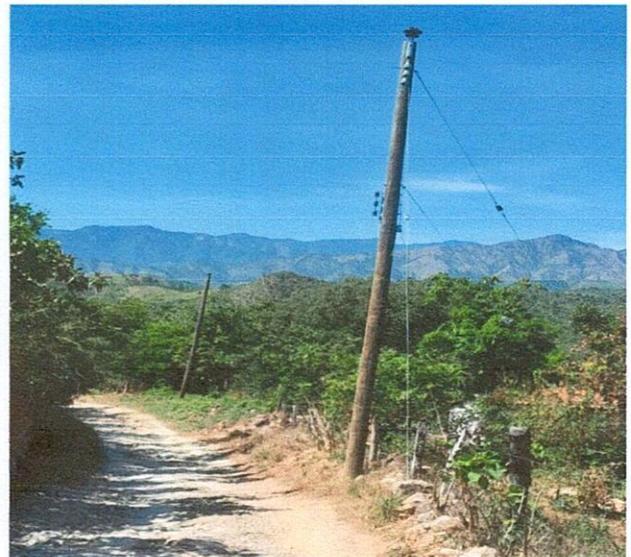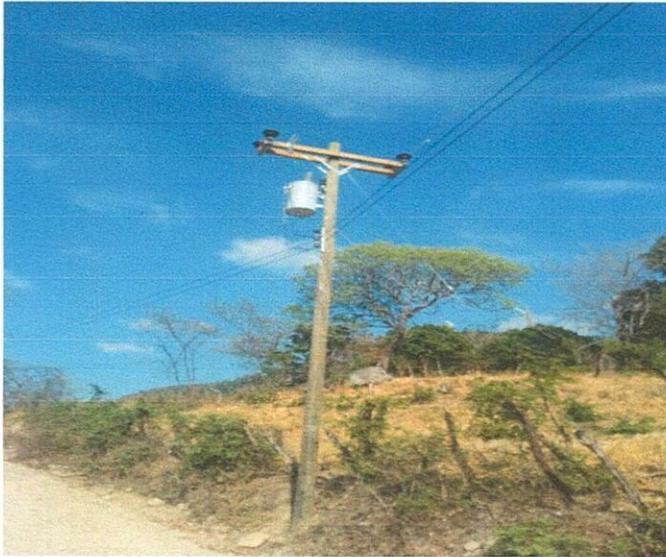


REGISTRO FOTOGRAFICO LA CRUZ Y CERRO CHATO

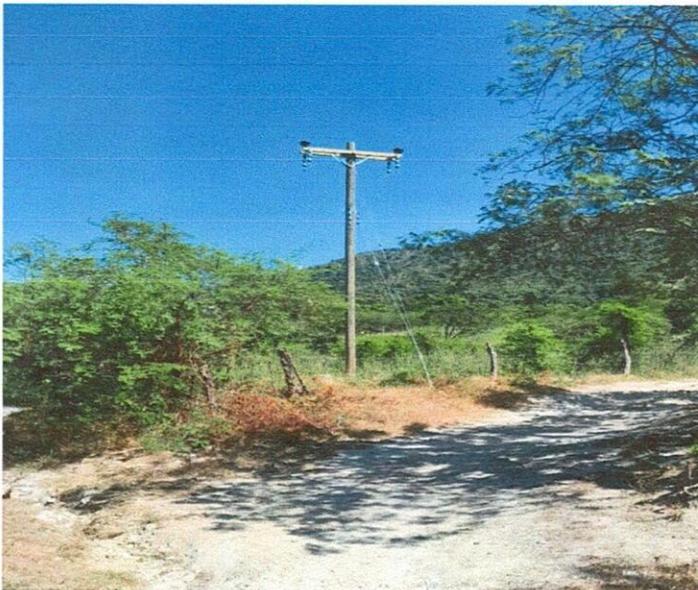




REGISTRO FOTOGRAFICO LA CRUZ Y CERRO CHATO

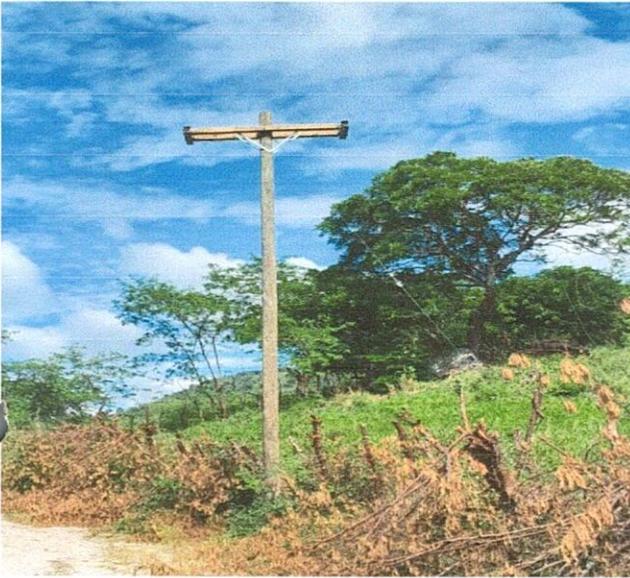

REGISTRO FOTOGRAFICO

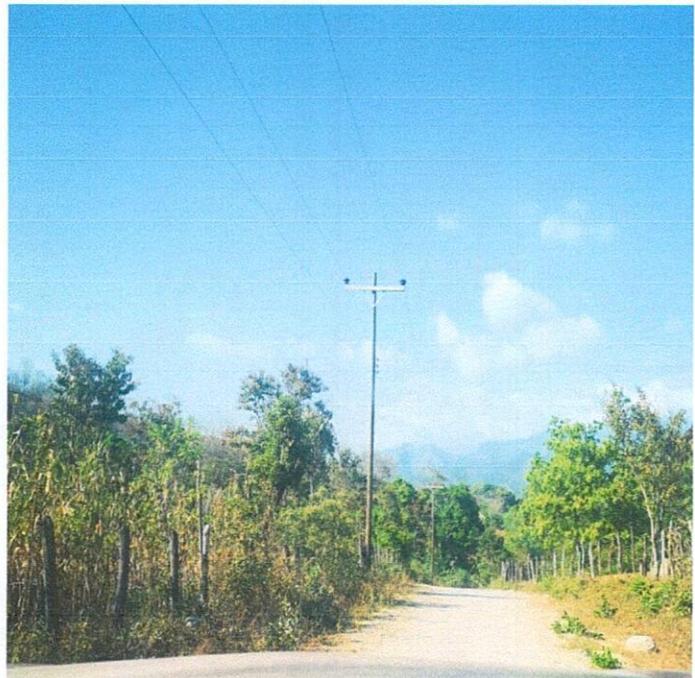

Republica de Honduras
Servicio de Administracion de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 2017/04/21 **RTN: 08019006502892**

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SRL
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Decreto No. 11-2017 del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,077 el 27 de febrero de 2017 y el Decreto No. 11-2017 del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,077 el 27 de febrero de 2017. Decreto No. 11-2017 del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,077 el 27 de febrero de 2017. Decreto No. 11-2017 del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,077 el 27 de febrero de 2017. Decreto No. 11-2017 del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,077 el 27 de febrero de 2017.


 Administración Tributaria


 ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
 HONDURAS

Este Contribuyente tiene de su cargo la deuda tributaria que se indica a continuación, la cual debe ser pagada en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de emisión de este documento. De no haberse pagado en el plazo establecido, el presente documento será enviado a la Administración Tributaria para su cobro forzoso.

Numero de Documento: 07-R-412-667128 Transacción: 441107



**ALCALDÍA MUNICIPAL
MARCALA, LA PAZ**

**PERMISO
PARA OPERACION DE NEGOCIO**



NUMERO 1090-2024

VALIDO PARA 20 24

PROPIETARIO: JAVIER FERMIN CALIX MANUELES

UBICACIÓN: BARRIO BUENA VISTA, MARCALA LA PAZ.

Conforme al Reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en este Municipio, el (la) Alcalde(sa) Municipal concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en sitio visible.

CLASE DE NEGOCIO: DICONELEC S. DE R.L.

Actividad Principal DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES Y ELECTROMECHANICAS


No. de Solicitud 1090-2024

FECHA DE VENCIMIENTO 31 DE DICIEMBRE 2024

Dada en la ciudad de MARCALA, a los 26
días del mes de ENERO de 20 24


JEFE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA




ALCALDE(SA) MUNICIPAL



Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras

CONSTANCIA DE SOLVENCIA N° 0064610

El Infrascrito Secretario del **COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS, ELECTRICISTAS Y QUÍMICOS DE HONDURAS (CIMEQH)**, Hacc constar: Que el Señor (a):
DANIEL GERARDINO BOQUIN REYES **CO02796**

_____ se encuentra debidamente
registrado en este Colegio en forma **PERMANENTE** como:

INGENIERO ELECTRICISTA INDUSTRIAL encontrándose en la fecha
solvente con sus obligaciones legales correspondiente con el Colegio; lo que le faculta para ejercer
su profesión.

Y, para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la Ciudad
de Tegucigalpa, a los **6** días del mes **FEBRERO** del año **2024**

SE LE EXTIENDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE SOLVENCIA AL INGENIERO DANIEL GERARDINO BOQUIN REYES, CO02796, INGENIERO ELECTRICISTA INDUSTRIAL, POR ESTAR SOLVENTE CON EL COLEGIO HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2024.

CONSTANCIA VÁLIDA AL 6 DE MARZO DE 2024.



SECRETARIO
Junta Directiva CIMEQH

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
☎ Tel.: (504) 2239-9676 / 2239-0998
☐ Trámites: (504) 9452-6041
☐ Cobros: (504) 9669-0748
☐ Contabilidad: (504) 9439-7008

☐ Oficial de seguros: (504) 9442-1663
✉ cimeqh@cimeqh.org
🌐 página Web: www.cimeqh.org

San Pedro Sula, Honduras
☎ Tel.: (504) 2566-0984
☐ Trámites: (504) 9439-0126
☐ Oficial de Seguros: (504) 9430-8251
✉ cimeqhcapnor@yahoo.com

La Ceiba, Atlántida
☎ Tel.: (504) 2440-3512
☐ Cel.: (504)9669-0747
✉ cimeqhla@yahoo.com

Marcala La Paz, 04 de septiembre de 2023

CERTIFICACIÓN

Por la presente **CERTIFICO** que el Ingeniero **DANIEL GERARDINO BOQUIN REYES**, con **NUMERO DE COLEGIACION C002796**, quien se encuentra contratado como ingeniero residente de los **PROYECTOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES** para la empresa **DICONELEC S. DE R. L.** Desde el mes de septiembre del año 2023

y para constancia se firma la presente con la fecha antes descrita en la ciudad de Marcala, La paz.

Firma Autorizada. _____



Nombre y Cargo del Firmante: **Ing. Javier Fermín Calix**
Gerente General

Diseños y Construcciones Electromecánicas y Civiles, Sociedad de Responsabilidad Limitada DICONELEC S. DE R.L.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-10197

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS SRL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006502892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-10197 en fecha 16/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418595614 de fecha 16/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35748779026, presentada el 24/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **201-24-10500-10197** o mediante el siguiente código QR:

