



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	07
Construcción y Mantenimiento de pozos para agua potable		Plan del Ocotal	1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto: Infraestructura agua y saneamiento			Cargo del Supervisor(a)			
Coordenadas del inicio de la obra:		Fecha de Inicio de la obra	Jefe de la Unidad Técnica Municipal		Fecha de inicio del reporte:	Febrero 2024
Lat: 14.8033 Long: -88.6066			Julio 2023			
Coordenadas del final de la obra:			Número telefónico:		Fecha de final del reporte:	Febrero 2024
Lat: 14°51'23.31 Long: --88°16'49.47			9946-5694			
Empleos Directos: 2			Correo Electrónico			
Empleos Indirectos: 5		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com				
Duración del Proyecto: Nueve meses						

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto :	Si ☐ No ☒	1. Reconstruir el tanque 2. Construcción de baños públicos 3. Construcción de lavaderos domésticos 4. Construcción de techo metálico y colocación de puertas de metal 5. Piso rustico 6. Pintura para baños y pilas	
Estado del tiempo:	Lluvioso		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	20km		
6. Recursos Presentes en Obra			
Personal/Mano de Obra:	Adecuada ☒ Suficiente ☒		
Materiales:	Adecuada ☒ Suficiente ☒		
Equipos y herramientas:	Adecuado ☒ Suficiente ☒		



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

Para la supervisión realizada se hicieron las siguientes observaciones:

1. Se completó la construcción del techo de base metálica.
2. Se hizo la colocación de las puertas de base metálica.
3. Se construyó la cerca, está siguiendo las especificaciones técnicas que se asignaron al encargado de la obra. Colocando dos hiladas de bloque, con tubo HG completándolo con malla olímpica como se muestra en la sección de imágenes.
4. Aún quedan obras adicionales pendientes, como ser el repello de los baños, pintura de los mismos y piso rustico.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Colocación de los tubos HG, malla olímpica y techo de base metálica terminado.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiaria	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	02
Construcción del proyecto de electricidad.		B° La Balastrea	1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto:			Cargo del Supervisor(a)			
Infraestructura de electricidad		Fecha de Inicio de la obra	Jefe de la Unidad Técnica Municipal		Fecha de inicio del reporte:	Febrero 2024
Coordenadas del inicio de la obra:			enero 2024			
Coordenadas del final de la obra:			Número telefónico:		Fecha de final del reporte:	Febrero 2024
Empleos Directos:			9946-5694			
Empleos Indirectos:			Correo Electrónico			
Duración del Proyecto:		unidadtecnicamunicipal69@gmail.com				

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto de:	Si ☐ No ☒	El proyecto consiste en el suministro de una red primaria y una red secundaria e instalación de un transformador de 15KVA, suministro e instalación de 11 postes de madera clase 5.	
Estado del tiempo:	Caluroso		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	25km		
6. Recursos Presentes en Obra			
Personal/Mano de Obra:	Suficiente ☒	Adecuado ☒	
Materiales:	Suficientes ☒	Adecuado ☒	
Equipos y herramientas:	Suficiente ☒	Adecuado ☒	





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto


Para el proyecto se tienen contemplado la ejecución de las siguientes obras:

- ✓ Suministro e instalación de 7 postes de madera de 30 pies de clase 5
- ✓ Suministro e instalación de 2 postes de madera de 40 pies de clase 5
- ✓ Suministro e instalación de 2 postes de madera de 35 pies de clase
- ✓ Suministro e instalación de 1 transformador de 15kva/34.5/240/120v
- ✓ Suministro e instalación de 28 retenidas completas
- ✓ 2100 pies suministro e instalación de cable #1/0acsr
- ✓ 2900 pies suministro e instalación de cable #1/0wp
- ✓ 3500 pies suministro e instalación de cable #2, acsr
- ✓ 20 pies suministro e instalación de cable #3/0wp
- ✓ Suministro e instalación de 4 aterrizaje de proyecto
- ✓ Suministro e instalación de 2 crucetas de madera de 4x8/96
- ✓ Suministro e instalación de 6 luminarias completas
- ✓ Suministro e instalación de 6 estructuras de red primaria
- ✓ Suministro e instalación de 11 estructuras de red secundarias.

De las cuales, ya se han realizado las obras menores como ser la apertura de los agujeros, chapias de la brecha de las red primaria y secundaria.

OBSERVACIONES: Todas las actividades antes mencionadas fueron ejecutadas en tiempo y forma, quedando pendiente la legalización del proyecto, el cual consiste en la el envío de la información a las oficinas de FOSODE a través de la Yadira Alvares Licona y el contratista a cargo del proyecto para que posteriormente se nos haga llegar una constancia donde se autorizan las bajadas de la energía a los hogares, dicha información ya fue respectivamente enviada.

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto

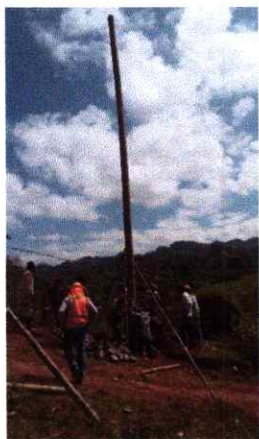

Descripción:

Sentadura de postes de madera clase 5, tendido de cable para red primaria y secundaria, colocación del W15kva/34.5/240/120v, retenidas, caídas de proyecto y luminarias.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiaria	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	02
Construcción del proyecto de electricidad.		B° Las Mecetas, Loma Alta	1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto: Infraestructura eléctrica			Cargo del Supervisor(a)			
			Jefe de la Unidad Técnica Municipal			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: _14.888445°	Long: -88.600367°	Fecha de Inicio de la obra	febrero 2024	Fecha de inicio del reporte:	Febrero 2024
Coordenadas del final de la obra:	Lat: _14.888445°	Long: -88.600367°		Número telefónico:		
Empleos Directos:	2			9946-5694		
Empleos Indirectos:	5			Correo Electrónico	Fecha de final del reporte:	Febrero 2024
Duración del Proyecto:	Dos meses			unidadtecnicamunicipal69@gmail.com		

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto de:	Si ☐ No ☒	El proyecto consiste en el suministro de una red primaria y una red secundaria e instalación de un transformador de 15KVA, suministro e instalación de 13 postes de madera clase 5.	
Estado del tiempo:	Caluroso		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	20km		
6. Recursos Presentes en Obra			
Personal/Mano de Obra:	Suficiente ☒	Adecuado ☒	
Materiales:	Suficientes ☒	Adecuado ☒	
Equipos y herramientas:	Suficiente ☒	Adecuado ☒	





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto


Para el proyecto se tienen contemplado la ejecución de las siguientes obras:

- ✓ Suministro e instalación de 5 postes de madera de 30 pies de clase 5
- ✓ Suministro e instalación de 1 postes de madera de 40 pies de clase 5
- ✓ Suministro e instalación de 7 postes de madera de 35 pies de clase
- ✓ Suministro e instalación de 1 transformador de 15kva/34.5/240/120v
- ✓ Suministro e instalación de 43 retenidas completas
- ✓ 2050 pies suministro e instalación de cable #1/0acsr
- ✓ 3608 pies suministro e instalación de cable #1/0wp
- ✓ 2952 pies suministro e instalación de cable #2, acsr
- ✓ 20 pies suministro e instalación de cable #3/0wp
- ✓ Suministro e instalación de 3 aterrizaje de proyecto
- ✓ Suministro e instalación de 2 crucetas de madera de 4x8/96
- ✓ Suministro e instalación de 7 luminarias completas
- ✓ Suministro e instalación de 9 estructuras de red primaria
- ✓ Suministro e instalación de 12 estructuras de red secundarias.

De las cuales, ya se han realizado las obras menores como ser la apertura de los agujeros, chapias de la brecha de las red primaria y secundaria.

OBSERVACIONES: Todas las actividades antes mencionadas fueron ejecutadas en tiempo y forma, quedando pendiente la legalización del proyecto, el cual consiste en la el envío de la información a las oficinas de FOSODE a través de la Yadira Alvares Licona y el contratista a cargo del proyecto para que posteriormente se nos haga llegar una constancia donde se autorizan las bajadas de la energía a los hogares, dicha información ya fue respectivamente enviada.

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto

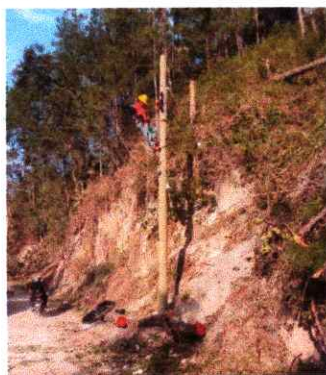

Descripción:

Sentadura de postes de madera clase I3, tendido de cable para red primaria y secundaria, colocación del W15kva/34.5/240/120v, retenidas, caídas de proyecto y luminarias.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto			Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)	Número de Ficha:	01
Construcción del proyecto de electricidad.			B° La Arada, El Carmen	1313-1998-00298		
Tipo de Proyecto: Infraestructura eléctrica				Cargo del Supervisor(a)		
			Jefe de la Unidad Técnica Municipal			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: _14.888445°	Long: -88.600367°	Fecha de Inicio de la obra	febrero 2024	Fecha de inicio del reporte:	Febrero 2024
Coordenadas del final de la obra:	Lat: _14.888445°	Long: -88.600367°		Número telefónico:		
Empleos Directos:	2			9946-5694		
Empleos Indirectos:	5			Correo Electrónico	Fecha de final del reporte:	
Duración del Proyecto:	Dos meses			unidadtecnicamunicipal69@gmail.com	Febrero 2024	

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto de:	Si ☐	NO ☒		El proyecto consiste en el suministro de una red primaria y una red secundaria e instalación de un transformador de 15KVA, suministro e instalación de 5 postes de madera clase 5.	
Estado del tiempo:	Caluroso				
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	20km				
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Suficiente ☒	Adecuado ☒			
Materiales:	Suficientes ☒	Adecuado ☒			
Equipos y herramientas:	Suficiente ☒	Adecuado ☒			





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com




7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

Para el proyecto se tienen contemplado la ejecución de las siguientes obras:

1. Suministro e Instalación de 4 postes de madera de 30 pies clase 5
2. Suministro e Instalación de 1 postes de madera de 40 pies clase 5.
3. Suministro e Instalación de 1 transformador de 15 KVA/34.5/240/120V
4. Suministro e Instalación de 6 retenidas completas.
5. Suministro e Instalación de 509 pies de cable # 1/0 ACSR.
6. Suministro e instalación de 830 pies de cable # 1/0 WP.
7. suministro e instalación de 591 pies de cable # 2, ACSR.
8. Suministro e Instalación de 20 pies de cable # 3/0 WP.
9. Suministro e Instalación de 2 aterrizajes proyecto
10. Suministro e Instalación de 2 crucetas de madera de 4x8/96.
11. Suministro e Instalación de 2 luminarias completas.
12. Suministro e Instalación de 2 estructuras de red primaria.
13. Suministro e Instalación de 5 estructuras de red secundaria.
14. Resección proyecto.

OBSERVACIONES: El proyecto está en ejecución, se hará un nuevo remarcage para corregir, sentada de postes de 30 clase 5, se han sacado los permisos ambientales, catastrales y exoneraciones de impuestos. El día jueves 07 de marzo se tiene la visita para supervisar avances y dar más indicaciones junto con el equipo de SEHESEL

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto

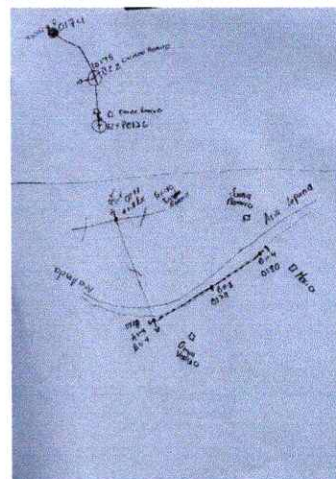

Descripción: Identificación de la red primaria y secundaria para la ubicación de los postes.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR



FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiada	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	01
Construcción del Kinder		San Matías	1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto: Infraestructura Escolar			Cargo del Supervisor(a)			
Jefe de la Unidad Técnica Municipal		Enero 2024		Fecha de inicio del reporte:	enero 2024	
Coordenadas del inicio de la obra: Lat: 14°49'51"N Long: - 88°34'27"W		Número telefónico:				
Coordenadas del final de la obra: Lat: 14°49'51"N Long: - 88°34'27"W		Fecha de Inicio de la obra	9946-5694		Fecha de final del reporte:	enero 2024
Empleos Directos: 4			Correo Electrónico			
Empleos Indirectos: 2			unidadtecnicamunicipal69@gmail.com			
Duración del Proyecto: 2 meses						

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto :	Si ☐ No ☒	El proyecto consiste en la construcción de un kínder con un aula de 6x8 y corredor de 1,50 x 8mts. Baños privados y semi estantería para el guardo de material didáctico.	
Estado del tiempo:	caluroso		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	12km		
6. Recursos Presentes en Obra			
Personal/Mano de Obra:	Adecuada ☒ Suficiente ☒		
Materiales:	Adecuada ☒ Suficiente ☒		
Equipos y herramientas:	Adecuado ☒ Suficiente ☒		





REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Lepaera, Lempira

Correo: unidadtecnicamunicipal69@gmail.com



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

1. La Obra está terminada al 90%, se hicieron modificaciones en la edificación. Esto debido a que inicialmente se había contemplado hacer la construcción con bloque sisado, los armex que se habían pre elaborado, se tuvieron que modificar ya que posteriormente el Sr. Alcalde decidió que el kínder fuera de pared con repello y pulido.
2. Las obras adicionales pendientes únicamente tenemos:
 - 2.1. Elaboración y colocación de ventanales.
 - 2.2. Pintura del edificio.
 - 2.3. Instalación y suministro de electricidad

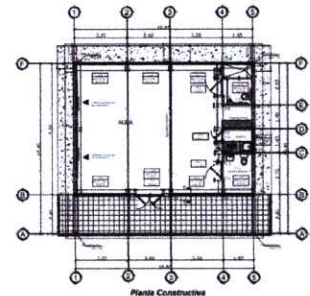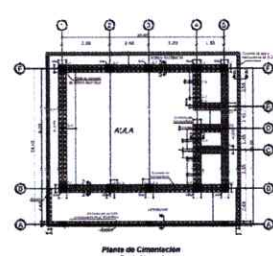

***Nota:** Desglosar Diagnóstico en el informe

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Levantamiento de paredes y repello y pulido.



Descripción: Construcción de techo de base metálica y piso rustico.



Descripción: Colocación de puertas y balcones.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiaria	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	01
Construcción de caja puente		Rinconada	1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto: Infraestructura vial			Cargo del Supervisor(a)			
			Jefe de Unidad Técnica Municipal			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: 14°47'41.21"N	Long: - 88°39'47.91"O	Fecha de Inicio de la obra	Febrero 2024	Fecha de inicio del reporte:	Febrero 2024
Coordenadas del final de la obra:	Lat: 14°47'41.21"N	Long: - 88°39'47.91"O		Número telefónico:		
Empleos Directos:	1			9946-5694		
Empleos Indirectos:	5			Correo Electrónico		
Duración del Proyecto:	Dos meses			unidadtecnicamunicipal69@gmail.com	Fecha de final del reporte:	Febrero 2024

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto de:	Si ☐ No ☒	El proyecto tiene como fin de facilitar la comunicación vial entre San José Pajapas y Rinconada, con ello no sólo se facilita el movimiento, sino también la realización de actividades, mercantiles y recreativas, entre otras. Además de salvar un accidente geográfico debido a que en tiempos de invierno la población queda sin fácil acceso, con riesgo a tener un accidente al cruzar el río.	
Estado del tiempo:	Lluvioso		
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	28km		
6. Recursos Presentes en Obra			
Personal/Mano de Obra:	Suficiente ☒ Adecuado ☒		
Materiales:	Suficientes ☒ Adecuado ☒		
Equipos y herramientas:	Suficiente ☒ Adecuado ☒		





7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

Obras realizadas:

1. Trazado y marcado de la obra
2. Acarreo de materiales importados y de rio.
3. Corte y acarreo de madera rustica.
4. Demolición de obras previamente realizadas y que no estaban bien construidas.
5. Excavaciones y encofrados.

Obras pendientes:

1. Construcción de cabezales con brazos
2. Obras grises completas como ser: losa superior, columnas y losa inferior.
3. Armados de armex
4. Limpieza de la zona de construcción.

Observaciones: Se dieron nuevas instrucciones para continuar con la obra esto debido a que se hizo recorte presupuestario por 2da vez en el proyecto. Limitándonos a la obtención de algunos materiales que previamente se estaban destinando a la obra, y que de ahora en adelante la comunidad debe proporcionarlos y eso nos generara un retraso en el lapso de tiempo previamente pactado en el contrato.

***Nota: Desglosar Diagnóstico en el informe**

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Limpieza y demolición de obras existentes.



Descripción: Trazado y marcado de la obra.



Descripción: Encofrado y fundiciones.

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiaria	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	01
Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico		B° Las Delicias	1313-1998-00298			
Tipo de Proyecto: Infraestructura Vial			Cargo del Supervisor(a)			
Coordenadas del inicio de la obra:		Fecha de Inicio de la obra	Jefe de Unidad Técnica Municipal		Fecha de inicio del reporte:	Febrero 2024
Lat: 14°46'54.88"N Long: - 88°35'27.23"O			Febrero 2024			
Coordenadas del final de la obra:			Número telefónico:		Fecha de final del reporte:	Febrero 2024
Lat: 14°47'0.59"N Long: - 88°35'27.34"O			9946-5694			
Empleos Directos: 1			Correo Electrónico			
Empleos Indirectos: 5			unidadtecnicamunicipal69@gmail.com			
Duración del Proyecto: Dos meses						

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto de:		Si ☐	No ☒	El proyecto consiste en la construcción de 1132.2ML de 3,500 PSI e=6. Comprendiendo el tramo carretero desde donde era la Bloquera de don Félix Pineda previo a la calle que comunica el mercado San Juan.	
Estado del tiempo:		Lluvioso			
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:		0,5km			
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Suficiente	☒	Adecuado	☒	
Materiales:	Suficientes	☒	Adecuado	☒	
Equipos y herramientas:	Suficiente	☒	Adecuado	☒	





7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

Obras realizadas:

1. Se hizo limpieza del tramo carretero.
2. Levantamiento de topografía y diseño del proyecto.
3. Conformación de la cama con material selecto.
4. Colocación de trompos y marcaje para formar camas.
5. Encofrado.

Obras pendientes:

1. Fundiciones
2. Corte de juntas y curación de las pastillas de concreto con asfáltico
3. Construcción de Bordillos
4. Limpieza de la zona de construcción
5. Entrega del proyecto.

***Nota:** Desglosar Diagnóstico en el informe

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Levantamiento de topografía



Descripción: Conformación de calle con material selecto



Descripción: Encofrado para fundiciones de pastillas de concreto

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR





FICHA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión UTM		3. Reporte	
Nombre del Proyecto		Aldea Beneficiaria	DNI del Supervisor(a)		Número de Ficha:	01
Mejoras y Adiciones al Mercado San Juan		B° San Juan	1313-1998-00298			
			Cargo del Supervisor(a)			
Tipo de Proyecto:	Infraestructura social		Jefe de Unidad Técnica Municipal			
Coordenadas del inicio de la obra:	Lat: 14°46'52.45"N	Long: - 88°35'23.19"O	Fecha de Inicio de la obra	Febrero 2024	Fecha de inicio del reporte:	Febrero 2024
Coordenadas del final de la obra:	Lat: 14°46'52.45"N	Long: - 88°35'23.19"O		Número telefónico:		
Empleos Directos:	1			9946-5694		
Empleos Indirectos:	5			Correo Electrónico		
Duración del Proyecto:	Dos meses			unidadtecnicamunicipal69@gmail.com	Fecha de final del reporte:	Febrero 2024

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto	
Rótulo original de Proyecto de:	Si ☐	No ☒		El proyecto surge de la necesidad de ofrecer una mejor prestación de servicios en cuanto a infraestructura de mercados. Ya que durante la pandemia estos espacios quedaron cerrados y cayeron en deterioro, por ende, los vendedores decidieron exhibir sus productos en las aceras y calles, el objetivo con esto es poder ingresar a estas personas nuevamente a los espacios oficialmente destinados para esta actividad.	
Estado del tiempo:	Lluvioso				
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	0,5km				
6. Recursos Presentes en Obra					
Personal/Mano de Obra:	Suficiente	☒	Adecuado	☒	
Materiales:	Suficientes	☒	Adecuado	☒	
Equipos y herramientas:	Suficiente	☒	Adecuado	☒	



7. Diagnóstico de Avance del Proyecto

Obras realizadas:

1. Levantamiento de paredes para asegurar el perímetro
2. Colocación de nuevos techos en zonas donde estaba al descubierto y en mal estado
3. Construcción de locales que estaban en mal estado.
4. Elaboración y colocación de puertas y balcones
5. Elaboración y colocación de portones

Obras pendientes:

1. Pintura de todo el edificio
2. Colocación de la energía
3. Malla para el área de carnicerías
4. Limpieza de la zona de construcción

***Nota:** Desglosar Diagnóstico en el informe

8. Diagnóstico de Avance del Proyecto



Descripción: Pintado de la primera parte del mercado San Juan, específicamente la zona de baños y comedores

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR

