

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970



RESUMEN EJECUTIVO

| 1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO. | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------|----------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | | AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO MEDIANTE INTERCONEXION A LA RED DE LAS COMUNIDADES DE CAMALOTES NUMERO DOS, Y CAMALOTE CENTRO, SANTA MARIA LA PAZ. | | |
| CODIGO: | | COT-1217-01-2016 | | |
| UBICACIÓN: | | COMUNIDADES DE CAMALOTES N°2; CAMALOTE CENTRO, SANTA MARIA LA PAZ | | |
| BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: | | El proyecto consiste en la ampliación del sistema eléctrico con la ampliación de red en su mayoría con red secundaria, se incorporaran nuevos postes de acuerdo a los planos propuestos, y los presupuestos. Se incluyen en este trabajo vestir los postes con los herrajes correspondientes y aprobados por la ENEE, respetando las normas establecidas para la construcción. | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ | | |
| INVERSION DEL PROYECTO: | | | | |
| CONCEPTO | FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD | APORTE MUNICIPALIDAD | APORTE COMUNIDAD | SUB-TOTAL |
| COSTO DE INFRAESTRUCUTRA | L. 875,073.68 | L. 0.000 | L. 0.00 | L. 875,073.68 |
| COSTO DE SUPERVISION (10% del monto del proyecto) | L. 0.00 | | | L. 875,073.68 |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | | | | L. 875,073.68 |



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970



Santa María la Paz, 16 mayo de 2016.

GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: AMPLIACION DE
ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE
INTERCONEXION A LA RED, DE LAS
COMUNIDADES DE CAMALOTES NUMERO
DOS Y CAMALOTE CENTRO, MUNICIPIO DE
SANTAMARIA LA PAZ.

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME N°1, del proyecto en mención; comprende el periodo del 10 al 16 de mayo de 2016.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.




ING. EFRAIM ANIBAL NICOLAS MORALES
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepaz.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970



| 1.2- INFORMACION CONTRACTUAL. | |
|--|---|
| NOMBRE DEL EJECUTOR: | CONSULDI Y ASOCIADOS. |
| SUPERVISION | MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: ELY ANIBAL NICOLAS MORALES. |
| CONTRATO ORIGINAL | |
| FECHA DE FIRMA DE CONTRATO | 10 DE MAYO DE 2016 |
| FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO | NO HAY |
| FECHA DE ORDEN DE INICIO | 10 DE MAYO DE 2016 |
| PLAZO CONTRACTUAL | 45 DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE FINALIZACION | 24 DE JUNIO DE 2016 |

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA: se prepara el informe que corresponde a la estimación número uno del proyecto el cual presenta un avance a la fecha con el suministro del 100% de los postes en el sitio del proyecto, también hay un sector de la escuela en el camalotes centro donde ya estaban los postes y actualmente están vestidos y ya se instaló el cable #2 ACSR (190 M.L).

Actualmente está el personal en el sitio con su equipo y se preparan para vestir los postes instalados y al mismo tiempo concluir con el hincado de los postes de 30 pies en lunes secundaria.

El clima es normal, el acceso en buen estado, y se encuentra el Ing. responsable en el sitio de las obras.

PRESENTANDO UN AVANCE FISICO DE UN 36.51%

SITUACIONES PRESENTADAS:
NO HAY.

SOLUCIONES PROPUESTAS:
NO HAY.





CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un ING Eléctrico y un técnico eléctrico, cuenta con todas la herramientas necesarias para hacerle frente al proyecto, cuenta con el personal calificado, hay suficiente material en sitio como ser postes de 30 pies, el día de hoy están llegando los herrajes para vestir los postes y el equipo necesarios.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. ING RESPONSABLE
2. TECNICO ELECTRICISTA.
3. LINIEROS.
4. AYUDANTES.

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.


1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoria municipal.
4. Apertura de Bitácora.
5. Verificar calidad de materiales
6. Evaluar el personal contratado.

1.5CONCLUSIONES.

1. El proyecto avanza dentro del cronograma.
2. Presenta una buena calidad de obra
3. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
4. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
5. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.



POSTERIA PARA LA INSTALACION DEL TENDIDO ELECTRICO

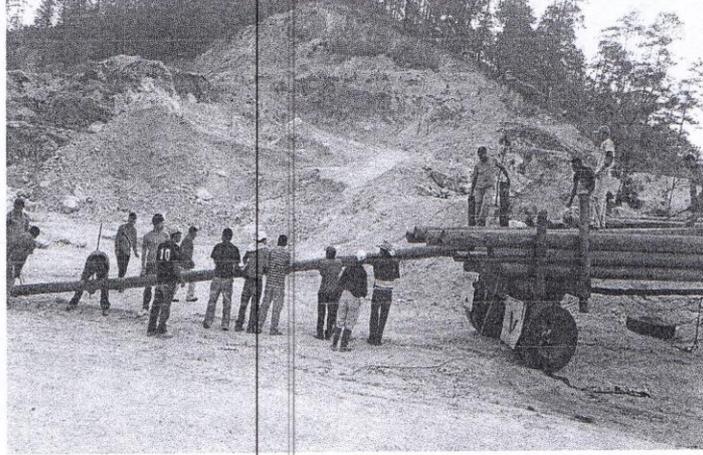



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA.
Gabino Argueta Gálvez
Alcalde Municipal.
Tel: 2757-8970



Originales de igual contenido, en el Municipio de Santa María, Departamento de La Paz, a los 10 días del mes de Mayo del año 2016.


GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA/LA PAZ



JOSE MELVIN DIAZ LOPEZ
CONTRATISTA
CONSULDI S.A
