



Republica de Honduras
Alcaldía Municipal de Taulabé
Taulabé; Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAMPO MES DE OCTUBRE 2023

INFORME UTM

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2023

Sirva el presente para dar a conocer las diferentes actividades que formaron parte de las intervenciones de la Unidad Tecina Municipal (UTM). Durante el mes de octubre, detallado de la siguiente manera:

A) Visitas Técnicas Y Supervisión.

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	LUGAR DE VISITA	DETALLE	RECORRIDO
1/9/2023	Ing Edin Pineda Morales, alcalde Denis Omar Membreño.	Parque Central José Trinidad Cabañas	Supervisión de Proyecto, Construcción Adiciones y mejoras de segunda etapa de parque central José Trinidad Cabañas.	N/A
	Ing Edin Pineda Morales, alcalde Denis Omar Membre.	Quebraditas	Instalación de Alcantarilla ADS. De 36"	N/A
	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Barrio el Carmen	Supervisión de proyecto, construcción de pavimento de concreto hidráulico	N/A
5/9/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Barrio el Carmen	Supervisión de proyecto, construcción de pavimento de concreto hidráulico	N/A
6/9/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	La Laguna	Supervisión de proyecto, construcción de Huellas Vehiculares	N/A
		Barrio Las Acacias	Supervisión de proyecto, habilitación de paso vehicular	N/A

		Mercado Municipal	Supervisión de proyecto, mejoras en mercado municipal	N/A
7/9/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Barrio el Carmen	Supervisión de proyecto, construcción de pavimento de concreto hidráulico	N/A
8/9/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Barrio el Carmen	Supervisión de proyecto, construcción de pavimento de concreto hidráulico	N/A
		La Laguna	Supervisión de proyecto, construcción de Huellas Vehiculares	N/A
9/9/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Barrio el Carmen	Supervisión de proyecto, construcción de pavimento de concreto hidráulico	N/A
11/9/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Mercado Municipal	Visita técnica para continuación de mejoras en mercado municipal	N/A
		Barrio el Carmen	Supervisión de proyecto, construcción de pavimento de concreto hidráulico	N/A
13/9/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	El Cerrón	Supervisión de proyecto, Construcción de caja puente.	N/A
		Barrio el Carmen	Supervisión de proyecto, construcción de pavimento de concreto hidráulico	N/A
18/9/2023	Ing Edin Pineda Morales, alcalde Denis Omar Membreño.	Barrio el Carmen	Supervisión de proyecto, construcción de pavimento de concreto hidráulico	N/A
		Parque Central José Trinidad Cabañas	Supervisión de Proyecto, Construcción Adiciones y mejoras de segunda etapa de parque central José Trinidad Cabañas.	N/A
		El Cerrón	Supervisión de proyecto, Construcción de caja puente.	N/A
		Barrio Las Acacias	Supervisión de proyecto, habilitación de paso vehicular	N/A
		Palmichal Fátima	Visita supervisión para construcción de huellas vehiculares	N/A
		Jardines	Visita técnica para reparación de calle	N/A
19/9/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM), alcalde Denis Omar Membreño	Las Conchas	Visita técnica pasar construcción de pavimento de concreto Hidráulico	N/A
		La Laguna	Visita técnica para construcción de proyecto en la comunidad de la laguna	N/A
21/9/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Parque Central José Trinidad Cabañas	Supervisión de Proyecto, Construcción Adiciones y mejoras de segunda etapa de parque central José Trinidad Cabañas.	N/A
22/9/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM), alcalde Denis Omar Membreño	Barrio Monte Fresco, Barrio La Ceibita	Visita técnica para proyecto de construcción de pavimento de concreto Hidráulico	N/A
25/9/2023	Ing Edin Pineda (UTM).	San Antonio de Yurés	Visita supervisión para construcción de huellas vehiculares	N/A
		Crematorio Municipal	Visita supervisión para construcción de caseta de vigilancia	N/A
		Parque Central José Trinidad Cabañas	Supervisión de Proyecto, Construcción Adiciones y mejoras de segunda etapa de parque central José Trinidad Cabañas.	N/A

27/9/2023	Ing Edin Pineda (UTM)	Parque Central José Trinidad Cabañas	Supervisión de Proyecto, Construcción Adiciones y mejoras de segunda etapa de parque central José Trinidad Cabañas.	N/A
-----------	-----------------------	--------------------------------------	---	-----



Ing Edin Pineda
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRAFICO.





República de Honduras
Alcaldía Municipal de Taulabé
Taulabé; Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE CONTRATOS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	DETALLE	PROYECTO O ACTIVIDAD	EJE	CONTRATISTA	LUGAR
26/9/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Construcción, Adiciones y Mejoras de parque central José trinidad Cabañas	Social	SINPAD S DE R.L	Barrio Santa Barbara, Taulabé
16/10/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Construcción de caseta de vigilancia y obras adicionales	Agua y Saneamiento	Rolando Pineda Machado	Sabanas de Ocote
26/10/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Instalación de estructura metálica para módulos de ventas	Comercio	Municipalidad de Taulabé	Mercado Municipal
27/10/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Construcción, Adiciones y Mejoras de parque central José trinidad Cabañas	Social	SINPAD S DE R.L	Barrio Santa Barbara, Taulabé


Jefe de Unidad Técnica Municipal
Ing. Edin Pineda Morales, Comayagua





Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #2

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE CENTRAL JOSE TRINIDAD CABAÑAS.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Barrio Santa Barbara.

Responsables:

Ejecutor: SINPAD S DE R.L

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 14.34%
Fecha de Presentación de Informe	26 de septiembre de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia		Bueno	X	Maestro de Obra.	4
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	7
				Peón	7

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza con los trabajos de instalaciones eléctricas en el área del techo curvo de escenario.
- Suministro de salida eléctrica circuito de toma 1, con caja metálica de 2x4 y accesorios de instalación.
- Suministro de salida eléctrica circuito de toma 2, con caja metálica de 2x4 y accesorios de instalación
- Suministro de salida eléctrica circuito de toma 3, con caja metálica de 2x4 y accesorios de instalación.
- La pared que conforma el escenario, contiene 6 unidades de tomacorrientes doble polarizado de 120V, a 0.30 M SNPT.
- Además de los tomacorrientes doble polarizados, también contiene 3 unidades de tomacorrientes especial de 240 V, a 0.30 M SNPT.
- El numero de cable que se utiliza para el sistema de tomacorrientes, es de (1 x 10 N, x 12 PT).
- Suministro de salida eléctrica para reflectores con cable (1 x 12 L + 1 x 12 N + 1 x 14PT)
- Suministros de 4 luminarias led tipo reflector de 25 W/120V.
- Suministro e instalación de luminarias para circuitos #1, #2 y #3, en área de techo curvo.



CONCLUSIONES:

- El desarrollo de la ejecución del proyecto, se realiza de acuerdo a los establecido en los detalles, mas sin embargo en el mes de septiembre, se ha visto interrumpido el avance debido a las diferentes programaciones en el marco de las fiestas patrias de nuestro país.
- Con la actual programación del I festival del Dulce de Panela, en nuestro municipio, se toma la decisión de quitar todo el cerco perimetral y utilizar el espacio para el desarrollo de lo antes mencionado, por lo que las empresas, suspenden actividades.
- El desarrollo de la obra se ejecuta de acuerdo a lo especificado en detalles de planos.



SUPERVISOR UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

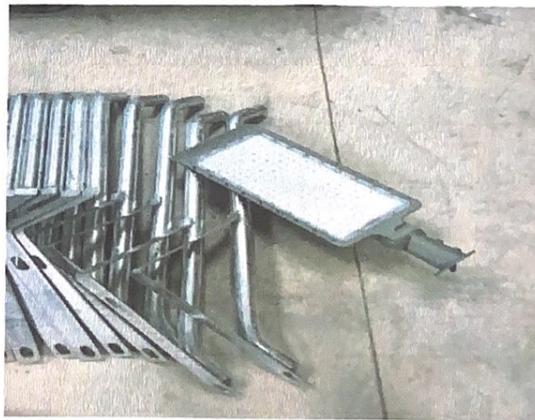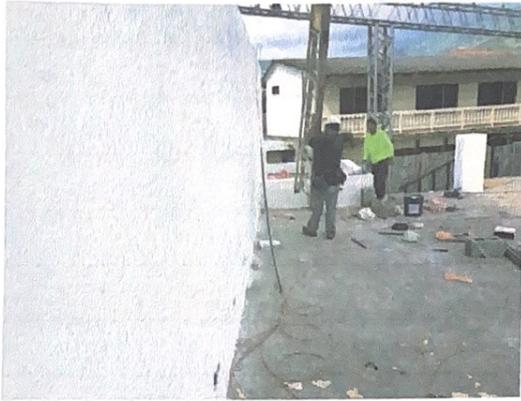





Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y OBRAS ADICIONALES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Crematorio Municipal, Sabanas de Ocote.

Responsables:

Ejecutor: Rolando Pineda

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	16 de octubre de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	2
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno


Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se realizan la nivelación y trazo del terreno para preparar el lugar donde se realizara la construcción de la caseta de vigilancia.
- Las dimensiones establecidas por la unidad técnica municipal son de 3.25 m x 3.15 m.
- Este modulo de caseta de vigilancia cuenta con un baño dentro, además cuenta con una ventana corrediza, y una puerta metaliza de lamina troquelada.
- Los castillos que se utilizaron para el armados con de 15 x 20 cms, con un armados de 4 # 3 y #2 @ 15 cm para la solera inferior y superior, los castillos estructurales son de 15 x 15 cms, con un armado de 4#3 y #2 @ 20 cms,
- Para la cimentación cuenta con una excavación de 50 x 50 cms, utilizando una mampostería de 65% piedra y 35% concreto.
- También se le adicionara 2 columnas de 15 x 15, esto se realiza como iniciativa de poder controlar la demanda de carros que frecuentemente visitan al crematorio.
- Y como obra adicional de señalizara el crematorio municipal, con el nombre que corresponde.


CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se cumple en tiempo y forma



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

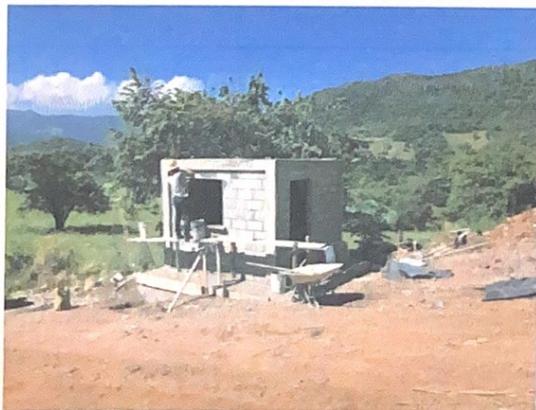





Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAL METALICA PARA MODULOS DE VENTAS.

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Mercado Municipal, Barrio El Centro.

Responsables:

Ejecutor: Municipalidad de Taulabe

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	26 de octubre de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	4
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Cada modulo cuenta con un espacio, adecuado para la venta de productos dentro de las instalaciones del mercado municipal.
- Se pretende la instalación de estructura metálica con tubo de 1 ½" x 1 ½", y tubo cuadrado de ¾" x ¾" "para los largueros principales.
- Cada cubículo contara con una puerta y una ventana.
- Para el forraje de toda la estructura se contará con maya desplegable para cubrir el 100% de todo el espacio.
- Dos de los espacios que está destinado a carnicerías, fueron separados con la intención de poder crear mas espacios para poder integrar a todos los comerciantes en espacios donde puedan desempeñar su trabajo en condiciones óptimas, este trabajo fue realizado con una pared de bloque de 5", mismo se le coloco acero por temperatura.
- Se mejora todo el sistema eléctrico tanto en circuitos de iluminación, como en circuitos de tomacorrientes den cada uno de los módulos.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se cumple en tiempo y forma.

[Handwritten signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
U.T.M.
TAMAYO

SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #3

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE CENTRAL JOSE TRINIDAD CABAÑAS.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Barrio Santa Barbara.

Responsables:

Ejecutor: SINPAD S DE R.L

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 14.31%
Fecha de Presentación de Informe	27 de octubre de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia		Bueno	X	Maestro de Obra.	4
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	7
				Peón	7

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se realiza el trazo de la jardinera cuadrada en estacionamiento, colindante con la calle con dimensiones de 5.92 x 2.43 metros incluyendo actividades de excavación con dimensiones de 0.20 x 0.20 metros y vaciado de concreto con mampostería al 65% de piedra y 35% concreto, esta jardinera cuenta con 4 castillos con dimensiones de 0.15 x 0.15, y un armado de 4#3 y #2 @ 20 cm, la pared es de bloque simple.
- Para el área de las gradas, se realiza todo el trazado y marcado, a lo largo de la cancha multiusos y las gradas en ambos laterales del portal de banderas, incluye la excavación con dimensiones de 0.20 x 0.20 m, con un vaciado de concreto de 65% de piedra y 35% de concreto, además lleva consigo un bastón de 1#4 @ cada 40 cms. con bloque fundido de 8.
- El enchape de esta desarrollando en las gradas y uno de los laterales de la cancha.
- Se realiza también el trazado y marcado de las bancas concreto metal que incluye la excavación, estas bancas con concreto fundido y un armado de castillo de 4#3 y #2 @ 20 cms, con revoque de pared rustica.
- Para el portal de banderas se realiza toda el trazado y marcado, vaciado y concreto de mampostería, pared de bloque fundido y el suministro de tubería para atas de banderas.

CONCLUSIONES:

- Los detalles antes mencionados en el desarrollo de actividades están plasmados dentro del juegos de planos propuestos.
- Actualmente se sigue desarrollando las actividades que prosiguen par la finalización y entrega de proyecto.
- Las condiciones de clima han mejorado.


SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEBA MORALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

