

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Marcovia, 08 de noviembre de 2023

NOTA INFORMATIVA

Por medio de la presente envío documentación complementaria de la finalización del proceso de Licitación Privada LP-02-2023 para el proyecto de Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo e=20cm en la comunidad de La Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Sin otro particular.



José Daniel Maldonado
Admón. Unidad de Infraestructura



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023
Hora : 07:58 p.m.
USUARIO: PR.ANDINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 44337

L.: 962,325.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7384

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 7013728

Paguese a: GERARDO ANTONIO ESTRADA DURON

Id/RTN: 08011977116442

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO AL SR. GERARDO ANTONIO ESTRADA DURON EN REPRESENTACION DE INGENIEROS TECNICOS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.de.R.L (INGETECC), POR CONCEPTO DE ABONO DEL VALOR DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e= 20cm EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. TOTAL CONTRATO L. 1,603,875.00 MENOS VALOR DEL ABONO L. 962,325.00 SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO L. 641,550.00

Banco Atlantida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 032 000 001 47210 11-011-03	Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo La Majada (Caminos Productivos).	962,325.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-03	PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS SIT	962,325.00
Monto Total:		962,325.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		962,325.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		962,325.00

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Tesorería:
 Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.: 08011977116442

0s+jsj8Jmc6WcR3xvF18QVcxvZRypwgW4fZ19m2ySGqPm/mzjzCxf2gYz6yWUOdqrUh9GepDdOD/kYyby6srN+X2MGBQOv/E7KNv8FQN/UR3XIEZcX5MKQjzQ7Gwq962TIMQ5J4vTEZ5KjQ77VgdZWL14B4Fh

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA. 29 MES Septiembre AÑO 2023

MUNICIPALIDAD DE
MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Gerardo Antonio Estrada Duran

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 962,325.00

Novecientos Sesenta y dos Mil Trescientos Veinticinco con
Centavos


POR CONCEPTO DE: pago abono del valor del contrato
de construcción de pavimento de concreto ciclóped e = 20cm
en la comunidad de la Majada

SOLVENCIA MUNICIPAL

IDENTIDAD NO, 0801197711644

FIRMA

VO BO ALCALDE MUNICIPAL

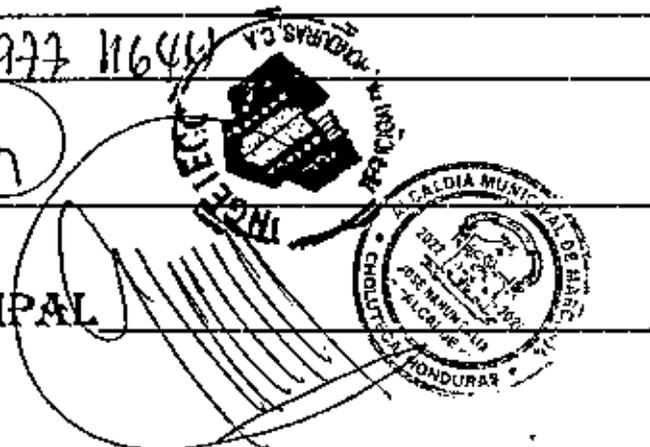

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Para:

José Nahum Gallo
Alcalde Municipal



De:

José Daniel Majada
Admón. Unidad de Infraestructura



Asunto:

Lo Descrito

Fecha:

29 de septiembre de 2023

Sirva la presente para solicitarle Autorice el pago al señor Gerardo Antonio Estrada Durón en representación de Ingenieros Técnicos Contratistas y Consultores S. de R.L. (INGETECC) por concepto de abono del valor del contrato de Construcción de Pavimento de concreto ciclópeo e= 20cm en la comunidad de la Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Total Contrato	-----	L. 1, 603, 875.00
Valor del abono	-----	L. 962, 325.00
Saldo pendiente del contrato	-----	L. 641, 550.00

Total a pagar (Novecientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Veinticinco Lempiras Exactos)

PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNICA ESTIMACION TOTAL

OBRA CIVIL CONTRATADA						ESTIMACION PRESENTE		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. OBRA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT. OBRA	PRECIO TOTAL	% AVANCE
1.0	Pavimento de concreto e: 20 cm	m2	2,000.00	L 717.15	L 1434,300.00	2,000.00	L 1434,300.00	100.00%
2.0	Relleno Mat/Selecto con compacto de plato	m3	300.00	L 555.25	L 166,575.00	300.00	L 166,575.00	100.00%
3.0	Movilización de Equipo	Global	1.00	L 3,000.00	L 3,000.00	1.00	L 3,000.00	100.00%
GRAN TOTAL = L.		L	1603,875.00			L	1603,875.00	

FECHA: 25/08/2023

RESUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN

OBRA TOTAL EJECUTADA A LA FECHA = Lps. 1603,875.00
 OBRA ADICIONAL = Lps. 0.00
TOTAL OBRA EJECUTADA EN ESTA ESTIMACIÓN = Lps. 1603,875.00

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO = Lps. 0.00
 RETENCIÓN DE CALIDAD DE OBRA DEL 5% = Lps. 0.00
TOTAL DEDUCCIONES = Lps. 0.00

TOTAL NETO A PAGAR = Lps. 1603,875.00


 Gerardo Antonio B. Contratista
 INBEYEG
 INGENIERIA DE HONDURAS, S.A.


 Jose Daniel Maldonado
 Unidad de Infraestructura
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
 MARCOVIA, HONDURAS


 Jose Natush Cerna
 Alcalde Municipal
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
 MARCOVIA, HONDURAS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-63231

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón **INGENIEROS TECNICOS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S DE R.L**
Social:

Con Registro Tributario Nacional: **08019018034017**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número **201-23-10500-63241** en fecha 03/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. **25455914264** de fecha 03/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración **35744180053**, presentada el 01/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/11/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-63231** o mediante el siguiente código QR:



Municipalidad de Marcovia, Choluteca

Comprobante de Pago

RTN: 06079995201200

No. Recibo: 147581

Fecha Recibo: 03/10/2023

Identidad: 08019018034017


Nombre: Ingenieros Tecnicos Contratistas y

Dirección: Tegucigalpa, Col. Las Colinas, Calle Quinta Entrada Casa# 3214, bloque F

Detalle: Pago de solvencia

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111101	Impuesto Personal	1.00	4,020.00
11111817	Tasa Ambiental	1.00	10.00
Total:			4,030.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
286447(Octubre-2023).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Factura: yony
Cajero: alma lopes

00007100034375
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
FRENTE AL PARQUE, MARCOVIA
CHOLUTECA TEL. 2722-7071 / 2072

CHEQUE No. 07013728

29/09/2023 Marcovia
Lugar y Fecha

Gerardo Antonio Estrada Duron L 962,325.00
Páguese a la orden de

Novecientos sesenta y Dos mil Trecientos Veinticinco
Cantidad en letras Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



⑆01007024⑆00007100034375⑆07013728

07013728

00007100034375
CONCEPTO DEL PAGO:

Gerardo Antonio Estrada Duron

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Abono al Sr Gerardo Antonio Estrada Duron en representación de la empresa de Ingenieros Técnicos contratados y consultores S de RL (Incoetec) por concepto de construcción de pasarela ciclistas		962,325.00
BALANCE LPS			

HECHO POR: [Signature]
REVISADO POR: [Signature]
APROBADO POR: [Signature]
RECIBI CONFORME: [Signature]
0001197711644

4
3
2



República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/07/2018

RTN: 08019018034017

INGENIEROS TECNICOS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S. DE R. L.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Reprantas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 286 de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 58 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 68, 69 numeral 3 y 4 184 del Código Tributario.


 Miguel Oviedo

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 83 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2960803

Transacción: 222988



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-5500

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INGENIEROS TÉCNICOS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018034017**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-5500 en fecha 02/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25410436393 de fecha 02/09/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/09/2023 hasta 02/10/2023, lo mismo no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.gt/>, ingresando el número 151-23-10500-5500 o mediante el siguiente código QR:





Póliza No.:	ZC-FC-99462-2023	Desde:	28/08/2023	12 M.
Fecha de Emisión:	28/08/2023	Hasta:	28/08/2024	12 M.
Afianzado:	INGENIEROS TECNICOS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S. DE R. L			
Domicilio:	DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN			
Beneficiario:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA CHOLUTECA			
Domicilio:	MARCOVIA, CHOLUTECA			
Suma Afianzada:	L 80,193.75			

FIANZA DE CALIDAD DE OBRA
CONDICIONES GENERALES

Garantía a favor de "ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA CHOLUTECA", para garantizarle que el afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, reparará o corregirá cualquier falla o defecto de construcción por mano de obra o materiales empleados por el afianzado, en el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEG E=20 CM." UBICADO LA MAJADA, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA". Garantía que asciende a la cantidad de: L 80,193.75 (OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100),

CLÁUSULA ESPECIAL: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.

SEGUROS CREFISA, S.A., que en lo sucesivo se denominará la Compañía garantiza por la presente póliza a favor del beneficiario (arriba mencionado), el cumplimiento por parte del afianzado (también arriba mencionado),

Las Condiciones Particulares que se agreguen a esta póliza, con el consentimiento de las partes contratantes se entienden que hacen parte del seguro otorgado según los términos de este documento.

Las Condiciones Generales adjuntas que se agregan a esta Fianza, con el consentimiento de las partes contratantes forman parte integrante de la presente Póliza

En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de:
TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 de Agosto del 2023

		
Firma Autorizada		Afianzado

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA

Acta de Recepción Definitiva

Nombre del Proyecto: Construcción de pavimento con concreto ciclópeo e=20 cm.

Ubicación: La Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del Estado relacionada(s) con la obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que les corresponde.


En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

La Majada, Marcovia, 28 de agosto de 2023.

Lugar y fecha


Alcalde
Municipal




Supervisor





Beneficiario
199/089



Proyecto: "Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo e: 20 cm, Ubicado en la Comunidad de La Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, Republica de Honduras"

INFORME DE SUPERVISION

Proyecto: "Pavimento de Concreto Ciclópeo e: 20 cm, Ubicado en la Comunidad de La Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, Republica de Honduras"

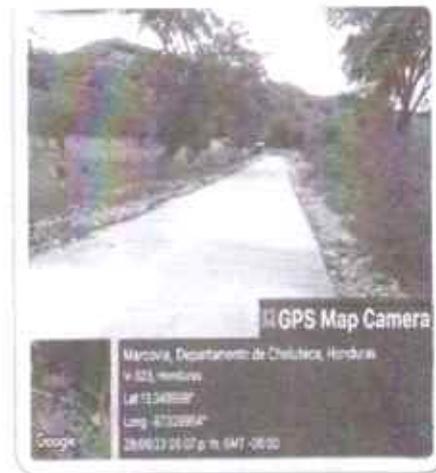

Periodo: 17 de julio al 18 de agosto del 2023

Supervisión

José Daniel Maldonado

Choluteca, Choluteca

Agosto/2023

Marcovia, Choluteca.
21 de agosto del 2023

Secretaría de Infraestructura y Transporte.
Su Oficina;

Estimado Ing:

En atención a la ejecución del proyecto en referencia, adjunto el informe de supervisión de obra civil que correspondiente al periodo comprendido del 17 de julio al 18 de agosto del 2023.

Atentamente

José Daniel Maldonado
Admón. Unidad de Infraestructura
Alcaldía Municipal de Marcovia

CC: Archivo

CONTENIDO

I.	EL PROYECTO.....	4
1.1	GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	4
1.2	UBICACIÓN DEL PROYECTO	4
II.	EL CONTRATISTA.....	5
II.1	Información General.....	5
II.2.	Trabajo realizado en el Período por el Contratista	6
II.3.	Estado del tiempo.....	6

I. EL PROYECTO

1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO


El proyecto contempla las actividades y presupuesto que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. OBRA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	Pavimento de concreto e: 20 cm	m2	2,000.00	L 717.15	L 1,434,300.00
2.0	Relleno Mat/Selecto con compacto de plato	m3	300.00	L 555.25	L 166,575.00
3.0	Movilización de Equipo	Global	1.00	L 3,000.00	L 3,000.00
GRAN TOTAL = L			L	1,603,875.00	

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El sitio donde se ejecutó el proyecto en referencia se encuentra ubicado en la comunidad de "La Majada", jurisdicción del municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, específicamente en las siguientes coordenadas:

- 16P
- Este: 464363.59 m
- Norte: 1475699.13 m

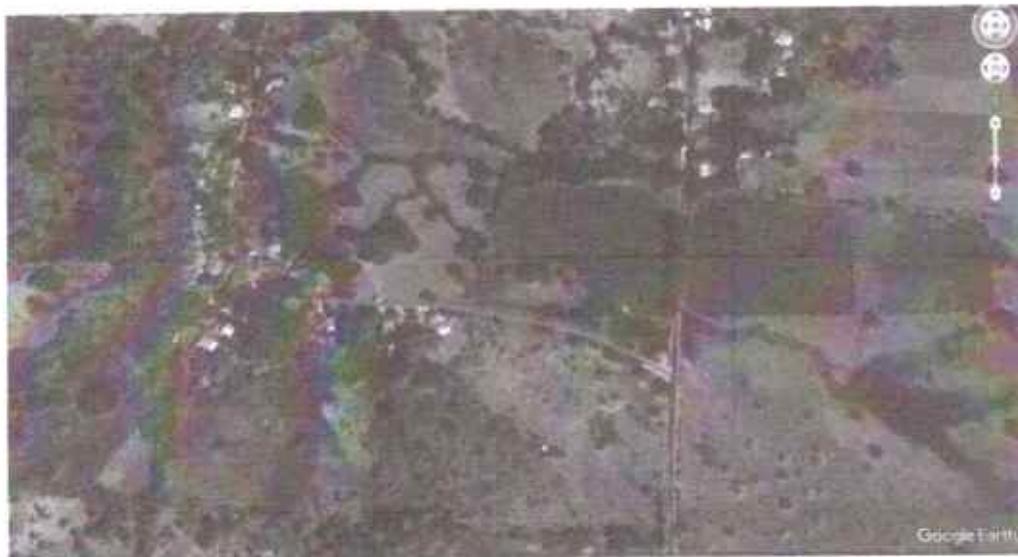

Ubicación del Proyecto en relacion a la Comunidad "La Majada", municipio de Marcovia, Choluteca.

1.3 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la "Mejora de caminos productivos en la Comunidad de "La Majada", municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, Republica de Honduras".

Mejora de la infraestructura vial interna de la comunidad "La Majada", mediante la pavimentación con concreto ciclópeo e: 20 cm y todas las actividades previas al pavimento como ser la conformación y afinamiento con motoniveladora, aporte de material selecto humedecido y compactado con vibro compactador.

De esta manera poder contar con una capa de rodadura estable para la movilización adecuada de productos agrícolas de la zona.

II. EL CONTRATISTA

II.1 Información General

CONCEPTO	CONTRATISTA
Nombre del Contratista	<i>Ingenieros Técnicos Contratistas y Consultores S de R.L</i>
Fecha de orden inicio	17 de julio del 2023
Fecha de finalización según contrato	18 de septiembre del 20203
Monto contractual	<i>LPS 1,603,875.00</i>
Monto Ejecutado estimación Unica	<i>LPS 1,603,875.00</i>
Total a pagar estimación Única	<i>LPS 1,603,875.00</i>

El contratista presento estimación única de las actividades desarrolladas por un monto de L. 1,603,875.00 (Un Millón Seiscientos Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos) ver anexos.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cantidad	Descripción
1	Capataz de Maquinaria
2	Choferes de Volqueta
1	Operador de Motoniveladora
1	Operador de Retroexcavadora
1	Operador de Vibro Compactador
1	Topógrafo (Estación Total)

1	Cadenero
1	Capataz de Albañilería
3	Albañiles
12	Ayudantes

EQUIPO DEL CONTRATISTA

Cantidad	Descripción
1	Retroexcavadora
1	Motoniveladora
1	Pick up
1	Vibro Compactador
2	Camiones de Volteo de 12 m3

II.2. Trabajo realizado en el Periodo por el Contratista

Durante el periodo se realizaron las actividades siguientes:

1. Preliminares


- 1.1- Limpieza o descapote de maleza para trazar y marcar.
- 1.2- Trazar y Marcar con estación total.

2. Concreto Ciclópeo e: 20 cm

- 1.1- Acarreo de material selecto.
- 1.2- Tender el material selecto con motoniveladora.
- 1.3- Vibrado de material selecto con vibro compactador de 12Tn.
- 1.4- Encofrado y colocado de cama de piedra con diámetro no mayor de 4"
- 1.5- Colado de concreto de 4,000 PSI.

II.3. Estado del tiempo


El clima ha afectado las actividades debido a que ha presentado clima lluvioso y nublado, sin embargo, se logró culminar el proyecto con normal en tiempo y forma.

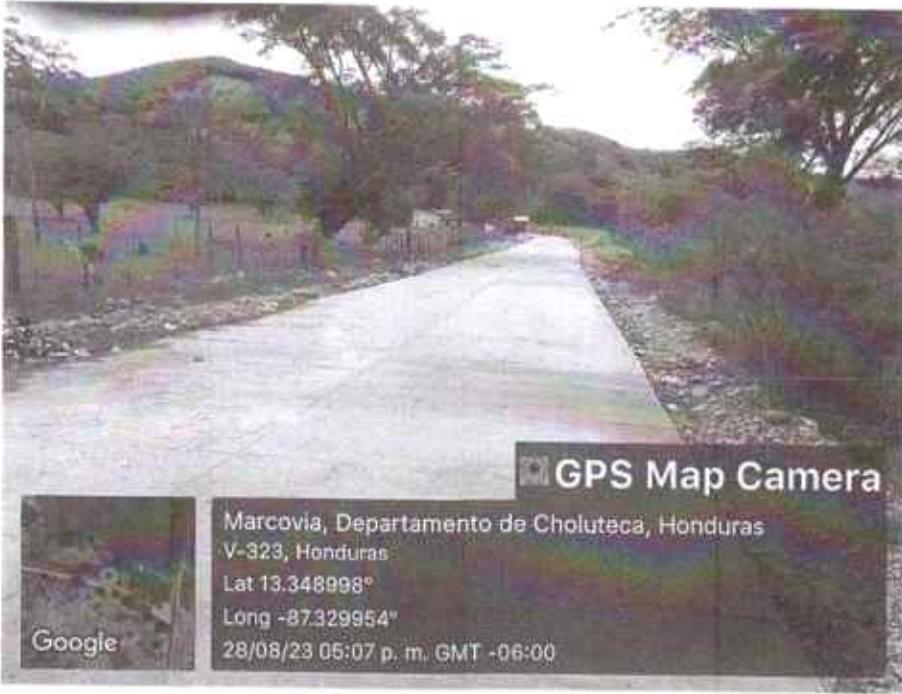

GPS Map Camera

Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras
V-323, Honduras
Lat 13.348998°
Long -87.329954°
28/08/23 05:07 p. m. GMT -06:00


Google

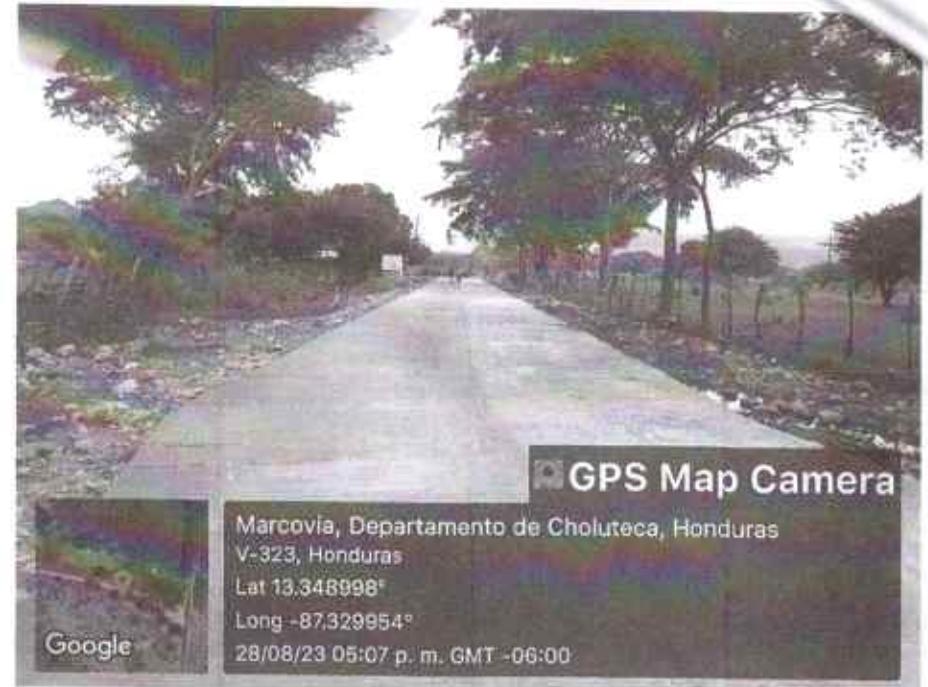

GPS Map Camera

Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras
V-323, Honduras
Lat 13.348998°
Long -87.329954°
28/08/23 05:07 p. m. GMT -06:00


Google

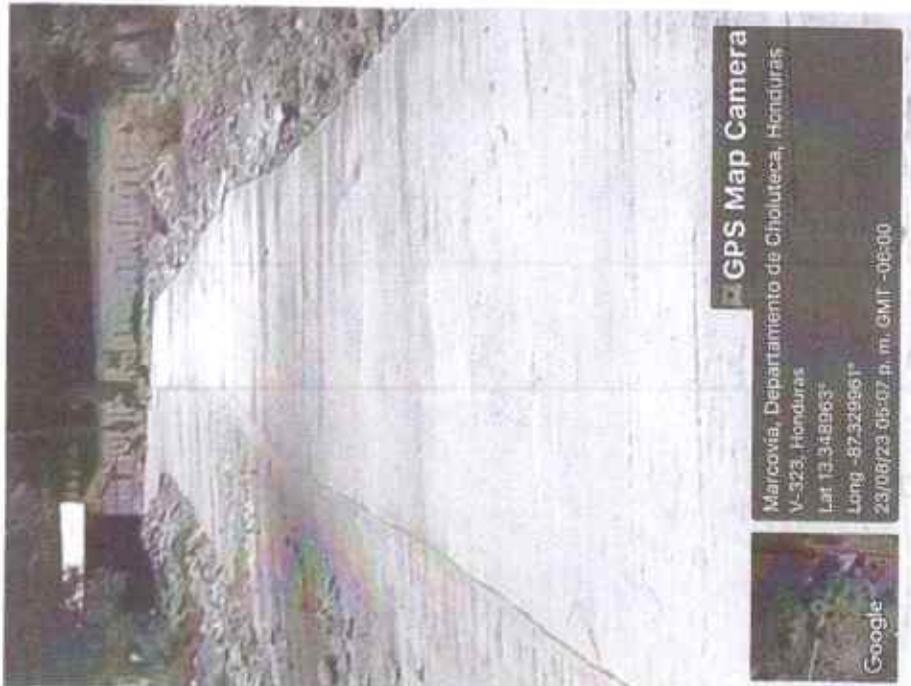

GPS Map Camera

Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras
V-323, Honduras
Lat 13.348963°
Long -87.329961°
28/08/23 05:07 p. m. GMT -06:00



Google




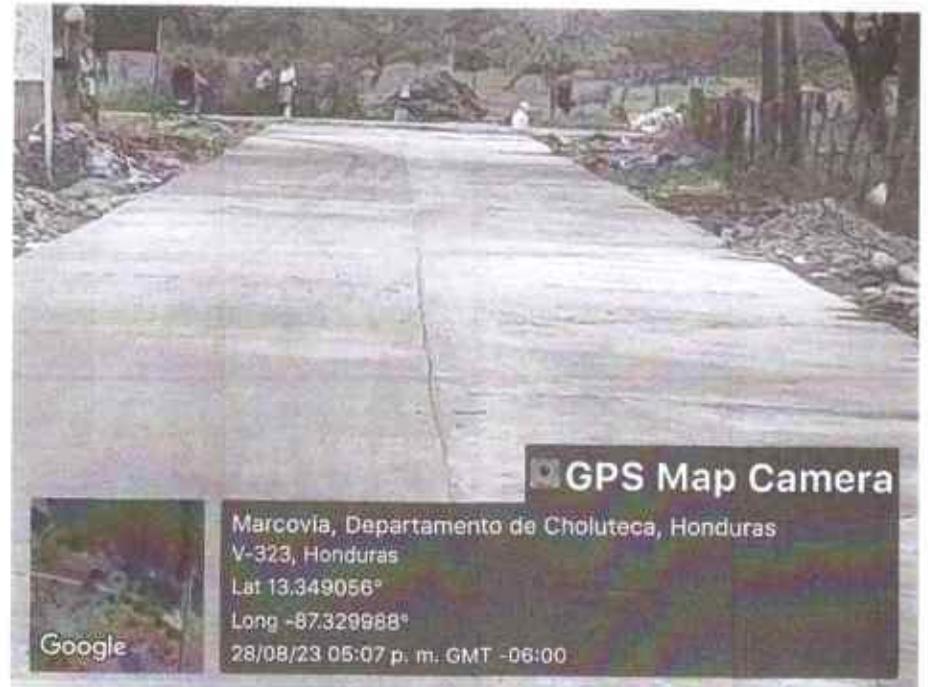


GPS Map Camera

Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras
V-323, Honduras
Lat 13.349056°
Long -87.329988°
28/08/23 05:07 p. m. GMT -06:00

Google

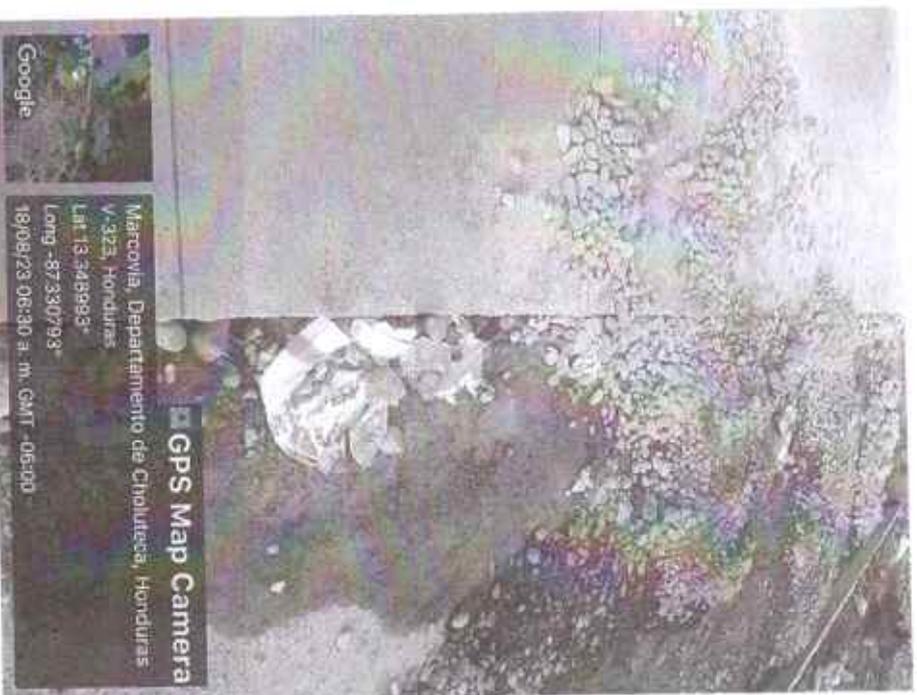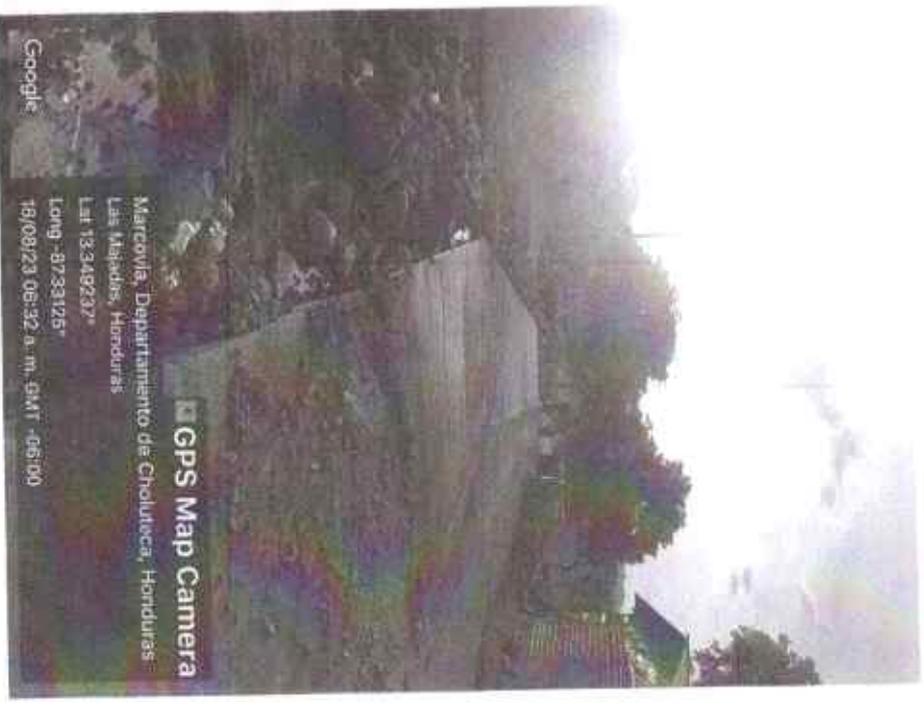

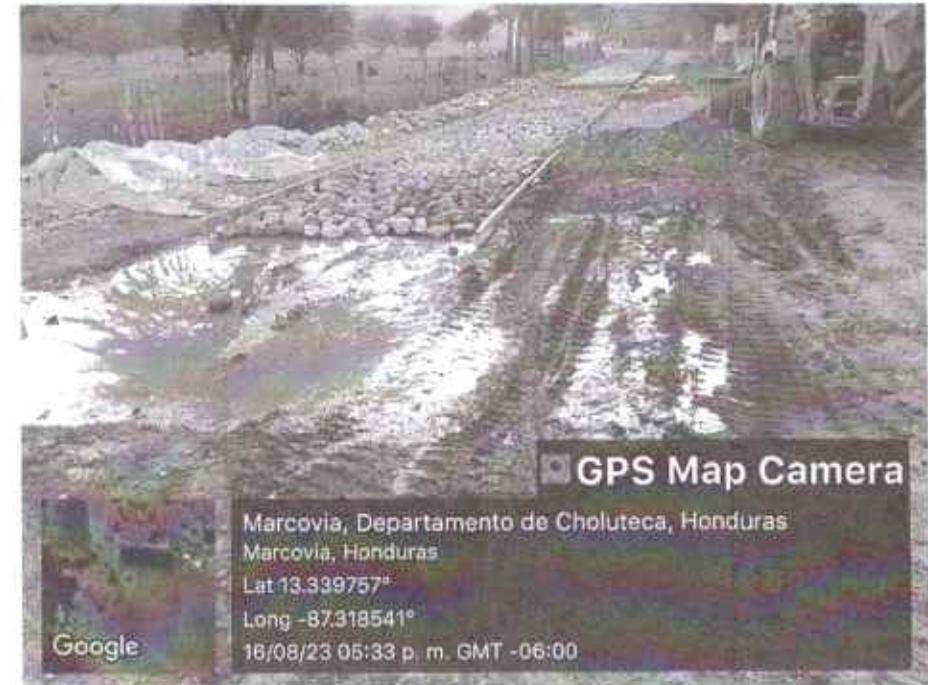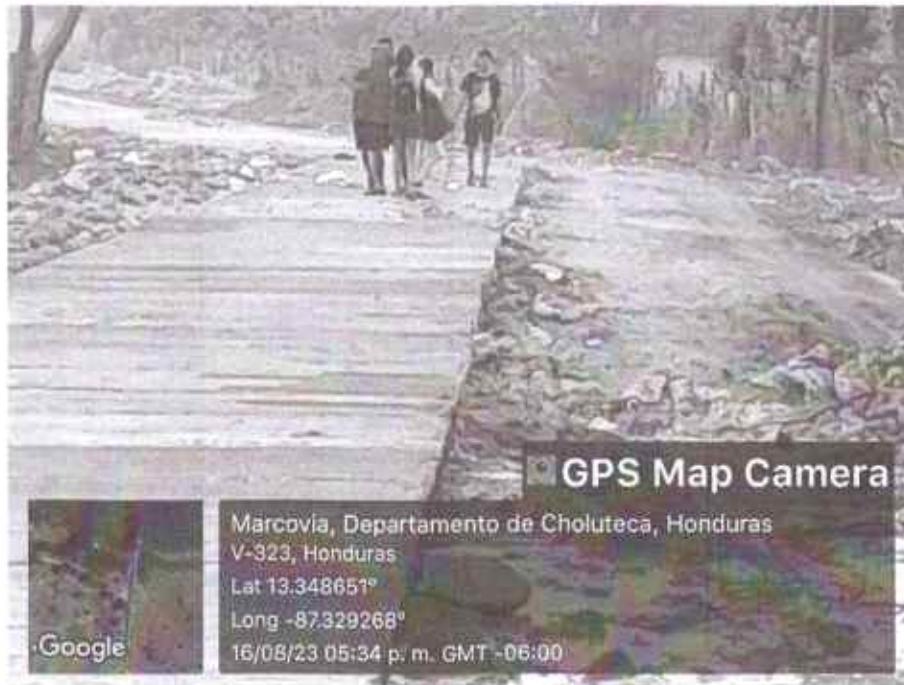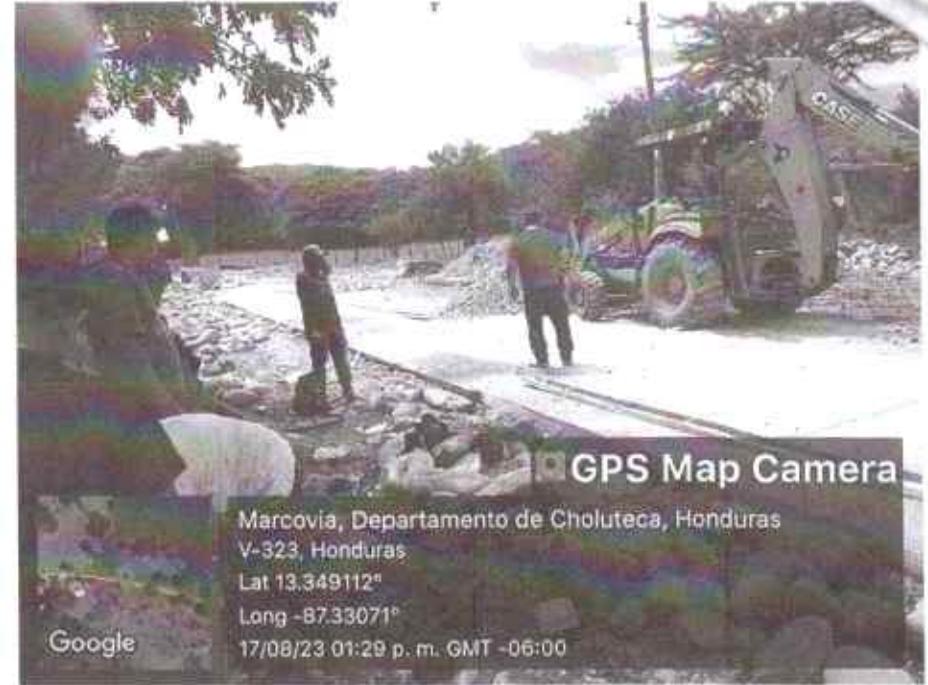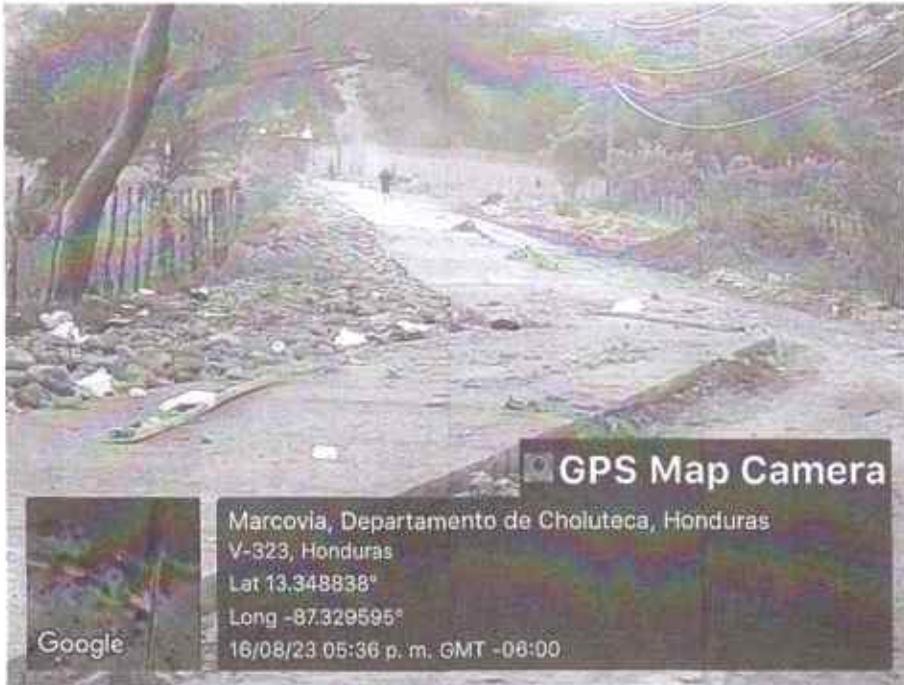


GPS Map Camera

Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras

Lat 13.349237°

Long -87.331177°

08/08/23 06:27 a. m. GMT -06:00




GPS Map Camera


Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras

Lat 13.349237°

Long -87.331177°

08/08/23 06:27 a. m. GMT -06:00



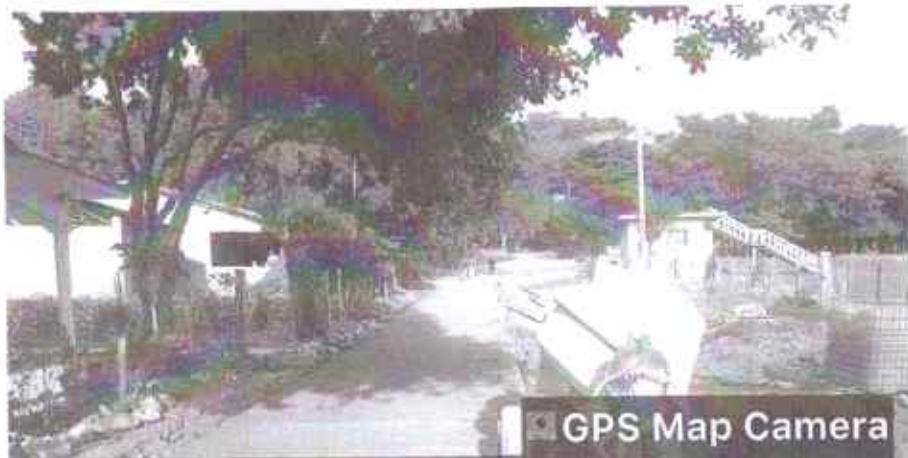

GPS Map Camera
Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras
Las Majadas, Honduras
Lat 13.349227°
Long -87.331546°
07/08/23 07:15 a. m. GMT -06:00







GPS Map Camera
Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras
Las Majadas, Honduras
Lat 13.349225°
Long -87.331591°
08/08/23 01:21 p. m. GMT -06:00



GPS Map Camera
Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras
Las Majadas, Honduras
Lat 13.349236°
Long -87.331169°
07/08/23 07:14 a. m. GMT -06:00



GPS Map Camera
Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras
V-323, Honduras
Lat 13.349012°
Long -87.330091°
07/08/23 07:14 a. m. GMT -06:00

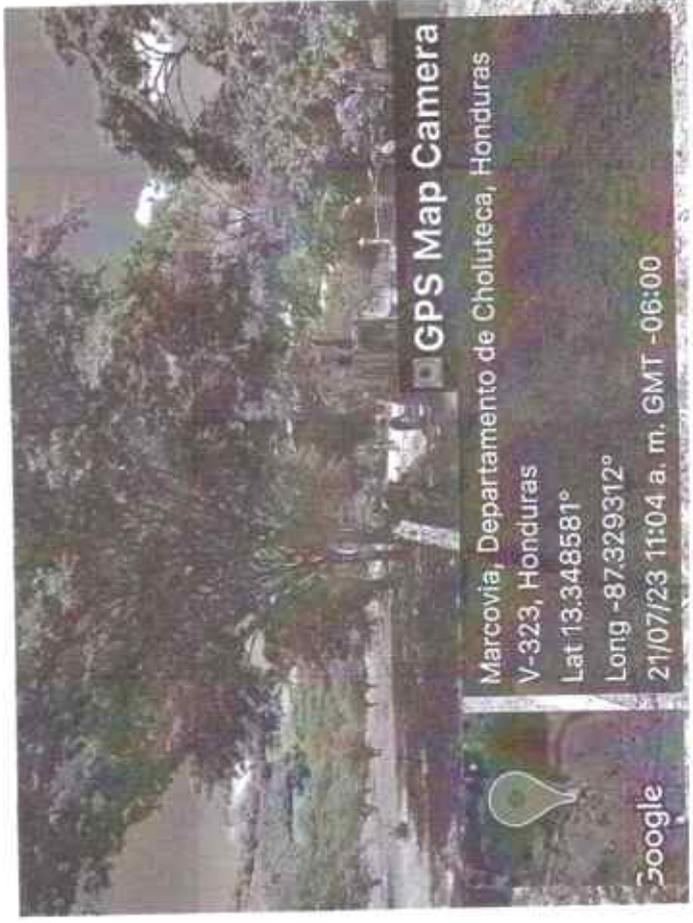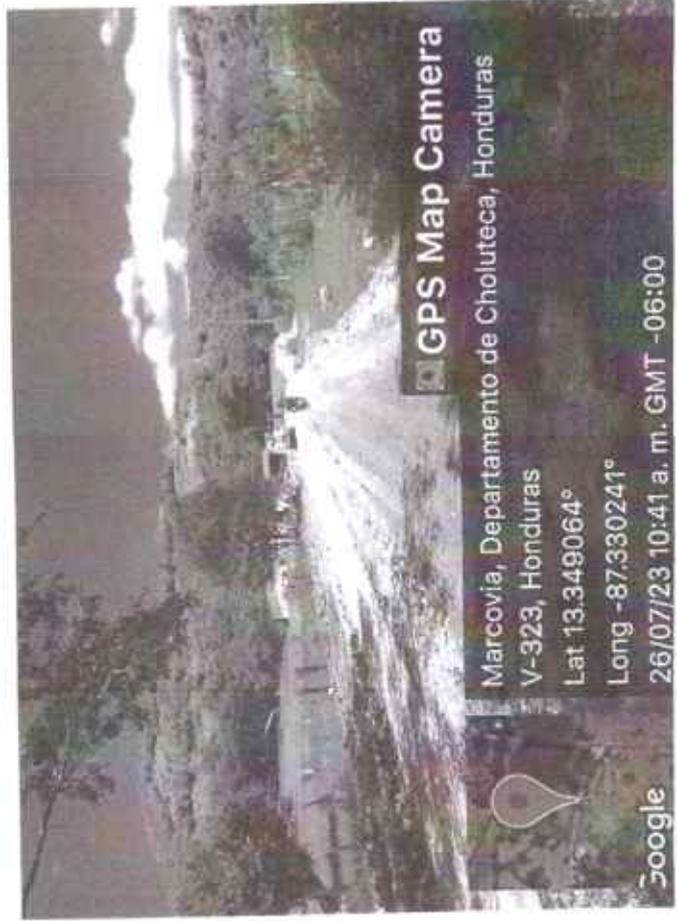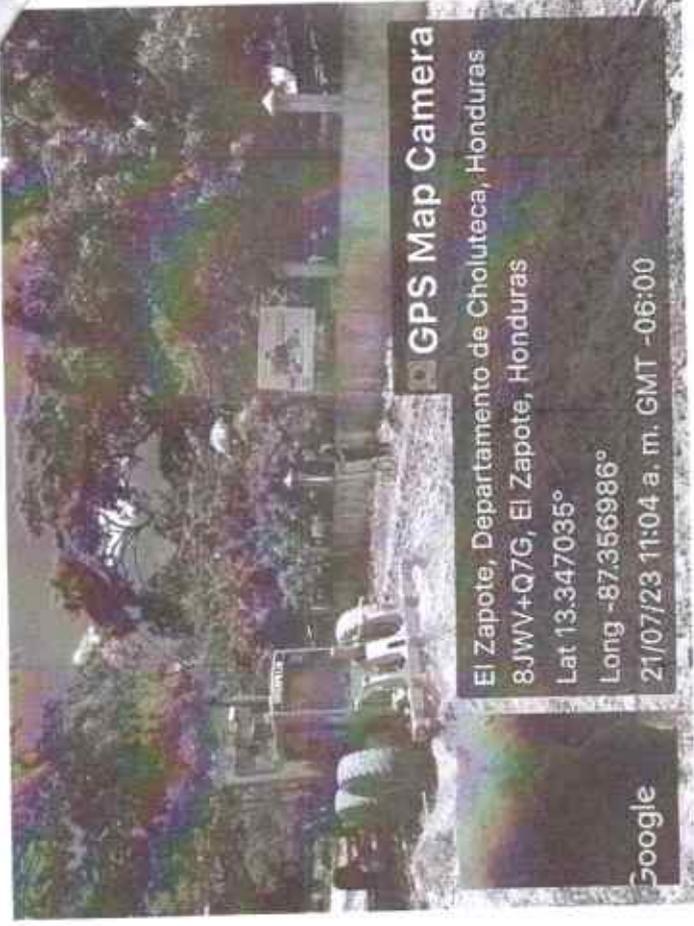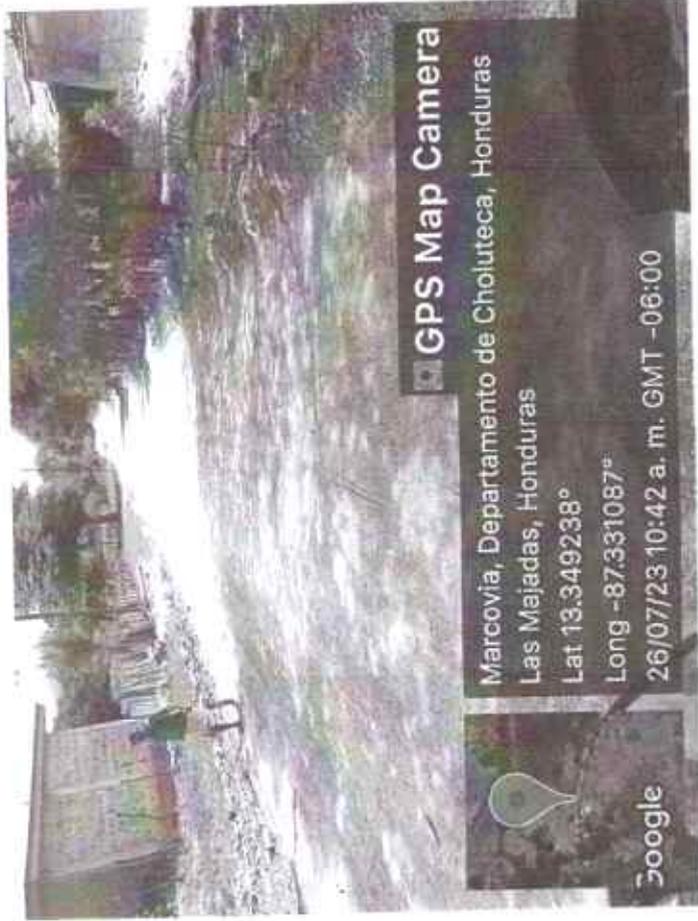



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 02/11/2023
Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: PRANDINO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 44459

L: 641,550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7428

Fecha de Emisión: 1/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 7013736

Paguese a: GERARDO ANTONIO ESTRADA DURON

Id/RTN: 08011977116442

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO AL SEÑOR GERARDO ANTONIO ESTRADA DURON EN REPRESENTACION DE INGENIEROS TECNICOS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S DE RL (INGETEC), POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL VALOR DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO e= 20cm EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA VALOR DEL CONTRATO L. 1,603,875.00 MENOS VALOR DEL ABONO L. 962,325.00 TOTAL A PAGAR L. 641,550.00

14 02 032 000 001 47210 11-011-03	Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo La Majada (Caminos Productivos).	641,550.00
-----------------------------------	---	------------

Total de retenciones:		0.00
------------------------------	--	-------------

11-011-03	PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS SIT	641,550.00
Monto Total:		641,550.00

SUBTOTAL	641,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	641,550.00

Firma y Sello de



Firma y Sello de



Recibido por:

Identidad No.:

Gerardo A. Estrada Duron
0801 1997 116442

De: ja/j8.lmc01w0R3xvF8QVcrvZR/ypqjW4Z3m2ySGcPm...
Owq962T0M05J4vTE25gQ77Vgd2wL484Fh

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA _____ MES _____ AÑO _____

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Cecardo Antonio Estrada

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 641,550.00

Seiscientos Cuarenta y un Mil Quinientos cincuenta exactos

POR CONCEPTO DE: pago cancelación del valor del contrato
de construcción de pavimento de concreto ciclopeo e= 20cm
en la comunidad de la Majada.

SOLVENCIA MUNICIPAL

IDENTIDAD NO. 0801 1977 11644

FIRMA

VO BO ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Para:


José Nahum Calix
Alcalde Municipal

De:


José Daniel Maldonado
Admón. Unidad de Infraestructura

Asunto:

Lo Descrito


Fecha:

31 de octubre de 2023

Sirva la presente para solicitarle Autorice el pago al señor Gerardo Antonio Estrada Durón en representación de Ingenieros Técnicos Contratistas y Consultores S. de R.L. (INGETECC) por concepto de cancelación del valor del contrato de Construcción de Pavimento de concreto ciclópeo e= 20cm en la comunidad de la Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Total Contrato	_____	L. 1, 603, 875.00
Menos valor del abono	_____	L. 962, 325.00
Valor a pagar	_____	L. 641, 550.00

Total a pagar (Seiscientos Cuarenta y Un Mil Quinientos Cincuenta Lempras Exactos)

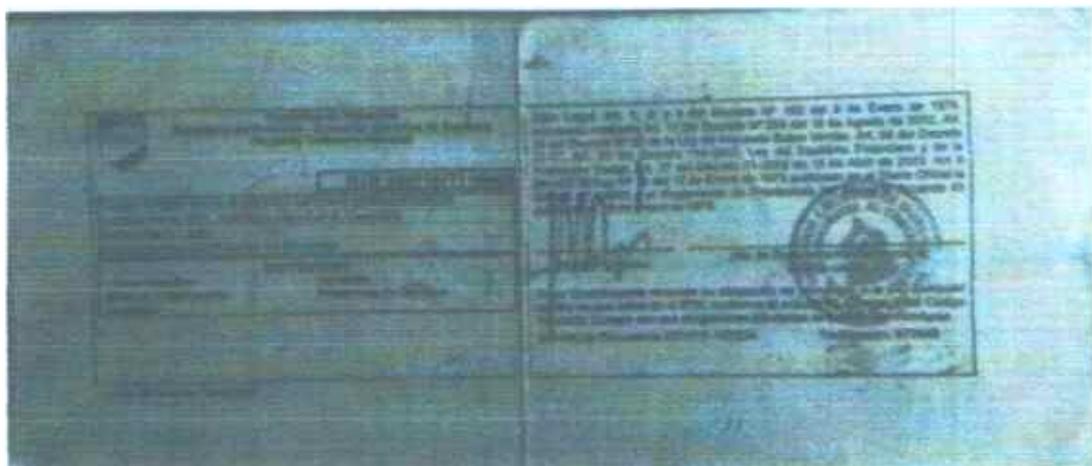



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-63231

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón **INGENIEROS TECNICOS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S DE R.L**
Social:

Con Registro Tributario Nacional: **08019018034017**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número **201-23-10500-63241** en fecha 03/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. **25455914264** de fecha 03/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración **35744180053**, presentada el 01/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/11/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-63231** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 06/07/2018

RTN: 08018018034017

INGENIEROS TECNICOS CONTRATISTAS Y COMERCIORES S. DE R. L.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Practicas Importaciones de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholicos Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholicos Licorosos	<input type="checkbox"/>
Importante	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholicos Licorosos	<input type="checkbox"/>
Protestante	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 107 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 236 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Ingresos Selva Verde, Art. 5 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prácticas de Comercio Aduanado 43 de 1973, Art. 30, 38 y 39 Decreto N° 17-2070, Art. 40 de los SS. 51, 52, 53, 54, 55 numeral 1, 56 numeral 1, 58 numeral 1, 59 numeral 2 y 4, 104 del Código Tributario.



El señor Gerente Técnico recuerda su obligación de presentar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 83 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es Progresar"

Número de Documento SAR-412-280803 Transacción: 222886



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-79977

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ESTRADA DURON GERARDO ANTONIO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011977116442**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-79977 en fecha 20/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25278890883 de fecha 20/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27229922010, presentada el 20/10/2023, la presente Constancia vence el 20/11/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-79977 o mediante el siguiente código QR:





SEGUROS
CREFISA
Programa de Transparencia

POLIZA DE FIANZA

Póliza No.: ZC-FC-99462-2023 **Desde:** 28/08/2023 **12 M.**
Fecha de Emisión: 28/08/2023 **Hasta:** 28/08/2024 **12 M.**
Afianzado: INGENIEROS TECNICOS CONTRATISTAS Y CONSULTORES S. DE R. L.
Domicilio: DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA CHOLUTECA
Domicilio: MARCOVIA, CHOLUTECA
Suma Afianzada: L 80,193.75

**FIANZA DE CALIDAD DE OBRA
CONDICIONES GENERALES**

Garantía a favor de "ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA CHOLUTECA", para garantizarle que el afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, reparará o corregirá cualquier falla o defecto de construcción por mano de obra o materiales empleados por el afianzado, en el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20 CM." UBICADO LA MAJADA, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA". Garantía que asciende a la cantidad de: L 80,193.75 (OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100),


CLÁUSULA ESPECIAL: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.

SEGUROS CREFISA, S.A., que en lo sucesivo se denominará la Compañía garantiza por la presente póliza a favor del beneficiario (arriba mencionado), el cumplimiento por parte del afianzado (también arriba mencionado),

Las Condiciones Particulares que se agreguen a esta póliza, con el consentimiento de las partes contratantes se entienden que hacen parte del seguro otorgado según los términos de este documento.

Las Condiciones Generales adjuntas que se agregan a esta Fianza, con el consentimiento de las partes contratantes forman parte integrante de la presente Póliza

En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de:
TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 de Agosto del 2023


Firma Autorizada




Afianzado

Tegucigalpa, M.D.C.
Edificio Fianza, Primer Nivel,
Boulevard Morazan,
Apdo. Postal 1774,
Tel.: PBX 2216-4700
Fax: (504) 2238-1714

San Pedro Sula, Cortés,
Edificio Inversiones Crefisa,
Barrio El Centro,
5ª Avenida, 2ª Calle, N.O.
Tel. 2557-9971,
Fax: (504) 2558-0942

La Ceiba, Atlántida
Frente al Boulevard
15 de Septiembre, ¼ cuadra al
este del Banco Central,
Tel.: 2443-4208, 2443-4210
Fax: (504) 2443-0098

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA

Acta de Recepción Definitiva

Nombre del Proyecto: Construcción de pavimento con concreto ciclópeo
e=20 cm.

Ubicación: La Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución(es) del Estado relacionada(s) con la obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que les corresponde.


En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

La Majada, Marcovia, 28 de agosto de 2023.

Lugar y fecha


Alcalde
Municipal




Supervisor




Beneficiario




INGENIERO



PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNICA ESTIMACION TOTAL

OBRA CIVIL CONTRATADA							ESTIMACION PRESENTE		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. OBRA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	CANT. OBRA	PRECIO TOTAL	% AVANCE	
1.0	Pavimento de concreto e: 20 cm	m2	2,000.00	L 717.15	L 1,434,300.00	2,000.00	L 1,434,300.00	100.00%	
2.0	Relleno Mat/Selecto con compacto de plato	m3	300.00	L 553.25	L 166,575.00	300.00	L 166,575.00	100.00%	
3.0	Movilización de Equipo	Global	1.00	L 3,000.00	L 3,000.00	1.00	L 3,000.00	100.00%	
GRAN TOTAL = L		L			1603,875.00		L 1603,875.00		

FECHA: 25/08/2023

RESUMEN DE ESTA ESTIMACION

OBRA TOTAL EJECUTADA A LA FECHA = Lps. 1603,875.00
 OBRA ADICIONAL = Lps. 0.00
TOTAL OBRA EJECUTADA EN ESTA ESTIMACION = Lps. 1603,875.00

DEDUCCIONES

AMORTIZACION DEL ANTICIPO = Lps. 0.00
 RETENCION DE CALIDAD DE OBRA DEL 5% = Lps. 0.00
TOTAL DEDUCCIONES = Lps. 0.00

TOTAL NETO A PAGAR = Lps. 1603,875.00



Proyecto: "Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo e: 20 cm, Ubicado en la Comunidad de La Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, Republica de Honduras"

INFORME DE SUPERVISION

Proyecto: "Pavimento de Concreto Ciclópeo e: 20 cm, Ubicado en la Comunidad de La Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, Republica de Honduras"



Periodo: 17 de julio al 18 de agosto del 2023

Supervisión

José Daniel Maldonado

Choluteca, Choluteca

septiembre/2023

CONTENIDO

I. EL PROYECTO.....	4
1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	4
1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO.....	4
II. EL CONTRATISTA.....	5
II.1 Información General.....	5
II.2. Trabajo realizado en el Periodo por el Contratista.....	6
II.3. Estado del tiempo.....	6

I. EL PROYECTO

1.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

El proyecto contempla las actividades y presupuesto que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. OBRA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1.0	Pavimento de concreto e: 20 cm	m2	2,000.00	L 717.15	L 1,434,300.00
2.0	Relleno Mat/Selecto con compacto de plato	m3	300.00	L 555.25	L 166,575.00
3.0	Movillización de Equipo	Global	1.00	L 3,000.00	L 3,000.00
GRAN TOTAL = L			L		1,603,875.00

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El sitio donde se ejecutó el proyecto en referencia se encuentra ubicado en la comunidad de "La Majada", jurisdicción del municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, específicamente en las siguientes coordenadas:

- 16P
- Este: 464363.59 m
- Norte: 1475699.13 m



Ubicación del Proyecto en relación a la Comunidad "La Majada", municipio de Marcovia, Choluteca.

I.3 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la "Mejora de caminos productivos en la Comunidad de "La Majada", municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, Republica de Honduras".

Mejora de la infraestructura vial interna de la comunidad "La Majada", mediante la pavimentación con concreto ciclópeo e: 20 cm y todas las actividades previas al pavimento como ser la conformación y afinamiento con motoniveladora, aporte de material selecto humedecido y compactado con vibro compactador.

De esta manera poder contar con una capa de rodadura firme y estable para la movilización adecuada de productos agrícolas de la zona.

II. EL CONTRATISTA

II.1 Información General

CONCEPTO	CONTRATISTA
Nombre del Contratista	<i>Ingenieros Técnicos Contratistas y Consultores S de R.L</i>
Fecha de orden inicio	17 de julio del 2023
Fecha de finalización según contrato	18 de septiembre del 20203
Monto contractual	<i>LPS 1,603,875.00</i>
Monto Ejecutado estimación Única	<i>LPS 1,603,875.00</i>
Total a pagar estimación Única	<i>LPS 1,603,875.00</i>

El contratista presento estimación única de las actividades desarrolladas por un monto de Lps. 1,603,875.00 (Un Millón Seiscientos Tres Mil Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos) ver anexos.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Cantidad	Descripción
1	Capataz de Maquinaria
2	Choferes de Volqueta
1	Operador de Motoniveladora
1	Operador de Retroexcavadora
1	Operador de Vibro Compactador
1	Topógrafo (Estación Total)
1	Cadenero

1	Capataz de Albañilería
3	Albañiles
12	Ayudantes

EQUIPO DEL CONTRATISTA

Cantidad	Descripción
1	Retroexcavadora
1	Motoniveladora
1	Pick up
1	Vibro Compactador
2	Camiones de Volteo de 12 m3

II.2. Trabajo realizado en el Periodo por el Contratista

Durante el periodo se realizaron las actividades siguientes:

1. Preliminares

- 1.1- Limpieza o descapote de maleza para trazar y marcar.
- 1.2- Trazar y Marcar con estación total.

2. Concreto Ciclópeo e: 20 cm




- 1.1- Acarreo de material selecto.
- 1.2- Tender el material selecto con motoniveladora.
- 1.3- Vibrado de material selecto con vibro compactador de 12Tn.
- 1.4- Encofrado y colocado de cama de piedra con diámetro no mayor de 4"
- 1.5- Colado de concreto de 4,000 PSI.

II.3. Estado del tiempo

El clima ha afectado las actividades debido a que ha presentado clima lluvioso y nublado, sin embargo, se logró culminar el proyecto con normalidad en tiempo y forma.




Proyecto: "Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo e: 20 cm, Ubicado en la Comunidad de La Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, Republica de Honduras"

Al realizar la supervisión final se encontraron algunas fisuras en el pavimento, por lo que se le solicito al contratista la respectiva reparación, mismas que se llevaron a cabo de manera satisfactoria. A continuación algunas fotografías:

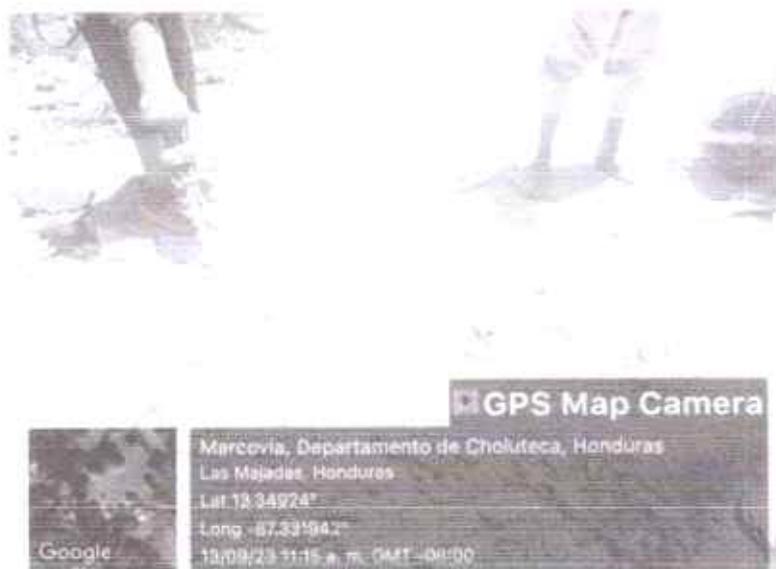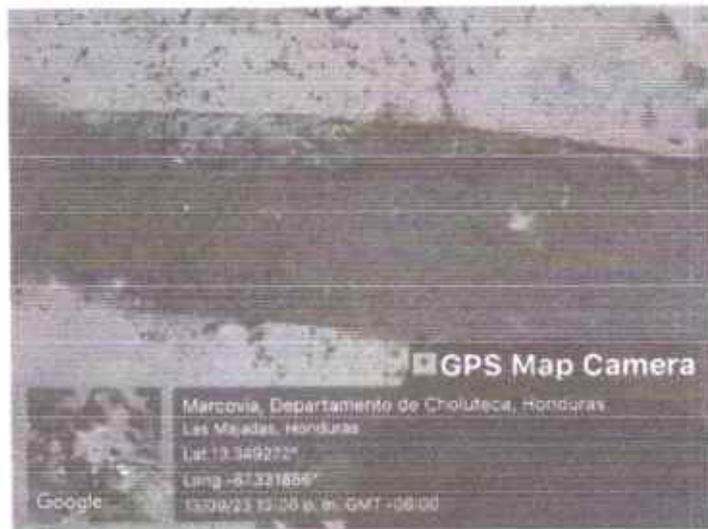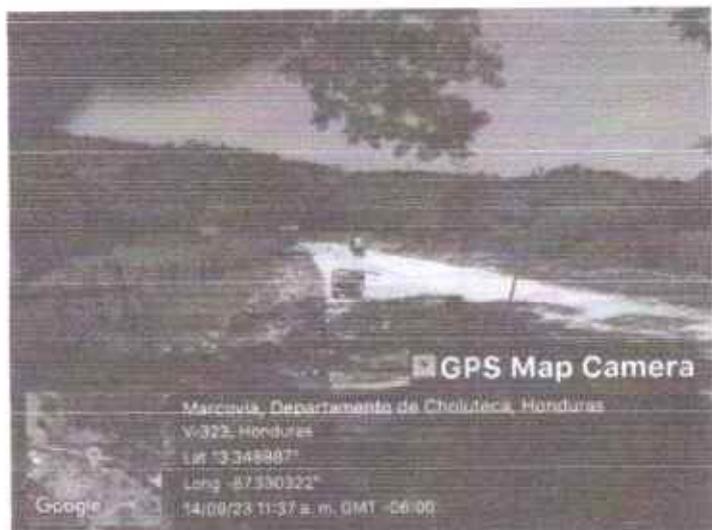

FOTOGRAFIAS

Proyecto: "Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo e: 20 cm, Ubicado en la Comunidad de La Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, Republica de Honduras"

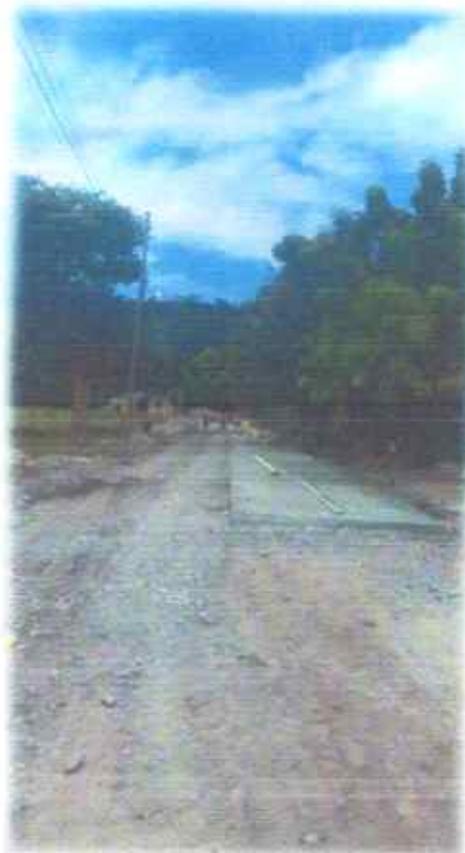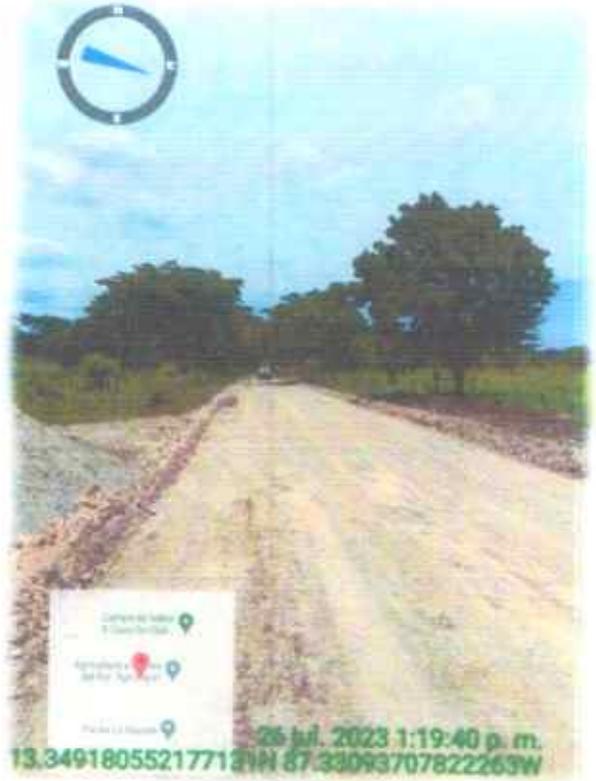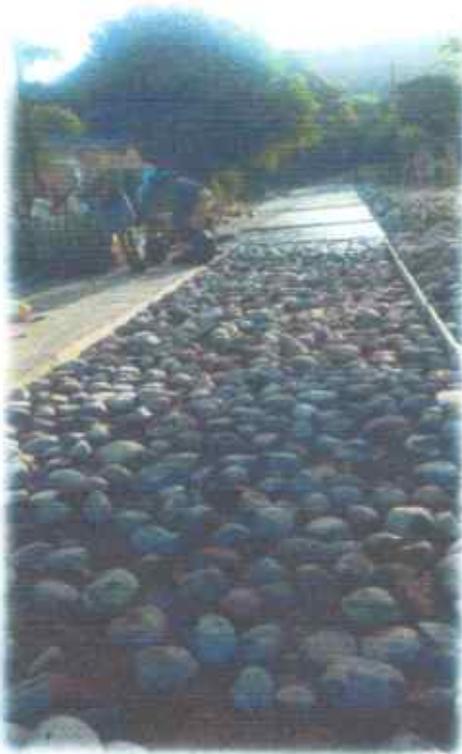

Proyecto: "Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo e: 20 cm, Ubicado en la Comunidad de La Majada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, Republica de Honduras"



0007100034375
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CENTRO AL PARQUE, MARCOVIA
BIBLIOTECA TEL. 2722-7071 / 2072

CHEQUE No. 07013736

02/11/2023 MARCOVIA
Lugar y Fecha

Gerardo Antonio Estrada Duron 641,580.00

Seiscientos cuarenta y un mil quinientos ochenta
Lempiras

Banco
Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



00000710003437507013736

0007100034375

07013736

CONCEPTO DEL PAGO:

Gerardo Antonio Estrada Duron

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago a IN COETEC Ingenieros Técnicos contratistas cobro alucin del contrato presupuesto cuenta ciclo por en la comunidad de la mapala.		
	BALANCE LPS.		641,580.00

HECHO POR:

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME
05/11/2023
