

# ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

## UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Marcovia, 08 de noviembre de 2023

### NOTA INFORMATIVA

Por medio de la presente envío documentación del proceso de Licitación Privada LP-04-2023 para el proyecto de Construcción de calle con concreto hidráulico en la comunidad de La Joyada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Sin otro particular.

  
  
**José Daniel Maldonado**  
Admón. Unidad de Infraestructura



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023  
Hora : 08:16 p.m.  
USUARIO: PR.ANDINO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 44385

L: 499,993.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7408

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 10377

Paguese a: ARNOLD JAVIER JIRON CARRANZA

Id/RTN: 03011966006126

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A ARNOLD JAVIER JIRON CARRANZA POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION N.1 DEL VALOR DEL CONTRATO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA JOYADA, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA VALOR DEL CONTRATO L. 2.796.038.92 VALOR ESTIMACION N.1 L. 624.992.18 MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO L. 124.998.44 VALOR A PAGAR L. 499,993.75

*Banco Occidente*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 041 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Calle con Concreto Hidraulico en la Comunidad de la Joyada	499,993.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	499,993.75
<b>Monto Total:</b>		<b>499,993.75</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		499,993.75
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>499,993.75</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Arnold Javier Jiron Carranza  
Identidad No.: 03011966006126



08+js|9Jmc6WcR3xvFBOVcxvZR/yypwgW4fZm2ySGqPm/mzjCx2gvzeHwMUOwq9G3P0H00qYy9Mn+x2MGBQOv/E7KNv8FONUR3XIE2cX5MKQzQ7Gwq962TfMQ5J4vTE25KJQ7VgdZwL4B4Fh

# COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 19 MES Octubre AÑO 2023

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Arnold Javier Jiron Carranza

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE  
LPS. 499,993.75

Quatrocientos Noventa y Nueve mil Novecientos Noventa y  
tres con setenta y cinco centavos

POR CONCEPTO DE: Pago estimación N.1 del valor  
del contrato construcción de calle con concreto hidráulico  
en la comunidad de la joyada.

SOLVENCIA MUNICIPAL \_\_\_\_\_

IDENTIDAD NO, 0301196600612

FIRMA \_\_\_\_\_



VO BO ALCALDE MUNICIPAL



# ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Para:



José Nahon Calzadilla  
Alcalde Municipal

De:



José Daniel Maldonado  
Admón. Unidad de Infraestructura

Asunto:

Lo Descrito

Fecha:

19 de octubre de 2023

Sirva la presente para solicitarle autorice el pago a Arnold Javier Jirón Carranza, por concepto de pago de Estimación N° 1 del valor del Contrato para proyecto "Construcción de calle con concreto hidráulico en la comunidad de La Joyada", Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Valor del contrato	L. 2,796,038.92
Valor estimación N° 1	L. 624,992.18
Menos valor amortización de anticipo	L. 124,998.44
Valor a pagar	L. 499,993.75

**Total a pagar** (Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres Lempiras con 75/00)

Saldo total del contrato L. 2,171,046.74

F.P.

**CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD LA JOYADA  
MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, REPUBLICA DE HONDURAS**

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA JOYADA, MARCOVIA, CHOLUTECA, HONDURAS

CONTRATISTA: ARNOLD JAVIER JIRÓN CARRANZA RTN: 06011966006126

**I ESTIMACIÓN DE OBRA**

FECHA: DESDE 18/9/2023 HASTA 28/9/2023

CONTRATO ORIGINAL					I ESTIMACIÓN DE OBRA			
Item	Descripción de Actividades	Unidad	Cantidad	P.U.	Total de Obra	Cantidad Ejecutada	P. Total	% de Obra
1	<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLE</b>							
1	Trazado y marcado (con estación total)	ML	610.00	15.00	9,150.00	400.00	6,000.00	66%
2	Concreto 4000 Psi (e. 0.15 m)	M3	539.00	4,343.60	2,341,200.40	122.94	534,002.38	23%
3	Acero de refuerzo	KG	765.00	51.00	39,015.00	200.00	10,200.00	26%
4	Bordillo de concreto de 15 x 13 cm	ML	1220.00	208.30	254,126.00	300.00	62,490.00	25%
5	Pintura de bordillo	M2	366.00	108.91	39,861.06	0.00	-	0%
6	Corte para juntas	ML	2542.00	24.60	62,533.20	300.00	12,300.00	20%
7	Sellado de juntas	ML	2542.00	19.73	50,153.66	0.00	-	0%
<b>GRAN TOTAL DE OBRA</b>					<b>L. 2,796,039.32</b>	<b>SUB TOTAL I ESTIMACIÓN</b>	<b>L. 624,992.18</b>	

TOTAL DE I ESTIMACIÓN	L.	624,992.18
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	L.	124,998.44
TOTAL NETO A PAGAR	L.	499,993.75

*Arnold*  
**ARNOLD JAVIER JIRÓN CARRANZA**  
 INGENIERO CIVIL  
 EJECUTOR DE PROYECTO  
 10-10-02  
 04-06-15  
 No. 1188

*Jose Daniel*  
**JOSE DANIEL MALDONADO**  
 ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD  
 DE INFRAESTRUCTURA

*Jose Nahum*  
**JOSE NAHUM CALIN**  
 ALCALDE MUNICIPAL



República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 03011966006126

Nombre o Razón Social: ARNOLD JAVIER JIRON CARRANZA  
Domicilio Fiscal: LA PAGODA Calle PRINCIPAL N. Casa 326  
Representante Legal:  
Categoría Económica Principal: No Obligados

**Inscripciones**

Impuestos Selectivos	Imprentas
Quina Tragamoneda	Prestatista No Bancario
Impuesto de Timbre	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2000, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 13,000 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 13 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente: le recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 de Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 357956

Transacción 78CF9E

Fecha de Emisión: 20090728

Fecha de Vencimiento:



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-84034

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JIRON CARRANZA ARNOLD JAVIER**  
Con Registro Tributario Nacional: **03011966006126**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-84034 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415933541 de fecha 04/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27728535763, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY POBERIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



[\*] Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.nac.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-84034** o mediante el siguiente código QR:







## INFORME DE PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN  
LA COMUNIDAD LA JOYADA MUNICIPIO DE MARCOVIA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, REPUBLICA DE  
HONDURAS"

## Generalidades del Proyecto

### Nombre del proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD LA JOYADA MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA REPUBLICA DE HONDURAS

### Ubicacion del Proyecto:

El proyecto está ubicado en la calle hacia el norte de la entrada principal de la comunidad de la Joyada municipio de Marcovia departamento de Choluteca Honduras



Ubicación de la Joyada, Marcovia, Choluteca Fuente: Google Earth

## **Alcances del Proyecto:**

El proyecto "construcción de calle con concreto hidráulico en la comunidad la Joyada municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, republica de honduras", comprende la pavimentación de la calle que dirige rumbo a aldea La Joyada con 620 metros lineales de pavimento hidráulico con un espesor de 15cms con una resistencia de 4,000 PSI e lo largo de toda la calzada.

Este proyecto beneficiara alrededor de 2,972 personas que son los habitantes de la aldea la Joyada, además este importante proyecto trae consigo el crecimiento de actividades económicas como el comercio y las actividades agrícolas de la zona como el camarón, sandía, caña de azúcar, melón, entre otras.

## **Metodología de Ejecución**

En el proyecto se utilizó una metodología de ejecución basada en la calidad de los implementos utilizados en la construcción del pavimento para garantizar la correcta ejecución del mismo.

**Maquinaria y Equipo:** La maquinaria utilizada en la construcción del pavimento garantiza la correcta nivelación del terreno, así como también el correcto maquilado del concreto a utilizar lo que garantiza una correcta y adecuada resistencia a la compresión de 4,000 PSI. La maquinaria utilizada fue la siguiente

- **Motoniveladora para terrenos Caterpillar.**
- **Camión Maquiladora para Concreto Mixer, con capacidad para 2.5 M3**
- **Camión Maquiladora para Concreto Mixer, con capacidad para 2.5 M3**
- **Retroexcavadora John Deere 310J**
- **Cortadora para concreto**

**Agregados:** Los agregados utilizados en el proyecto cumplen con la calidad que se requiere en un proyecto de estas características, tanto el agregado grueso y el agregado fino fueron comprados con la mejor calidad posible.



**Agregado Fino:** Se utilizó Arena de Río lavada y colada, se acarreo hacia el proyecto en camión volqueta con capacidad de 14m<sup>3</sup>


**Agregado Grueso:** Se utilizó Grava de piedra Triturada, se acarreo hacia el proyecto en camión volqueta con capacidad de 12m<sup>3</sup>

**Personal:** El personal utilizado en la ejecución del pavimento hidráulico cumplía a cabalidad con las capacidades y conocimientos técnicos que son de vital importancia para garantizar la correcta ejecución del proyecto, dentro del proyecto participaron alrededor de 18 personas para lograr la ejecución del mismo, divididos de la siguiente manera

- Albañiles técnicos
- Ayudantes Técnicos
- Ayudantes no Técnicos
- Maestro de obra
- Ingeniero Residente
- Ingeniero de Maquinaria
- Operarios de Maquinaria
- Cuadrilla de Topografía

ANEXOS DE LA EJECUCIÓN

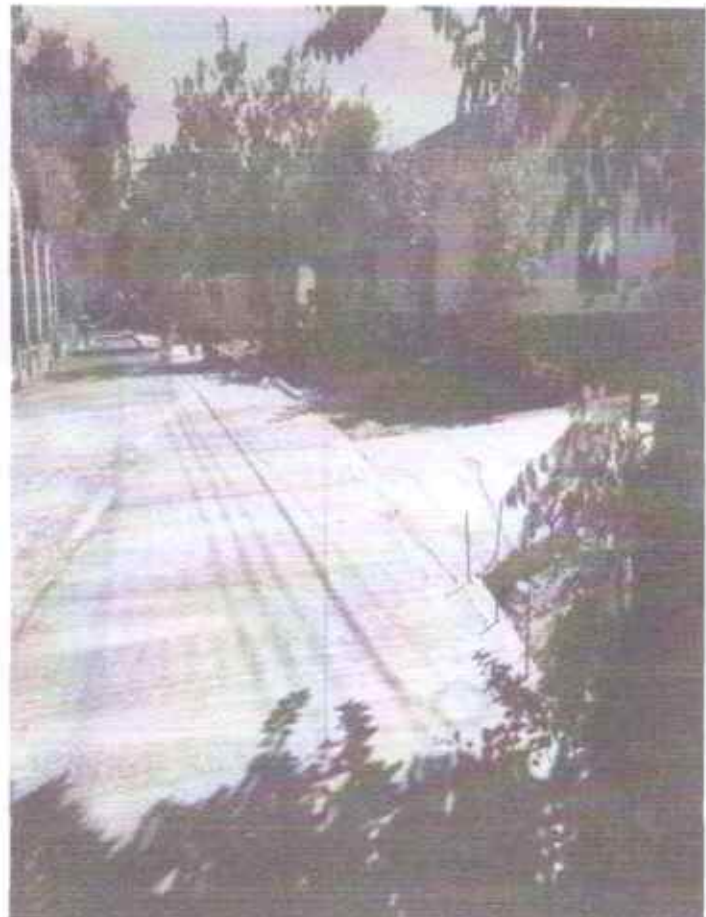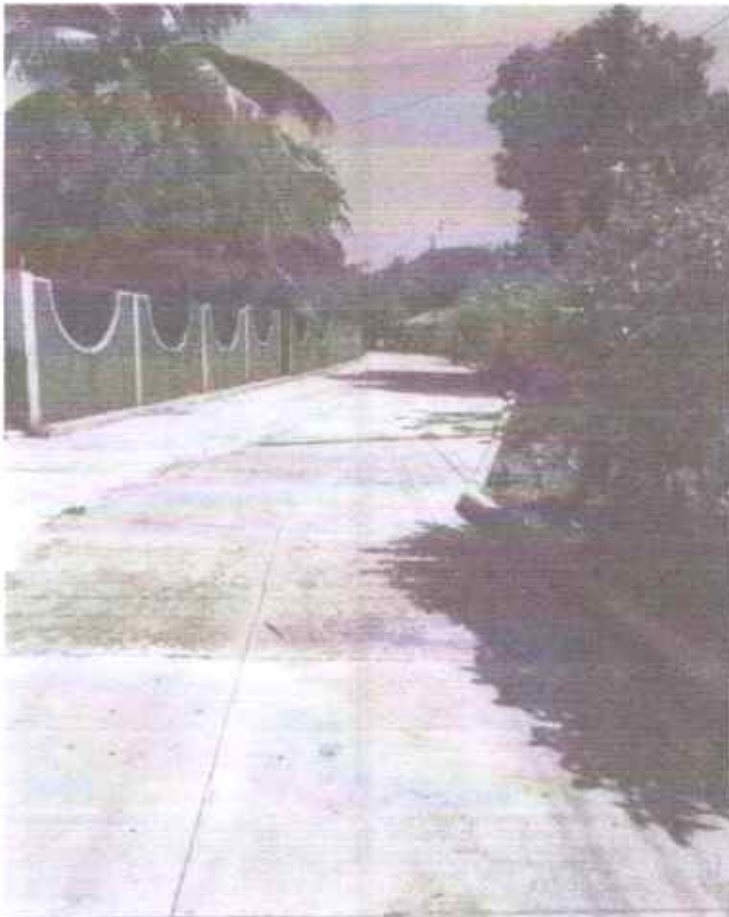

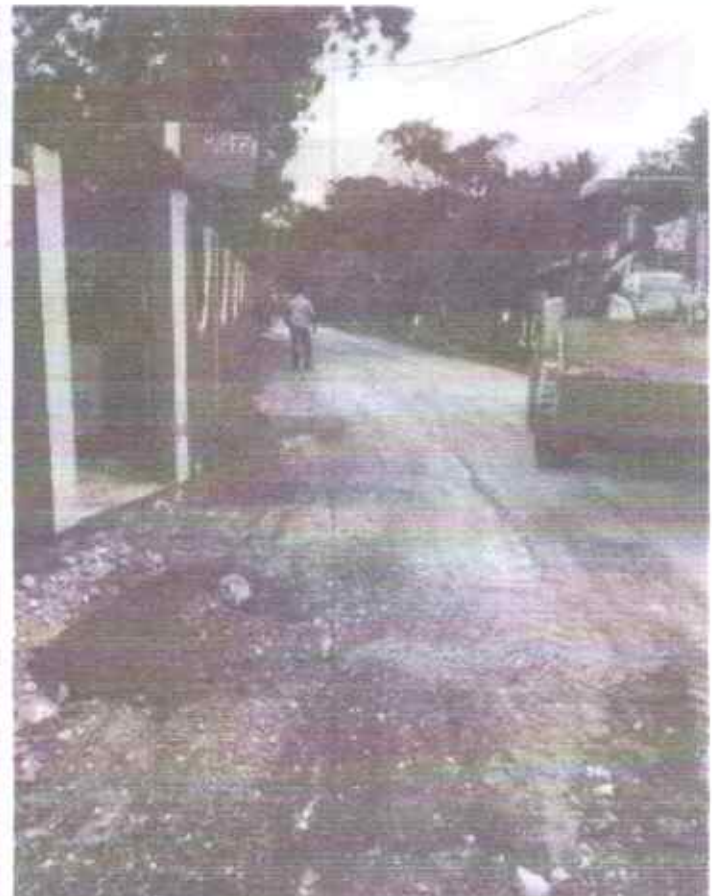



Municipio Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, Pinar y Plaza Chica  
 Marcovia, Chuquisaca, Tel: 27242011, 27242012  
 Cuenta N°: 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00010377


20/10/2023 MARCOVIA  
 Lugar y Fecha

Arnold Javier Jiron Carranza

499,993.75

Pagarse a la orden de

Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y tres con 75/100 ctvs  
 Cantidad en letras



Firma(s)



⑆0⑆50⑆079⑆00⑆⑆50⑆00⑆9043⑆000⑆0377

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
	Pago de anticipo #1 al Sr Arnold Javier Jiron Carranza para proyecto Construcción de proyecto Hidráulico Comunal de los campos menajira de marcovia Valor total anticipo 624,992.18 . anticipa 124,998.40 Saldo de anticipo #1 499,993.75		
	TOTAL EN CANTON		R 499,993.75
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
			RECIBIDO POR
			<i>[Signature]</i>

N° 00010377

