



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia

Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	CONSTRUCTORA CONGUSA
2. Sector o Sub sector:	Zona productora
3. Nombre del Proyecto:	"PROYECTO EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA."
4. Ubicación Geográfica del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a familias de la zona productora del municipio de Cane con el proyecto de EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6 ML en calle de difícil acceso y así contribuir en las actividades económicas de la población.
6. Objetivos Específicos del Proyecto	• Mejorar el acceso carretero a zonas productivas • Fortalecer las actividades económicas de la población. • Prevención de accidentes futuros. • Enchapar calle con piedra E=15cm
7. Descripción del Proyecto:	Empedrado de calles ancho 6 ml en calle de acceso a Miraflores "zona productiva" requiere de una conformación para darle forma a la calle utilizando la motoniveladora, agua, vibro, piedra, cemento. Este trabajo consistirá en la construcción de una calle enchape de mampostería con un ancho neto de 6.00 mts tipo. y espesor de 15 cms, conformada por piedras ripió unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 80 productores de la zona
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 03 de Julio del 2023, teniendo una vigencia de 90 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):	Lps. 2,189,818.22			
7. Fecha de Finalización:	03/10/2023			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
TERMINADO	Está en etapa de empedrado de la calle.	01/11/2023 al 30/11/2023	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 100%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	El proyecto tiene un desfase por las altas lluvias que ha provocado que los trabajos se atrasen.			
3. Variación en el costo del Proyecto:	L. 398,223.20			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	NO APLICA			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	Se hizo una alcantarilla			




Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos



ANEXO 2

ORDEN DE CAMBIO # 2

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

PROYECTO:

UBICACIÓN:

EJECUTOR:

FECHA:

EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA

CANE, LA PAZ

ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

09/10/2023

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO INICIAL			PRESUPUESTO CONTRATADO + ORDEN DE CAMBIO			
			CANTIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	MONTO	ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)	MONTO
1	EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6 M	M.L	936,40	L2.190,05	L2.050.762,82	946,94	L2.073.847,23	10,54	L23.084,41
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M2	5618,40	L24,75	L139.055,40	5618,40	L139.055,40	0,00	L0,00
	SUB TOTAL				L2.189.818,22		L2.212.902,63		L23.084,41
	ACTIVIDADES NUEVAS								
	EMPEDRADO DE CALLES								
3	TRAZADO Y MARCADO	ML	936,40	L39,49	L36.978,44	936,40	L36.978,44	0,00	L0,00
	SUB TOTAL				L36.978,44		L36.978,44		L0,00
	ALCANTARRILLA RIB LOC DE 36"								
4	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 1	M3	65,58	L243,21	L15.949,71	65,58	L15.949,71	0,00	L0,00
5	CAMA DE ARENA COMPACTADA E= 5CMS	M3	3,95	L917,90	L3.625,71	3,22	L2.955,64	-0,73	-L670,07
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO RIB LOC DE 36"	M.L	24,00	L11.499,95	L275.998,80	16,00	L183.999,20	-8,00	-L91.999,60
7	ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA	M3	6,590	L3.530,30	L23.264,68	12,46	L43.987,54	5,87	L20.722,86
8	RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMP. DE PLATO	M3	28,17	L934,45	L26.323,46	80,46	L75.185,85	52,29	L48.862,39
9	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	85,25	L188,65	L16.082,41	85,25	L16.082,41	0,00	L0,00
	SUB TOTAL				L361.244,76		L338.160,35		-L23.084,42
	SUB TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS				L375.723,20		L375.138,78		-L23.084,42
	MONTO TOTAL				L2.588.041,42		L2.588.041,42		L0,00
									0,00%

FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: ING. WALTER DAVID GUZMAN	NOMBRE: ING. NAHUN ORTEGA	NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO	NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ
FECHA: 9 DE OCTUBRE DEL 2023	FECHA: 9 DE OCTUBRE DEL 2023	FECHA: 9 DE OCTUBRE DEL 2023	FECHA: 9 DE OCTUBRE DEL 2023



ESTIMACION DE OBRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

PROYECTO: EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA

UBICACIÓN: CASCO URBANO CANE, LA PAZ

EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

ESTIMACION: 4

PERIODO DEL: 18/11/2023

HASTA

30/11/2023

12

DIAS



No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJEC. EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		% AVANCE
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1	EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6 M	M.L	946,94	L2.190,05	L2.073.847,23	768,20	L1.682.396,41	178,74	L391.450,82	946,94	L2.073.847,23	100,00%
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M2	5618,40	L24,75	L139.055,40	5618,40	L139.055,40	0,00	L0,00	5618,40	L139.055,40	100,00%
	SUB TOTAL				L2.212.902,63		L1.821.451,81		L391.450,82		L2.212.902,63	100,00%
	ACTIVIDADES NUEVAS											
	EMPEDRADO DE CALLES											
3	TRAZADO Y MARCADO	ML	936,40	L39,49	L36.978,44	936,40	L36.978,44	0,00	L0,00	936,40	L36.978,44	100,00%
	SUB TOTAL				L36.978,44		L36.978,44		L0,00		L36.978,44	100,00%
	ALCANTARRILLA RIB LOC DE 36"											
4	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 1	M3	65,58	L243,21	L15.949,71	65,58	L15.949,71	0,00	L0,00	65,58	L15.949,71	100,00%
5	CAMA DE ARENA COMPACTADA E= 5CMS	M3	3,22	L917,90	L2.955,64	3,95	L3.625,71	-0,73	-L670,07	3,22	L2.955,64	100,00%
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO RIB LOC DE 36"	M.L	16,00	L11.499,95	L183.999,20	24,00	L275.998,80	-8,00	-L91.999,60	16,00	L183.999,20	100,00%
7	ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA	M3	12,460	L3.530,30	L43.987,54	0,00	L0,00	12,46	L43.987,54	12,46	L43.987,54	100,00%
8	RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMP. DE PLATO	M3	80,46	L934,45	L75.185,85	28,17	L26.323,46	52,29	L48.862,39	80,46	L75.185,85	100,00%
9	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	85,25	L188,65	L16.082,41	85,25	L16.082,41	0,00	L0,00	85,25	L16.082,41	100,00%
	SUB TOTAL				L338.160,35		L337.980,09		L180,26		L338.160,35	100,00%
	SUB TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS				L375.138,78		L374.958,52		L180,26		L375.138,78	100,00%
	MONTO TOTAL				L2.588.041,42		L2.196.410,33		L391.631,09		L2.588.041,42	100,00%

ESTIMACION # 4	L391.631,09
MENOS 15% DE ANTICIPO	L0,00
MENOS 5% CALIDAD DE OBRA	L19.581,55
NETO A PAGAR	L372.049,53

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad, y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

EJECUTOR		SUPERVISION		ALCALDE MUNICIPAL CANE		TECNICO MUNICIPAL	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE: ING. WALTER DAVID GUZMAN		NOMBRE: ING. NAHUM ORTEGA		NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO		NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ	
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023		FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023		FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023		FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	



INFORME CUARTA ESTIMACION

Cane, La Paz 30/11/2023

ING. NAHUM ORTEGA
SUPERVISOR MANSUCOPA
CANE, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Informe de primera estimación:

"PROYECTO EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA."

MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.

Estimado Supervisor.:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como contratista del proyecto **EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA."** me permito entregar el INFORME DE LA CUARTA ESTIMACION, comprendido del periodo de 18 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2023.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

ING. WALTER DAVID GUZMAN
CONTRATISTA

RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.		
NOMBRE DEL PROYECTO:		"PROYECTO EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA."

INFORME CUARTA ESTIMACION

UBICACIÓN:		MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:		Empedrado de calles ancho 6 ml en calle de acceso a Miraflores "zona productiva" requiere de una conformación para darle forma a la calle utilizando la motoniveladora, agua, vibro, piedra, cemento. Este trabajo consistirá en la construcción de una calle enchape de mampostería con un ancho neto de 6.00 mts tipo. y espesor de 15 cms, conformada por piedras ripió unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4. Se trabajó en una alcantarilla tipo RIB LOC de 36 de un ancho de 20 metros por 6 de largo. Consiste en excavación, cama de arena, instalación de tubería, estructura de mampostería, relleno de material de sitio, acarreo de material desperdicio.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, ALCALDIA DE CANE

INVERSION DEL PROYECTO:

CONCEPTO	MONTO DEL CONTRATO EMPRESA EJECUTORA + ADEMIDA	MUNICIPALIDAD	TOTAL
COSTO DEL PROYECTO	L. 2, 588,041.42	L. 2, 588,041.42	L. 2, 588,041.42
COSTO TOTAL DE LA OBRA			L. 2, 588,041.42

1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CONGUSA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER DAVID GUZMAN

INFORME CUARTA ESTIMACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE CANE
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATANTE	LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
SUPERVISION	ING. NAHUM ORTEGA
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	03 de Julio del 2023
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	12 de Julio 2023
FECHA DE ORDEN DE INICIO	06 de julio 2023
PLAZO CONTRACTUAL	90 días calendario
AMPLIACION	45 días
FECHA DE FINALIZACION	30 noviembre 2023.

1.3 -RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN	Acumulado Anterior	Pagar
MONTO ESTIMADO	L. 2,196,410.33	L 391,631.09
Anticipo	L. 328,472.73	L 0.00
Retención por I.S.R.	L. 0.00	L 0.00
Retención 5% por Calidad de Obra	L. 109,820.52	L 19,581.55
Retención por Multa		L -
Neto a Pagar	L. 1,758,117.08	L 372,049.53

INFORME CUARTA ESTIMACION

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

EJECUCION:

Se presenta el informe de Cuarta estimación sobre los trabajos realizados por el contratista Walter David Guzmán, representante legal de la empresa CONGUSA donde los trabajos ha presentado un avance físico y avance financiero en el periodo del 100.00%, en base a lo contratado, en tal sentido para esta fecha las actividades ejecutadas corresponden a, **"empedrado de calle ancho 6ml**, los trabajos se realizaron en un periodo de 13 días calendario.

AVANCE DE LOS TRABAJOS:

Las actividades que se han realizados son las actividades que la Alcaldía Municipal autorizó.

PERSONAL TRABAJANDO Y MAQUINARIA EN SITIO:

El desarrollo del proyecto se cuenta con personal permanente altamente calificado

1. Ing. Walter David Guzmán (Ing, residente, contratista)
2. **Jornaleros**
3. **Maestro de obra**
4. **Bueyeros**
5. **Conductor de camión**

EQUIPO EN SITIO

1. Mezcladora
2. Camión
3. Carretas de bueyes

CONCLUSIONES.





1. El proyecto presenta un avance acumulado del 100.00%.
2. El proyecto presenta un avance físico del periodo de un 15.13%
3. Al momento se realizaron las actividades presentadas, las cuales se desarrollaron y culminaron a satisfacción del contratante.
4. Resumen del avance financiero conforme a las estimaciones y retenciones del proyecto antes mencionado

Retenciones	Monto Lps.	%
Pago Contratado	2,588,041.42	100.00
Deducción 5%	129,402.07	100.00
15% de anticipo	328,472.73	100.00





FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

INFORME CUARTA ESTIMACION

Empedrado de calle

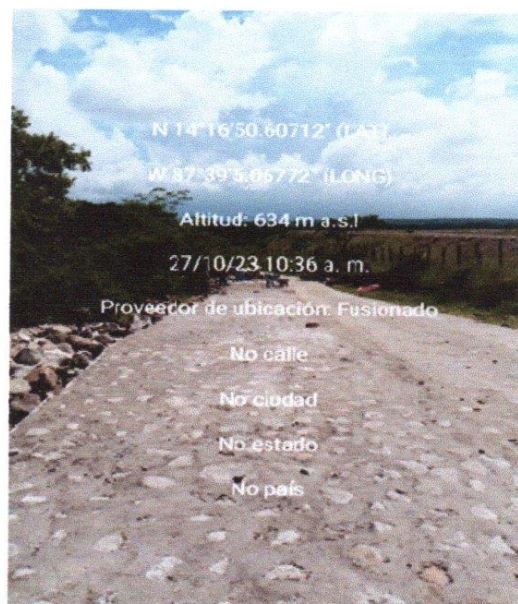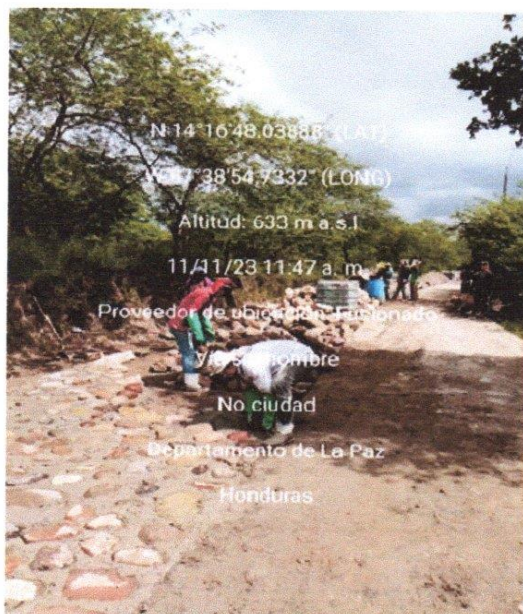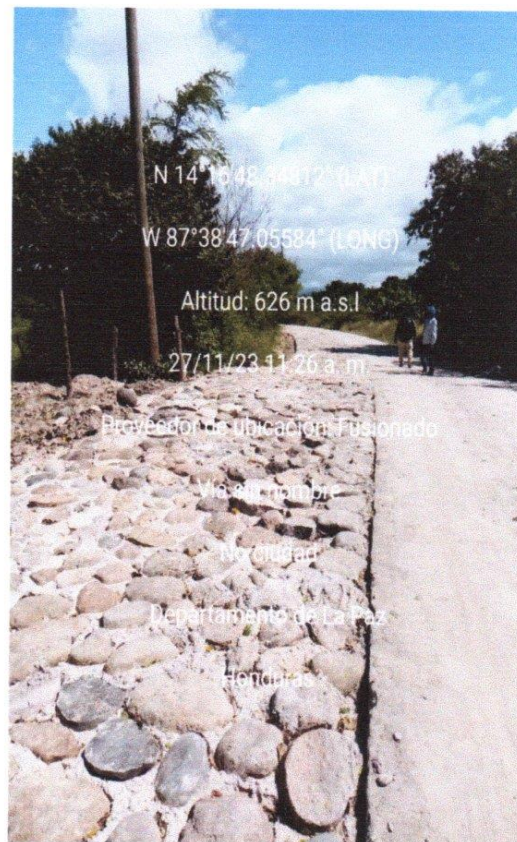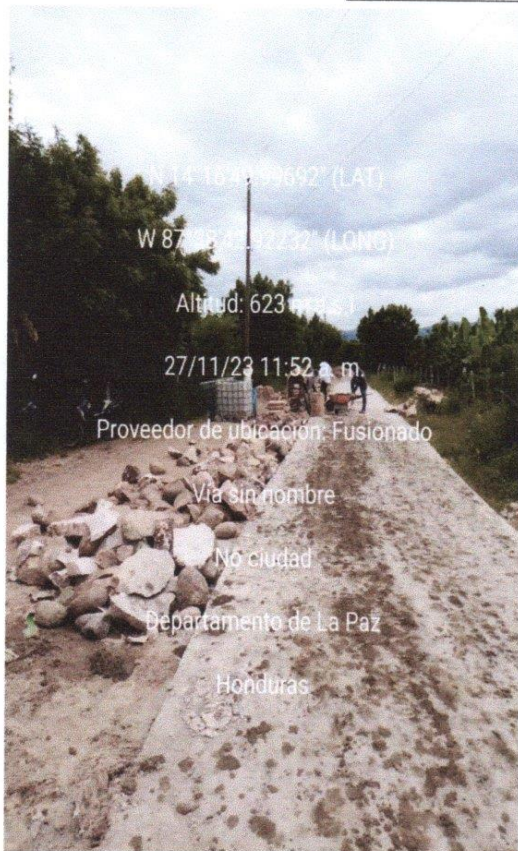

INFORME CUARTA ESTIMACION

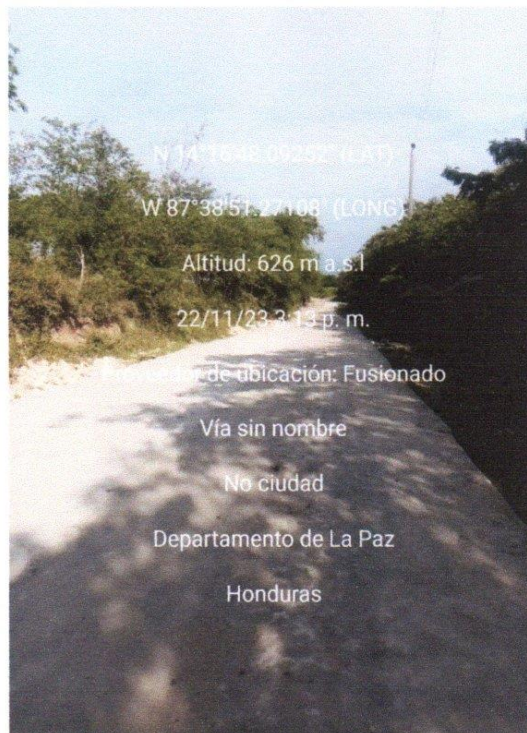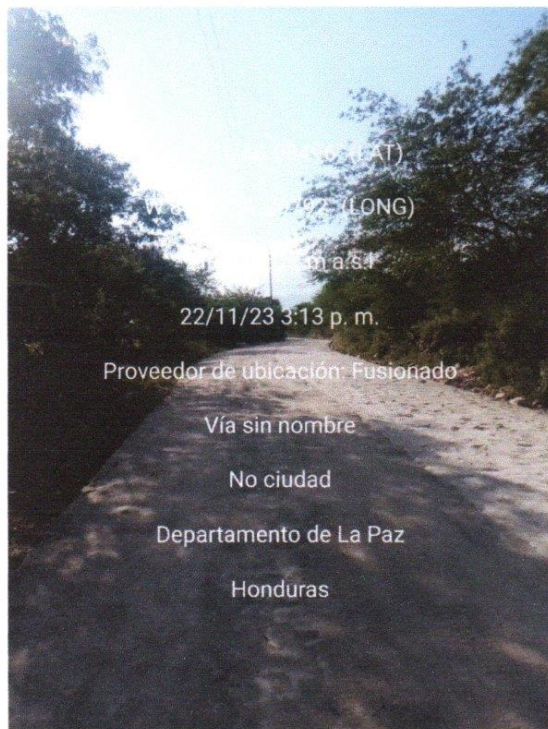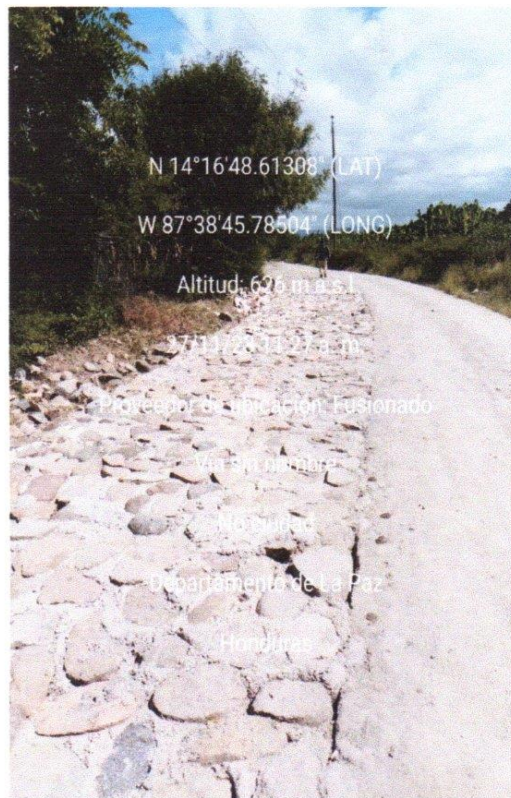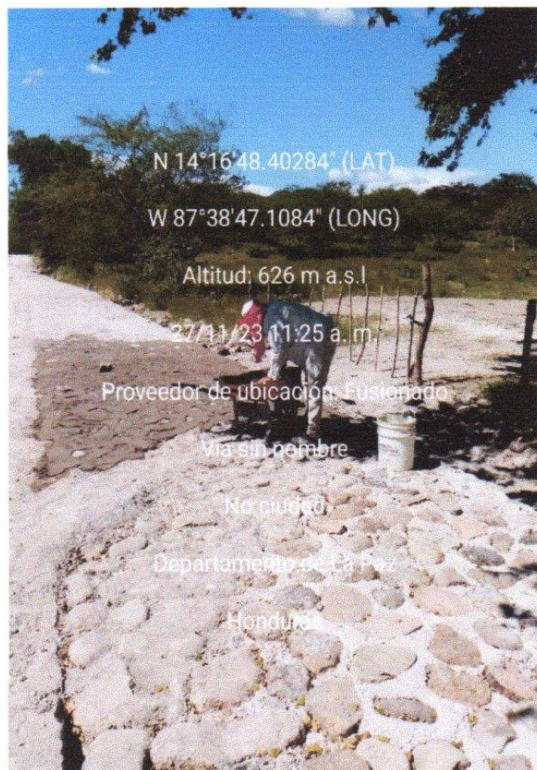



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2023

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 16510

L.: 526,600.81

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 12839

Fecha de Emision: 17/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

Id/RTN: 1204198200038

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de la Segunda Estimación del Proyecto, Empedrado de Calle a Miraflores Ancho 6 ML Zona Productiva del municipio de Cane, La Paz. por L. 526,600.81, por fondos se están ejecutando un monto de L. 86,645.42 y del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos el monto es de L. 439,955.39

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 004 000 001 47210 11-011-06	Proyecto Empedrado de Calle hacia Miraflores ancho 6 ML, zona Productiva	439,955.39
14 02 004 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento Y Reparación De Carreteras Hacia A San Sebastián, La Partidas, Miraflores Y Hacia Humuya.	86,645.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	Transferencias para Proyecto Empedrado de calle hacia Miraflores, Zona Productiva,	439,955.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	86,645.42
Monto Total:		526,600.81



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2023

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	526,600.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	526,600.81

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Walter David Guzman Salinas
1204-1982-00038

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94li6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFi5vuiTsLT2YmLkeUX6fPu4nqgXjIKYLq70vuEnDvHctnCKIwMadp8R
xapLzgZD1XGt6l8Qj8bBg==



La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!

ESTIMACION DE OBRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

PROYECTO: EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA

UBICACIÓN: CASCO URBANO CANE, LA PAZ

EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

ESTIMACION: 3

PERIODO DEL: 20/09/2023

HASTA

17/11/2023

58

DIAS




No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJEC. EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		% AVANCE
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1	EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6 M	M.L	936.40	L2,190.05	L2050,762.82	468.20	L1025,381.41	300.00	L657,015.00	768.20	L1682,396.41	82.04%
2	EXCAVACION Y CONFORMACION	M2	5618.40	L24.75	L139,055.40	5618.40	L139,055.40	0.00	L0.00	5618.40	L139,055.40	100.00%
	SUB TOTAL				L2189,818.22		L1164,436.81		L657,015.00		L1821,451.81	83.18%
	ACTIVIDADES NUEVAS											
	EMPEDRADO DE CALLES											
3	TRAZADO Y MARCADO	ML	936.40	L39.49	L36,978.44	936.40	L36,978.44	0.00	L0.00	936.40	L36,978.44	100.00%
	SUB TOTAL				L36,978.44		L36,978.44		L0.00		L36,978.44	100.00%
	ALCANTARRILLA RIB LOC DE 36"											
4	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO 1	M3	65.58	L243.21	L15,949.71	65.58	L15,949.71	0.00	L0.00	65.58	L15,949.71	100.00%
5	CAMA DE ARENA COMPACTADA E= 5CMS	M3	3.95	L917.90	L3,625.71	3.95	L3,625.71	0.00	L0.00	3.95	L3,625.71	100.00%
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO RIB LOC DE 36"	M.L	24.00	L11,499.95	L275,998.80	24.00	L275,998.80	0.00	L0.00	24.00	L275,998.80	100.00%
7	ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA	M3	6.590	L3,530.30	L23,264.68	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00	L0.00	0.00%
8	RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMP. DE PLATO	M3	28.17	L934.45	L26,323.46	28.17	L26,323.46	0.00	L0.00	28.17	L26,323.46	100.00%
9	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	85.25	L188.65	L16,082.41	85.25	L16,082.41	0.00	L0.00	85.25	L16,082.41	100.00%
	SUB TOTAL				L361,244.76		L337,980.09		L0.00		L337,980.09	93.56%
	SUB TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS				L398,223.20		L374,958.52		L0.00		L374,958.52	94.16%
	MONTO TOTAL				L2588,041.42		L1539,395.33		L657,015.00		L2196,410.33	84.87%

ESTIMACION # 3	L657,015.00
MENOS 15% DE ANTICIPO	L97,563.44
MENOS 5% CALIDAD DE OBRA	L32,850.75
NETO A PAGAR	L526,600.81

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor



EJECUTOR FIRMA: 	SUPERVISOR FIRMA: 	ALCALDE MUNICIPAL CANE FIRMA: 	TECNICO MUNICIPAL FIRMA: 
NOMBRE: ING. WALTER DAVID GUZMAN FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023	NOMBRE: ING. NAHUN ORTEGA FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023	NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023	NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 26 Sept / 2023

Nº


El día de hoy se procede a sacar la tubería Rib Loc de 36" ya que los niveles quedaron muy bajos por lo que el agua se queda estancada y no hay paso de ella mismo.



28/ sept / 2023.

Se instaló la tubería Tipo Rib Loc 36". Se instaló 10ml y no los 24ml porque no cabían en el espacio ya que hay un poste de luz que está en un extremo y en el otro extremo el dueño de la propiedad Alex Martinez no dio paso para dragado y colocación de la ola 3ml. de alcantarilla.

La alcantarilla quedó 9cm arriba del nivel de Terreno natural, con todo y relleno con material selecto, 80.40 m³ con Recubrimiento de Tubería de 30cm con Selecto para después colocar el anillo.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 3 10/10/2023

N°

Los días del 3-7 de octubre no se
Trabajo por la feria patronal de
Cano y los Trabajadores se pusieron
de acuerdo en no venir.



12/10/2023

Se Trabajo en mampostería de alcantarilla
en un total de 12.46 m³.

12/10/2023

Se Trabajo en enpedrado en la parte de
la alcantarilla que son 26 m² con
ancho de 3 m de Trocha. y También
se coloca enpedrado en la 1^a alcantarilla
Estación 0+240.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA 26 Oct / 2023

N°

Se trabaja empeludo de calle en la
Segunda Trocha encontramos en la estación
0+130

1/Nov/2023

Los días 30 Oct - 31 Oct y 1 Nov no se
trabaja por paro de vapor y dejando
intereses nuevos.

10/Nov/2023

Se trabaja en empeludo de calle con
ancho de Trocha de 3mt. de a trabajado
may poco los días lunes 6, Martes 7, Miércoles 8
a estado haciendo nos encontramos en la
estación 0+415

17/Nov/2023

Se continúan con el empeludo de calle
con ancho de 3mts. el día de hoy
se presenta la 3ª Estimación con %
de avance de 84.87% y nos encontra-
mos en la estación 0+600

007614000218

ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00011334

Com, 17/11/2023

Lugar y fecha

Walter David Luzgmon Solmes

L 526,600.87

Péguese a la orden de

Quinientos Ventiseis mil Axcientos con 87/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



Firma(s)



⑆01001142⑆00007614000218⑆00011334

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION

NOMBRE / FORENAME
WALTER DAVID

APELLIDO / SURNAME
GUZMAN SALINAS

FECHA DE NACIMIENTO / DAYS OF BIRTH
03-08-1982

FECHA DE EXPIRACION / DAYS OF EXPIRY
03-08-2031

NUMERO DE IDENTIFICACION / ID NUMBER
1204 1982 00038

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

(Signature)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-86323

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GUZMAN SALINAS WALTER DAVID**

Con Registro Tributario Nacional: **12041982000380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-86323 en fecha 11/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417310012 de fecha 11/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27725033165, presentada el 25/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-86323** o mediante el siguiente código QR:



INFORME TERCERA ESTIMACION

Cane, La Paz 17/11/2023

ING. NAHUM ORTEGA
SUPERVISOR MANSUCOPA
CANE, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Informe de primera estimación:

"PROYECTO EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA."

MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.

Estimado Supervisor.:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como contratista del proyecto **EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA."** me permito entregar el INFORME DE LA TERCERA ESTIMACION, comprendido del periodo de 20 de Septiembre al 17 de noviembre del 2023.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

ING. WALTER DAVID GUZMAN
CONTRATISTA

RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.		
NOMBRE DEL PROYECTO:		"PROYECTO EMPEDRADO DE CALLE A MIRAFLORES ANCHO 6 ML ZONA PRODUCTIVA."

INFORME TERCERA ESTIMACION

UBICACIÓN:		MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.	
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:		Empedrado de calles ancho 6 ml en calle de acceso a Miraflores "zona productiva" requiere de una conformación para darle forma a la calle utilizando la motoniveladora, agua, vibro, piedra, cemento. Este trabajo consistirá en la construcción de una calle enchape de mampostería con un ancho neto de 6.00 mts tipo. y espesor de 15 cms, conformada por piedras ripió unidas con mortero de cemento en una proporción 1:4. Se trabajó en una alcantarilla tipo RIB LOC de 36 de un ancho de 20 metros por 6 de largo. Consiste en excavación, cama de arena, instalación de tubería, estructura de mampostería, relleno de material de sitio, acarreo de material desperdicio.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, ALCALDIA DE CANE	
INVERSION DEL PROYECTO:			
CONCEPTO	MONTO DEL CONTRATO EMPRESA EJECUTORA + ADEMIDA	MUNICIPALIDAD	TOTAL
COSTO DEL PROYECTO	L. 2, 588,041.42	L. 2, 588,041.42	L. 2, 588,041.42
COSTO TOTAL DE LA OBRA			L. 2, 588,041.42

1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA CONGUSA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER DAVID GUZMAN

INFORME TERCERA ESTIMACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE CANE
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATANTE	LIC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
SUPERVISION	ING. NAHUM ORTEGA
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	03 de Julio del 2023
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	12 de Julio 2023
FECHA DE ORDEN DE INICIO	06 de julio 2023
PLAZO CONTRACTUAL	90 días calendario
AMPLIACION	60 días
FECHA DE FINALIZACION	30 noviembre 2023.

1.3 -RESUMEN FINACIERO DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN	Acumulado Anterior	Pagar
MONTO ESTIMADO	L. 1539,395.33	L 657,015.00
Anticipo	L. 230,909.29	L 97,563.44
Retención por I.S.R.	L. 0.00	L 0.00
Retención 5% por Calidad de Obra	L. 76,969.76	L 32,850.75
Retención por Multa		L -
Neto a Pagar	L. 1,231,516.28	L 526,600.81

INFORME TERCERA ESTIMACION

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

EJECUCION:

Se presenta el informe de tercera estimación sobre los trabajos realizados por el contratista Walter David Guzmán, representante legal de la empresa CONGUSA donde los trabajos ha presentado un avance físico y avance financiero en el periodo del 84.87%, en base a lo contratado, en tal sentido para esta fecha las actividades ejecutadas corresponden a, **"empedrado de calle ancho 6ml, instalación de alcantarilla tipo RIB LOC"**, los trabajos se realizaron en un periodo de 58 días calendario.

AVANCE DE LOS TRABAJOS:

Las actividades que se han realizados son las actividades que la Alcaldía Municipal autorizó.

PERSONAL TRABAJANDO Y MAQUINARIA EN SITIO:

El desarrollo del proyecto se cuenta con personal permanente altamente calificado

1. Ing. Walter David Guzmán (ing, residente, contratista)
2. Jornaleros
3. Maestro de obra
4. Bueyeros
5. Conductor de camión

EQUIPO EN SITIO

1. Mezcladora
2. Camión
3. Carretas de bueyes

CONCLUSIONES.




1. El proyecto presenta un avance acumulado del 59.48%.
2. El proyecto presenta un avance físico del periodo de un 25.39%
3. Al momento se realizaron las actividades presentadas, las cuales se desarrollaron y culminaron a satisfacción del contratante.
4. Resumen del avance financiero conforme a las estimaciones y retenciones del proyecto antes mencionado

Retenciones	Monto Lps.	%
Pago Contratado	2,196,410.33	84.87
Deducción 5%	109,820.52	84.87
15% de anticipo	328,472.73	100.00





FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

INFORME TERCERA ESTIMACION




Empedrado de calle con 6 metros de ancho

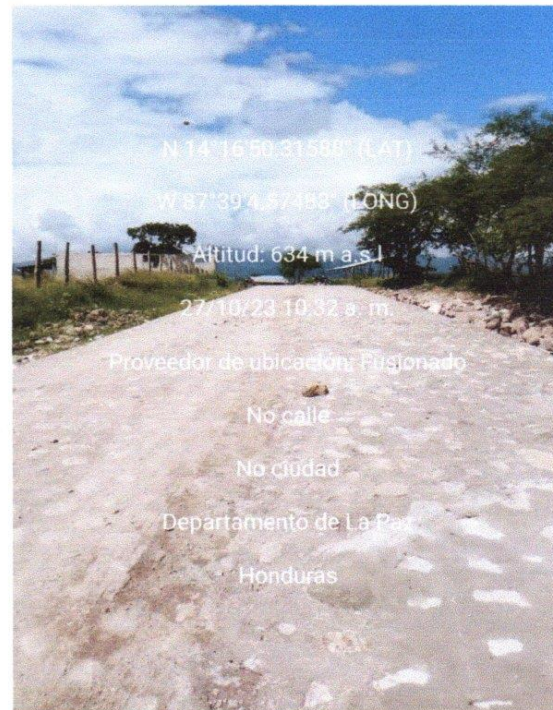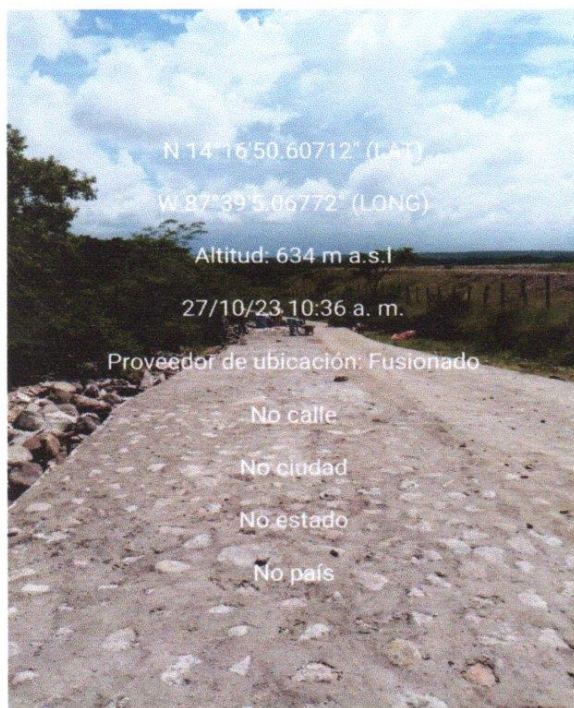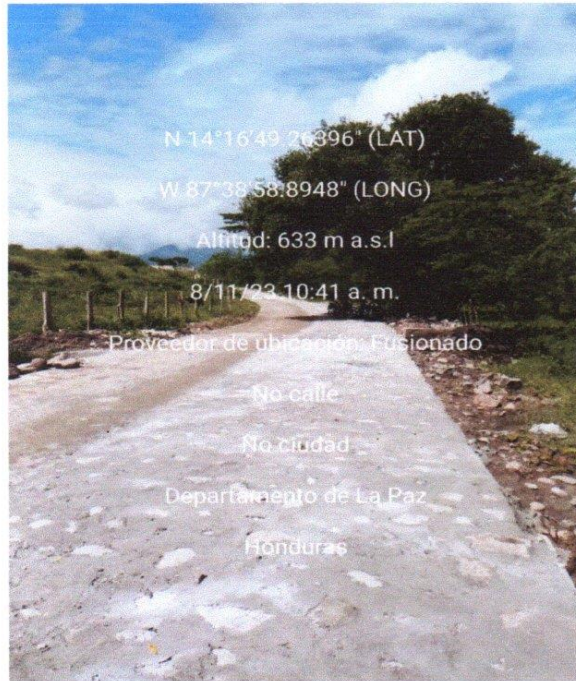

INFORME TERCERA ESTIMACION

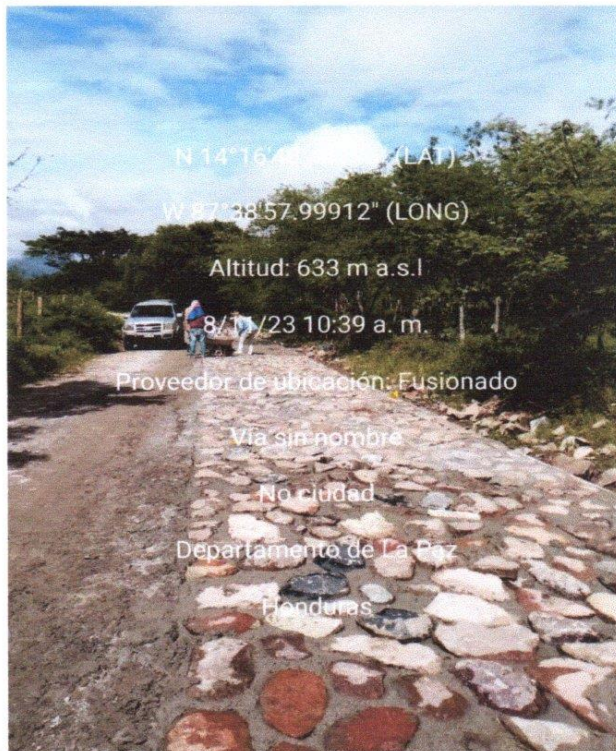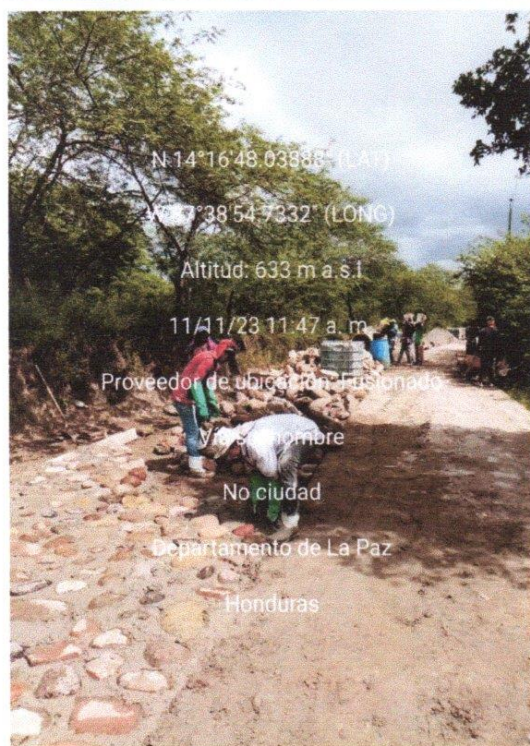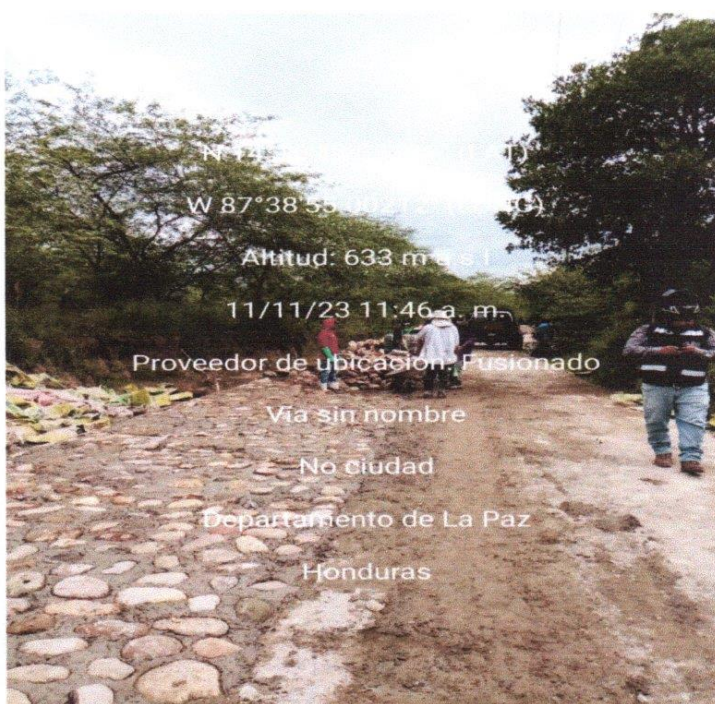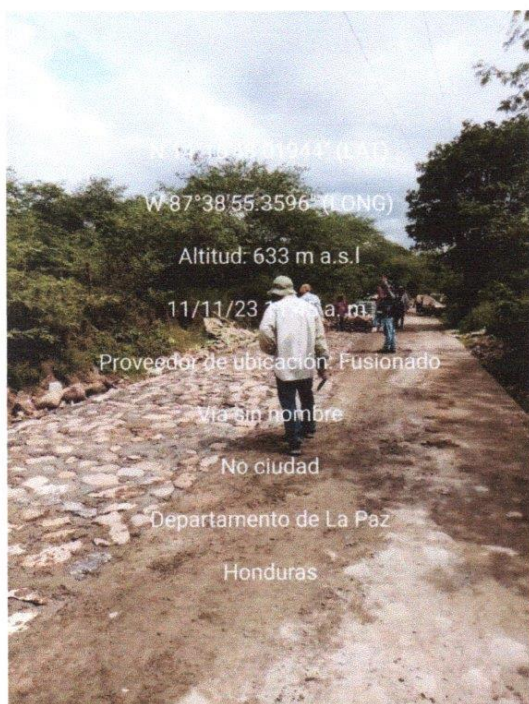

INFORME TERCERA ESTIMACION

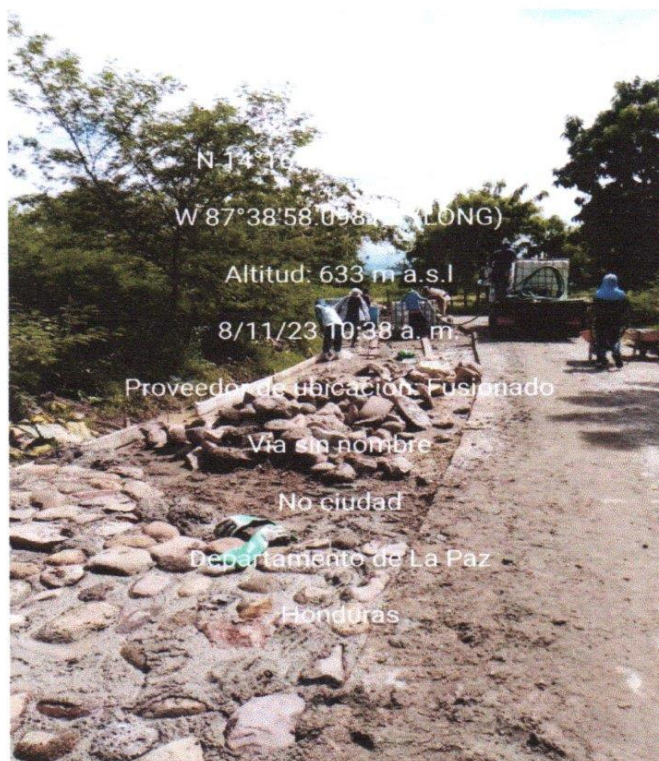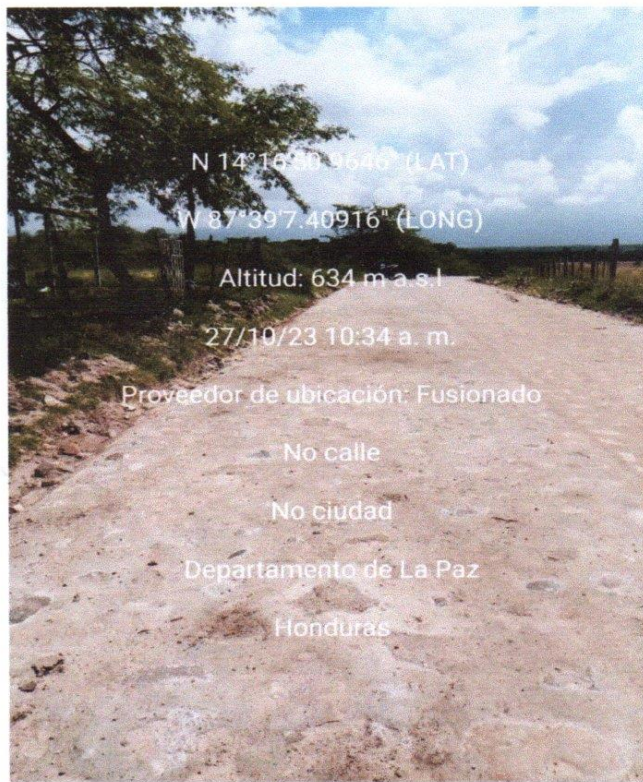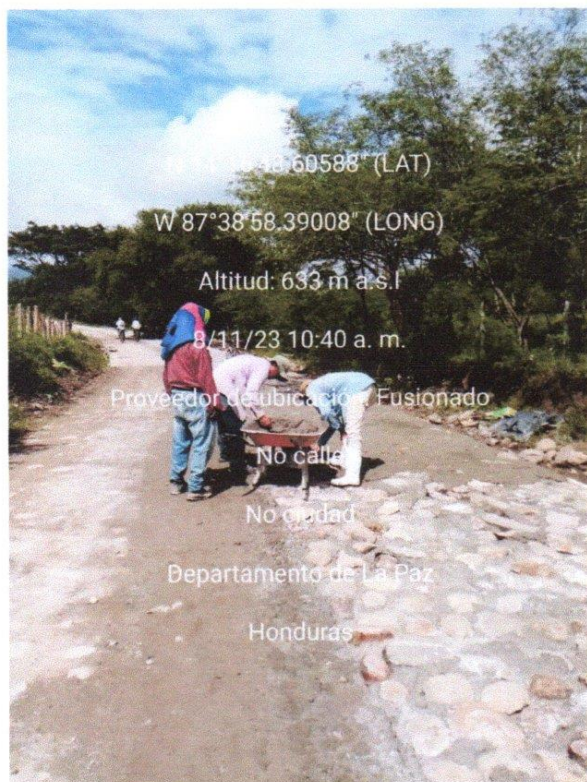

INFORME TERCERA ESTIMACION

