



**ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ**  
**UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL**

**“INFORME”**

**Informe De Supervisión**

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA**  
**“POLICARPO BONILLA”**

**Contratista:**  
**INGENIUM S. DE R.L.**

**Alcalde Municipal**  
**Señor. Erlin Omar Rodríguez Ramos**

**Aguanqueterique La Paz, viernes 01 de diciembre de 2023**



**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**



Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos  
Alcalde Municipal

Aguanqueterique, La Paz 01 de diciembre de 2023

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA "POLICARPO BONILLA"; UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO;**

Según las actividades contratadas esta ejecutadas al cien por ciento en su totalidad.

Por lo tanto, se puede proceder con el trámite de pago de tercer y última estimación por un valor de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN LEMPTRAS CON 13/100 (L.166,601.13.).**

**A Favor de INGENIUM S. DE R.L.** Representada legalmente por la representación legal de la ing. Yessica del Socorro Medina.

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.

  
Abner Israel Perdomo Medina  
Técnico Municipal de Proyectos





**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**



Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Departamento de Tesorería Municipal

Aguanqueterique, La Paz, 01 de diciembre de 2023

Reciban un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA "POLICARPO BONILLA"; UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO;**

Según las actividades contratadas esta ejecutadas al cien por ciento en su totalidad.

Por lo tanto, se puede proceder con el trámite de liquidación de pago de tercer y última estimación por un valor de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON 13/100 (L.166,601.13.).**

**A Favor de INGENIUM S. DE R.L.** Representada legalmente por la representación legal de la ing. Yessica del Socorro Medina.

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo municipal.

  
  
**Erlin Omar Rodríguez Ramos**  
Alcalde Municipal



## ANTECEDENTES

El Municipio de Aguanqueterique La Paz, se encuentra ubicado en la zona baja del canal seco.

Aguanqueterique, siendo un municipio que cuenta con una proyección grande en nivel educativo;

A través de las gestiones comunitarias de los beneficiarios de los centros educativos se ha visto la necesidad de proporcionar un espacio físico óptimo para el aprendizaje con el apoyo financiero de la alcaldía municipal de Aguanqueterique.

## RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

**Nombre: Construcción de edificio de Escuela “Policarpo Bonilla”**

**Ubicación: Comunidad de El Espino**

**Comunidad Solicitante:** miembros de patronato y del comité coordinador para solicitar dicho proyecto.

**Duración:** 120 Días.

**Situación Actual del Proyecto:** Ejecutado en su totalidad al 100% de actividades contratadas

**Costo Total del Proyecto Presupuestado: L. 748,627.20**

**Monto Solicitado por esta estimación: L. 166,601.13**

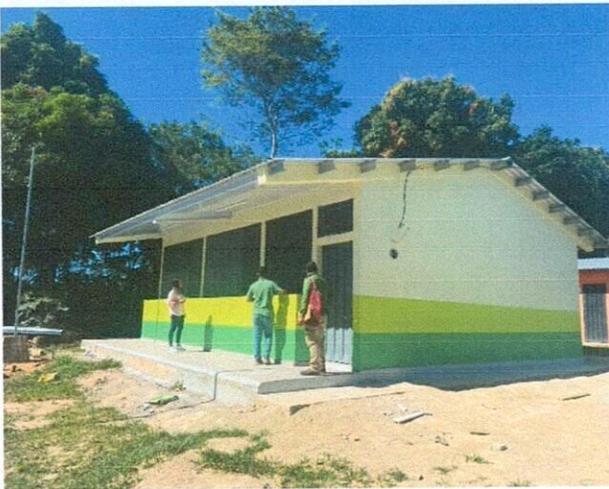
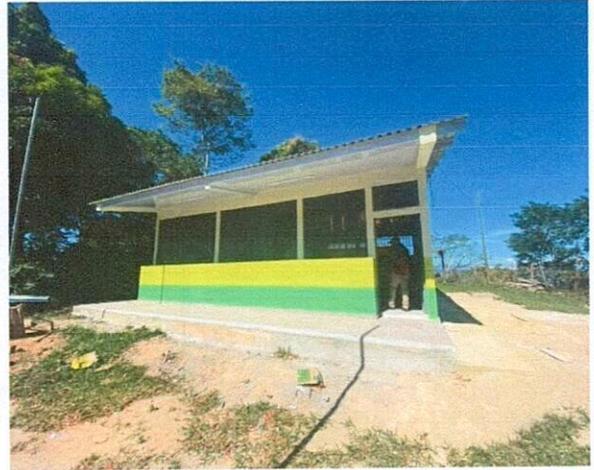
**Fuente Financiera:** Municipalidad de Aguanqueterique

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto está ejecución al 100 % y presenta muy buena calidad de obra, por lo que se adjunta el cuadro de estimación para observación.
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se recomienda a la comunidad hacer vigilancia para evitar pérdidas y daños a las obras previo la recepción por parte de la alcaldía.
- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y presentar las mejores condiciones del centro educativo.



**MATERIAL FOTOGRAFICO**





MATERIAL FOTOGRAFICO





## CONSTANCIA SM-2024-4120

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....CONSTRUCTORA INGENIUM, S. DE R.L.  
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 04 TOMO: 04 DEP: LA PAZ  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....1201198500481  
R.T.N.....08019018064932  
REPRESENTANTE LEGAL.....YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: PARA TRAMITES DE PAGOS Y LICITACIONES PARA PRESENTARSE ANTE: SEGUN MANIFIESTO ADJUNTO

### OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero del 2024

ABG. KAREN ROSIBEL FUNEZ FLORES  
SECRETARIA GENERAL POR LEY  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 11/02/2019

RTN: 08019018064932

CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3123418

Transacción: 3DD2BC



República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

**RTN: 12011985004816**

**YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS**  
 Nombre o Razon Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestatista	

Fecha de Emisión: 20110209

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 Sublicado el 18 de Enero de 1973

*[Handwritten Signature]*



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 584515

Transacción: BB7B4A





## Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

### Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2451-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 27/10/2021 12:54:43 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Cristian Emilio -Castillo Mateo, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 25228 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2451-2022 en el área de actividad relativa a Consultoría, Obras . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.** Con **R.T.N. 08019018064932** y con domicilio en la Ciudad de La Paz, Departamento de La Paz y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integral de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 24 enero 2022, 16:13

Válido por 1095 días.

Código  
Verificación:



Código de Verificación:

**341a7e10-e26f-46e2-a00d-ccd6fffd6542**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	<b>CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>
No. de Resolución	<b>2451-2022</b>
No. de Certificación	<b>2451</b>
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	<b>24/01/2025</b>
Área de Actividad	<b>Consultoria,Obras</b>
Rubro	<b>Supervisión de proyectos, obras y construcción.</b>
Registro Tributario Numérico	<b>08019018064932</b>
Certificación del Órgano Societario	<b>Yessica del Socorro Medina Claros , Rody Emiro Medina Claros , Diana Waldina Medina Claros</b>
Domicilio Legal	<b>Honduras, La Paz, La Paz</b>
Dirección	<b>Boulevard, La merced.</b>
Teléfono	<b>27742008</b>
Correo Electrónico	<b>constructoraingenium@hotmail.com</b>

Fecha de Emisión: 24 enero 2022, 16:13

Válido por 1095 días.

Código  
Verificación:



Código de Verificación:

**341a7e10-e26f-46e2-a00d-ccd6fffd6542**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



**TERCERO:** La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE. DIRECTOR POR LEY de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE  
DIRECTOR POR LEY**

CC.DALD

**Verificar en:**

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

---

Fecha de Emisión: 24 enero 2022, 16:13

Válido por 1095 días.

Código  
Verificación:



---

Código de Verificación:

**341a7e10-e26f-46e2-a00d-ccd6fffd6542**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-10212

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019018064932**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-10212 en fecha 16/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418595946 de fecha 16/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744284432, presentada el 13/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-10212** o mediante el siguiente código QR:





# Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

## CONSTANCIA

N° 104416

N° 2023 - 1

El Suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) hace constar que:

**YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS**

Se encuentra debidamente inscrito y activo en éste colegio como


**INGENIERA CIVIL**

bajo el N° CICH.

**5028**


encontrándose a la fecha solvente con sus obligaciones correspondientes; y de acuerdo a nuestro registro está facultado para ejercer su profesión.

**TEGUCIGALPA M.D.C. 13 de noviembre de 2023**

  
**SECRETARIO GENERAL**



MCRUZ



# Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

## CONSTANCIA

No. 2023 - 1

El suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH)+  
hace constar que la firma

**CONSTRUCTORA INGENIUM, S.DE R.L.**

se encuentra debidamente registrada en este colegio bajo el No. 2322-1-N-CT/CS ;  
y de acuerdo a dicho registro está autorizada para realizar trabajos de  
**CONSTRUCCION Y CONSULTORIA** siendo representada por el Ingeniero

**YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS**

No. CICH 5028

encontrándose a la fecha, tanto la firma como el representante, solventes con sus  
obligaciones correspondientes.

En consecuencia la firma

**CONSTRUCTORA INGENIUM, S.DE R.L.**

está facultada por la presente para participar en

**PROCESO DE LICITACION NO.UNACIFOR-LP-GCUE09-2023-01**

Este colegio se permite aclarar que ninguna otra firma que tenga intereses  
comunes con **CONSTRUCTORA INGENIUM, S.DE R.L.**

podrá intervenir en forma separada en **Licitaciones** en que ésta participe,  
a menos que entren conjuntamente.

Tegucigalpa, M. D. C., 13 de noviembre del 2023

MCRUZ

SECRETARIO GENERAL





Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 05:47 p.m.

USUARIO: ALEX.MAMZANARES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5034

L.: 166,601.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1173

Fecha de Emision: 7/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019018064932

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A ESTIMACION FINAL (NO.3) AL PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.  
POR LA CANTIDAD DE L.166,601.13

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 006 000 001 47110 11-001-01	Construcion de edificio de la Escuela Policarpo Bonilla en la Comunidad de el Espino	166,601.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	166,601.13
<b>Monto Total:</b>		<b>166,601.13</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		166,601.13
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>166,601.13</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Yesica del Socorro Medina  
Identidad No.: 1201198500481

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdji7HFOxAOKnylkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOld6luYkoHGdeCb6B+ItnJC/P2Vsihiq8PI1yiCJD9QtVYbdj+I10ct03/otx4F28v6Akt1  
Q22RN3pZOEIGD6bMDPwofr6NvBBTQUaTp8ew=





## ACTA DE RECEPCION FINAL


### **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA POLICARPO BONILLA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**


Los suscritos, El Alcalde Municipal **Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos**, en representación del Municipio de Aguanqueterique, Departamento de La Paz y como ejecutor representante a la **Sra. Yessica Del Socorro Medina Claros**, reunidos en el sitio del proyecto el día 15 de diciembre del año 2023 y habiendo realizado el recorrido del sitio y encontrado aceptable en todos los aspectos del proyecto denominado **“CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA POLICARPO BONILLA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ”** a fin de realizar una inspección final de la obra ejecutada en el mismo **HACEMOS CONSTAR QUE:** Los trabajos ejecutados por la **empresa constructora INGENIUM S DE R.L.** según contrato suscrito a los 27 días del mes de julio del año 2023, con un monto del contrato final **SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.748,627.20).**

Dichas actividades contratadas están ejecutadas a un 100% de su totalidad.

En fe de lo anterior firmamos la presente **ACTA DE RECEPCION FINAL** y **ACEPTACION** del proyecto: **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA POLICARPO BONILLA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**


en el Municipio de Aguanqueterique, Departamento de La Paz, a los 29 días del mes de noviembre del año 2023.

  
  
**Darwin Ulice Chávez**  
Supervisión UTI MAMSON

  
  
**Yessica Del Socorro Medina Claros**  
Gerente General INGENIUM S DE R.L.

  
  
**Erlin Omar Rodríguez Ramos**  
Alcalde Municipal

**CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA POLICARPO BONILLA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ**



# FIANZA BUENA CALIDAD DE OBRA

No. FB 240051

**VIGENCIA:**

DESDE: 29 DE NOVIEMBRE DE 2023

HASTA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

**SUMA AFIANZADA HASTA:**

L. 35,691.81 (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 81/100)

**AFIANZADO:**

CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.

**BENEFICIARIO:**

MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.

**COBERTURA:** Para garantizar la buena calidad del Proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ESCUELA POLICARPO BONILLA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ".

Cláusula especial: La compañía de seguros, se obliga a reponer, reparar o pagar hasta la cantidad establecida en esta garantía, a prorrata, a solicitud del beneficiario, acompañada de un certificado que indique y compruebe el incumplimiento contractual, con los soportes técnicos, administrativos y legales correspondientes.

Tegucigalpa, M. D. C., 29 de noviembre de 2023.

FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

## ORDEN DE CAMBIO # 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA


POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO

PROYECTO:  
CODIGO:  
UBICACION:  
EJECUTOR:  
ORDEN DE CAMBIO:  
PERIODO DEL:

AGUANQ-06-2023  
EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ  
CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R. L.  
NUMERO UNO  
09/09/2023

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO ORIGINAL			ORDEN DE CAMBIO			CONTRATO ORIGINAL + ORDEN DE CAMBIO		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	47.00	L 30.29	L 1,423.63				47.00	L 30.29	L 1,423.63
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	16.47	L 355.95	L 5,862.50				16.47	L 355.95	L 5,862.50
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL(INC. ACARREO 20 MTS)	M3	26.40	L 124.30	L 3,281.52				26.40	L 124.30	L 3,281.52
4	ACARREO DE MATERIAL(DESPERDICIOS)	M3	53.59	L 180.33	L 9,663.88				53.59	L 180.33	L 9,663.88
5	RELLENO COMP.CON MATERIAL SELECTO (IN.ACARREO)	M3	16.34	L 664.73	L 10,861.69				16.34	L 664.73	L 10,861.69
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4Nu3, Nu2 @ 20 cm	UNID	13.00	L 704.78	L 9,162.14				13.00	L 704.78	L 9,162.14
7	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA ARENA	M3	14.85	L 1,842.53	L 27,361.57				14.85	L 1,842.53	L 27,361.57
8	SOLERA DE 20 X 20 , 4No.3 y No. 2 @ 15 cm, CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 439.73	L 14,950.82				34.00	L 439.73	L 14,950.82
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 8 CM	M.L	12.55	L 136.28	L 1,710.31				12.55	L 136.28	L 1,710.31
10	SOLERA DE 15 X 15, 3#3, 2#@ 15 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	10.50	L 243.34	L 2,555.07				10.50	L 243.34	L 2,555.07
11	CASTILLO 15 X 15 4 # 3, Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L	38.60	L 364.33	L 14,063.14				38.60	L 364.33	L 14,063.14
12	CASTILLO 15 X 15, 3 No.3 y No2 @ 20 , CONCRETO 1:2:2	M.L	8.64	L 304.75	L 2,633.04				8.64	L 304.75	L 2,633.04
13	LOSA DE LIBRERO 0.6 X 0.1 MTS (PULIDA)	M.L	8.00	L 643.33	L 5,146.64				8.00	L 643.33	L 5,146.64
14	LIBRERO EMPOTRADO KINDER	UNID	1.00	L 19,850.57	L 19,850.57				1.00	L 19,850.57	L 19,850.57
15	SOLERA 15 X 20 4Nu3 Y Nu2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 368.93	L 12,543.62				34.00	L 368.93	L 12,543.62
16	SOLERA 20 X 25, 4#3, 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L	22.84	L 677.58	L 15,475.93				22.84	L 677.58	L 15,475.93
17	CARGADOR DE 10 X 15 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L	1.15	L 277.12	L 318.69				1.15	L 277.12	L 318.69
18	BATIENTE DE 10 X 20 CM, 2#3; #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	8.55	L 234.98	L 2,009.08				8.55	L 234.98	L 2,009.08
19	PARED DE BLOQUE SIMPLÉ SISADO 15(INHABILITADA)	M2	73.77	L 730.08	L 53,858.00				73.77	L 730.08	L 53,858.00
20	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	21.38	L 1,445.33	L 30,901.16	-21.38	L 1,445.33	-L 30,901.16	0.00	L 1,445.33	L -
21	PUERTA METALICA (1X2.10m). TUBO IND.3/4, LAM 1/16	UNID	1.00	L 6,205.29	L 6,205.29				1.00	L 6,205.29	L 6,205.29
22	PISO GRANITO TERRAZO 30 X 30	M2	83.64	L 782.88	L 65,480.08	1.63	L 782.88	L 1,276.09	85.27	L 782.88	L 66,756.18
23	TECHO CANALETA 6", LAM ALUMINIZADA ONDULADA AULA	M2	108.63	L 570.34	L 61,956.03	1.37	L 570.34	L 781.37	110.00	L 570.34	L 62,737.40
24	CIELO FALSO DE PVC CON PERFIL DE ALUMINIO	M2	83.64	L 559.35	L 46,784.03	6.46	L 559.35	L 3,613.40	90.10	L 559.35	L 50,397.44
25	PIZARRA DE FORMICA 2.4 X 1.20(SUM/INST)	UNID	1.00	L 4,751.18	L 4,751.18				1.00	L 4,751.18	L 4,751.18
26	ENTABICADO BLOQUE 30 CM (REPE/PUL)(***)	M.L	17.70	L 503.74	L 8,916.20				17.70	L 503.74	L 8,916.20
27	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	85.77	L 16.46	L 1,411.77				85.77	L 16.46	L 1,411.77
28	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e= 2 CM MORTERO DE 1:4	M2	191.39	L 244.98	L 46,886.72				191.39	L 244.98	L 46,886.72
29	PINTURA DE ACEITE	M2	191.39	L 81.34	L 15,567.66				191.39	L 81.34	L 15,567.66
<b>MODULO DE AULA DE 9 X 8</b>					<b>L 501,591.97</b>			<b>-L 25,230.29</b>			<b>L 476,361.68</b>
30	TRAZADO Y MARCADO	M.L	9.38	L 30.29	L 284.12	20.62	L 30.29	L 624.58	30.00	L 30.29	L 908.70
31	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	10.67	L 355.95	L 3,797.99				10.67	L 355.95	L 3,797.99
32	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM DE CAMA ARENA	M3	8.49	L 1,842.53	L 15,643.08				8.49	L 1,842.53	L 15,643.08
33	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC.M2	M2	11.88	L 879.16	L 10,444.42	-11.88	L 879.16	-L 10,444.42	0.00	L 879.16	L -
34	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	11.49	L 153.49	L 1,763.60				11.49	L 153.49	L 1,763.60
35	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM CODALEADO FINO	M2	86.58	L 484.57	L 41,954.07	-62.19	L 484.57	-L 30,135.41	24.39	L 484.57	L 11,818.66
<b>MODULO DE ACERAS AULAS Y CIRCULACION</b>					<b>L 73,887.28</b>			<b>-L 39,955.25</b>			<b>L 33,932.03</b>
35	INTERRUPTOR DOBLE	UNID	2.00	L 455.34	L 910.68				2.00	L 455.34	L 910.68
37	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	2.00	L 412.97	L 825.94				2.00	L 412.97	L 825.94
38	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)(INHABILITADA)	UNID	1.00	L 3,751.18	L 3,751.18				1.00	L 3,751.18	L 3,751.18

42	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP TUBERIA EMT	M.L	26.00	L 101.10	L 2,628.60	0.00	L -	26.00	L 101.10	L 2,628.60	26.00	L 2,628.60	26.00	L 2,628.60	100%
43	CIRCUITO DE ILUM.HASTA 20 AMP, POLIDUCTO	M.L	15.00	L 69.18	L 1,037.70	0.00	L -	15.00	L 69.18	L 1,037.70	15.00	L 1,037.70	15.00	L 1,037.70	100%
44	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE	M.L	40.00	L 161.78	L 6,471.20		L -	25.00	L 161.78	L 4,044.50	25.00	L 4,044.50	25.00	L 4,044.50	63%
45	SUM/INST DE LUMINARIA DE TECHO LED	UNID	9.00	L 1,984.27	L 17,858.43	0.00	L -	9.00	L 1,984.27	L 17,858.43	9.00	L 17,858.43	9.00	L 17,858.43	100%
<b>MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					<b>L 41,897.29</b>		<b>L -</b>	<b>0.00</b>	<b>L -</b>	<b>L 39,470.59</b>		<b>L 39,470.59</b>		<b>L 39,470.59</b>	<b>94%</b>
46	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UNID	1.00	L 6,479.46	L 6,479.46		L -	1.00	L 6,479.46	L 6,479.46	1.00	L 6,479.46	1.00	L 6,479.46	100%
<b>MODULO DE HASTA</b>					<b>L 6,479.46</b>		<b>L -</b>	<b>0.00</b>	<b>L -</b>	<b>L 6,479.46</b>		<b>L 6,479.46</b>		<b>L 6,479.46</b>	<b>100%</b>
47	SUM/INST DE PLACA DE ALUMINIO 20X24 CON LOGO DE 4X5	UNID						1.00	L 17,174.50	L 17,174.50	1.00	L 17,174.50	1.00	L 17,174.50	100%
48	MOLDURA DE GRANITO	ML						34.39	L 237.89	L 8,181.04	34.39	L 8,181.04	34.39	L 8,181.04	100%
49	VENTANA DE TUBO ESTRUCTURAL Y LAMINA GALV DE 1/8"	M2						21.38	L 1,830.34	L 39,132.67	21.38	L 39,132.67	21.38	L 39,132.67	100%
<b>MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS</b>					<b>L -</b>		<b>L -</b>			<b>L 64,488.21</b>		<b>L 64,488.21</b>		<b>L 64,488.21</b>	<b>100%</b>
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>L 623,856.00</b>		<b>L 481,897.69</b>	<b>0.00</b>		<b>L 620,731.96</b>		<b>L 138,834.27</b>		<b>L 620,731.96</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS 7%</b>					<b>L 43,669.92</b>		<b>L 33,732.84</b>	<b>0.00</b>		<b>L 43,451.24</b>		<b>L 9,718.40</b>		<b>L 43,451.24</b>	<b>100%</b>
<b>UTILIDAD 13%</b>					<b>L 81,101.28</b>		<b>L 62,646.70</b>	<b>0.00</b>		<b>L 80,695.16</b>		<b>L 18,048.46</b>		<b>L 80,695.16</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 748,627.20</b>		<b>L 578,277.23</b>	<b>0.00</b>		<b>L 744,878.35</b>		<b>L 166,601.13</b>		<b>L 744,878.35</b>	<b>100%</b>

<b>SUPERVISOR</b>		<b>CONTRATISTA</b>	
FIRMA:		FIRMA:	
			
NOMBRE: DARVIN ULICE RODRIGUEZ		NOMBRE: CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L. / YESSICA DEL SOCORRO MEDINA	
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	



**ESTIMACIÓN DE PAGO**  
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

CODIGO  
PROYECTO:  
UBICACIÓN:  
EJECUTOR:  
ESTIMACION:  
PERIODO DEL:

AGUANQ-06-2023  
PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO  
EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ  
CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R. L.  
NUMERO TRES  
21/11/2023 HASTA 29/11/2023

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	'PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		CONTRATO ORIGINAL + ORDEN DE CAMBIO # 1			EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		% AVANCE
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	47.00	L 30.29	L 1,423.63	47.00	L 1,423.63	47.00	L 30.29	L 1,423.63			47.00	L 1,423.63	100%
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	16.47	L 355.95	L 5,862.50	16.47	L 5,862.50	16.47	L 355.95	L 5,862.50			16.47	L 5,862.50	100%
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL(INC. ACARREO 20 MTS)	M3	26.40	L 124.30	L 3,281.52	26.40	L 3,281.52	26.40	L 124.30	L 3,281.52			26.40	L 3,281.52	100%
4	ACARREO DE MATERIAL(DESPERDICIOS)	M3	53.59	L 180.33	L 9,663.88	53.59	L 9,663.88	53.59	L 180.33	L 9,663.88			53.59	L 9,663.88	100%
5	RELLENO COMP.CON MATERIAL SELECTO (IN.ACARREO)	M3	16.34	L 664.73	L 10,861.69	16.34	L 10,861.69	16.34	L 664.73	L 10,861.69			16.34	L 10,861.69	100%
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4Nu3, Nu2 @ 20 cm	UNID	13.00	L 704.78	L 9,162.14	13.00	L 9,162.14	13.00	L 704.78	L 9,162.14			13.00	L 9,162.14	100%
7	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA ARENA	M3	14.85	L 1,842.53	L 27,361.57	14.85	L 27,361.57	14.85	L 1,842.53	L 27,361.57			14.85	L 27,361.57	100%
8	SOLERA DE 20 X 20 , 4No.3 y No. 2 @ 15 cm, CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 439.73	L 14,950.82	34.00	L 14,950.82	34.00	L 439.73	L 14,950.82			34.00	L 14,950.82	100%
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 8 CM	M.L	12.55	L 136.28	L 1,710.31	12.55	L 1,710.31	12.55	L 136.28	L 1,710.31			12.55	L 1,710.31	100%
10	SOLERA DE 15 X 15, 3#3, 2# @ 15 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	10.50	L 243.34	L 2,555.07	10.50	L 2,555.07	10.50	L 243.34	L 2,555.07			10.50	L 2,555.07	100%
11	CASTILLO 15 X 15 4 # 3, Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L	38.60	L 364.33	L 14,063.14	38.60	L 14,063.14	38.60	L 364.33	L 14,063.14			38.60	L 14,063.14	100%
12	CASTILLO 15 X 15, 3 No.3 y No2 @ 20 , CONCRETO 1:2:2	M.L	8.64	L 304.75	L 2,633.04	8.64	L 2,633.04	8.64	L 304.75	L 2,633.04			8.64	L 2,633.04	100%
13	LOSA DE LIBRERO 0.6 X 0.1 MTS (PULIDA)	M.L	8.00	L 643.33	L 5,146.64	8.00	L 5,146.64	8.00	L 643.33	L 5,146.64			8.00	L 5,146.64	100%
14	LIBRERO EMPOTRADO KINDER	UNID	1.00	L 19,850.57	L 19,850.57	1.00	L 19,850.57	1.00	L 19,850.57	L 19,850.57			1.00	L 19,850.57	100%
15	SOLERA 15 X 20 4Nu3 y Nu2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 368.93	L 12,543.62	34.00	L 12,543.62	34.00	L 368.93	L 12,543.62			34.00	L 12,543.62	100%
16	SOLERA 20 X 25, 4#3, 2#4, #2 @ 15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L	22.84	L 677.58	L 15,475.93	22.84	L 15,475.93	22.84	L 677.58	L 15,475.93			22.84	L 15,475.93	100%
17	CARGADOR DE 10 X 15 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L	1.15	L 277.12	L 318.69	1.15	L 318.69	1.15	L 277.12	L 318.69			1.15	L 318.69	100%
18	BATIENTE DE 10 X 20 CM, 2#3; #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	8.55	L 234.98	L 2,009.08	8.55	L 2,009.08	8.55	L 234.98	L 2,009.08			8.55	L 2,009.08	100%
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO 15(INHABILITADA)	M2	73.77	L 730.08	L 53,858.00	73.77	L 53,858.00	73.77	L 730.08	L 53,858.00			73.77	L 53,858.00	100%
20	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	21.38	L 1,445.33	L 30,901.16	0.00	L -	0.00	L 1,445.33	L -					
21	PUERTA METALICA (1X2.10m). TUBO IND.3/4, LAM 1/16	UNID	1.00	L 6,205.29	L 6,205.29	1.00	L 6,205.29	1.00	L 6,205.29	L 6,205.29			1.00	L 6,205.29	100%
22	PISO GRANITO TERRAZO 30 X 30	M2	83.64	L 782.88	L 65,480.08	83.64	L 65,480.08	85.27	L 782.88	L 66,756.18	1.63	L 1,276.09	85.27	L 66,756.18	102%
23	TECHO CANALETA 6", LAM ALUMINIZADA ONDULADA AULA	M2	108.63	L 570.34	L 61,956.03	108.63	L 61,956.03	110.00	L 570.34	L 62,737.40	1.37	L 781.37	110.00	L 62,737.40	101%
24	CIELO FALSO DE PVC CON PERFIL DE ALUMINIO	M2	83.64	L 559.35	L 46,784.03	83.64	L 46,784.03	90.10	L 559.35	L 50,397.44	6.46	L 3,613.40	90.10	L 50,397.44	108%
25	PIZARRA DE FORMICA 2.4 X 1.20(SUM/INST)	UNID	1.00	L 4,751.18	L 4,751.18	1.00	L 4,751.18	1.00	L 4,751.18	L 4,751.18			1.00	L 4,751.18	100%
26	ENTABICADO BLOQUE 30 CM (REPE/PUL)(***)	M.L	17.70	L 503.74	L 8,916.20	17.70	L 8,916.20	17.70	L 503.74	L 8,916.20			17.70	L 8,916.20	100%
27	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	85.77	L 16.46	L 1,411.77	85.77	L 1,411.77	85.77	L 16.46	L 1,411.77			85.77	L 1,411.77	100%
28	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e= 2 CM MORTERO DE 1:4	M2	191.39	L 244.98	L 46,886.72	191.39	L 46,886.72	191.39	L 244.98	L 46,886.72			191.39	L 46,886.72	100%
29	PINTURA DE ACEITE	M2	191.39	L 81.34	L 15,567.66	191.39	L 15,567.66	191.39	L 81.34	L 15,567.66			191.39	L 15,567.66	100%
<b>MODULO DE AULA DE 9 X 8</b>					<b>L 501,591.97</b>	<b>L 470,690.82</b>	<b>0.00</b>	<b>L -</b>	<b>L 476,361.68</b>	<b>L 5,670.86</b>	<b>L 476,361.68</b>	<b>95%</b>			
30	TRAZADO Y MARCADO	M.L	9.38	L 30.29	L 284.12	9.38	L 284.12	30.00	L 30.29	L 908.70	20.62	L 624.58	30.00	L 908.70	320%
31	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	10.67	L 355.95	L 3,797.99	10.67	L 3,797.99	10.67	L 355.95	L 3,797.99			10.67	L 3,797.99	100%
32	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM DE CAMA ARENA	M3	8.49	L 1,842.53	L 15,643.08	3.87	L 7,124.77	8.49	L 1,842.53	L 15,643.08	4.62	L 8,518.31	8.49	L 15,643.08	100%
33	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC.M2	M2	11.88	L 879.16	L 10,444.42			0.00	L 879.16	L -					
34	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	11.49	L 153.49	L 1,763.60	0.00	L -	11.49	L 153.49	L 1,763.60	11.49	L 1,763.60	11.49	L 1,763.60	100%
35	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM CODALEADO FINO	M2	86.58	L 484.57	L 41,954.07	0.00	L -	24.39	L 484.57	L 11,818.66	24.39	L 11,818.66	24.39	L 11,818.66	28%
<b>MODULO DE ACERAS AULAS Y CIRCULACION</b>					<b>L 73,887.28</b>	<b>L 11,206.87</b>	<b>0.00</b>	<b>L -</b>	<b>L 33,932.03</b>	<b>L 22,725.16</b>	<b>L 33,932.03</b>	<b>46%</b>			
36	INTERRUPTOR DOBLE	UNID	2.00	L 455.34	L 910.68	0.00	L -	2.00	L 455.34	L 910.68	2.00	L 910.68	2.00	L 910.68	100%
37	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	2.00	L 412.97	L 825.94	0.00	L -	2.00	L 412.97	L 825.94	2.00	L 825.94	2.00	L 825.94	100%
38	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)(INHABILITADA)	UNID	1.00	L 3,751.18	L 3,751.18	0.00	L -	1.00	L 3,751.18	L 3,751.18	1.00	L 3,751.18	1.00	L 3,751.18	100%
39	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNID	1.00	L 4,266.78	L 4,266.78	0.00	L -	1.00	L 4,266.78	L 4,266.78	1.00	L 4,266.78	1.00	L 4,266.78	100%
40	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	1.00	L 341.88	L 341.88	0.00	L -	1.00	L 341.88	L 341.88	1.00	L 341.88	1.00	L 341.88	100%
41	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO	M.L	55.00	L 69.18	L 3,804.90	0.00	L -	55.00	L 69.18	L 3,804.90	55.00	L 3,804.90	55.00	L 3,804.90	100%

39	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNID	1.00	L 4,266.78	L 4,266.78				1.00	L 4,266.78	L 4,266.78
40	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	1.00	L 341.88	L 341.88				1.00	L 341.88	L 341.88
41	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO	M.L	55.00	L 69.18	L 3,804.90				55.00	L 69.18	L 3,804.90
42	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP TUBERIA EMT	M.L	26.00	L 101.10	L 2,628.60				26.00	L 101.10	L 2,628.60
43	CIRCUITO DE ILUM.HASTA 20 AMP, POLIDUCTO	M.L	15.00	L 69.18	L 1,037.70				15.00	L 69.18	L 1,037.70
44	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE	M.L	40.00	L 161.78	L 6,471.20	-15.00	L 161.78	-L 2,426.70	25.00	L 161.78	L 4,044.50
45	SUM/INST DE LUMINARIA DE TECHO LED	UNID	9.00	L 1,984.27	L 17,858.43		L -		9.00	L 1,984.27	L 17,858.43
<b>MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					L 41,897.29			-L 2,426.70			L 39,470.59
46	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UNID	1.00	L 6,479.46	L 6,479.46		L -		1.00	L 6,479.46	L 6,479.46
<b>MODULO DE HASTA</b>					L 6,479.46						L 6,479.46
47	SUM/INST DE PLACA DE ALUMINIO 20X24 CON LOGO DE 4X5	UNID		L 17,174.50	L -	1.00	L 17,174.50	L 17,174.50	1.00	L 17,174.50	L 17,174.50
48	MOLDURA DE GRANITO	ML		L 237.89	L -	34.39	L 237.89	L 8,181.04	34.39	L 237.89	L 8,181.04
49	VENTANA DE TUBO ESTRUCTURAL Y LAMINA GALV DE 1/8"	M2		L 1,830.34	L -	21.38	L 1,830.34	L 39,132.67	21.38	L 1,830.34	L 39,132.67
<b>MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS</b>					L -			L 64,488.21			L 64,488.21
<b>SUB-TOTAL</b>					L 623,856.00			-L 3,124.04	0.00		L 620,731.96
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS 7%</b>					L 43,669.92			-L 218.68	0.00		L 43,451.24
<b>UTILIDAD 13%</b>					L 81,101.28			-L 406.13	0.00		L 80,695.16
<b>TOTAL</b>					L 748,627.20			-L 3,748.85	0.00		L 744,878.35

SUPERVISOR	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
		
		
NOMBRE: DARVIN ULICE RODRIGUEZ	NOMBRE: ERLIN OMAR RODRIGUEZ	NOMBRE: CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L. / YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS
FECHA: 9/9/2023	FECHA: 9/9/2023	FECHA: 9/9/2023
