



MUNICIPALIDAD DE MARALE

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELEFONO: 2768-2003, TELEFAX: 2768-2007

Correo Electronico: municipalidadmarale@yahoo.com

1046

ORDEN DE PAGO N° 013239

Municipalidad: Marale

Unidad Ejecutora: ALCALDÍA MUNICIPAL

No. Cheque: 83764448

Departamento: FRANCISCO MORAZAN

Orden de Pago

Paguese a: Martinez Vasquez consultores y contratistas A.S. de R.L. de C.V. Valor efectivo

Cantidad en letras: Doscientos treinta y cinco mil setecientos treinta y siete tempas con 18/100

centavos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-011-04	15-03	00-03	05

Gasto Corriente: ☐

Gasto de Inversión Social: ☐

Gasto por Deuda Publica: ☐

Objeto de Gasto	Descripcion	Total
47210		235,737.18
Pago por construcción pavimento de concreto Hidráulico e=15cm, concreto ps, ubicado en barrio las Flores, Marale Uniba, Municipio de Marale, Francisco Morazán, Segundo estimación de proyectos de pavimentación caminos productivos.		
		235,737.18

GRAPHICAR R.T.N.08011985160550, Tel.2213-4432/ CETIFICADO N° 9231-21-10500 164/graphicarT.hn@gmail.com

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Tesorero

Contador

Fecha: 24 octubre de 2023

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 080196005639

Impuesto Vecinal.: _____

MARVAS
MARTINEZ - VASQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

PAGADO

Original: Tesoreria

Copia: Presupuesto



Alcaldía municipal de Marale
Barrio El Centro, Marale, Francisco Morazán
RTN: 08119003246775
Solicitud Ampliación de Tiempo

Por este medio se solicita

AMPLIACIÓN DE TIEMPO POR 30 días para la ejecución del contrato Lote de 3 proyectos: 1) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BARRIO MARALE ARRIBA, MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN. 2) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO DE DIOS, MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN. 3) CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE UNA VÍA, CON UNA LONGITUD DE 6 M Y UN ANCHO DE 4 M EN LA COMUNIDAD RODEO DE PACAYA, MUNICIPIO DE MARALE.

lo anterior en vista de lo siguiente:

- 30 días por definición del cambio de pavimento concreto hidráulico a pavimento con White Topping en un tramo de la calle del Barrio de Dios.
- Con respecto a la caja puente la misma no se ha podido iniciar debido a que por las lluvias y la crecida del río no se ha podido realizar el ingreso de materiales.

TIEMPO DE DURACIÓN: 60 DÍAS

FECHA DE INICIO: 1/AGOSTO/2023

FINALIZACIÓN DE LA OBRA: 29/SEPTIEMBRE/2023

AMPLIACIÓN DE TIEMPO SOLICITADO: 30 DÍAS

NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 29 OCTUBRE 2023

Lugar y Fecha: Municipio de Marale, 30 de agosto 2023

Solicitado: por

MARVAS
MARTÍNEZ - VÁSQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

Jesús Alex Vásquez Mondragón

MARTÍNEZ VÁSQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. MARVAS.

Aprobado por:

Ing. Suyapa Andino
SUPERVISORA UTI-MANOFM



Edwin Otilio Montes Matute
Alcalde Municipal





RECIBO POR L 294,671.47

RECIBI, DE LA MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS 47/100 (L294,671.47) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO 2 DE LOS PROYECTOS:

- Construcción Pavimento de concreto Hidráulico, e=15 Cm., Concreto 3000 psi, Ubicado en barrio las flores Marale Arriba, Municipio de Marale, Francisco Morazán.
- Construcción Pavimento de concreto Hidráulico, e=15 Cm., Concreto 3000 psi, Ubicado en barrio de Dios, Municipio de Marale, Francisco Morazán.
- Construcción Caja Puente (Menor) Doble de una vía, con una longitud de 6 cm y un ancho de 4cm en la comunidad Rodeo de Pacaya, Municipio de Marale, Francisco Morazán

DESGLOSE


ESTIMACION No 1.	L.294,671.47
Menos amortización Anticipo Est No 1	L.58,934.29

TOTAL, NETO A RECIBIR	L.235,737.18
------------------------------	---------------------

Tegucigalpa M.D.C 19 DE OCTUBRE 2023.

Sin otro particular.

Atentamente.


ING JESUS ALEX VASQUEZ MONDRAGON
GERENTE GENERAL

MARVAS
MARTÍNEZ - VÁSQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS, ASOCIADOS S DE R.L DE C.V. "MARVAS"

Página 1 de 1

Edificio Marvas, 3 Nivel Bo, San Felipe, Calle Bustamante Rivera, Tegucigalpa 11101

teléfonos: 9637-2158 3185-0201

123marvas@gmail.com

marvas1234@yahoo.es

ORDEN DE CAMBIO 1

Nombre del Proyecto: Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico e= 15 c.m. concreto 3000 psi.
Dirección: Barrio de Dios, Municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán
Nombre del Contratista: MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S.DE R.L. DE C.V. (MARVAS)
Fecha: 30 de Agosto 2023

No.	CONCEPTOS	UNIDAD	PRESUPUESTO SEGÚN CONTRATO			ORDEN DE CAMBIO		NUEVO MONTO MODIFICADO		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	MONTO (LPS)	%
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO										
1	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	M.L.	172.86	22.55	3,897.99	-172.86	-3,897.99	0.00	L -	0.00%
2	CORTE DE MATERIAL COMUN CON EQUIPO	M3	108.90	72.77	7,924.85	-108.90	-7,924.65	0.00	L -	0.00%
3	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION	M2	363.00	65.49	23,772.87	-363.00	-23,772.87	0.00	L -	0.00%
4	ACARREO DE MATERIAL CON VOQUETA SM3 Y CARGADORA	M3	136.13	102.53	13,957.41	-136.13	-13,957.41	0.00	L -	0.00%
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE	M3	54.45	660.04	35,939.18	-54.45	-35,939.18	0.00	L -	0.00%
6	PAVIMENTO CONCR. HIDR. 3000LB/PLG2, E=15 CMS.	M2	363.00	776.99	282,047.37	-363.00	-282,047.37	0.00	L -	0.00%
7	BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CMS	ML	115.24	313.57	36,135.81	-115.24	-36,135.81	0.00	L -	0.00%
8	CORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	202.82	15.38	3,119.37	-202.82	-3,119.37	0.00	L -	0.00%
SUB.- TOTAL (LPS)					406,794.65		-406,794.65			
ACTIVIDADES MODIFICADAS POR AREAS										
PAVIMENTACIÓN CALLE LATERAL IGLESIA										
1	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	22.55			59.28	1,336.76	59.28	1,336.76	100%
2	EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO II (SEMI DURO)	M3	454.78			35.56	16,171.98	35.56	16,171.98	100%
3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	990.98			17.78	17,619.62	17.78	17,619.62	100%
4	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	275.37			46.23	12,730.36	46.23	12,730.36	100%
5	PAVIMENTO CONCR. HIDR. 3000LB/PLG2, E=15 CMS.	M2	776.99			118.56	92,119.93	118.56	92,119.93	100%
6	BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CMS	ML	313.57			39.52	12,392.29	39.52	12,392.29	100%
7	CORTADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	15.38			67.76	1,042.15	67.76	1,042.15	100%
SUB TOTAL PAVIMENTACIÓN CALLE LATERAL IGLESIA							L 153,413.09		L 153,413.09	
LOSA DE TRANSICIÓN BARRIO DE DIOS										
8	TRAZADO Y MARCADO DE CALLE	ML	22.55			108.00	2,435.40	108.00	2,435.40	100%
9	DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO	M2	43.42			34.00	1,476.28	34.00	1,476.28	100%
10	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	990.98			1.70	1,684.67	1.70	1,684.67	100%
11	PAVIMENTO CONCR. HIDR. 3000LB/PLG2, E=15 CMS.	M2	776.99			34.00	26,417.66	34.00	26,417.66	100%
12	BORDILLO DE CONCRETO 15X15 CMS	ML	313.57			8.00				



Alcaldía municipal de Marale

Barrio El Centro, Marale, Francisco Morazán

RTN: 08119003246775

Solicitud Ampliación de Tiempo

Por este medio se solicita:

AMPLIACIÓN DE TIEMPO POR 15 días para la ejecución del contrato Lote de 3 proyectos: 1) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BARRIO MARALE ARRIBA, MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN. 2) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO DE DIOS, MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN. 3) CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE UNA VÍA, CON UNA LONGITUD DE 6 M Y UN ANCHO DE 4 M EN LA COMUNIDAD RODEO DE PACAYA, MUNICIPIO DE MARALE.

lo anterior en vista de lo siguiente:

- 15 días por fuertes lluvias en la zona lo cual ha afectado la ejecución de la obra en pavimento Barrio de Dios y en la construcción de la Caja puente Rodeo de Pacaya.
- Con respecto a la caja puente la misma no se ha podido iniciar debido a que por las lluvias y la crecida del río no se ha podido realizar el ingreso de materiales.

TIEMPO DE DURACIÓN: 60 DÍAS

FECHA DE INICIO: 1/AGOSTO/2023

FINALIZACIÓN ORIGINAL DE LA OBRA: 29/SEPTIEMBRE/2023

AMPLIACIÓN DE TIEMPO #1 APROBADA: 30 DÍAS

FECHA DE FINALIZACIÓN: 29 OCTUBRE 2023

SOLICITUD AMPLIACIÓN DE TIEMPO # 2 : 15 DÍAS

NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha: Municipio de Marale, 10 de octubre 2023

Solicitado: por

MARVAS
MARTÍNEZ - VÁSQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

Jesús Alex Vásquez Mondragón

MARTÍNEZ VÁSQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. MARVAS.

Aprobado por:

Edwin Otilio Montes Matute

Alcalde Municipal





Honduras

Secretaría de Estado en los Despachos de
Gestión del Riesgo y Contingencias
Nacionales COPECO

Centro Nacional de Estudios
Atmosféricos, Oceánicos y
Sísmicos CENAOS

Aldea El Ocotal, Comayagüela M.D.C, 10 de octubre del 2023
Ref. CENAOS/COPECO No. 165- 2023

Abog.
José Fernando Martínez
Gerente General
MARVAS

Adjunto se remite la información solicitada mediante nota del día 10 de octubre 2023, referente a los datos de precipitación acumulada diaria, de fecha 01 de junio al 30 de septiembre 2023. Los registros corresponden a la estación de San Ignacio, ubicada en el departamento de Francisco Morazán. Esta es la estación más cercana al proyecto, con información disponible.

Atentamente,

Sin otro particular,
Atentamente,


Francisco Argeñal
Director
CENAOS



cc: archivo

MARVAS
MARTÍNEZ-VÁSQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.



Honduras

Secretaría de Estado en los
Despachos de Gestión del
Riesgo y Contingencias
Nacionales COPECO

Centro Nacional de Estudios
Atmosféricos, Oceánicos y
Sísmicos CENAOS

REGISTROS DE PRECIPITACIÓN EN MILÍMETROS SECCION DE CLIMATOLOGÍA

CENAOS/COPECO 165 -2023

ESTACIÓN: SAN IGNACIO

AÑO	2023				
DÍA/MES	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
1	1.6	55.3	1.1	1.8	0.0
2	0.1	0.1	0.0	2.1	23.1✓
3	0.3	0.0	0.0	33.4 ✓	36.1✓
4	62.7	12.5	0.0	0.2	4.2
5	3.1	0.3	0.0	0.0	0.1
6	0.6	1.0	0.3	0.0	21.1✓
7	0.3	0.1	0.0	0.0	20.9✓
8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2✓
9	6.0	0.6	0.0	0.0	0.3
10	0.6	0.0	0.0	0.0	*
11	0.0	0.0	0.0	0.0	*
12	0.1	4.4	0.0	0.0	*
13	0.0	0.8	0.5	0.4	*
14	0.0	7.3	1.8	0.3	*
15	0.9	0.3	9.4 ✓	0.0	*
16	0.0	5.2	0.1	0.0	*
17	17.7	12.1	1.3	11.2 ✓	*
18	0.2	0.2	1.6	0.2	*
19	0.0	0.0	13.2 ✓	0.0	*
20	0.0	0.0	25.9 ✓	11.9 ✓	*
21	0.5	2.4	0.0	0.3	*
22	0.2	1.5	43.3 ✓	0.0	*
23	0.0	0.0	9.9 ✓	0.2	*
24	0.0	0.0	59.3 ✓	47.4 ✓	*
25	0.0	0.0	0.8	0.3	*
26	1.6	0.0	24.3 ✓	0.0	*
27	14.9	0.0	26.1 ✓	34.2 ✓	*
28	0.0	3.4	0.3	1.3	*
29	0.0	6.3	0.0	10.0 ✓	*
30	0.0	13.2	0.0	1.5	*
31	*	7.3	0.0	*	*
TOTAL MI	111.4	134.3	219.2	156.7	115.0

[Handwritten signature]



MARVAS
MARTÍNEZ-VÁSQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

REGISTROS DE INGRESOS
SECCION
1977

ANO	FECHA	...
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE

CHEQUE No. 83764448


11-419-000347-2
MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO
MORAZAN
BO. CENTRO CERCA DEL PARQUE MUNICIPA
9621 7385 2768 2007


TALANGA, F.M. 24 de Octubre de 2023
Lugar y Fecha

Martinez Vasquez Consultores y Contabilistas A.S. de R.L. CV L 235,737.18
Páguese a la orden de

Docecientos Treinta y cinco Mil Setecientos Treinta y Siete Lempiras con 18/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆01419079⑆00114190002472⑆83764448




ALCALDIA MUNICIPAL DE MARALE

YO. Jesus Alex Vasquez M. Mayor de edad, con
numero de Identidad 0801 1960 05639. Por medio de la
presente hago constar que recibí de la Tesorería Municipal la
Cantidad de Lps. 235,737.18

Descripción Pago Por construcción de Pavimento de
concreto Hidráulico e=15cm ubicada en Barrio los
flares, Marale arriba, Municipio Marale, Francisco Morazán
Segunda Estimación de Proyectos de Pavimentación
Cominos Productivos

Y para constancia que estime conveniente se extiende de la
presente en Marale Francisco Morazán, a los 24 días del
mes de Octubre del año 2023


MARVAS
MARTINEZ - VASQUEZ
Consultores & Contratistas
Asesores, S. de R.L. de C.V.

MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS
A.S DE RL. DE CV

0801-196005639



Alcaldía municipal de Marale
Barrio El Centro, Marale, Francisco Morazán
RTN: 08119003246775

ESTIMACION #2

Objeto: Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico e= 15 c.m. concreto 3000 psi.
Barrio Las Flores y Barrio Marale Arriba, Municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán
Contratista: MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S.DE R.L. DE C.V. (MARVAS)
septiembre 2023

Periodo 25 agosto al 24 septiembre 2023

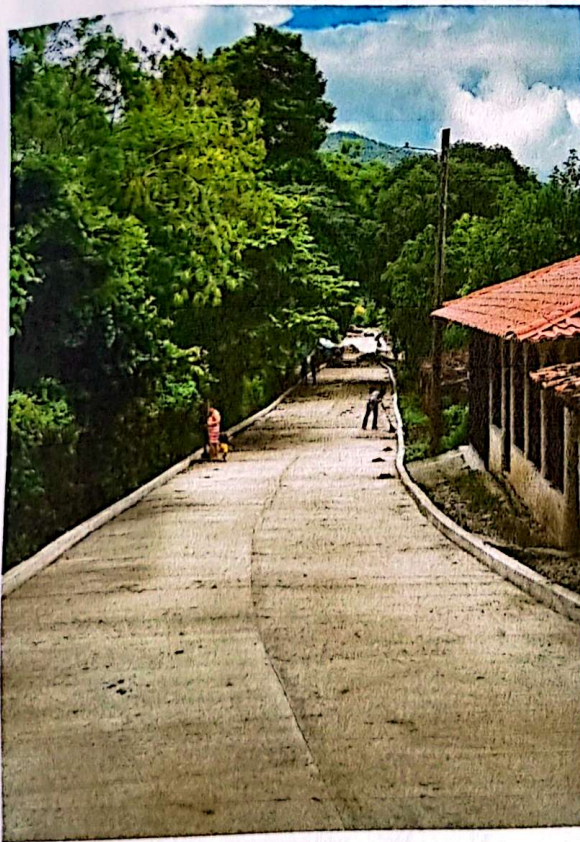
MARVAS
MARTINEZ - VÁSQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados S. de R.L. de C.V.
JESUS ALEX VÁSQUEZ MONDRAGON
GERENTE GENERAL
MARVAS S.DE R.L.

EDWIN OTILIO MONTES MATUTE
ALCALDE MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BARRIO MARALE ARRIBA, MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN.

se realizó en total la construcción de 1032.00 m² de pavimento con concreto hidráulico e= 15 c.m. concreto 3000 psi. y 344 m.l. de bordillo, Barrio Las Flores y Barrio marale Arriba.



Pavimento finalizado

MARVAS
MARTÍNEZ - VÁSQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

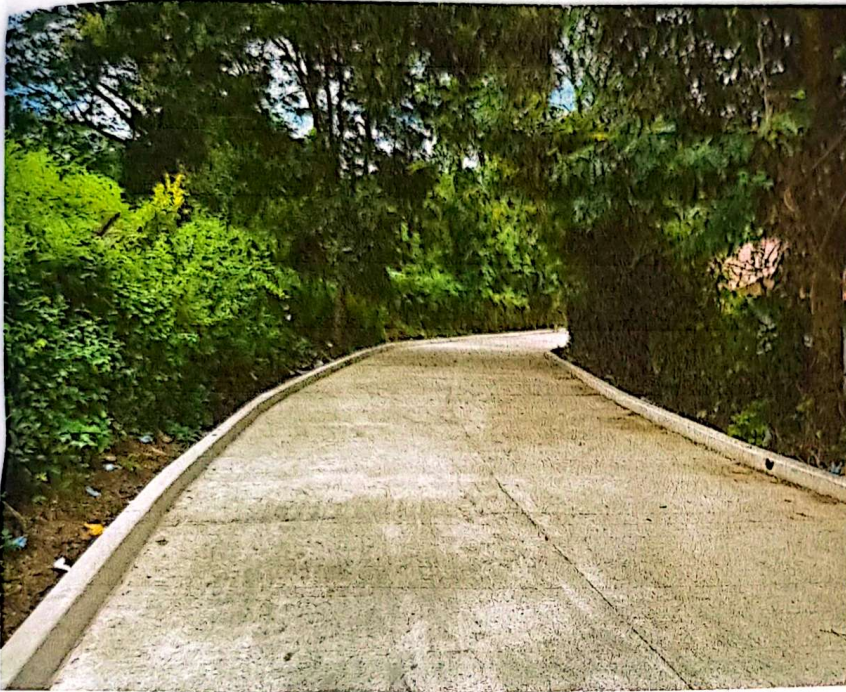
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BARRIO MARALE ARRIBA, MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN.



MARVAS
MARTÍNEZ - VÁSQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BARRIO MARALE ARRIBA, MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN.



MARVAS
MARTÍNEZ - VÁSQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BARRIO MARALE ARRIBA, MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN.



MARVAS
MARTÍNEZ - VÁSQUEZ
Consultores & Contratistas
Asociados, S. de R.L. de C.V.



Alcaldía municipal de Marale
Barrio El Centro, Marale, Francisco Morazán
RTN: 08119003246775

ACTA DE RECEPCION

Contrato: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE UN LOTE DE 3 PROYECTOS: "1) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BARRIO MARALE ARRIBA, MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN. 2) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO DE DIOS, MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN. 3) CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE UNA VÍA, CON UNA LONGITUD DE 6 M Y UN ANCHO DE 4 M EN LA COMUNIDAD RODEO DE PACAYA, MUNICIPIO DE MARALE, FRANCISCO SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARALE Y LA EMPRESA MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (MARVAS) - CON FUENTE: FONDOS DEL PROGRAMA CAMINOS PRODUCTIVOS/SIT. Y CONTRAPARTE MUNICIPAL


Nombre del Proyecto: 1) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BARRIO MARALE ARRIBA

Ubicación: Municipio de Marale

Departamento: Francisco Morazán

En base a la revisión en campo se ha verificado y recibido a entera satisfacción las obras realizadas por el contratista MARTINEZ VASQUEZ CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS S.DE R.L. DE C.V. (MARVAS). En el proyecto 1) CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, E= 15 C.M., CONCRETO 3000 PSI, UBICADO EN BARRIO LAS FLORES Y BARRIO MARALE ARRIBA, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales en el proyecto arriba mencionado.

Se extiende la presente Acta a los 24 días del mes de septiembre del 2023, en el municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán.


EDWIN OTILIO MONTES MATUTE
ALCALDE MUNICIPAL



Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
¡Educación para la vida!
