

# ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

## UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Marcovia, 10 de enero de 2024

### NOTA INFORMATIVA

Por medio de la presente envío documentación complementaria del proceso de Licitación Privada LP-04-2023 para el proyecto de Construcción de calle con concreto hidráulico en la comunidad de La Joyada, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Sin otro particular.

  
  
\_\_\_\_\_  
**José Daniel Maldonado**  
Admón. Unidad de Infraestructura



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023  
Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: PR.ANDINO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 44716

L.: 500,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7604

Fecha de Emision: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 10905

Paguese a: ARNOLD JAVIER JIRON CARRANZA

Id/RTN: 03011966006126

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A ARNOLD JAVIER JIRON CARRANZA POR CONCEPTO DE ESTIMACION #2 DEL CONTRATO PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA JOYADA MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L. 2,796,038.92 MENOS VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO L. 125,000.00 TOTAL A PAGAR L. 500,000.00 SALDO TOTAL DEL CONTRATO L. 1,546,046.74

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 041 000 001 47210 15-013-01	Construccion de Calle con Concreto Hidraulico en la Comunidad de la Joyada	500,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>500,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		500,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>500,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesoreria
---	----------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZi9m2ySGqPm/mzjzCxf2ovzeHwMlUQqrUhgZpDdOD/kYyby6srN+x2MGBQOv/E7KNv8FQN/UR3XIEZcX5MKQjzQ7Gwq962TtMQ5J4vTEZ5KjQ77VgdZwLl4B4Fh



*[Handwritten signature]*

# COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 18 MES Diciembre AÑO 2023

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Arnold Javier Jiron Cavanza

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE  
LPS. 500,000.00  
Quinientos mil Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: pago estimación #2 del contrato  
para proyecto construcción de calle con concreto  
Hidráulica en la comunidad de la joyada.

SOLVENCIA MUNICIPAL \_\_\_\_\_  
IDENTIDAD NO, 0301996600612

FIRMA



VO BO ALCALDE MUNICIPAL



# ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

**Para:**

José Nahún Calix  
Alcalde Municipal



**De:**

José Daniel Maldonado  
Admón. Unidad de Infraestructura



**Asunto:**

Lo Descrito

**Fecha:**

03 de noviembre de 2023

Sirva la presente para solicitarle autorice el pago a **Arnold Javier Jirón Carranza**, por concepto de pago de Estimación N° 2 del valor del Contrato para proyecto **"Construcción de calle con concreto hidráulico en la comunidad de La Joyada"**, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

**Valor del contrato** ----- L. 2, 796, 038.92

**Valor estimación N° 2** ----- L. 625, 000.00

**Menos valor amortización de anticipo** ----- L. 125, 000.00

**Valor a pagar** ----- L. 500, 000.00

**Total a pagar (Quinientos Mil Lempiras Exactos)**

**Saldo total del contrato** ----- L. 1, 546, 046.74

Cc. Archivo





República de Honduras  
 Secretaria de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

**RTN: 03011966006126**

Nombre o Razon Social: ARNOLD JAVIER JIRON CARRANZA  
 Domicilio Fiscal: LA PAGODA Calle PRINCIPAL N. Casa 326  
 Representante Legal:  
 Actividad Económica Principal: No Obligados

**Inscripciones**

Ventas Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20090728

Fecha de Vencimiento:

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1971 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2001; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 1 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 28879 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



*[Handwritten Signature]*

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente: Recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-357956

Transacción: 78CF9E



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-84034

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JIRON CARRANZA ARNOLD JAVIER**  
Con Registro Tributario Nacional: **03011966006126**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-84034 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415933541 de fecha 04/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX: NO existen Registros de Deudas.  
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27728539763, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-84034** o mediante el siguiente código QR:



**CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD LA JOYADA  
MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, REPUBLICA DE HONDURAS**

UBICACIÓN: COMUNIDAD LA JOYADA, MARCOVIA, CHOLUTECA, HONDURAS

CONTRATISTA: ARNOLD JAVIER JIRÓN CARRANZA RTN: 06011966006126

**ESTIMACIÓN DE OBRA**

FECHA: DESDE 29/9/2023 HASTA 10/10/2023

CONTRATO ORIGINAL				ESTIMACIÓN ANTERIOR				ESTIMACIÓN ACTUAL				ACUMULADO TOTAL			
Item	Descripcion de Actividades	Unidad	Cantidad	P.U	Total de Obra	Cantidad Ejecutada	P. Total	Cantidad Ejecutada	P. Total	% de obra actual	Cantidad Acum.	P. Total Acumulado	% de Obra Acum.		
1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE														
1	Trazado y marcado (con estación total)	ML	610.00	L 15.00	L 9,150.00	400.00	L 6,000.00	202.81	L 3,042.14	33.25%	602.81	L 9,042.14	99%		
2	Concreto 4000 PSI (e: 0.15 m)	M3	539.00	L 4,343.60	L 2,341,200.40	122.94	L 534,002.18	121.50	L 527,747.40	22.54%	244.44	L 1,061,749.58	45%		
3	Acero de refuerzo	KG	765.00	L 51.00	L 39,015.00	200.00	L 10,200.00	147.51	L 7,523.11	19.28%	347.51	L 17,723.11	45%		
4	Bordillo de concreto de 15 x 15 cm	ML	1220.00	L 208.30	L 254,126.00	300.00	L 62,490.00	203.54	L 42,397.59	16.68%	503.54	L 104,887.59	41%		
5	Pintura de bordillo	M2	366.00	L 108.91	L 39,861.06	0.00	L -	202.79	L 22,086.19	55.41%	202.79	L 22,086.19	55%		
6	Corte para juntas	ML	2542.00	L 24.60	L 62,533.20	500.00	L 12,300.00	500.85	L 12,320.81	19.70%	1000.85	L 24,620.81	39%		
7	Sellado de juntas	ML	2542.00	L 19.73	L 50,153.66	0.00	L -	500.90	L 9,882.76	19.70%	500.90	L 9,882.76	20%		
<b>GRAN TOTAL DE OBRA</b>					<b>L 2,796,039.32</b>	<b>SUB TOTAL ANTERIOR</b>	<b>L 624,992.18</b>	<b>SUB TOTAL ESTIMACIÓN</b>	<b>L 625,000.0</b>	<b>625,000.0</b>	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>L 1,249,992.17</b>			


	ESTIM. ANTERIOR	ESTIM ACTUAL
TOTAL DE ESTIMACIÓN	L 624,992.18	L 625,000.0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	L 124,998.44	L 125,000.00
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>	<b>L 499,993.75</b>	<b>L 500,000.0</b>

  
 EJECUTOR DE PROYECTOS

ARNOLD JAVIER JIRÓN CARRANZA

ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD  
DE INFRAESTRUCTURA

JOSÉ DANIEL MALDONADO

  
 ALCALDE MUNICIPAL

JOSÉ NAHUM BALIX

**INFORME DE PROYECTO N° 2**

**"CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN  
LA COMUNIDAD LA JOYADA MUNICIPIO DE MARCOVIA,  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, REPUBLICA DE  
HONDURAS"**


## Generalidades del Proyecto

### **Nombre del proyecto:**

CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD LA JOYADA MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, REPUBLICA DE HONDURAS.

### **Ubicación del Proyecto:**

El proyecto está ubicado en la calle hacia el norte de la entrada principal de la comunidad de la Joyada, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, Honduras.

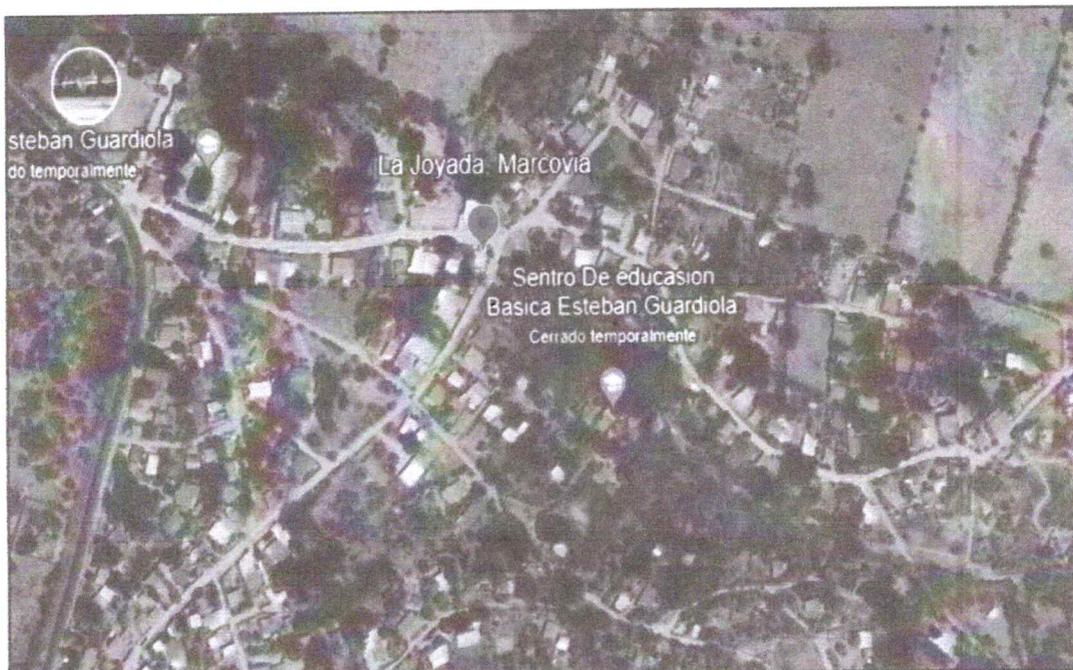

Ubicación de la Joyada, Marcovia, Choluteca    fuente: Google Earth

## **Alcances del Proyecto:**

El proyecto "construcción de calle con concreto hidráulico en la comunidad la Joyada municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, republica de honduras", comprende la pavimentación de la calle que dirige rumbo a aldea La Joyada con 620 metros lineales de pavimento hidráulico con un espesor de 15cms con una resistencia de 4,000 PSI e lo largo de toda la calzada.

Este proyecto beneficiara alrededor de 2,972.00 personas que son los habitantes de la aldea la Joyada, además este importante proyecto trae consigo el crecimiento de actividades económicas como el comercio y las actividades agrícolas de la zona como el camarón, sandía, caña de azúcar, melón, entre otras.

## **Metodología de Ejecución**

En el proyecto se utilizó una metodología de ejecución basada en la calidad de los implementos utilizados en la construcción del pavimento para garantizar la correcta ejecución del mismo.

**Maquinaria y Equipo:** La maquinaria utilizada en la construcción del pavimento garantiza la correcta nivelación del terreno, así como también el correcto maquilado del concreto a utilizar lo que garantiza una correcta y adecuada resistencia a la compresión de 4,000 PSI. La maquinaria utilizada fue la siguiente

- **Motoniveladora para terrenos Caterpillar.**
- **Camión Maquiladora para Concreto Mixer, con capacidad para 2.5 M3**
- **Camión Maquiladora para Concreto Mixer, con capacidad para 2.5 M3**
- **Retroexcavadora John Deere 310J**
- **Cortadora para concreto**

**Agregados:** Los agregados utilizados en el proyecto cumplen con la calidad que se requiere en un proyecto de estas características, tanto el agregado grueso y el agregado fino fueron comprados con la mejor calidad posible.



**Agregado Fino:** Se utilizó Arena de Río lavada y colada, se acarreoó hacia el proyecto en camión volqueta con capacidad de 14m<sup>3</sup>



**Agregado Grueso:** Se utilizó Grava de piedra Triturada, se acarreoó hacia el proyecto en camión volqueta con capacidad de 12m<sup>3</sup>




**Personal:** El personal utilizado en la ejecución del pavimento hidráulico cumplía a cabalidad con las capacidades y conocimientos técnicos que son de vital importancia para garantizar la correcta ejecución del proyecto, dentro del proyecto participaron alrededor de 18 personas para lograr la ejecución del mismo, divididos de la siguiente manera

- **Albañiles técnicos**
- **Ayudantes Técnicos**
- **Ayudantes no Técnicos**
- **Maestro de obra**
- **Ingeniero Residente**
- **Ingeniero de Maquinaria**
- **Operarios de Maquinaria**
- **Cuadrilla de Topografía**

## ANEXOS DE AVANCES DE LA EJECUCIÓN

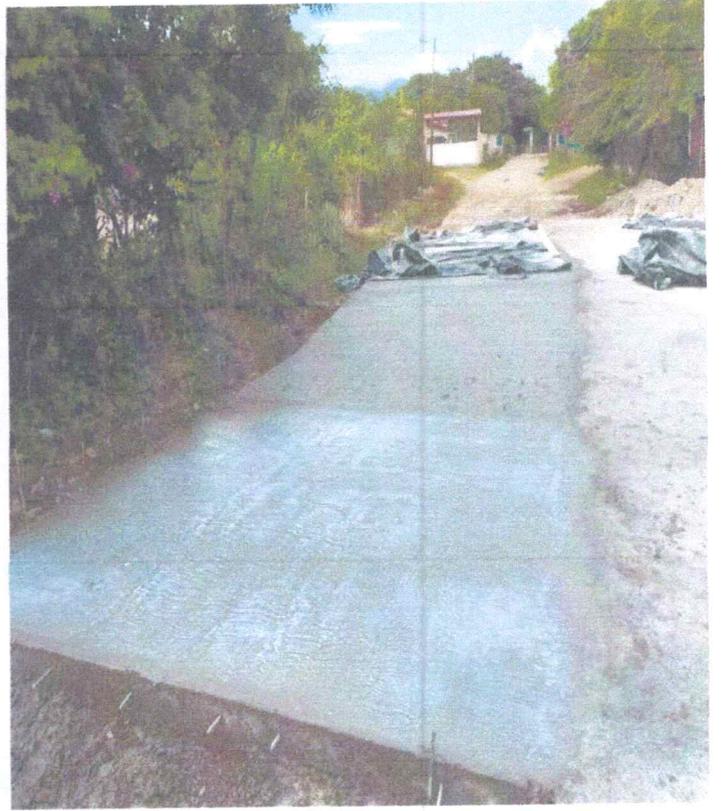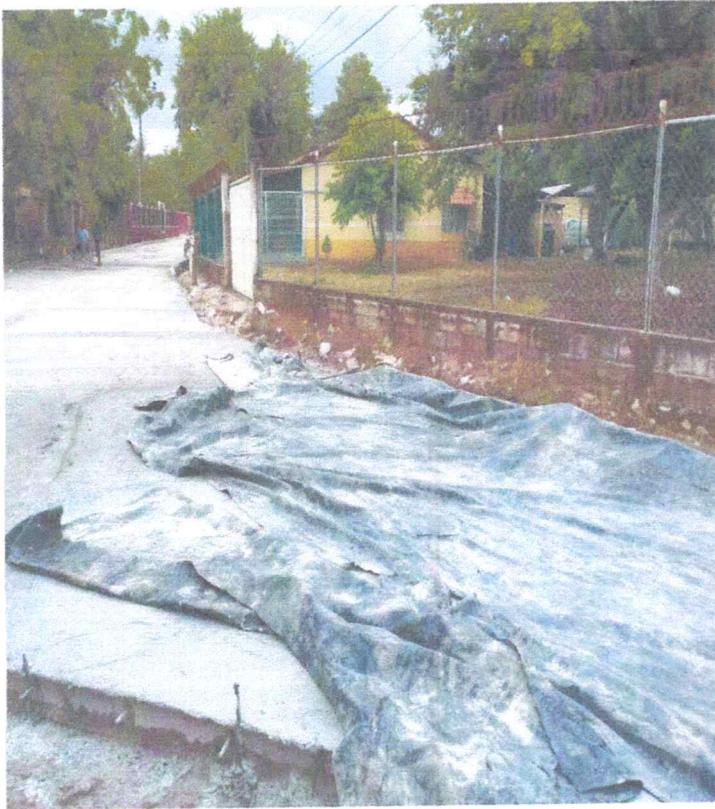

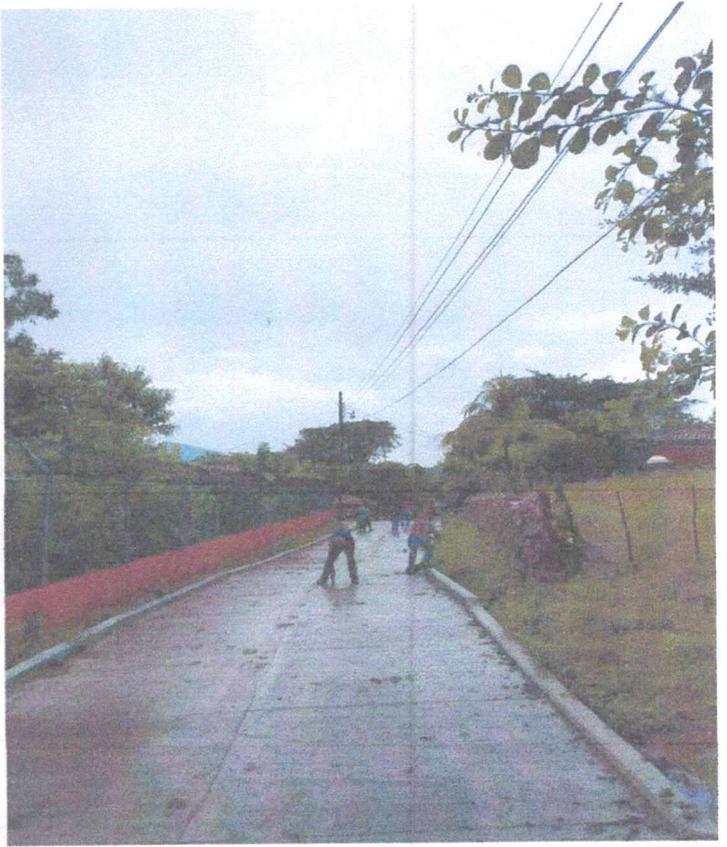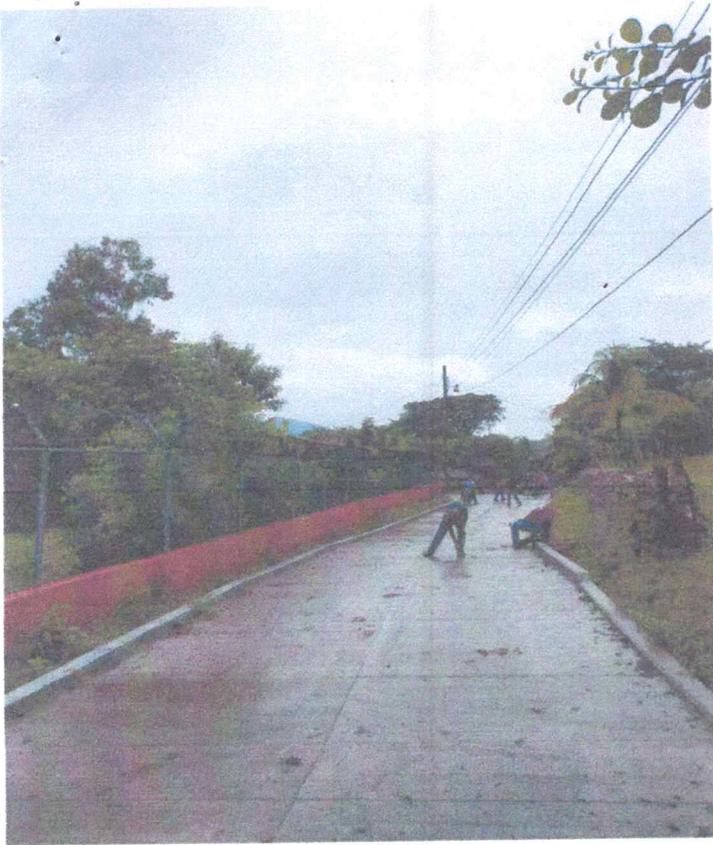

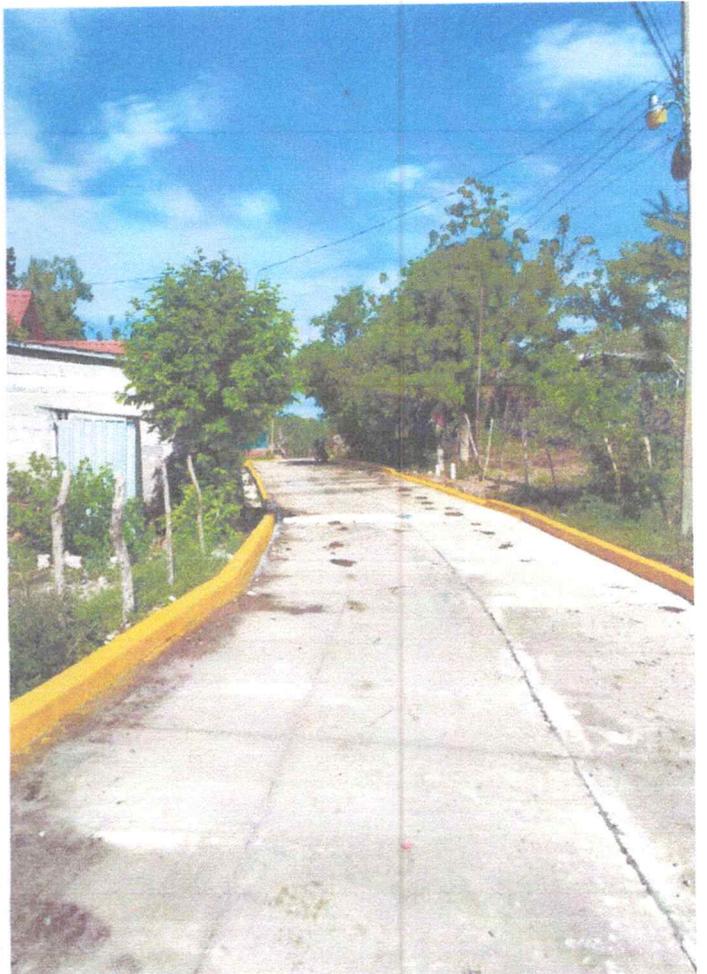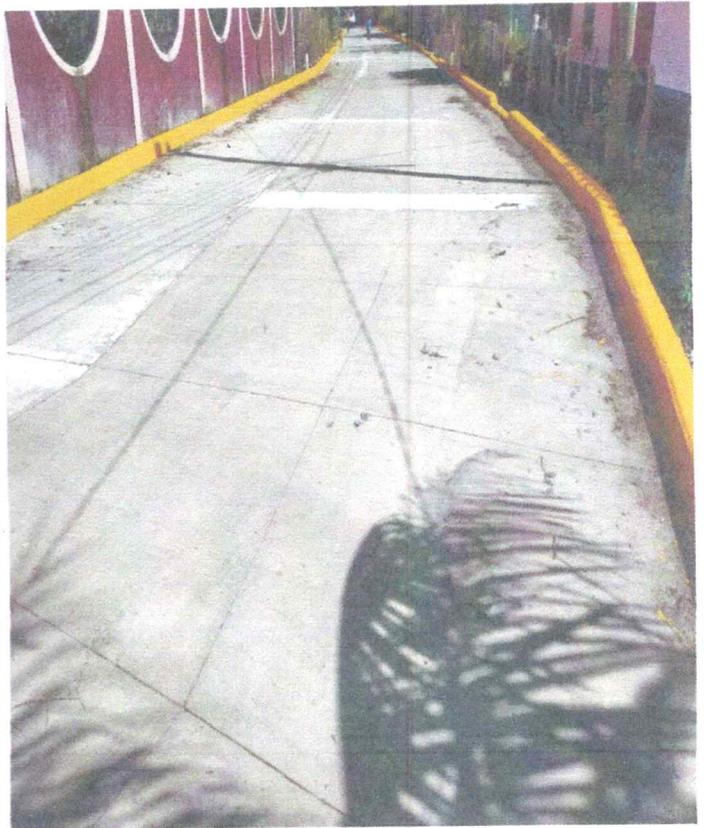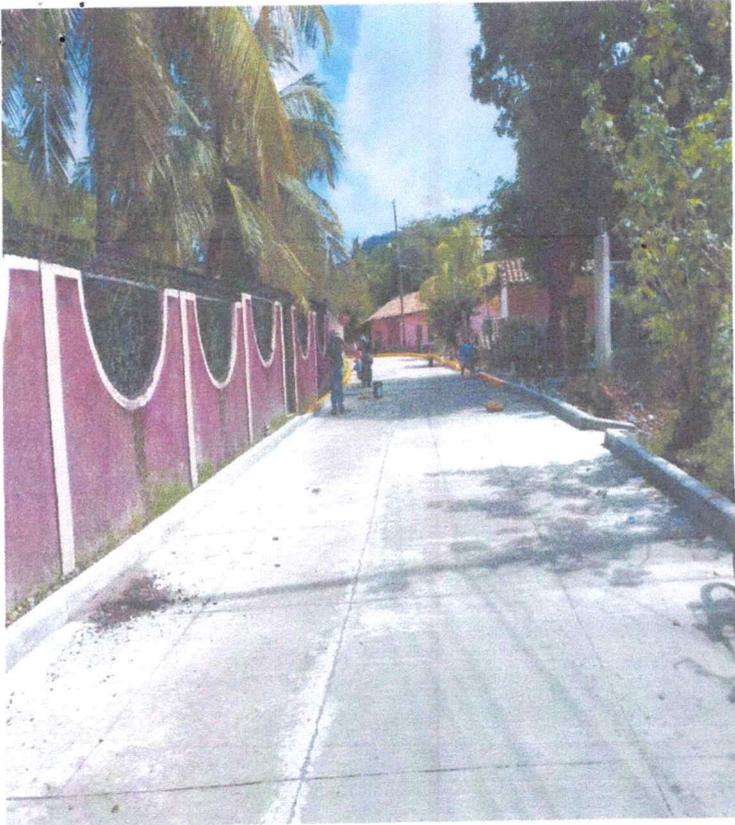

# INVERSIONES JIRON

Arnold Javier Jiron Carranza  
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ALQUILER DE MAQUINARIA  
 CONSTRUYENDO PARA EL FUTURO

Residencial Palmeras, 1 cuadra de la entrada principal, Choluteca, Honduras.  
 Email: arnoldjiron@yahoo.com // R.T.N. 03011966006126  
 Tel.: +(504) 2782-8413 / Cel.: +(504) 9992-5642

CAI: 2ED9B4-8F28FC-26428B-B18AFF-7D6EF3-37

## FACTURA

000-001-01-00 No 000467

DÍA	MES	AÑO
19	DIC	2023

Señor (a): Alcaldia Marcovia

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 06079995201200 TEL.: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
II	Estimación construcción de calle de concreto hidráulico de la comunidad de La Joyada, Marcovia			500,000.00
<b>Total</b>				<b>500,000.00</b>

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
 R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2024

Valor en letras: quinientos mil

exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro del SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.


Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

PS. V. 15% L.

PS. V. 18% L.

**TOTAL L. 500,000.00**



*[Handwritten Signature]*

Original: Contribuyente  
 Copia: Contabilidad  
 Copia: Tesorería



Facturo: my99  
 Cajero: alma lagos

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)  
 268935(Diciembre-2023).

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111101	Impuesto Personal	1.00	1,680.00
11111817	Tasa Ambiental	1.00	10.00
<b>Total:</b>			<b>1,690.00</b>

Detalle: solvencia

No. Recibo: 149092  
 Nombre: ARNOLD JAVIER GIRON CARRANZA  
 Dirección: CHOLUTECA

Fecha Recibo: 19/12/2023  
 Identidad: 0301196600612

Comprobante de Pago  
 RTN: 06079995201200

Municipalidad de Marcovia, Choluteca



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica, Marcovia, Choluteca, Tels. 2722-2071, 2722-2072  
Cuenta N°.: 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00010905

19/12/2023 Marcovia  
Lugar y Fecha

Arnold Javier Jiron Carranza


Páguese a la orden de

L 500,000.00

Quinientos mil Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



001501079:0015010019043#00010905

CUENTA N°

DESCRIPCIÓN AUXILIAR

DEBE

HABER

PAGO Arnoldo Javier Jiron  
por concepto de Estimación  
#2 del contrato para proyecto  
de construcción de calle con  
cuerpo hidráulico en la  
Comunidad de los guayabos



500,000.00

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

N° 00010905

J. J. Jiron  
030117660612

Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:
