



ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ
UNIDAD DE SUPERVISION MUNICIPAL

“INFORME”

Informe De Supervisión

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA
“POLICARPO BONILLA”

Contratista:
INGENIUM S. DE R.L.

Alcalde Municipal
Señor. Erlin Omar Rodríguez Ramos

Aguanqueterique La Paz, viernes 01 de diciembre de 2023



**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**



Sr. Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal

Aguanqueterique, La Paz 01 de diciembre de 2023

Reciba un atento y cordial saludo

La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA "POLICARPO BONILLA"; UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO;**

- Según las actividades contratadas esta ejecutadas al cien por ciento en su totalidad.

Por lo tanto, se puede proceder con el trámite de pago de tercer y última estimación por un valor de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON 13/100 (L.166,601.13.).**

A Favor de INGENIUM S. DE R.L. Representada legalmente por la representación legal de la ing. Yessica del Socorro Medina.

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo Municipal.


Abner Israel Perdomo Medina
Técnico Municipal de Proyectos



**MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**



Departamento de Presupuesto y Contabilidad

Departamento de Tesorería Municipal

Aguanqueterique, La Paz, 01 de diciembre de 2023

Reciban un atento y cordial saludo


La presente es para hacer de su conocimiento que el proyecto: **CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA "POLICARPO BONILLA"; UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO;**

Según las actividades contratadas esta ejecutadas al cien por ciento en su totalidad.

Por lo tanto, se puede proceder con el trámite de liquidación de pago de tercer y última estimación por un valor de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON 13/100 (L.166,601.13.).**

A Favor de INGENIUM S. DE R.L. Representada legalmente por la representación legal de la ing. Yessica del Socorro Medina.

Agradezco su compromiso en los procesos de desarrollo municipal.



Erlin Omar Rodríguez Ramos
Alcalde Municipal



ANTECEDENTES

El Municipio de Aguanqueterique La Paz, se encuentra ubicado en la zona baja del canal seco.

Aguanqueterique, siendo un municipio que cuenta con una proyección grande en nivel educativo;

A través de las gestiones comunitarias de los beneficiarios de los centros educativos se ha visto la necesidad de proporcionar un espacio físico óptimo para el aprendizaje con el apoyo financiero de la alcaldía municipal de Aguanqueterique.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL



Nombre: Construcción de edificio de Escuela “Policarpo Bonilla”
Ubicación: Comunidad de El Espino
Comunidad Solicitante: miembros de patronato y del comité coordinador para solicitar dicho proyecto.
Duración: 120 Días.
Situación Actual del Proyecto: Ejecutado en su totalidad al 100% de actividades contratadas
Costo Total del Proyecto Presupuestado: L. 748,627.20
Monto Solicitado por esta estimación: L. 166,601.13
Fuente Financiera: Municipalidad de Aguanqueterique

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto está ejecución al 100 % y presenta muy buena calidad de obra, por lo que se adjunta el cuadro de estimación para observación.
- Las cantidades de la obra fueron verificadas en campo y comparadas en la estimación presentada.
- Se recomienda a la comunidad hacer vigilancia para evitar pérdidas y daños a las obras previo la recepción por parte de la alcaldía.
- Se utilizó todo el equipo necesario para una buena ejecución y presentar las mejores condiciones del centro educativo.




MATERIAL FOTOGRAFICO

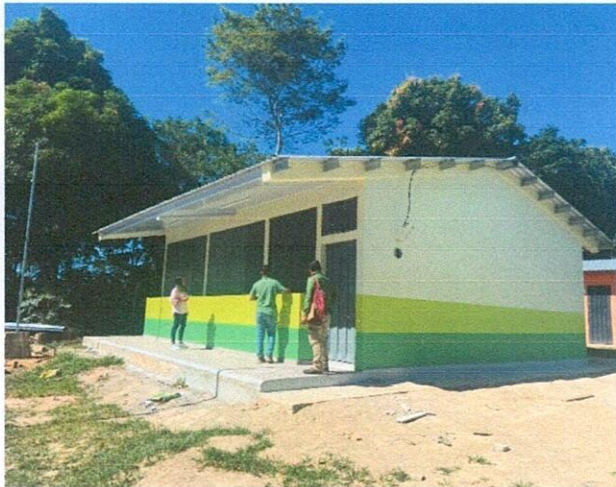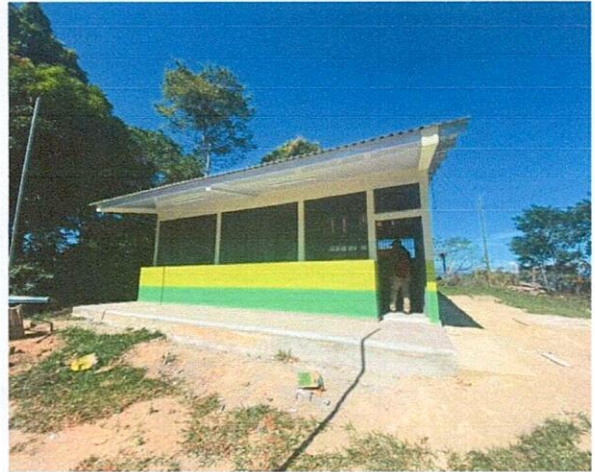



MATERIAL FOTOGRAFICO

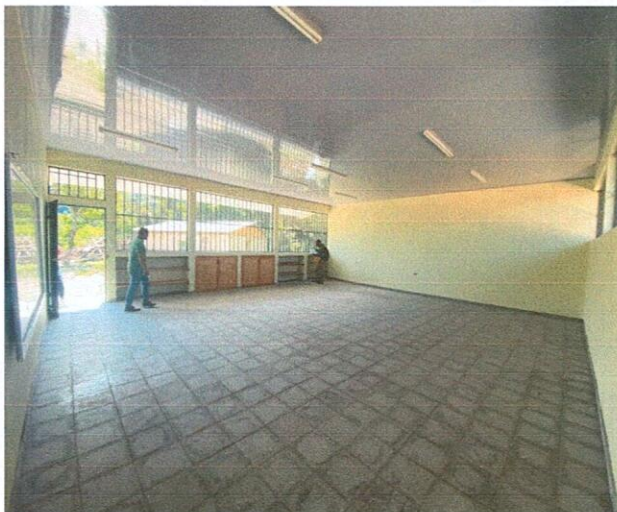



CONSTANCIA

SM-2024-4120

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....CONSTRUCTORA INGENIUM, S. DE R.L.
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 04 TOMO: 04 DEP: LA PAZ
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....1201198500481
R.T.N.....08019018064932
REPRESENTANTE LEGAL.....YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: PARA TRAMITES DE PAGOS Y LICITACIONES PARA PRESENTARSE ANTE: SEGUN MANIFIESTO ADJUNTO

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero del 2024



ABG. KAREN ROSIBEL FÚNEZ FLORES
SECRETARIA GENERAL POR LEY
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 11/02/2019

RTN: 08019018064932

CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo



Productores Importadores
de Cigarrillos



Importador



Productor Alcoholes Licores



Exportador



Distribuidor Alcoholes Licores



Imprentas



Importador Alcoholes Licores



Prestamista



Base Legal: Art. 1° del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3123418

Transacción: 3DD2BC

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional													
RTN: 12011985004816													
YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS Nombre o Razón Social													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Inscripciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas-Selectivo</td> <td>Productores Importadores de Cigarrillos</td> </tr> <tr> <td>Importador</td> <td>Productor Alcoholes Licores</td> </tr> <tr> <td>Exportador</td> <td>Distribuidor Alcoholes Licores</td> </tr> <tr> <td>Imprentas</td> <td>Importador Alcoholes Licores</td> </tr> <tr> <td>Prestamista</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Inscripciones		Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos	Importador	Productor Alcoholes Licores	Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores	Imprentas	Importador Alcoholes Licores	Prestamista	
Inscripciones													
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos												
Importador	Productor Alcoholes Licores												
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores												
Imprentas	Importador Alcoholes Licores												
Prestamista													
Fecha de Emisión: 20110209													

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973	
 Director Ejecutivo	 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente
Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras	
Número de Documento DEI-412- 584815	Transacción: BB7B4A



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 2451-2022 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 27/10/2021 12:54:43 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Cristian Emilio -Castillo Mateo, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 25228 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 2451-2022 en el área de actividad relativa a Consultoría, Obras . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. Con **R.T.N. 08019018064932** y con domicilio en la Ciudad de La Paz, Departamento de La Paz y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 24 enero 2022, 16:13

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

341a7e10-e26f-46e2-a00d-ccd6fffd6542

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
No. de Resolución	2451-2022
No. de Certificación	2451
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	24/01/2025
Área de Actividad	Consultoria, Obras
Rubro	Supervisión de proyectos, obras y construcción.
Registro Tributario Numérico	08019018064932
Certificación del Órgano Societario	Yessica del Socorro Medina Claros , Rody Emiro Medina Claros , Diana Waldina Medina Claros
Domicilio Legal	Honduras, La Paz, La Paz
Dirección	Boulevard, La merced.
Teléfono	27742008
Correo Electrónico	constructoraingenium@hotmail.com

Fecha de Emisión: 24 enero 2022, 16:13

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

341a7e10-e26f-46e2-a00d-ccd6fffd6542

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE. DIRECTOR POR LEY de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

**Abog. DAVID ALEJANDRO LUNA DUARTE
DIRECTOR POR LEY**

CC.DALD

Verificar en:

<http://www.hondocompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 24 enero 2022, 16:13

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

341a7e10-e26f-46e2-a00d-cd6fffd6542

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-10212

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019018064932**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-10212 en fecha 16/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418595946 de fecha 16/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35744284432, presentada el 13/04/2023.


La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-10212** o mediante el siguiente código QR:





Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

CONSTANCIA

N° 104416

N° 2023 - 1

El Suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH)
hace constar que: **YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS**

Se encuentra debidamente inscrito y activo en éste colegio como


INGENIERA CIVIL

bajo el N° CICH.

5028


encontrándose a la fecha solvente con sus obligaciones correspondientes; y de acuerdo a nuestro registro está facultado para ejercer su profesión.

TEGUCIGALPA M.D.C. 13 de noviembre de 2023



SECRETARIO GENERAL

MCRUZ



35052

Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

CONSTANCIA

No. 2023 - 1

El suscrito Secretario General del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH)+
hace constar que la firma

CONSTRUCTORA INGENIUM, S.DE R.L.

se encuentra debidamente registrada en este colegio bajo el No. 2322-1-N-CT/CS ;
y de acuerdo a dicho registro está autorizada para realizar trabajos de
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA siendo representada por el Ingeniero

YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

No. CICH

5028

encontrándose a la fecha, tanto la firma como el representante, solventes con sus
obligaciones correspondientes.

En consecuencia la firma

CONSTRUCTORA INGENIUM, S.DE R.L.

está facultada por la presente para participar en

PROCESO DE LICITACION NO.UNACIFOR-LP-GCUE09-2023-01

Este colegio se permite aclarar que ninguna otra firma que tenga intereses
comunes con **CONSTRUCTORA INGENIUM, S.DE R.L.**

podrá intervenir en forma separada en **Licitaciones** en que ésta participe,
a menos que entren conjuntamente.

Tegucigalpa, M. D. C., 13 de noviembre del 2023

MCRUZ

SECRETARIO GENERAL





Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2024

Hora : 05:47 p.m.

USUARIO: ALEX.MAMZANARES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5034

L.: 166,601.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1173Fecha de Emision: 7/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019018064932La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS UN CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO A ESTIMACION FINAL (NO.3) AL PROYECTO CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.
POR LA CANTIDAD DE L.166,601.13

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 006 000 001 47110 11-001-01	Construccion de edificio de la Escuela Policarpo Bonilla en la Comunidad de el Espino	166,601.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	166,601.13
	Monto Total:	166,601.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		166,601.13
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		166,601.13

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Yesica del Socorro Medina
1201198500481

0s+js/j9JmeD/W+GrAJe8cHdjI7HFOxAKNyIkzKGear7v7QV9GxNoAci5QCpOld6luYkoHGdeCb6B+ltmJC/P2Vsihiq8PI1yiCJD9QtVYbdjJ+II0ct03/otx4F28v6Akta1
Q22RN3pZOEIGD6bMDPwofr6NvBBTQUaTp8ew=

Cant. en Letras: Ciento sesenta y seis mil seiscientos
con limpios con 13/100 ctvs.
La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!

ORDEN DE CAMBIO # 1

ALCALDIA MUNICIPAL DEAGUANQUETERIQUE

PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA

POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO

PROYECTO:

CODIGO:

UBICACIÓN:

EJECUTOR :

ORDEN DE CAMBIO:

PERIODO DEL:

AGUANQ-06-2023

EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R. L.


NUMERO UNO

09/09/2023

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA		CONTRATO ORIGINAL			ORDEN DE CAMBIO			CONTRATO ORIGINAL + ORDEN DE CAMBIO		
	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	47.00	L 30.29	L 1,423.63				47.00	L 30.29	L 1,423.63
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	16.47	L 355.95	L 5,862.50				16.47	L 355.95	L 5,862.50
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL(INC. ACARREO 20 MTS)	M3	26.40	L 124.30	L 3,281.52				26.40	L 124.30	L 3,281.52
4	ACARREO DE MATERIAL(DESPERDICIOS)	M3	53.59	L 180.33	L 9,663.88				53.59	L 180.33	L 9,663.88
5	RELLENO COMP.CON MATERIAL SELECTO (IN.ACARREO)	M3	16.34	L 664.73	L 10,861.69				16.34	L 664.73	L 10,861.69
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4Nu3, Nu2 @ 20 cm	UNID	13.00	L 704.78	L 9,162.14				13.00	L 704.78	L 9,162.14
7	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA ARENA	M3	14.85	L 1,842.53	L 27,361.57				14.85	L 1,842.53	L 27,361.57
8	SOLERA DE 20 X 20 , 4No.3 y No. 2 @ 15 cm, CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 439.73	L 14,950.82				34.00	L 439.73	L 14,950.82
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 8 CM	M.L	12.55	L 136.28	L 1,710.31				12.55	L 136.28	L 1,710.31
10	SOLERA DE 15 X 15, 3#3, 2#@ 15 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	10.50	L 243.34	L 2,555.07				10.50	L 243.34	L 2,555.07
11	CASTILLO 15 X 15 4 #3, Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L	38.60	L 364.33	L 14,063.14				38.60	L 364.33	L 14,063.14
12	CASTILLO 15 X 15, 3 No.3 y No2 @ 20 , CONCRETO 1:2:2	M.L	8.64	L 304.75	L 2,633.04				8.64	L 304.75	L 2,633.04
13	LOSA DE LIBRERO 0.6 X 0.1 MTS (PULIDA)	M.L	8.00	L 643.33	L 5,146.64				8.00	L 643.33	L 5,146.64
14	LIBRERO EMPOTRADO KINDER	UNID	1.00	L 19,850.57	L 19,850.57				1.00	L 19,850.57	L 19,850.57
15	SOLERA 15 X 20 4Nu3 Y Nu2@ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 368.93	L 12,543.62				34.00	L 368.93	L 12,543.62
16	SOLERA 20 X 25, 4#3, 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L	22.84	L 677.58	L 15,475.93				22.84	L 677.58	L 15,475.93
17	CARGADOR DE 10 X 15 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L	1.15	L 277.12	L 318.69				1.15	L 277.12	L 318.69
18	BATIENTE DE 10 X 20 CM, 2#3; #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	8.55	L 234.98	L 2,009.08				8.55	L 234.98	L 2,009.08
19	PARED DE BLOQUE SIMPLÉ SISADO 15(INHABILITADA)	M2	73.77	L 730.08	L 53,858.00				73.77	L 730.08	L 53,858.00
20	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	21.38	L 1,445.33	L 30,901.16	-21.38	L 1,445.33	-L 30,901.16	0.00	L 1,445.33	L -
21	PUERTA METALICA (1X2.10m). TUBO IND.3/4, LAM 1/16	UNID	1.00	L 6,205.29	L 6,205.29				1.00	L 6,205.29	L 6,205.29
22	PISO GRANITO TERRAZO 30 X 30	M2	83.64	L 782.88	L 65,480.08	1.63	L 782.88	L 1,276.09	85.27	L 782.88	L 66,756.18
23	TECHO CANALETA 6", LAM ALUMINIZADA ONDULADA AULA	M2	108.63	L 570.34	L 61,956.03	1.37	L 570.34	L 781.37	110.00	L 570.34	L 62,737.40
24	CIELO FALSO DE PVC CON PERIL DE ALUMINIO	M2	83.64	L 559.35	L 46,784.03	6.46	L 559.35	L 3,613.40	90.10	L 559.35	L 50,397.44
25	PIZARRA DE FORMICA 2.4 X 1.20(SUM/INST)	UNID	1.00	L 4,751.18	L 4,751.18				1.00	L 4,751.18	L 4,751.18
26	ENTABICADO BLOQUE 30 CM (REPE/PULJ)(***)	M.L	17.70	L 503.74	L 8,916.20				17.70	L 503.74	L 8,916.20
27	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	85.77	L 16.46	L 1,411.77				85.77	L 16.46	L 1,411.77
28	REPELO Y PULIDO DE PAREDES e= 2 CM MORTERO DE 1:4	M2	191.39	L 244.98	L 46,886.72				191.39	L 244.98	L 46,886.72
29	PINTURA DE ACEITE	M2	191.39	L 81.34	L 15,567.66				191.39	L 81.34	L 15,567.66
MODULO DE AULA DE 9 X 8					L 501,591.97			-L 25,230.29			L 476,361.68
30	TRAZADO Y MARCADO	M.L	9.38	L 30.29	L 284.12	20.62	L 30.29	L 624.58	30.00	L 30.29	L 908.70
31	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	10.67	L 355.95	L 3,797.99				10.67	L 355.95	L 3,797.99
32	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM DE CAMA ARENA	M3	8.49	L 1,842.53	L 15,643.08				8.49	L 1,842.53	L 15,643.08
33	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC.M2	M2	11.88	L 879.16	L 10,444.42	-11.88	L 879.16	-L 10,444.42	0.00	L 879.16	L -
34	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	11.49	L 153.49	L 1,763.60				11.49	L 153.49	L 1,763.60
35	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM CODALEADO FINO	M2	86.58	L 484.57	L 41,954.07	-62.19	L 484.57	-L 30,135.41	24.39	L 484.57	L 11,818.66
MODULO DE ACERAS AULAS Y CIRCULACION					L 73,887.28			-L 39,955.25			L 33,932.03
36	INTERRUPTOR DOBLE	UNID	2.00	L 455.34	L 910.68				2.00	L 455.34	L 910.68
37	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	2.00	L 412.97	L 825.94				2.00	L 412.97	L 825.94
38	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)(INHABILITADA)	UNID	1.00	L 3,751.18	L 3,751.18				1.00	L 3,751.18	L 3,751.18

42	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP TUBERIA EMT	M.L	26.00	L 101.10	L 2,628.60	0.00	L -	26.00	L 101.10	L 2,628.60	26.00	L 2,628.60	26.00	L 2,628.60	100%
43	CIRCUITO DE ILUM.HASTA 20 AMP, POLIDUCTO	M.L	15.00	L 69.18	L 1,037.70	0.00	L -	15.00	L 69.18	L 1,037.70	15.00	L 1,037.70	15.00	L 1,037.70	100%
44	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE	M.L	40.00	L 161.78	L 6,471.20		L -	25.00	L 161.78	L 4,044.50	25.00	L 4,044.50	25.00	L 4,044.50	63%
45	SUM/INST DE LUMINARIA DE TECHO LED	UNID	9.00	L 1,984.27	L 17,858.43	0.00	L -	9.00	L 1,984.27	L 17,858.43	9.00	L 17,858.43	9.00	L 17,858.43	100%
MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS					L 41,897.29		L -	0.00	L -	L 39,470.59		L 39,470.59		L 39,470.59	94%
46	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UNID	1.00	L 6,479.46	L 6,479.46		L -	1.00	L 6,479.46	L 6,479.46	1.00	L 6,479.46	1.00	L 6,479.46	100%
MODULO DE HASTA					L 6,479.46		L -	0.00		L 6,479.46		L 6,479.46		L 6,479.46	100%
47	SUM/INST DE PLACA DE ALUMINIO 20X24 CON LOGO DE 4X5	UNID						1.00	L 17,174.50	L 17,174.50	1.00	L 17,174.50	1.00	L 17,174.50	100%
48	MOLDURA DE GRANITO	ML						34.39	L 237.89	L 8,181.04	34.39	L 8,181.04	34.39	L 8,181.04	100%
49	VENTANA DE TUBO ESTRUCTURAL Y LAMINA GALV DE 1/8"	M2						21.38	L 1,830.34	L 39,132.67	21.38	L 39,132.67	21.38	L 39,132.67	100%
MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS					L -		L -			L 64,488.21		L 64,488.21		L 64,488.21	100%
SUB-TOTAL					L 623,856.00		L 481,897.69	0.00		L 620,731.96		L 138,834.27		L 620,731.96	100%
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7%					L 43,669.92		L 33,732.84	0.00		L 43,451.24		L 9,718.40		L 43,451.24	100%
UTILIDAD 13%					L 81,101.28		L 62,646.70	0.00		L 80,695.16		L 18,048.46		L 80,695.16	100%
TOTAL					L 748,627.20		L 578,277.23	0.00		L 744,878.35		L 166,601.13		L 744,878.35	100%

SUPERVISOR		CONTRATISTA	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE: DARVIN ULICE RODRIGUEZ		NOMBRE: CONSTRUCCION INGENIUM S. DE R.L. / YESSICA DEL SOCORRO MEDINA	
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023	





ESTIMACIÓN DE PAGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

CODIGO: AGUANQ-06-2023
 PROYECTO: PROYECTO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESCUELA RURAL MIXTA POLICARPO BONILLA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO
 UBICACIÓN: EL ESPINO, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
 EJECUTOR : CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R. L.
 ESTIMACION: NUMERO TRES
 PERIODO DEL: 21/11/2023 HASTA 29/11/2023

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		CONTRATO ORIGINAL + ORDEN DE CAMBIO # 1			EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO		% AVANCE
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L	47.00	L 30.29	L 1,423.63	47.00	L 1,423.63	47.00	L 30.29	L 1,423.63			47.00	L 1,423.63	100%
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	16.47	L 355.95	L 5,862.50	16.47	L 5,862.50	16.47	L 355.95	L 5,862.50			16.47	L 5,862.50	100%
3	REMOCION DE CAPA VEGETAL(INC. ACARREO 20 MTS)	M3	26.40	L 124.30	L 3,281.52	26.40	L 3,281.52	26.40	L 124.30	L 3,281.52			26.40	L 3,281.52	100%
4	ACARREO DE MATERIAL(DESPERDICIOS)	M3	53.59	L 180.33	L 9,663.88	53.59	L 9,663.88	53.59	L 180.33	L 9,663.88			53.59	L 9,663.88	100%
5	RELLENO COMP.CON MATERIAL SELECTO (IN.ACARREO)	M3	16.34	L 664.73	L 10,861.69	16.34	L 10,861.69	16.34	L 664.73	L 10,861.69			16.34	L 10,861.69	100%
6	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4Nu3, Nu2 @ 20 cm	UNID	13.00	L 704.78	L 9,162.14	13.00	L 9,162.14	13.00	L 704.78	L 9,162.14			13.00	L 9,162.14	100%
7	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5CM DE CAMA ARENA	M3	14.85	L 1,842.53	L 27,361.57	14.85	L 27,361.57	14.85	L 1,842.53	L 27,361.57			14.85	L 27,361.57	100%
8	SOLERA DE 20 X 20, 4No.3 y No.2 @ 15 cm, CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 439.73	L 14,950.82	34.00	L 14,950.82	34.00	L 439.73	L 14,950.82			34.00	L 14,950.82	100%
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 8 CM	M.L	12.55	L 136.28	L 1,710.31	12.55	L 1,710.31	12.55	L 136.28	L 1,710.31			12.55	L 1,710.31	100%
10	SOLERA DE 15 X 15, 3#3, 2# @ 15 CM, CONCRETO 1:2:2	M.L	10.50	L 243.34	L 2,555.07	10.50	L 2,555.07	10.50	L 243.34	L 2,555.07			10.50	L 2,555.07	100%
11	CASTILLO 15 X 15 4 # 3, Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L	38.60	L 364.33	L 14,063.14	38.60	L 14,063.14	38.60	L 364.33	L 14,063.14			38.60	L 14,063.14	100%
12	CASTILLO 15 X 15, 3 No.3 y No2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L	8.64	L 304.75	L 2,633.04	8.64	L 2,633.04	8.64	L 304.75	L 2,633.04			8.64	L 2,633.04	100%
13	LOSA DE LIBRERO 0.6 X 0.1 MTS (PULIDA)	M.L	8.00	L 643.33	L 5,146.64	8.00	L 5,146.64	8.00	L 643.33	L 5,146.64			8.00	L 5,146.64	100%
14	LIBRERO EMPOTRADO KINDER	UNID	1.00	L 19,850.57	L 19,850.57	1.00	L 19,850.57	1.00	L 19,850.57	L 19,850.57			1.00	L 19,850.57	100%
15	SOLERA 15 X 20 4Nu3 Y Nu2@ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L	34.00	L 368.93	L 12,543.62	34.00	L 12,543.62	34.00	L 368.93	L 12,543.62			34.00	L 12,543.62	100%
16	SOLERA 20 X 25, 4#3, 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L	22.84	L 677.58	L 15,475.93	22.84	L 15,475.93	22.84	L 677.58	L 15,475.93			22.84	L 15,475.93	100%
17	CARGADOR DE 10 X 15 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L	1.15	L 277.12	L 318.69	1.15	L 318.69	1.15	L 277.12	L 318.69			1.15	L 318.69	100%
18	BATIENTE DE 10 X 20 CM, 2#3; #2 @ 15 CM CONCRETO 1:2:2	M.L	8.55	L 234.98	L 2,009.08	8.55	L 2,009.08	8.55	L 234.98	L 2,009.08			8.55	L 2,009.08	100%
19	PARED DE BLOQUE SIMPLE SISADO 15(INHABILITADA)	M2	73.77	L 730.08	L 53,858.00	73.77	L 53,858.00	73.77	L 730.08	L 53,858.00			73.77	L 53,858.00	100%
20	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL	M2	21.38	L 1,445.33	L 30,901.16	0.00	L -	0.00	L 1,445.33	L -			1.00	L 6,205.29	100%
21	PUERTA METALICA (1X2.10m). TUBO IND.3/4, LAM 1/16	UNID	1.00	L 6,205.29	L 6,205.29	1.00	L 6,205.29	1.00	L 6,205.29	L 6,205.29			1.00	L 6,205.29	102%
22	PISO GRANITO TERRAZO 30 X 30	M2	83.64	L 782.88	L 65,480.08	83.64	L 65,480.08	85.27	L 782.88	L 66,756.18	1.63	L 1,276.09	85.27	L 66,756.18	101%
23	TECHO CANALETA 6", LAM ALUMINIZADA ONDULADA AULA	M2	108.63	L 570.34	L 61,956.03	108.63	L 61,956.03	110.00	L 570.34	L 62,737.40	1.37	L 781.37	110.00	L 62,737.40	108%
24	CIELO FALSO DE PVC CON PERFIL DE ALUMINIO	M2	83.64	L 559.35	L 46,784.03	83.64	L 46,784.03	90.10	L 559.35	L 50,397.44	6.46	L 3,613.40	90.10	L 50,397.44	100%
25	PIZARRA DE FORMICA 2.4 X 1.20(SUM/INST)	UNID	1.00	L 4,751.18	L 4,751.18	1.00	L 4,751.18	1.00	L 4,751.18	L 4,751.18			1.00	L 4,751.18	100%
26	ENTABICADO BLOQUE 30 CM (REPE/PUL)(***)	M.L	17.70	L 503.74	L 8,916.20	17.70	L 8,916.20	17.70	L 503.74	L 8,916.20			17.70	L 8,916.20	100%
27	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	85.77	L 16.46	L 1,411.77	85.77	L 1,411.77	85.77	L 16.46	L 1,411.77			85.77	L 1,411.77	100%
28	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e= 2 CM MORTERO DE 1:4	M2	191.39	L 244.98	L 46,886.72	191.39	L 46,886.72	191.39	L 244.98	L 46,886.72			191.39	L 46,886.72	100%
29	PINTURA DE ACEITE	M2	191.39	L 81.34	L 15,567.66	191.39	L 15,567.66	191.39	L 81.34	L 15,567.66			191.39	L 15,567.66	100%
MODULO DE AULA DE 9 X 8					L 501,591.97		L 470,690.82	0.00	L -	L 476,361.68		L 5,670.86		L 476,361.68	95%
30	TRAZADO Y MARCADO	M.L	9.38	L 30.29	L 284.12	9.38	L 284.12	30.00	L 30.29	L 908.70	20.62	L 624.58	30.00	L 908.70	320%
31	EXCAVACION MATERIAL TIPO II(SEMI DURO)	M3	10.67	L 355.95	L 3,797.99	10.67	L 3,797.99	10.67	L 355.95	L 3,797.99			10.67	L 3,797.99	100%
32	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM DE CAMA ARENA	M3	8.49	L 1,842.53	L 15,643.08	3.87	L 7,124.77	8.49	L 1,842.53	L 15,643.08	4.62	L 8,518.31	8.49	L 15,643.08	100%
33	SOBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 RELLENO CONC.M2	M2	11.88	L 879.16	L 10,444.42			0.00	L 879.16	L -					
34	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	11.49	L 153.49	L 1,763.60	0.00	L -	11.49	L 153.49	L 1,763.60	11.49	L 1,763.60	11.49	L 1,763.60	100%
35	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM CODALEADO FINO	M2	86.58	L 484.57	L 41,954.07	0.00	L -	24.39	L 484.57	L 11,818.66	24.39	L 11,818.66	24.39	L 11,818.66	28%
MODULO DE ACERAS AULAS Y CIRCULACION					L 73,887.28		L 11,206.87	0.00	L -	L 33,932.03		L 22,725.16		L 33,932.03	46%
36	INTERRUPTOR DOBLE	UNID	2.00	L 455.34	L 910.68	0.00	L -	2.00	L 455.34	L 910.68	2.00	L 910.68	2.00	L 910.68	100%
37	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	UNID	2.00	L 412.97	L 825.94	0.00	L -	2.00	L 412.97	L 825.94	2.00	L 825.94	2.00	L 825.94	100%
38	BASE PARA CONTADOR (200 AMPERIOS)(INHABILITADA)	UNID	1.00	L 3,751.18	L 3,751.18	0.00	L -	1.00	L 3,751.18	L 3,751.18	1.00	L 3,751.18	1.00	L 3,751.18	100%
39	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNID	1.00	L 4,266.78	L 4,266.78	0.00	L -	1.00	L 4,266.78	L 4,266.78	1.00	L 4,266.78	1.00	L 4,266.78	100%
40	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	1.00	L 341.88	L 341.88	0.00	L -	1.00	L 341.88	L 341.88	1.00	L 341.88	1.00	L 341.88	100%
41	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO	M.L	55.00	L 69.18	L 3,804.90	0.00	L -	55.00	L 69.18	L 3,804.90	55.00	L 3,804.90	55.00	L 3,804.90	100%

39	CENTRO DE CARGA DE 8 ESPACIOS	UNID	1.00	L 4,266.78	L 4,266.78				1.00	L 4,266.78	L 4,266.78
40	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	1.00	L 341.88	L 341.88				1.00	L 341.88	L 341.88
41	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO	M.L	55.00	L 69.18	L 3,804.90				55.00	L 69.18	L 3,804.90
42	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP TUBERIA EMT	M.L	26.00	L 101.10	L 2,628.60				26.00	L 101.10	L 2,628.60
43	CIRCUITO DE ILUM.HASTA 20 AMP, POLIDUCTO	M.L	15.00	L 69.18	L 1,037.70				15.00	L 69.18	L 1,037.70
44	ACOMETIDA AEREA, CONTADOR Y POSTE EXISTENTE	M.L	40.00	L 161.78	L 6,471.20	-15.00	L 161.78	-L 2,426.70	25.00	L 161.78	L 4,044.50
45	SUM/INST DE LUMINARIA DE TECHO LED	UNID	9.00	L 1,984.27	L 17,858.43		L -		9.00	L 1,984.27	L 17,858.43
MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS					L 41,897.29			-L 2,426.70			L 39,470.59
46	ASTA DE BANDERA CON ASIENTO DE MAMPOSTERIA	UNID	1.00	L 6,479.46	L 6,479.46		L -		1.00	L 6,479.46	L 6,479.46
MODULO DE HASTA					L 6,479.46						L 6,479.46
47	SUM/INST DE PLACA DE ALUMINIO 20X24 CON LOGO DE 4X5	UNID		L 17,174.50	L -	1.00	L 17,174.50	L 17,174.50	1.00	L 17,174.50	L 17,174.50
48	MOLDURA DE GRANITO	ML		L 237.89	L -	34.39	L 237.89	L 8,181.04	34.39	L 237.89	L 8,181.04
49	VENTANA DE TUBO ESTRUCTURAL Y LAMINA GALV DE 1/8"	M2		L 1,830.34		21.38	L 1,830.34	L 39,132.67	21.38	L 1,830.34	L 39,132.67
MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS					L -			L 64,488.21			L 64,488.21
SUB-TOTAL					L 623,856.00			-L 3,124.04	0.00		L 620,731.96
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7%					L 43,669.92			-L 218.68	0.00		L 43,451.24
UTILIDAD 13%					L 81,101.28			-L 406.13	0.00		L 80,695.16
TOTAL					L 748,627.20			-L 3,748.85	0.00		L 744,878.35

SUPERVISOR	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATISTA
FIRMA:  	 	FIRMA:  
NOMBRE: DARVIN ULICE RODRIGUEZ	NOMBRE: ERLIN OMAR RODRIGUEZ	NOMBRE: CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L. / YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS
FECHA: 9/9/2023	FECHA: 9/9/2023	FECHA: 9/9/2023
