




LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Identificación del Proyecto				
1. Propietario del Proyecto:		CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L.		
2. Sector o Sub sector:		BARRIO LA VIOLETA		
3. Nombre del Proyecto:		“RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL II ETAPA, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ.”		
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:		Casco urbano del Municipio		
5. Objetivo General del Proyecto:		Beneficiar a 5190 habitantes del municipio de Cane		
6. Objetivos Específicos del Proyecto		• Mejorar el acceso recreativo de las personas • Reconstrucción del parque central.		
7. Descripción del Proyecto:		El proyecto de reconstrucción del parque central del municipio de Cane, Construcción de escenario, instalación de alumbrado, estampado a la par de la iglesia católica.		
Elaboración del Proyecto				
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):		Beneficiar a 5190 habitantes		
2. Impacto en las planificaciones institucionales		No aplica		
3. Detalles de Contacto:		El contrato se firmó el 20 de Febrero del 2024, teniendo una vigencia de 150 días calendario a partir de la orden de inicio		
4. Fuente de Financiamiento:		Alcaldía municipal de Cane		
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo exacto, mostrar una proyección del mismo):		Lps. 2,963,270.12		
7. Fecha de Finalización:		21/07/2024		
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

EJECUCION	Jardinería, estampado, escenario	27/06/2024 09/08/2024	al Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 70.00%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	31/08/2024			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	Lluvias invernales, cambio de estructura de escenario			


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Proyectos




Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2024

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17166

L.: 994,377.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 13503Fecha de Emisión: 27/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019018064932La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de la segunda estimación del Proyecto de la Segunda Etapa de la Reconstrucción del Parque Municipal del Municipio de Cane Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 001 47110 11-001-01	Reconstrucción Y Mejoras Del Parque Municipal	994,377.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	994,377.90
	Monto Total:	994,377.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	994,377.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	994,377.90

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria	 Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Yessica Del Sacramento Medina claresIdentidad No.: 1201-1985-00481

0s+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA990b02EWZbt1x94li6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBevimWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==



MUNICIPALIDAD DE CANE
PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL II ETAPA
UBICACIÓN: UBICACIÓN: B" LA VIOLETA, CANE, LA PAZ
EJECUTOR: CONSTRUCTORA INGENIUM

ESTIMACION N° 2

PERIODO:

24/4/2024

AL

27/6/2024

64.00

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
33	COLUMNA CIRCULAR 15" DIAMETRO GN04, N03 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L	36.00	L 1,547.68	L 55,716.48	0.00	L -	36.00	L 55,716.48	36.00	L 55,716.48	100.00%
34	PARED BLOQ 15" CM, REL. REF. 1 #3 @ 20 y 1 #3 @ 1H	M2	18.16	L 1,169.83	L 21,244.11	0.00	L -	18.16	L 21,244.11	18.16	L 21,244.11	100.00%
35	SOLERA 15X20, 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2	M.L	31.91	L 357.71	L 11,414.53	0.00	L -	31.91	L 11,414.53	31.91	L 11,414.53	100.00%
36	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	M3	7.13	L 5,691.40	L 40,579.68	0.00	L -	7.13	L 40,579.68	7.13	L 40,579.68	100.00%
37	PISO DE PORCELANATO 33 X33 CM	M2	88.86	L 994.23	L 88,347.28	0.00	L -		L -	0.00	L -	0.00%
38	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	67.64	L 244.95	L 16,568.42	0.00	L -	67.64	L 16,568.42	67.64	L 16,568.42	100.00%
39	PINTURA DE ACEITE	M2	33.82	L 92.75	L 3,136.81	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
40	TECHO CURVO PARA ESCENARIO	M2	102.94	L 2,800.00	L 288,232.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
41	GRADAS DE ACCESO A ESCENARIO	M2	17.59	L 3,010.22	L 52,949.77	0.00	L -	17.59	L 52,949.77	17.59	L 52,949.77	100.00%
42	CIRCUITO DE FUER. HASTA 35 AMP.PVC ELEC 3/4	M.L	32.00	L 138.76	L 4,440.32	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
43	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP.PVC ELEC 1/2"	M.L	33.00	L 155.86	L 5,143.38	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
44	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP. PVC ELECTRICO 1/2"	M.L	60.00	L 98.46	L 5,907.60	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
45	TOMACORRIENTE TRIFILAR DE 50 AMP	M.L	2.00	L 741.17	L 1,482.34	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
46	TOMA CORRIENTE PARA INTERPERIE	M.L	6.00	L 317.78	L 1,906.68	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
47	LAMPARA EN TECHO	UND	4.00	L 1,204.98	L 4,819.92	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
48	SUM/INST DE LUZ SPOT EN PISO PARA ESCENARIO	UND	2.00	L 1,836.00	L 3,672.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
49	SUM/INST DE REFLECTORES PARA ESCENARIO EN TECHO	UND	2.00	L 4,224.35	L 8,448.70	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: - ESCENARIO					L 748,752.44		L 20,165.89		L 313,049.53		L 333,215.41	44.50%
MODULO: PASILLO LADO SUR												
50	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA	M2	1.39	L 687.50	L 955.63	1.39	L 955.63	0.00	L -	1.39	L 955.63	100.00%
51	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	ML	23.38	L 40.67	L 950.86	23.38	L 950.86	0.00	L -	23.38	L 950.86	100.00%
52	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	3.98	L 221.10	L 879.98	3.98	L 879.98	0.00	L -	3.98	L 879.98	100.00%
53	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	5.17	L -	L -	5.17	L -	0.00	L -	5.17	L -	0.00%
54	CIMENTACION MAMPOSTERIA, CAMA ARENA e=5cm, MORT 1:5	M3	3.98	L 1,680.99	L 6,690.34	3.98	L 6,690.34	0.00	L -	3.98	L 6,690.34	100.00%
55	SOLERA 15X20 4N#3 Y N#2 @ 20	ML	19.90	L 357.71	L 7,118.43	19.90	L 7,118.43	0.00	L -	19.90	L 7,118.43	100.00%
56	CASTILLO 15X15 4 N#3 Y No. 2 @ 15	ML	8.00	L 365.88	L 2,927.04	8.00	L 2,927.04	0.00	L -	8.00	L 2,927.04	100.00%
57	PARED DE BLOQUE 15 CM RELLENO DE CONCRETO	M2	7.16	L 797.88	L 5,712.82	7.16	L 5,712.82	0.00	L -	7.16	L 5,712.82	100.00%
58	SOLERA SUPERIOR DE 7.00X30.00 CM, 3#3 Y #2@15CM	ML	19.90	L 456.36	L 9,081.56	19.90	L 9,081.56	0.00	L -	19.90	L 9,081.56	100.00%
59	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	26.27	L 244.95	L 6,434.84	26.27	L 6,434.84	0.00	L -	26.27	L 6,434.84	100.00%
60	PINTURA DE ACEITE	M2	26.27	L 92.75	L 2,436.54	26.27	L 2,436.54	0.00	L -	26.27	L 2,436.54	100.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: PASILLO LADO SUR					L 43,188.04		L 43,188.04		L -		L 43,188.04	100.00%
MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS												
61	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	29.61	L 221.10	L 6,546.77	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
62	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	38.49	L -	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
63	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	M3	0.31	L 1,680.99	L 521.11	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
64	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO 1/2	M.L	338.00	L 98.46	L 33,279.48	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
65	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP, TUBO PVC 1/2	M.L	413.50	L 155.86	L 64,448.11	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
66	PEDESTALES DE CONCRETO 25X25X50 CM	UND	7.00	L 754.58	L 5,282.06	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
67	FAROL TIPO POSTE	UND	7.00	L 6,566.24	L 45,963.68	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
68	TOMA CORRIENTE PARA INTERPERIE	M.L	12.00	L 317.78	L 3,813.36	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: - INSTALACIONES ELECTRICAS					L 159,854.57		L -		L -		L -	0.00%
MODULO DE PORTICOS DE ENTRADA A PARQUE												
69	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	ML	28.60	L 40.67	L 1,163.16	28.60	L 1,163.16	0.00	L -	28.60	L 1,163.16	100.00%



MUNICIPALIDAD DE CANE
PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL II ETAPA
UBICACIÓN: UBICACIÓN: B' LA VIOLETA, CANE, LA PAZ
EJECUTOR: CONSTRUCTORA INGENIUM
ESTIMACION N° 2
PERIODO: 24/4/2024

AL

27/6/2024

64.00

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
MODULO: - PRELIMINARES												
1	CERCA PERIMETRAL LAMINA DE ZINC	ML	89.66	L 336.32	L 30,154.45	89.66	L 30,154.45	0.00	L -	89.66	L 30,154.45	100.00%
2	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO (PISO)	M3	72.55	L 313.00	L 22,708.15	72.55	L 22,708.15	0.00	L -	72.55	L 22,708.15	100.00%
3	DEMOLICION AREA DE ESCENARIO, INCLUYE TECHO, COLUMNAS, PISO, PAREDES.	M3	45.54	L 687.49	L 31,308.29	45.54	L 31,308.29	0.00	L -	45.54	L 31,308.29	100.00%
4	DEMOLICION DE CASETA PAREDES, TECHO, PISO	M3	35.54	L 687.49	L 24,433.39	0.00	L -	35.54	L 24,433.39	35.54	L 24,433.39	100.00%
5	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	199.72	L -	L -	199.72	L -	199.72	L -	399.44	L -	100.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: - PRELIMINARES					L 108,604.28		L 84,170.90		L 24,433.39		L 108,604.28	100.00%
MODULO: - EXPLANACION DEL TERRENO												
6	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	ML	253.95	L 40.67	L 10,328.15	253.95	L 10,328.15	0.00	L -	253.95	L 10,328.15	100.00%
7	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA E=10 CM	M3	83.78	L 376.25	L 31,522.23	83.78	L 31,522.23	0.00	L -	83.78	L 31,522.23	100.00%
8	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	108.91	L -	L -	108.91	L -	0.00	L -	108.91	L -	
9	RELLENO COMP. MATERIAL SELECTO E=10 CM	M3	83.78	L 749.90	L 62,826.62	83.78	L 62,826.62	0.00	L -	83.78	L 62,826.62	100.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: - EXPLANACION DEL TERRENO					L 104,677.00		L 104,676.99		L -		L 104,677.00	100.00%
MODULO: JARDINERAS												
10	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	ML	107.13	L 40.67	L 4,356.98	107.13	L 4,356.98	0.00	L -	107.13	L 4,356.98	100.00%
11	DEMOLICION DE PARED BLOQUE DE 15CM	M2	87.21	L 82.50	L 7,194.83	87.21	L 7,194.83	0.00	L -	87.21	L 7,194.83	100.00%
12	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	16.07	L 221.10	L 3,553.08	16.07	L 3,553.08	0.00	L -	16.07	L 3,553.08	100.00%
13	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	20.89	L -	L -	20.89	L -	0.00	L -	20.89	L -	
14	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	M3	16.07	L 1,680.99	L 27,013.51	7.00	L 11,766.93	9.07	L 15,246.58	16.07	L 27,013.51	100.00%
15	SOBRECIMENTACION DE MAMPOSTERIA	M3	8.03	L 1,722.44	L 13,831.19	0.00	L -	8.03	L 13,831.19	8.03	L 13,831.19	100.00%
16	SOLERA 15X20 4N3 Y N#2 @ 20	M.L.	107.13	L 357.71	L 38,321.47	35.00	L 12,519.85	72.13	L 25,801.62	107.13	L 38,321.47	100.00%
17	CASTILLO 15X15 4 N#3 Y No. 3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	55.00	L 357.92	L 19,685.60	14.00	L 5,010.88	41.00	L 14,674.72	55.00	L 19,685.60	100.00%
18	PARED DE BLOQUE 15 CM RELLENO DE CONCRETO	M2	43.51	L 797.88	L 34,715.76	15.40	L 12,287.35	28.11	L 22,428.41	43.51	L 34,715.76	100.00%
19	SOLERA DE 7X30 CM, 3#3 Y #2@15 CM	M.L.	107.13	L 456.36	L 48,889.85	35.00	L 15,972.60	72.13	L 32,917.25	107.13	L 48,889.85	100.00%
20	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	141.42	L 244.95	L 34,640.83	42.00	L 10,287.90	99.42	L 24,352.93	141.42	L 34,640.83	100.00%
21	PINTURA DE ACEITE	M2	141.42	L 92.75	L 13,116.71	0.00	L -		L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: JARDINERAS					L 245,319.81		L 82,950.39		L 149,252.70		L 232,203.10	94.65%
MODULO DE ESTAMPADO												
22	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	ML	241.55	L 40.67	L 9,823.84	0.00	L -	241.55	L 9,823.84	241.55	L 9,823.84	100.00%
23	CONCRETO HIDRAULICO e=10 CM DE 250 KG/CM2	M3	68.59	L 5,691.40	L 390,373.13	0.00	L -	25.50	L 145,130.70	25.50	L 145,130.70	37.18%
24	ESTAMPADO EN CONCRETO	M2	685.92	L 771.65	L 529,290.17	0.00	L -	255.50	L 197,156.58	255.50	L 197,156.58	37.25%
SUB TOTAL DEL MODULO: - ESTAMPADO					L 929,487.14		L -		L 352,111.12		L 352,111.12	37.88%
MODULO DE ESCENARIO												
25	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	ML	72.41	L 40.67	L 2,944.91	72.41	L 2,944.91	0.00	L -	72.41	L 2,944.91	100.00%
26	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	26.41	L 221.10	L 5,839.25	26.41	L 5,839.25	0.00	L -	26.41	L 5,839.25	100.00%
27	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	34.33	L -	L -	34.33	L -	34.33	L -	68.66	L -	
28	CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	M3	20.27	L 1,680.99	L 34,073.67	0.00	L -	20.27	L 34,073.67	20.27	L 34,073.67	100.00%
29	ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.30 , 6 N#4, a.s.	UNID	8.00	L 1,315.24	L 10,521.92	0.00	L -	8.00	L 10,521.92	8.00	L 10,521.92	100.00%
30	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	67.48	L 749.90	L 50,603.25	0.00	L -	67.48	L 50,603.25	67.48	L 50,603.25	100.00%
31	SOLERA 20X20, 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	31.91	L 406.49	L 12,971.10	28.00	L 11,381.72	3.91	L 1,589.38	31.91	L 12,971.10	100.00%
32	CASTILLOS 20X20 4#3, #2@20CM	ML	44.00	L 404.28	L 17,788.32	0.00	L -	44.00	L 17,788.32	44.00	L 17,788.32	100.00%

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE CANE
 PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL II ETAPA
 UBICACIÓN: UBICACIÓN: 8ª LA VIOLETA, CANE, LA PAZ
 EJECUTOR: CONSTRUCTORA INGENIUM
 ESTIMACION Nº 2

PERIODO: 24/4/2024

AL

27/6/2024

64.00

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
70	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	5.00	L 221.10	L 1,105.50	5.00	L 1,105.50	0.00	L -	5.00	L 1,105.50	100.00%
71	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	6.50	L -	L -	6.50	L -	0.00	L -	6.50	L -	-
72	ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20, 3 NÚ3, NÚ 3 @ 20 cms	M.L.	10.00	L 672.98	L 6,729.80	10.00	L 6,729.80	0.00	L -	10.00	L 6,729.80	100.00%
73	COLUMNA 30 X 30 4NÚ4, NÚ2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	58.80	L 951.63	L 55,955.84	40.00	L 38,065.20	18.80	L 17,890.64	58.80	L 55,955.84	100.00%
74	VIGA AEREA DE 20X25, 4#4, #2@20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	34.40	L 631.61	L 21,727.38	0.00	L -	34.40	L 21,727.38	34.40	L 21,727.38	100.00%
75	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M2	80.24	L 251.73	L 20,198.82	0.00	L -	80.24	L 20,198.82	80.24	L 20,198.82	100.00%
76	PINTURA DE ACEITE	M2	80.24	L 92.75	L 7,442.26	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	-
SUB TOTAL DEL MODULO: - PORTICOS DE ENTRADA A PARQUE					L 114,322.76		L 47,063.66		L 59,816.84		L 106,880.50	93.49%
MODULO DE GENERALES												
77	PLANTAS ORNAMENTALES	GLB	1.00	L 180,157.50	L 180,157.50	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
78	BANCAS METALICAS DE 2 X 0.6 MTS	UND	10.00	L 8,379.50	L 83,795.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
79	ENGRAMADO POR BLOQUES EN JARDINERAS INCLUYE TIERRA VEGA	M2	1158.92	L 211.50	L 245,111.58	0.00	L -	700.00	L 148,050.00	700.00	L 148,050.00	50.40%
SUB TOTAL DEL MODULO: GENERALES					L 509,064.08		L -		L 148,050.00		L 148,050.00	29.08%
COSTO PROYECTO					L 2,963,270.12		L 382,215.87		L 1,046,713.58		L 1,428,929.45	48.22%

EJECUTOR		SUPERVISION UTM		UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L		INGENIERIA DE LA PAZ		ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE	
FECHA: 22 DE JUNIO 2023		NOMBRE ING. MANUEL OSORIO		NOMBRE ING. LUIS FERNANDO MARTINEZ	
		FECHA: 27 DE JUNIO 2023		NOMBRE PROF. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES	

Barrio La Merced, media cuadra al sur del Parque Mabuchi
Ishisuque, casa color beige, La Paz, La Paz, Honduras C.A.
Cel.: 3184-1319 E-mail: constructoraingenium@hotmail.com

Día	Mes	Año
27	06	24

R.T.N.: 12049995434017

Dirección: B° La violeta, Lane, La Paz

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz. R.T.N. 12011978002898; Cel.:9952-8360; Barrio La Concepción. La Paz. La Paz, Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.		Deducciones y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
	Pago de la segunda estimación del proyecto de la Segunda etapa de La Reconstrucción del Parque Municipal del Municipio de Cane Casco Urbano.				904,377.90
Total					

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 a 000-001-01-00000500
Fecha Límite de Emisión: 16/04/2025
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐
Crédito ☐

Datos del Cliente Exonerado:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:


Firma _____

Deducciones y Rebajas Otorgadas	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Alicuota 0% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	904,377.90

Cant. en Letras: novecientos noventa y cuatro mil trescientos
setenta y siete lempiras con 90 l.00 cts.

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	LPR-CANE-01-2024
NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL II ETAPA
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	CANE
ALDEA:	"BARRIO LA VIOLETA"

FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	SEGUNDA ESTIMACION DEL:	24/4/2024	AL:
------------------------	---------------	-------------------------	-----------	-----

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 2,963,270.12
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	L -
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	L 2,963,270.12
Monto de SEGUNDA Estimacion	L 1,046,713.58

VoBo

SUPERVISOR MAMCEPAZ

VoBo

SUPERVISOR MUNICIPALIDAD

Retencion Sobre Anticipo	L 1,046,713.58
	L 2,963,270.12

% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
35.32%	1.25	44.15%	L -	L -

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

EJECUTOR PRESENTA FIANZA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Retencion de Calidad de obra	L 1,046,713.58
	L 2,963,270.12

FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
1.050	5.00%	L 1,046,713.58	L 52,335.68

RESUMEN

Monto Estimado	L 1,046,713.58
Menos Deducion de Anticipo	L -
Menos Deducion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 52,335.68
TOTAL A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION	L 994,377.90

Monto del Anticipo	L -	100.00%
	L -	#iDIV/0!
TOTAL AMORTIZADO	L -	#iDIV/0!
FALTA POR AMORTIZAR	L -	#iDIV/0!

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Cane, la Paz 27 de junio del 2024

FRANCICO BSUTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL
DE CANE, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: "CONSTRUCCION DE PARQUE
MUNICIPAL."

Estimada doctora:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME 2, del proyecto en mención; comprende el periodo del 30 de abril al 27 de junio 2024

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING MAURO RENÉ OSORIO
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepaz.

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA ETAPA
CODIGO:	LPR-CANE-01-2024
UBICACIÓN:	CASCO URBANO, CANE, DEPARTAMENTO LA PAZ.
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:	El proyecto consiste en la construcción de segunda etapa del parque municipal del municipio de cane
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD.

INVERSION DEL PROYECTO:

CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	ORDEN DE CAMBIO	APORTE	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L2,963,270.12	L. 0.00	L. 0.00	L2,963,270.12
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto).	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L2,963,270.12



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	CONSTRUCTORA INGENIUM
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: Mauro Rene Osorio Maldonado
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	3 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	No hubo
FECHA DE ORDEN DE INICIO	23 de febrero 2024
PLAZO CONTRACTUAL	150 DIAS
AMPLIACION	NO HAY
FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA	22 de julio 2424

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se prepara el informe que corresponde a la estimación número 2 del proyecto del parque municipal el cual presenta un avance a la fecha del 48.22% de las actividades del proyecto realizadas.

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Observaciones

- Se construyo de la manera correcta y establecida en los planos y actividades contratadas.

Situaciones presentadas

- No se encontraron.

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un ingeniero civil con experiencia en el ramo de la construcción, a la fecha se observa una planificación adecuada al proyecto, con un desempeño apto para ejecutar obras de construcción.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. ING RESIDENTE (1)
2. MAESTRO DE OBRA (2)
3. ALBAÑILES (5)
4. AYUDANTE (7)

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
4. Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoria municipal.
5. Apertura de Bitácora.
6. Verificar calidad de materiales
7. Evaluar el personal contratado.

CONCLUSIONES.

1. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
2. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
3. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



ACTIVIDADES REALIZADAS

CERCA PERIMETRAL LAMINA DE ZINC	100%
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO (PISO)	100%
DEMOLICION AREA DE ESCENARIO, INCLUYE TECHO, COLUMNAS, PISO, PAREDES.	100%
DEMOLICION DE CASETA PAREDES, TECHO, PISO	100%
ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	100%
TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	100%
CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA E=10 CM	100%
RELLENO COMP. MATERIAL SELECTO E=10 CM	100%
TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	100%
DEMOLICION DE PARED BLOQUE DE 15CM	100%
EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	100%
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	100%
SOBRECIMENTACION DE MAMPOSTERIA	100%
SOLERA 15X20 4Nº3 Y Nº2 @ 20	100%
CASTILLO 15X15 4 Nú3 Y No. 3 @ 15 CONCRETO 1:2:2	100%
PARED DE BLOQUE 15 CM RELLENO DE CONCRETO	100%
SOLERA DE 7X30 CM, 3#3 Y #2@15 CM	100%
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	100%
TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	100%
CONCRETO HIDRAULICO e=10 CM DE 250 KG/CM2	37%
ESTAMPADO EN CONCRETO	37%
TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	100%
EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	100%
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA	100%
ZAPATA AISLADA 0.80 x 0.80, e=0.30 , 6 Nú4, a.s.	100%
RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	100%
SOLERA 20X20, 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2	100%
CASTILLOS 20X20 4#3,,#2@20CM	100%
COLUMNA CIRCULAR 15" DIAMETRO 6Nú4, Nú3 @ 15, CONCRETO 1:2:2	100%
PARED BLOQ 15" CM, RELL. REF. 1 #3 @ 20 y1 #3 @ 1Hi	100%
SOLERA 15X20, 4#3, #2@20 CONCRETO 1:2:2	100%
TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	100%
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	100%
GRADAS DE ACCESO A ESCENARIO	100%
DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO/ MAMPOSTERIA	100%
TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	100%
EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	100%
CIMENTACION MAMPOSTERIA, CAMA ARENA e=5cm, MORT 1:5	100%





Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz

SOLERA 15X20 4Nº3 Y Nº2 @ 20	100%
CASTILLO 15X15 4 Nº3 Y No. 2 @ 15	100%
PARED DE BLOQUE 15 CM RELLENO DE CONCRETO	100%
SOLERA SUPERIOR DE 7.00X30.00 CM, 3#3 Y #2@15CM	100%
REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	100%
PINTURA DE ACEITE	100%
TRAZADO Y MARCADO CON ESTACIÓN TOTAL	100%
EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	100%
ZAPATA CORRIDA 0.50, e=0.20 , 3 Nú3, Nú 3 @ 20 cms	100%
COLUMNA 30 X 30 4Nú4, Nú2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	100%
VIGA AEREA DE 20X25, 4#4, #2@20, CONCRETO 1:2:2	100%
REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	100%
ENGRAMADO POR BLOQUES EN JARDINERAS INCLUYE TIERRA VEGA	60%



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



FOTOGRAFIAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO



Handwritten signature



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz


Marcala, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz





Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacía, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz

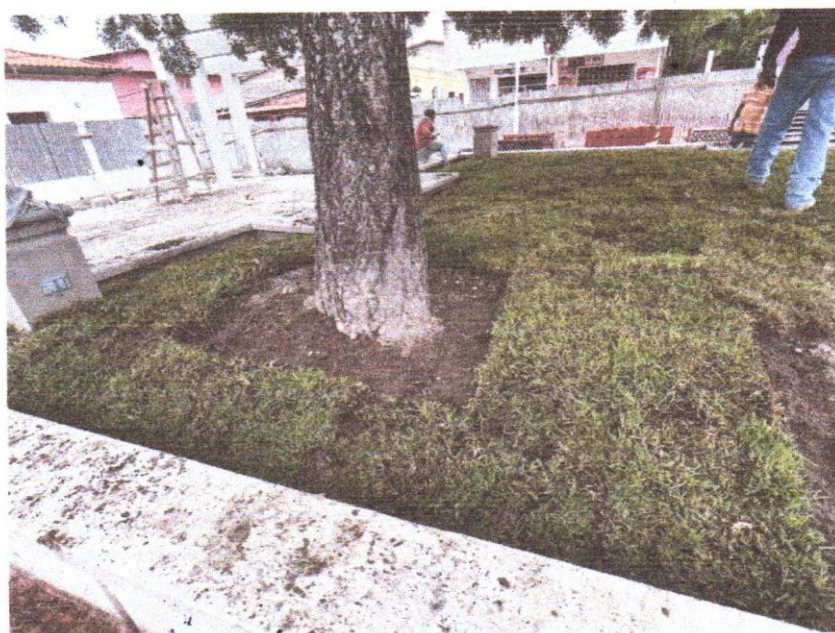

4 de mayo 2024

Hoja

Nº 00009

Clima soleado

Se concluyeron y fundieron las columnas del portico #11 frente a la alcaldía.

Continuamos pegando bloques en las jardineas cabe resaltar que la jardineira que está por el kiosco de la parada de buses cambio de dueño. Se hizo mas grande debido a que se le hacia según planos se tenia que cortar una palmera que está en buen estado.



11 mayo 2024

Se desmantelaron las columnas del portico #11 y se echo las vigas del mismo portico.

Se echo las columnas del portico #12, y se realizo el relleno con material seleccionado del mismo co.

Continuamos pegando bloques en las jardineas.



Bitácora Nº 040539

17 de mayo 2024

Hoja

Nº 100010

Continuamos con el ma soleado

Se fundieron las vigas del portico #1
y las columnas del portico #2

Empezamos con el armado de acero para

la solera superior de las jardinerías y
su encofrado.

~~MM/PM/DH~~

5 de mayo 2024

ma soleado y las cerchas en
las condiciones.

Continuamos trabajando en los porticos
armado colocando el armado de
las columnas del portico #2
y cubriendo con material selecto los
cuyos el mismo. Se dejó la
librería importada en los porticos
para colocar luz led.

Personal trabajando en el proyecto

4 albañiles

10 ayudantes

maestro de obra

Ing Residente

~~MM/PM/DH~~

05 Junio 2024

Hoja

Nº 00011

Clima Soleado

Se lindieron las soleras superior de las
jardineas, y las vigas cercas al portico #2

Comenzamos a repellar las jardineas por la
parte interior.

Comenzamos a llenar de tierra las jardineas
a conformar cada una de ellas.

Se corrigió el trazado y marcado del
escenario debido que se realizó un
nuevo diseño arquitectónico.

Se excavó con las nuevas medidas
una profundidad de 1.25 mts y
40 cm mas donde colocamos dados
de concreto para las columnas.

Empezamos a linder los dados de
concreto y una fundación de
mampostería de 0.70 cm.

Comenzamos a preparar el suelo para el
estampado en el área frente a la
iglesia.



Bitácora Nº 040539

7 de Junio 2024

Hoja

Nº 100012

Clima soleado

Empezamos a estampar frente a la iglesia
se desmontaron las vigas cierra de los
dos porticos y comenzamos con el tallado
de cada una de ellas.

Continuamos con el repello de las jardineras

Para la cimentación del escenario luego de
los 70 cm de mampostería colocamos
2 hileras de bloque 6" con reforzo entre
las 2 hileras de varilla de 3/8" y
betón de virilla 3/8" de cemento
una solera intermedia de 20 cm.

Empezamos la excavación para zapatas
cristadas donde van las estructuras
metálicas para el escenario

y se excava ciego donde va
el nicho eléctrico.

Continuamos con la mano de obra

Trabajando en esto estan las siguientes
personas:

- 1 Ingeniero civil
- 1 maestro de obra
- 4 albañiles
- 13 ayudantes



13 de Junio 2024

Hoja

Nº 000013

Clima opaca con lluvia por la tarde.

En el escenario continuamos con la pared de bloque de 3 hileras con varilla $3/8"$ de refuerzo y encostramos y fundimos solera superior de 20cm.

Continuamos con la excavación de los zapatos para las estructuras del escenario.

Comenzamos con el repello por la parte interior del escenario.

Empezamos a poner los partidos #1 y #2.

Continuamos estampando el arenado frente a la iglesia con un concreto de 3,500 PSI y color Ivory Sand con desmoldante Brown-tone.

Rellenamos con material selecto el escenario.

Fumigamos las jardinas para el control de maleza.

Personal trabajando: 1 Ing Residente
1 maestro de obra, 5 albañiles,
12 ayudantes.



Bitácora Nº 040539

22 de Junio 2024

Hoja

Nº 00014

Clima con chubascos

Continuamos repellando la pared exterior del escenario y continuamos con el relleno de material selecto y se compacta con la balanzal.

Se repello el nicho eléctrico

○ Terminamos de pulir los porticos

Comenzamos con el engramado por bloques de las jardinerías

Encoframos y lindamos las gradas frontales y lateral izquierdo del escenario

○ Mismo personal trabajando en el sitio.



24 de junio 2021

Hoja

Nº 00015

Clima fresco con probables lluvias

Con nuimos con el collar del escenario

En nuimos y tendemos las guías del

lado derecho cada guía tiene una

huella de 30cm y contra huella de 17cm

Comenzamos con el trabajo en las estructuras
metálicas del escenario haciendo las
figuras y ángulos en el suelo para una
mayor exactitud

Estamos utilizando tubo estructural
de 4x4 chapeado

El día de hoy contamos con la visita
del ingeniero supervisor Mauro Osorio de
INAMCERPAZ para verificar las cantidades
de obra de la estimación II de
este proyecto





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-23854

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019018064932**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-23854 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419991310 de fecha 01/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.


ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 35741214442, presentada el 17/03/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-24-10500-23854** o mediante el siguiente código QR:



007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00012035

Cane, 27/06/2024
Lugar y Fecha

Yessica Del Socorro Medina clares
Páguese a la orden de

L 994,377.90

novecientos noventa y cuatro mil trescientos setenta y siete con 90/10000 Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ



Firma(s)



⑆01001142⑆00007614000218⑆00012035



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org





LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

