



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2024
Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12270

L.: 266,521.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14774

Fecha de Emision: 18/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE

Id/RTN: 0607198800113

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripcion:

Segundo desembolso del 30% del contrato Proyecto construccion de Modulo sanitario y tanque de agua 2500 Lts y obras adicionales en el Instituto Jacobo V. Carcamo del Casco Urbano del Municipio (Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 016 001 000 23400 11-011-08	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PRI5-6 TANQUE DE AGUA DE 2,500 GAL Y PILETA Y OBRAS ADICIONALES INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	266,521.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	266,521.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	266,521.21

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por: Selvin Javier Baquedano Valle
 Identidad No.: 0607198800113

0s+js/9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyuCUZA9yMTTnxVmpyDxCozMjLADcAhRldWA5dl8cR4mai6eBtVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKtsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2024
Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12270

L.: 266,521.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14774

Fecha de Emision: 18/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE

Id/RTN: 0607198800113

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripcion:

Segundo desembolso del 30% del contrato Proyecto construccion de Modulo sanitario y tanque de agua 2500 Lts y obras adicionales en el Instituto Jacobo V. Carcamo del Casco Urbano del Municipio (Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 016 001 000 23400 11-011-08	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PRI5-6 TANQUE DE AGUA DE 2,500 GAL Y PILETA Y OBRAS ADICIONALES INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	266,521.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	266,521.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	266,521.21

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por: Selvin Javier Baquedano valle
 Identidad No.: 0607 1988 00113

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIdWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S
 AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOi81Np9hXm/4



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 2433-0127, 4233-0128, 2433-0232



AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (a): SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE con Tarjeta de
Identidad No. 0607-1988-00113
La cantidad de Lps. 266,521.21

(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS
CON 21/100 ctvs.)
Cantidad en letras

Por concepto de:

SEGUNDO DESENBOLSO DEL 30% DEL CONTRATO PROYECTO CONSTRUCCION DEL
MODULO SANITARIO Y TANQUE DE AGUA 2500 LTS Y OBRAS ADICIONALES
INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO DEL CASCO URBANO.

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de
Yoro a los 18 días de JULIO del Año 2024.


Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



CONTRATO DE OBRA

Por una parte, el señor **Carlos Alberto Zuniga Lagos**, hondureño, mayor de edad, soltero, vecino de este municipio, Ingeniero Civil, con Documento de Identificación Nacional **1802-1956-00086** en su condición de Alcalde del Municipio de Arenal, departamento de Yoro, con Credencial emitida por el Tribunal Superior de Elecciones bajo acta número 77-2021 de fecha 27 de enero del año 2022, quien en adelante llamaremos **CONTRATANTE** por otra parte el señor **Selvin Javier Baquedano Valle**, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, Con Documento de Identificación Nacional **0607-1988-00113** con domicilio en Tegucigalpa, Distrito Central, Calzada Guadalupe, Sendero La Selecta, Local 1 Gerente General de la Empresa **Construcciones Baquedano, Sociedad de Responsabilidad Limitada**, con Registro Tributario Nacional **08019019152415** con operaciones en todo el territorio nacional a quien en adelante llamaremos **CONTRATISTA**.

DECLARACIONES

I.- Declaran ambas partes que, el objeto de este contrato, es para la ejecución, de los proyectos del Programa Nacional de Infraestructura Escolar, por medio de la Construcción de varias obras consistentes en:

1) **MODULO SANITARIO, TANQUE DE 2500 LTS=661.38Galones Y OBRAS DE MITIGACION CON SUS DERIVADAS ACTIVIDADES**, en el Instituto **JACOBO V. CARCAMO**. Valor de estas obras es de **Ochocientos Ochenta y Ocho, Mil Cuatrocientos Cuatro Lempiras con Cero Cinco Centavos (Lps. 888,404.05)**

II.- Declaran ambas partes que, para regular adecuadamente su relación, sirven en someterse a las siguientes Clausulas:

PRIMERA. El objeto del presente contrato corresponde a la construcción de cada una de las obras antes descritas en el casco urbano de Arenal, Yoro.

SEGUNDA. El plazo de ejecución para las obras será de tres meses **(90) días hábiles**. El **CONTRATISTA** se compromete a realizar la obra de forma independiente, iniciando el **jueves 13 de junio del 2024** y terminando el **13 de septiembre del 2024**.



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



TERCERA. Valor de la obra. El **CONTRATANTE** está obligado a pagar al **CONTRATISTA**, por la ejecución total de las obras, la cantidad total de Ochocientos Ochenta y Ocho, Mil Cuatrocientos Cuatro Lempiras con Cero Cinco Centavos (Lps. 888,404.05)

CUARTA. Forma de pago. El pago de la obra total se podrá efectuar a través de transferencia bancaria a la cuenta corriente N. 11-443-000044-4, del Banco de Occidente, a nombre del **CONTRATISTA**, en 4 partes, **20% a la firma del presente contrato, 30% al presentar primer informe de avance de las obras, 30% al presentar segundo informe de avance de las obras, y 20% a la entrega de las obras, a entera satisfacción del CONTRATANTE.**

DERECHOS DE LA PARTE CONTRATANTE

- A.- Ser informado de cualquier problema que se presente durante la ejecución de la obra.
- B.- Exigir la culminación de la obra en el día estipulado en este contrato.

RESPONSABILIDADES DE LA PARTE CONTRATANTE

- A.- Facilitar al **CONTRATISTA** toda la información que necesitar para la ejecución de la obra.
- B.- Proporcionar los comprobantes de pago pedido por el **CONTRATISTA**.

DERECHOS DE LA PARTE CONTRATISTA

- A.- Exigir la colaboración indispensable de la parte **CONTRATANTE** para determinadas etapas de las obras.
- B.- Recibir su pago a tiempo, según las condiciones acordadas en este contrato.

RESPONSABILIDADES DE LA PARTE CONTRATISTA

- A.- Elaborar y entregar informes sobre el progreso de la ejecución de las obras a la parte **CONTRATANTE**.
- B.- Informar de retrasos o inconvenientes en la ejecución de las obras que puedan impedir la entrega a tiempo.



**Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal**
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO

- I.- El desistimiento de mutuo acuerdo mediante nota, si ambas partes deciden no continuar con el proyecto
- II.- La muerte del CONTRATISTA es causa de extinción del contrato, porque la responsabilidad del CONTRATISTA es personal.
- III.- La imposibilidad sobrevenida en la ejecución por causas independientes a la voluntad del CONTRATISTA.

Se firma el presente contrato por duplicado, en el municipio de Arenal, Yoro el 13 de junio del 2024.



[Handwritten Signature]
Carlos Alberto Zuniga Lagos
Alcalde Municipal **CONTRATANTE**



[Handwritten Signature]
Selvin Javier Baquedano Valle
CONTRATISTA

ALCALDIA MUNICIPAL

ARENAL-YORO

INFORME DE AVANCE No.1 (20%)

CENTROS EDUCATIVOS:

- INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO***
- KINDER GABRIELA MISTRAL***
- CEB. LUCAS QUEZADA.***
- ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE***

FECHA:

19-JULIO-2024

**EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES
BAQUEDANO S. de R.L.**

INFORME DE AVANCE No.1 (20%)

CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE YORO.

EL DIA VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2024 SE INICIA CON LA COLOCACION DE LOS ROTULOS EN LAS UBICACIONES SUGERIDAS POR LAS AUTORIDADES DE LO CENTROS EDUCATIVOS EN LOS CUALES SE EJECUTARAN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES.



ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE EN LA ALDEA DE ZAPAMATEPE E INSTITUTO JACOBO V CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL.

SE CONTINUA CON LA MISMA ACTIVIDAD EL DIA LUNES 17 DE JUNIO EN EL KINDER GABRIELA MISTRAL EN EL MUNICIPIO DE ARENAL Y EL CEB LUCAS QUEZADA UBICADO EN LA ALDEA DE TEGUAJAL.

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS OBRAS A REALIZAR EN DICHOS CENTROS EDUCATIVOS Y CUYAS UBICACIONES TAMBIEN LAS SUGIRIERON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES:

ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE: AULA DE 6X8 Y MODULO SANITARIO.

INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO: MODULO SANITARIO, TANQUE.

KINDER GABRIELA MISTRAL: MODULO SANITARIO Y TANQUE.

CEB LUCAS QUEZADA: MODULO SANITARIO, TANQUE Y FOSA SEPTICA.

LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE AREAS, MARCADO Y NIVELETEADO ASI COMO CON LAS EXCAVACIONES SE COMENZARON EL DIA MARTES 18 DE JUNIO EN LOS LUGARES QUE SE INDICARON POR LAS AUTORIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ARENAL Y TEGUAJAL Y EL DIA 21 EN EL DE LA ALDEA DE ZAPAMATEPE.

EL DIA JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE JUNIO SE PRESENTA EL ING. ELIO NUÑE POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ASIGNA NUEVAS UBICACIÓN EN EL INSTITUTO JACOBO V CARCAMO Y CEB LUCAS QUEZADA PARA EL MODULO SANITARIO Y EN LA ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE ASI COMO LAS NUEVAS UBIACIONES DE LOS ROTULOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

~~EN EL INSTITUTO JACOBO CARCAMO Y CEB LUCAS QUEZADA YA SE HABIAN HECHO LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MARCADO Y NIVELETEADO Y SE HABIA COMENZADO CON LAS EXCAVACIONES LAS CUALES YA TENIAN AVANZADAS ENTRE UN 35-40 % Y YA SE HABIAN CORTADO ARBOLES EN EL INSTITUTO JACOBO V CARCAMO.~~

EL SABADO 22 DE JUNIO SE COMIENZA CON LAS ACTIVIDADES DE REMOCION DE MADERA PARA NIVELETAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE DIERON NUEVAS UBICACIONES Y SE COMIENZA TAMBIEN CON EL MARCADO Y NIVELETEADO, EL DIA 24 DE JUNIO SE COMIENZA CON LAS EXCAVACIONES EN LAS NUEVAS UBICACIONES LOS TERRENOS TIENEN UN PORCENTAJE DE IRREGULARIDAD LO CUAL AFECTO LA ALTURA EN LA CIMENTACION.

SE ESTA TRABAJANDO EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y ARMADO DE HIERRO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO SOLERAS COLUMNAS CASTILLOS Y JAMBAS.

EL DIA 27 DE JUNIO SE HACE LA PRIMERA COMPRA DE BLOQUES EN LA FABRICA DE BLOQUES LA MODERNA UBICADA EN OLANCHITO LOS CUALES SON DE EXCELENTE CALIDAD CON PRUEBAS DE LABORATORIO.

LAS EXCAVACIONES EN LOS MODULOS SANITARIOS DEL KINDER GABRIELA MISTRAL, INSTITUTO JACOBO V CARCAMO Y CEB LUCAS QUEZADA SE FINALIZAN EL DIA 29 DE JUNIO Y SE PROCEDE A LA CIMENTACION

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN PLANOS LAS CUALES FINALIZAN EL DIA 6 DE JUNIO Y SE COMIENZA CON LA COLOCACION DE BLOQUE (LINEA MUERTA) PARA LLEGAR AL NIVEL REQUERIDO DE SOLERA INFERIOR, COMO SE MENCIONO ANTERIORMENTE LOS TERRENOS PRESENTAN UN % DE IRREGULARIDAD ESPECIALMENTE EN EL CEB LUCAS QUEZADA E INSTITUTO JACOBO V CARCAMO.

EN LA ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE SE CAMBIO UBICACIÓN EL AULA Y SE HABLO CON EL SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON RESPECTO A LOS ZANJOS CORRECTOS Y SE ATERRARON LOS EXISTENTE Y SE PROCEDIO CON LA EXCAVACION DE LOS NUEVOS Y EL DIA 6 DE JUNIO EN DICHA ESCUELA SE SIGUE CON LAS CIMENTACIONES.

EL DIA 30 DE JUNIO SUPERVISION CONFIRMA QUE EN EL CEB LUCAS QUEZADA LA FOSA SEPTICA QUE SE VA EJECUTAR ES LA TIPO II Y NO LA TIPO I EN LOS PLANOS ANTERIORES.

EL DIA 9 DE JULIO SE CULMINA FUNDICION DE SOLERA INFERIOR EN EL KINDER GABRIELA MISTRAL.

EL DIA 12 DE JULIO SE COMIENZA CON SOLERA INFERIOR EN EL CEB LUCAS QUEZADA Y EN LA ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE EL DIA 13.

NOTA: EXISTEN PROBLEMAS CON EL PERSONAL QUE ASIGNARON EN EL CEB LUCAS QUEZADA DE LOS CUALES SE LE INFORMO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR ATRASO EN EL PROGRESO DE LA OBRA.

~~NO SE TRABAJO EN EL TANQUEN DEL JACOBO CARCAMO YA QUE LAS AUTORIDADES ESTABAN ANALIZANDO EL CAMBIO DE REPARACION DE TANQUE EXISTENTE DEL INSTITUTO.~~

ACTIVIDADES:

INSTITUTO JACOBO V CARCAMO MODULO SANITARIO Y TANQUE.

LIMPIEZA, MARCACION DE EJES.



EXCAVACIONES, CIMENTOS Y SOLERA.





ACTIVIDADES:

KINDER GABRIELA MISTRAL MODULO SANITARIO Y TANQUE.



ACTIVIDADES:

CEB LUCAS QUEZADA FOSA SEPTICA TIPO II, MODULO SANITARIO Y TANQUE.

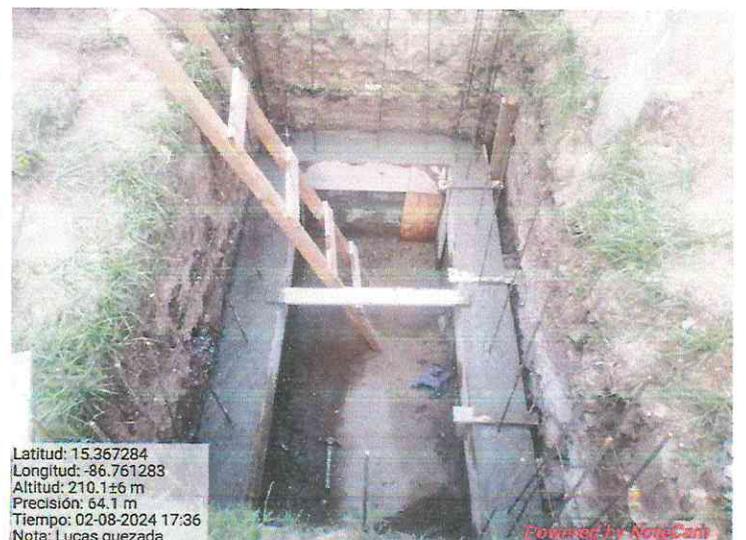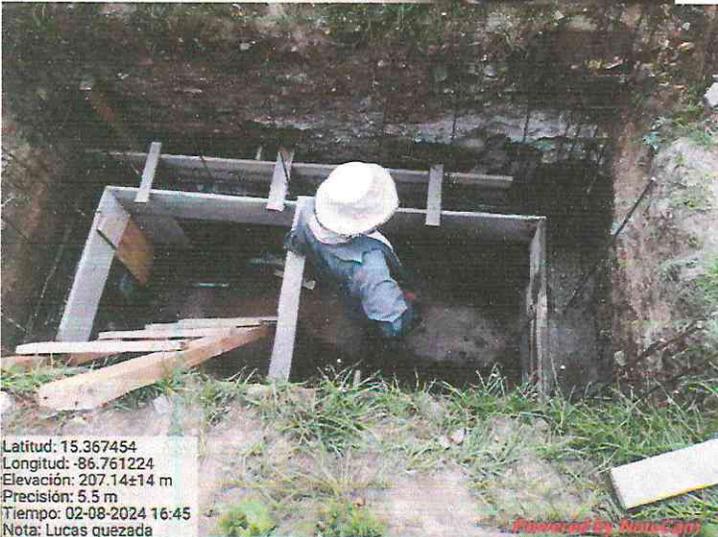




ACTIVIDADES:

ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE AULA 6X8 Y MODULO SANITARIO.



Tiempo: 06-07-2024 10:32
Nota: Proyecto carlos izaguirre modulo sanitario

Powered by NoteCam

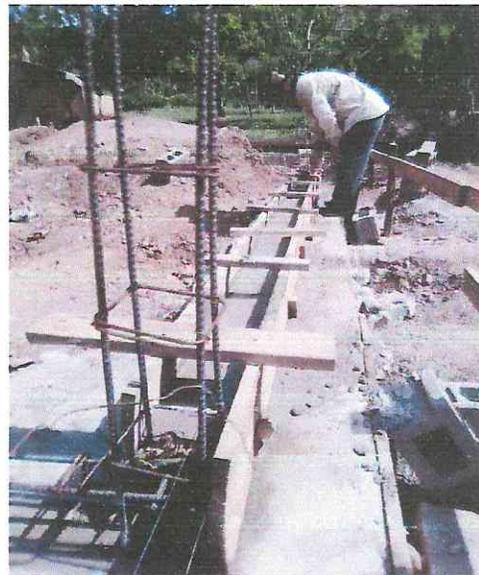





Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232
CERTIFICACION



La suscrita secretaria municipal del municipio de Arenal Dpto. de Yoro por medio de la presente CERTIFICA QUE: En el libro de actas municipales que lleva en esta oficina del año 2023, se encuentra el acta que literalmente dice: **ACTA N° 11**, En reunión ordinaria celebrada por la honorable corporación municipal del municipio de Arenal, Departamento de Yoro el Viernes 24 de mayo del año 2024. La sesión fue precedida por el infrascrito alcalde municipal Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos Y Vice Alcalde Lic. Senia Aracely Andino, Regidor 1 Abog. Luis Enrique Cárcamo Martínez Regidora 2. Lic. Noelia Vidalina Martínez, Regidora 3. Blanca Lisseth Andino Contreras, Regidor 4. Lic. Enil Edgar Vegas, Regidor 5. Lic. José Antonio Mejía Vallecillo, Regidor 6. Salma Yoconda Martínez Nuñez y también estuvieron presente miembros de la comisión ciudadana de transparencia y Comisionado Municipal de Derechos Humanos y por ende la secretaria municipal que da fe y lectura a la siguiente agenda; 1. Invocación a Dios. 2. Comprobación del quórum. 3. Apertura de la Sesión .4. Lectura Discusión y Aprobación de la Agenda .5. Revisión y Aprobación Acta Anterior .6. Lectura de correspondencia. 7. Temas: 1. Elaboración de rótulo Xiomara si cumple con una contraparte municipal para los proyectos de Educación. 2. Ampliación presupuestaria 2024 por el ingreso de fondos del Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar que fueron acreditados el 17 de mayo 2024 para los proyectos de los centros educativos priorizados Lps. 3,300,000.00. 3. Compromiso de continuar con la gestión de legalizar los terrenos escolares para hacer traspasado a la Secretaría de educación.4. Los proyectos identificados serán ejecutados tal como se estipula en el artículo 104 de las disposiciones generales del presupuesto. 5. Transferencia entre objeto del gasto de inversión del proyecto construcción de biblioteca C.E.B Lucas Quezada para construcción de cocina solicitados por los docentes del Centro Educativo y aprobado por la corporación municipal.6. Transferencia entre objeto del gasto de inversión del Proyecto alcantarillado sanitario comunidad de Zapamatepe para proyecto construcción de caja Puente/alcantarillas en el sector las crucitas ubicada en la misma comunidad ratificando punto de acta de cabildo abierto de fecha 07 del mes de septiembre 2023.8. Audiencia.9. Puntos Varios.10. Acuerdos. **La Honorable Corporación Municipal Aprobó Ampliación presupuestaria 2024 por el ingreso de**



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232
CERTIFICACION



fondos del Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar que fueron acreditados el 17 de mayo 2024 para los proyectos de los centros educativos priorizados Instituto Jacobo V Cárcamo código SACE 180200009M04, Jardín de Niños Gabriela Mistral Código SACE 180200008P01, Escuela Carlos Izaguirre código SACE 180200007B10 y C.E.B Lucas Quezada código SACE 180200004b09 Lps.3,300,000.00; Siendo aprobada por la corporación municipal Cierre: No Habiendo Más Que Tratar Se Cerró La Sesión A Las 3:38 Pm. SELLO Del Alcalde Municipal Y Firma Regidores, SELLO Secretaria Municipal.

Extendida en el Municipio De Arenal, Yoro a los 26 días del mes Mayo del 2024.

Lurby Gladissa López Martínez
Secretaria Municipal



Alcaldía Municipal
Municipalidad de Arenal
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



Acta de Adjudicación

En la ciudad de Arenal, departamento de Yoro, reunidos en el salón de sesiones de la municipalidad de Arenal Yoro, los miembros de la comisión nombrada, para el análisis, revisión de las cotizaciones presentadas, para la adjudicación de contratos individuales, al contratista o empresa, que desarrollara las actividades de beneficio al municipio producto del Programa Nacional de Infraestructura Escolar bajo Decreto Ejecutivo PCM 34-2023 estas obras se hacen con fondos recibidos por la Secretaria de Educación, y con una pequeña contraparte municipal, para la elaboración de los Rótulos que se deben instalar al inicio de las obras, esta comisión está conformada por la Vice Alcaldesa, SENIA 2.- MERARY ELIZABETH MONTOYA jefe de proyectos, 3- AMELIA DENISSE FIGUEROA MONTOYA, jefe de Desarrollo Comunitario, 4-MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTINEZ, jefe de presupuesto, y observadores ORLIN ORLANDO ORELLANA ZUNIGA, OLGA LIDIA CRUZ Y MARIA LETICIA RODRIGUEZ por parte de la Comisión de Transparencia Municipal y DIDIER MISAEL SALINAS comisionado municipal, dicha comisión es nombrada por el señor Alcalde Municipal, para dar trámite y agilidad dentro del marco legal, a lo aprobado por la corporación municipal bajo acuerdo municipal del Acta #11 de fecha 26 de mayo del año 2024, Que dice: Ampliar el presupuesto de la municipalidad de Arenal para el año 2024, debido al ingreso de los fondos por Lps.3.300,000.00 de parte de la Secretaria de Educación, para desarrollar los proyectos del Programa Nacional de Infraestructura Escolar.

Estando, todos presentes, siendo las 2:00 p.m., del día jueves 13 de junio del presente año 2024, Se procedió a analizar las ofertas con montos totales y desglosados siguientes:


NOMBRE DE LA EMPRESA	MONTO Total en LEMPIRAS
Contratista Ing. Mario López	Lps. 3.789,901.78
Construcciones Baquedano S de R.L.	Lps. 3.299,999.00
Constructora OREGA S. de R.L.	Lps. 3.596,169.71

Luego habiendo revisado y analizado la comisión evaluadora cada una de las ofertas con montos totales y por desglose en cada uno de los centros y, declarando cada uno de la comisión que no tiene ningún vínculo (Conflicto de interés) directo o indirecto con ninguna de las empresas, para llevar a cabo el análisis la comisión acordó considerar los criterios estipulados en las Bases de contratación del estado. Seguidamente en función a los criterios la comisión evaluadora se pronuncia de la siguiente manera: Se aclara que la comisión inicio este proceso hasta que les acreditaron los fondos del Programa antes descrito, se solicitó apoyo a la AMHON,

para conocer el procedimiento a seguir en la adjudicación, ejecución y liquidación de estos proyectos. **Por Tanto:**

SE RECOMIENDA: adjudicar la ejecución de los proyectos, a la Empresa CONSTRUCCIONES BAQUEDANO, por considerar que su oferta al ser evaluada es la más conveniente para los intereses del Municipio, en vista que cumple con los requerimientos tales como: Logística, Respaldo financiero, experiencia y suficiente personal para ejecutar en tiempo y forma lo requerido.


Finalmente, se concluyó el proceso de evaluación y análisis de la adjudicación vía cotización, firmando para constancia todos los presentes, como miembros de la comisión nombrada para tal efecto, en el mismo lugar y fecha antes enunciado.








maria Leticia Rodriguez







PROYECTO : INSTITUTO JACOBO V.CARCAMO
 UBICACION: ARENAL YORO
 PROPIETARIO :CONSTRUCTORA OREGA S. de R.L.
 PRESUPUESTO:MODULO SANITARIO

No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	CORTE Y CONFORMADO A MANO	M3	5.40	691.90	3,736.26
1.02	TRAZADO Y NIVELTEADO	M2	61.25	75.00	4,593.75
1.03	LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIOS	M3	5.00	399.00	1,995.00
1.04	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	4.69	1,111.75	5,214.11
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				15,539.12
2.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.01	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMIDURO)	M3	6.76	757.25	5,119.01
2.02	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	5.64	993.75	5,604.75
	SUBTOTAL EXCAVACIONES				10,723.76
3.00	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				
3.01	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA (0.70 X 0.50) EN CORREDOR,(0.30 X 0.20) EN ACERA, (0.40 X 0.50) M	M3	9.99	2,693.84	26,911.46
3.02	SOLERA 20 X 20 4#3 Y #2 A 20 CMS CONCRETO 1:2:2	ML	30.13	485.34	14,623.29
3.03	SOLERA DE 15 X 25 4#3 #2 A 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	30.13	1,433.09	43,179.00
3.04	DADO DE CONCRETO 50X50X50 4#3 #2 A 0.20	U	8.00	825.46	6,603.68
3.05	PEDESTAL DE CONCRETO 1 2:2 0.15X0.15'0.55 CON TUBO HG DE 2	ML	8.00	1,250.90	10,007.20
3.06	COLUMNA DE TUBO REDONDO HG DE 2 INCLUYE PLACA 6X8X1/8 H = 1.00 MT	ML	3.00	1,516.00	4,548.00
3.07	CASTILLOS a 45 DE 15 X 15 CMS ARMADO CON 4#3 Y ANILLOS #3 A 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	5.36	528.49	2,832.71
3.08	CASTILLOS DE 15 X 13 CMS ARMADO CON 4#3 Y ANILLOS #3 A 0.20 CONCRETO 1:2:2	ml	21.70	570.61	12,382.24
3.09	BORDILLO DE 5 X 10 CONCRETO 1:2:2 INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	ML	1.00	208.47	208.47
3.10	CARGADOR DE CONCRETO DE 17 X 15 ARMADO CON 3#3 Y # 2 A 0.20 CONCRETO 1:2:2	ML	12.40	391.51	4,854.72
3.11	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 5 CMS,# 2 A 25CMS AMBAS DIRECCIONES	M2	15.90	480.67	7,642.65
3.12	PISO DE CONCRETO SIMPLE 10 CMS PARA ACERA	M2	8.11	654.24	5,305.89
3.13	COLUMNA C-2 1:2:2 0.10 X 0.15 2 #3 #2 A 0.15	ML	30.27	445.78	13,493.76
	SUBTOTAL CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				152,593.07
4.00	PAREDES				
4.01	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 10 CMS	M2	23.98	892.22	21,395.44
4.02	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6X8X16 REF 1@3 A 0.60 MTS HORIZONTALMENTE MORTERO 1:5	ML	27.90	915.93	25,554.45
	SUBTOTAL PAREDES				46,949.88
5.00	REPELOS Y REVOQUES				
5.01	REPELLO DE PAREDES EXTERNAS E = 2 CMS MORTERO 1:4,PULIDO 1:1 E= 0.25 CMS	M2	49.65	250.82	12,453.21
5.02	PULIDO DE PAREDES INTERNAS MASILLA 1:1 E = 0.25	M2	49.65	132.06	6,556.78
5.03	TALLADO DE ELEMENTOS	M2	167.76	150.88	25,311.63
5.04	REPELLO DE ELEMENTOS L = 0.10 M CMS MORTERO 1:4, E= 2 CMS	ML	36.82	240.10	8,840.48
	SUBTOTAL REPELOS Y REVOQUES				53,162.10
6.00	CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
6.01	VIGA AEREA DE CANALETA DE 2x4	ML	6.85	685.68	4,696.91
6.02	TECHO DE CANALETA DE 6" CON LAMINA DE ALUZINC CAL 26 TROQUELADA COLOR ROJO,INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO Y ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	45.42	835.00	37,925.70
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	45.42	691.60	31,412.47
6.04	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	ML	6.63	130.49	865.15
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE FASCIA DE PVC	M2	26.96	30.65	826.32
	SUBTOTAL CUBIERTAS Y CIELO FALSOS				75,726.55
7.00	PISOS Y CERAMICAS				
7.01	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE 30X30 COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES INCLUYE FRAGUADO	M2	11.15	850.20	9,479.73
7.02	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE 30X30 COLOR ROJO PARA EXTERIORES INCLUYE FRAGUADO	M2	17.84	875.00	15,610.00
7.03	CERAMICA DE PARED COLOR BLANCO DE 20 X 30 CMS H : 1.50	M2	36.76	890.00	32,716.40
	SUBTOTAL PISOS Y CERAMICAS				57,806.13

8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.01	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP, 2#14 THHN COLOR NEGRO,DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	34.06	225.00	7,663.50
8.02	INTERRUPTOR SENCILLO	U	8.00	550.00	4,400.00
8.03	SUMINISTRO DE LAMINA LED 1 X 40	U	3.00	1,385.26	4,155.78
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO	U	2.00	500.30	1,000.60
8.05	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	U	1.00	3,500.00	3,500.00
8.06	ATERRIJAZE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	U	6.85	750.00	5,137.50
8.07	ACOMETIDA ELECTRICA CABLE THWW 2#6,1THWC#V8	ML	50.00	1,200.00	60,000.00
8.08	MUFA DE 2"	U	1.00	1,475.00	1,475.00
8.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRATIVOS	U	8.00	425.00	3,400.00
	SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS				90,732.38
9.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4 SDR 41	ML	23.89	495.20	11,830.33
9.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2 SDR B 41	ML	20.00	96.15	1,923.00
9.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2 SDR 26	ML	21.06	69.80	1,469.99
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC	GBL	1.00	1,100.00	1,100.00
9.05	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 X 30 X 40 CMS INCLUYE VALVULA DE PASO	U	30.27	350.75	10,617.20
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO MODELO EDERLY CADET TAZA ELONGADA INCLUYE ACCESORIOS	U	1.00	6,191.20	6,191.20
9.07	URINARIO COLECTIVO DE CONCRETO DE 1.22 X 0.41	U	1.00	2,812.71	2,812.71
9.08	CAJA DE REGISTRO DE 0.65 M X 0.65 M X 0.90 M	U	2.00	4,402.37	8,804.74
9.09	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70X0.60 MTS	U	1.00	9,916.10	9,916.10
9.10	CAJA DE REGISTRO DE 0.40 M X 0.40 M X0.50M	U	1.00	3,073.39	3,073.39
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	U	6.00	5,131.20	30,787.20
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PVC DE 2 INYECTADA	U	1.00	2,550.00	2,550.00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON HG DE 2	U	6.00	365.00	2,190.00
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				93,265.86
10.00	PUERTAS Y VENTANAS				
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1 X 2.1 M DE LAMINA METALICA DE 1/16 INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1X1 Y ANTICORROSIVO BLANCO	U	1.00	10,550.00	10,550.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.7X 2.1 M DE LAMINA METALICA DE 1/16 INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1X1 Y ANTICORROSIVO BLANCO	U	6.00	8,500.00	51,000.00
10.03	VENTANA DE REJILLA METALICA	M2	5.13	1,600.00	8,208.00
10.04	ACERA DE ACCESO A MODULO SANITARIOS	M2	20.00	434.47	8,689.35
	SUBTOTAL PUERTAS Y VENTANAS+B94:B95				78,447.35
11.00	PINTURA				
11.01	PINTURA Y SELLADOR DE ACEITE MATE A DOS MANOS	M2	94.79	253.25	24,005.57
	SUBTOTAL PINTURA				24,005.57
	SUB.- TOTAL (LPS)				698,951.78
	TOTAL LPS.				698,951.78

PROYECTO : INSTITUTO JACOBO V CARCAMO
UBICACION: ARENAL YORO
PROPIETARIO :CONSTRUCTORA OREGA S. de R.L.
PRESUPUESTO : tanque 2500 lts = 661.38 galones

No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	LIMPIEZA GENERAL EN TERRENO	DIA	0.30	898.50	269.55
1.02	TRAZADO Y MARCADO	M3	16.00	135.40	2,166.40
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				2,435.95
2.00	EXCAVACIONES				
2.01	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMIDURO)	M3	2.55	677.25	1,726.99
2.02	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	2.34	993.75	2,325.38
	SUBTOTAL EXCAVACIONES				4,052.36
3.00	ACARREOS				
3.01	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	3.31	260.00	860.60
	TOTAL ACARREOS				860.60
3.00	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				
3.01	COLUMNA 20X20 4 # 3 Y #2A 0.20 CONCRETO 1:2:2	ML	13.40	983.27	13,175.76
3.02	ZAPATA AISLADA 0.70 X 0.70 X 0.25 5#4 AMBOS SENTIDOS CTO 1:2:2	UNIDAD	4.00	1,110.00	4,440.00
3.03	VIGA DE 20 X 20 4#3 #2 A 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	10.40	915.35	9,519.64
3.04	LOSA DE CONCRETO ESPESOR : 0.15ARMADA CON #3 A CADA15 CMS A.A CTO 1:2:2	M2	4.00	1,500.00	6,000.00
3.05	TALLADO DE ELEMENTOS	ML	37.60	150.00	5,640.00
3.06	REPELLO Y AFINADO	M2	11.68	270.00	3,153.60
3.07	RELLENO CON CAPAS DE ARENA 0.15 CADA CAPA	M3	0.10	975.90	97.59
3.08	CABLE PARA PENDOLA DE 1/4	ML	10.00	75.00	750.00
3.09	GRAPA PARA CABLE DE 1/4	UNIDAD	10.00	55.00	550.00
3.10	TENSOR DE 1/2	UNIDAD	4.00	98.00	392.00
	SUBTOTAL CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				43,718.59
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS				
4.01	TANQUE DE 2500 LTS	U	1.00	10,250.00	10,250.00
4.02	PILETA DE ASEO 0.80 X 0.80 X 0.80	U	1.00	4,500.00	4,500.00

	SUBTOTAL PAREDES				14,750.00
5.00	PINTURA				
5.01	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	19.20	253.25	4,862.40
	SUBTOTAL REPELOS Y REVOQUES				4,862.40
	SUB.- TOTAL (LPS)				
	TOTAL LPS.				70,679.90

PROYECTO : INSTITUTO JACOBO V CARCAMO
 UBICACION: ARENAL YORO
 PROPIETARIO :CONSTRUCTORA OREGA S. de R.L.
 PRESUPUESTO :OBRAS DE MITIGACION

No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	OBRAS DE MITIGACION	GBL	1.00	191,550.19	191,550.19
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				191,550.19

INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO TOTAL LPS.	961,181.87
--	------------



Lic. Walter Daniel Orellana
 Representante Legal

PROYECTO : INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO

UBICACION: ARENAL YORO

PROPIETARIO :CONSTRUCCIONES BAQUEDANO S. de R.L.

PRESUPUESTO:MODULO SANITARIO

No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	CORTE Y CONFORMADO A MANO	M3	5.40	651.90	3,520.26
1.02	TRAZADO Y NIVELTEADO	M2	61.25	65.00	3,981.25
1.03	LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIOS	M3	5.00	375.00	1,875.00
1.04	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	4.69	993.75	4,660.69
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				14,037.20
2.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.01	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMIDURO)	M3	6.76	657.25	4,443.01
2.02	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	5.64	993.75	5,604.75
	SUBTOTAL EXCAVACIONES				10,047.76
3.00	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				
3.01	CIENTOS DE MAMPOSTERIA (0.70 X 0.50) EN CORREDOR,(0.30 X 0.20) EN ACERA, (0.40 X 0.50) M	M3	9.99	2,593.84	25,912.46
3.02	SOLERA 20 X 20 4#3 Y #2 A 20 CMS CONCRETO 1:2:2	ML	30.13	485.34	14,623.29
3.03	SOLERA DE 15 X 25 4#3 #2 A 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	30.13	1,433.09	43,179.00
3.04	DADO DE CONCRETO 50X50X50 4#3 #2 A 0.20	U	8.00	825.46	6,603.68
3.05	PEDESTAL DE CONCRETO 1 2:2 0.15X0.15"0.55 CON TUBO HG DE 2	ML	8.00	1,250.90	10,007.20
3.06	COLUMNA DE TUBO REDONDO HG DE 2 INCLUYE PLACA 6X8X1/8 H = 1.00 MT	ML	3.00	1,416.00	4,248.00
3.07	CASTILLOS α 45 DE 15 X 15 CMS ARMADO CON 4#3 Y ANILLOS #3 A 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	5.36	528.49	2,832.71
3.08	CASTILLOS DE 15 X 13 CMS ARMADO CON 4#3 Y ANILLOS #3 A 0.20 CONCRETO 1:2:2	ml	21.70	570.61	12,382.24
3.09	BORDILLO DE 5 X 10 CONCRETO 1:2:2 INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	ML	1.00	208.47	208.47
3.10	CARGADOR DE CONCRETO DE 17 X 15 ARMADO CON 3#3 Y # 2 A 0.20 CONCRETO 1:2:2	ML	12.40	391.51	4,854.72
3.11	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 5 CMS,# 2 A 25CMS AMBAS DIRECCIONES	M2	15.90	480.67	7,642.65
3.12	PISO DE CONCRETO SIMPLE 10 CMS PARA ACERA	M2	8.11	654.24	5,305.89
3.13	COLUMNA C-2 1:2:2 0.10 X 0.15 2 #3 #2 A 0.15	ML	30.27	345.78	10,466.76
	SUBTOTAL CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				148,267.07
4.00	PAREDES				
4.01	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 10 CMS	M2	23.98	792.22	18,997.44
4.02	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6X8X16 REF 1@3 A 0.60 MTS HORIZONTALMENTE MORTERO 1:5	ML	27.90	815.93	22,764.45
	SUBTOTAL PAREDES				41,761.88
5.00	REPELLOS Y REVOQUES				
5.01	REPELLO DE PAREDES EXTERNAS E = 2 CMS MORTERO 1:4,PULIDO 1:1 E= 0.25 CMS	M2	49.65	240.82	11,956.71
5.02	PULIDO DE PAREDES INTERNAS MASILLA 1:1 E = 0.25	M2	49.65	132.06	6,556.78
5.03	TALLADO DE ELEMENTOS	M2	167.76	150.88	25,311.63
5.04	REPELLO DE ELEMENTOS L = 0.10 M CMS MORTERO 1:4, E= 2 CMS	ML	36.82	140.10	5,158.48
	SUBTOTAL REPELLOS Y REVOQUES				48,983.60
6.00	CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
6.01	VIGA AEREA DE CANALETA DE 2x4	ML	6.85	635.68	4,354.41
6.02	TECHO DE CANALETA DE 6" CON LAMINA DE ALUZINC CAL 26 TROQUELADA COLOR ROJO,INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO Y ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	45.42	835.00	37,925.70
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	45.42	591.60	26,870.47
6.04	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	ML	6.63	130.49	865.15
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE FASCIA DE PVC	M2	26.96	240.65	6,487.92
	SUBTOTAL CUBIERTAS Y CIELO FALSOS				76,503.65
7.00	PISOS Y CERAMICAS				
7.01	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE 30X30 COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES INCLUYE FRAGUADO	M2	11.15	800.20	8,922.23
7.02	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE 30X30 COLOR ROJO PARA EXTERIORES INCLUYE FRAGUADO	M2	17.84	875.00	15,610.00
7.03	CERAMICA DE PARED COLOR BLANCO DE 20 X 30 CMS H : 1.50	M2	36.76	790.00	29,040.40
	SUBTOTAL PISOS Y CERAMICAS				53,572.63

8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.01	CIRQUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP, 2#14 THHN COLOR NEGRO,DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	34.06	125.00	4,257.50
8.02	INTERRUPTOR SENCILLO	U	8.00	550.00	4,400.00
8.03	SUMINISTRO DE LAMINA LED 1 X 40	U	3.00	1,385.26	4,155.78
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO	U	2.00	500.30	1,000.60
8.05	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	U	1.00	3,000.00	3,000.00
8.06	ATERRIJAZE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	U	6.85	750.00	5,137.50
8.07	ACOMETIDA ELECTRICA CABLE THWW 2#6,1THWC#V8	ML	50.00	1,200.00	60,000.00
8.08	MUFA DE 2"	U	1.00	1,475.00	1,475.00
8.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRATIVOS	U	8.00	325.00	2,600.00
	SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS				86,026.38
9.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4 SDR 41	ML	23.89	395.20	9,441.33
9.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2 SDR B 41	ML	20.00	96.15	1,923.00
9.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2 SDR 26	ML	21.06	69.80	1,469.99
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC	GBL	1.00	1,000.00	1,000.00
9.05	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 X 30 X 40 CMS INCLUYE VALVULA DE PASO	U	30.27	350.75	10,617.20
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO MODELO EDERLY CADET TAZA ELONGADA INCLUYE ACCESORIOS	U	1.00	6,181.20	6,181.20
9.07	URINARIO COLECTIVO DE CONCRETO DE 1.22 X 0.41	U	1.00	2,812.71	2,812.71
9.08	CAJA DE REGISTRO DE 0.65 M X 0.65 M X 0.90 M	U	2.00	4,402.37	8,804.74
9.09	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70X0.60 MTS	U	1.00	9,916.10	9,916.10
9.10	CAJA DE REGISTRO DE 0.40 M X 0.40 M X 0.50M	U	1.00	3,073.39	3,073.39
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	U	6.00	5,131.20	30,787.20
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PVC DE 2 INYECTADA	U	1.00	2,500.00	2,500.00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON HG DE 2	U	6.00	265.00	1,590.00
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				90,116.86
10.00	PUERTAS Y VENTANAS				
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1 X 2.1 M DE LAMINA METALICA DE 1/16 INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1X1 Y ANTICORROSIVO BLANCO	U	1.00	10,500.00	10,500.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.7X 2.1 M DE LAMINA METALICA DE 1/16 INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1X1 Y ANTICORROSIVO BLANCO	U	6.00	8,500.00	51,000.00
10.03	VENTANA DE REJILLA METALICA	M2	5.13	1,600.00	8,203.00
10.04	ACERA DE ACCESO A MODULO SANITARIOS	M2	20.00	334.47	6,689.35
	SUBTOTAL PUERTAS Y VENTANAS+B94:B95				76,397.35
11.00	PINTURA				
11.01	PINTURA Y SELLADOR DE ACEITE MATE A DOS MANOS	M2	94.79	153.25	14,526.57
	SUBTOTAL PINTURA				14,526.57
	SUB.- TOTAL (LPS)				660,240.96
	TOTAL LPS.				660,240.96

PROYECTO : INSTITUTO JACOBO V CARCAMO

UBICACION: ARENAL YORO

PROPIETARIO :CONSTRUCCIONES BAQUEDANO S. de R.L.

PRESUPUESTO : tanque 2500 lts = 661.38 galones

No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	LIMPIEZA GENERAL EN TERRENO	DIA	0.30	888.50	266.55
1.02	TRAZADO Y MARCADO	M3	16.00	115.40	1,846.40
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				2,112.95
2.00	EXCAVACIONES				
2.01	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMIDURO)	M3	2.55	657.25	1,675.99
2.02	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	2.34	993.75	2,325.38
	SUBTOTAL EXCAVACIONES				4,001.36
3.00	ACARREOS				
3.01	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	3.31	160.00	529.60
	TOTAL ACARREOS				529.60
3.00	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				
3.01	COLUMNA 20X20 4 # 3 Y #2A 0.20 CONCRETO 1:2:2	ML	13.40	883.27	11,835.76
3.02	ZAPATA AISLADA 0.70 X 0.70 X 0.25 5#4 AMBOS SENTIDOS CTO 1:2:2	UNIDAD	4.00	1,100.00	4,400.00
3.03	VIGA DE 20 X 20 4#3 #2 A 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	10.40	915.35	9,519.64
3.04	LOSA DE CONCRETO ESPESOR : 0.15ARMADA CON #3 A CADA15 CMS A.A CTO 1:2:2	M2	4.00	1,500.00	6,000.00
3.05	TALLADO DE ELEMENTOS	ML	37.60	150.00	5,640.00
3.06	REPELLO Y AFINADO	M2	11.68	270.00	3,153.60
3.07	RELLENO CON CAPAS DE ARENA 0.15 CADA CAPA	M3	0.10	975.90	97.59
3.08	CABLE PARA PENDOLA DE 1/4	ML	10.00	75.00	750.00
3.09	GRAPA PARA CABLE DE 1/4	UNIDAD	10.00	55.00	550.00
3.10	SENSOR DE 1/2	UNIDAD	4.00	95.00	380.00
	SUBTOTAL CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				42,326.59
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS				
4.01	TANQUE DE 2500 LTS	U	1.00	10,200.00	10,200.00
4.02	PILETA DE ASEO 0.80 X 0.80 X 0.80	U	1.00	4,500.00	4,500.00

	SUBTOTAL PAREDES				14,700.00
5.00	PINTURA				
5.01	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	19.20	153.25	2,942.40
	SUBTOTAL REPELOS Y REVOQUES				2,942.40
	SUB.- TOTAL (LPS)				
	TOTAL LPS.				66,612.90

PROYECTO : INSTITUTO JACOBO V CARCAMO

UBICACION: ARENAL YORO

PROPIETARIO :CONSTRUCCIONES BAQUEDANO S. de R.L.

PRESUPUESTO :OBRAS DE MITIGACION

No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	OBRAS DE MITIGACION	GBL	1.00	161,550.19	161,550.19
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				161,550.19

INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO TOTAL LPS.	888,404.05
--	------------



Ing. Selvin Baquedano
Representante Legal

CONSTRUCCIONES BAQUEDANO S. de R.L.

PROYECTO : INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO

UBICACION: ARENAL YORO

PROPIETARIO :ING. MARIO LOPEZ

PRESUPUESTO:MODULO SANITARIO

No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	P. TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	CORTE Y CONFORMADO A MANO	M3	5.40	791.90	4,276.26
1.02	TRAZADO Y NIVELTEADO	M2	61.25	75.00	4,593.75
1.03	LIMPIEZA Y ACARREO DE DESPERDICIOS	M3	5.00	399.00	1,995.00
1.04	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	4.69	1,311.75	6,152.11
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				17,017.12
2.00	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.01	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMIDURO)	M3	6.76	857.25	5,795.01
2.02	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	5.64	993.75	5,604.75
	SUBTOTAL EXCAVACIONES				11,399.76
3.00	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				
3.01	CIMIENOS DE MAMPOSTERIA (0.70 X 0.50) EN CORREDOR,(0.30 X 0.20) EN ACERA, (0.40 X 0.50) M	M3	9.99	2,793.84	27,910.46
3.02	SOLERA 20 X 20 4#3 Y #2 A 20 CMS CONCRETO 1:2:2	ML	30.13	485.34	14,623.29
3.03	SOLERA DE 15 X 25 4#3 #2 A 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	30.13	1,433.09	43,179.00
3.04	DADO DE CONCRETO 50X50X50 4#3 #2 A 0.20	U	8.00	825.46	6,603.68
3.05	PEDESTAL DE CONCRETO 1 2:2 0.15X0.15*0.55 CON TUBO HG DE 2	ML	8.00	1,290.90	10,327.20
3.06	COLUMNA DE TUBO REDONDO HG DE 2 INCLUYE PLACA 6X8X1/8 H = 1.00 MT	ML	3.00	1,516.00	4,548.00
3.07	CASTILLOS α 45 DE 15 X 15 CMS ARMADO CON 4#3 Y ANILLOS #3 A 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	5.36	528.49	2,832.71
3.08	CASTILLOS DE π 5 X 13 CMS ARMADO CON 4#3 Y ANILLOS #3 A 0.20 CONCRETO 1:2:2	ml	21.70	570.61	12,382.24
3.09	BORDILLO DE 5 X 10 CONCRETO 1:2:2 INCLUYE ENCOFRADO Y FUNDIDO	ML	1.00	208.47	208.47
3.10	CARGADOR DE CONCRETO DE 17 X 15 ARMADO CON 3#3 Y # 2 A 0.20 CONCRETO 1:2:2	ML	12.40	391.51	4,854.72
3.11	FIRME DE CONCRETO 1:2:3 REFORZADO E= 5 CMS,# 2 A 25CMS AMBAS DIRECCIONES	M2	15.90	490.67	7,801.65
3.12	PISO DE CONCRETO SIMPLE 10 CMS PARA ACERA	M2	8.11	654.24	5,305.89
3.13	COLUMNA C-2 1:2:2 0.10 X 0.15 2 #3 #2 A 0.15	ML	30.27	545.78	16,520.76
	SUBTOTAL CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				157,098.07
4.00	PAREDES				
4.01	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 10 CMS	M2	23.98	910.22	21,827.08
4.02	PARED REFORZADA DE BLOQUE SIMPLE DE 6X8X16 REF 1@3 A 0.60 MTS HORIZONTALMENTE MORTERO 1:5	ML	27.90	925.93	25,833.45
	SUBTOTAL PAREDES				47,660.52
5.00	REPELLOS Y REVOQUES				
5.01	REPELLO DE PAREDES EXTERNAS E = 2 CMS MORTERO 1:4,PULIDO 1:1 E= 0.25 CMS	M2	49.65	280.82	13,942.71
5.02	PULIDO DE PAREDES INTERNAS MASILLA 1:1 E = 0.25	M2	49.65	132.06	6,556.78
5.03	TALLADO DE ELEMENTOS	M2	167.76	150.88	25,311.63
5.04	REPELLO DE ELEMENTOS L = 0.10 M CMS MORTERO 1:4, E= 2 CMS	ML	36.82	290.10	10,681.48
	SUBTOTAL REPELLOS Y REVOQUES				56,492.60
6.00	CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS				
6.01	VIGA AEREA DE CANALETA DE 2x4	ML	6.85	695.68	4,765.41
6.02	TECHO DE CANALETA DE 6" CON LAMINA DE ALUZINC CAL 26 TROQUELADA COLOR ROJO,INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO Y ANTICORROSIVO A DOS MANOS	M2	45.42	835.00	37,925.70
6.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC	M2	45.42	691.60	31,412.47
6.04	CAPOTE PARA ALUZINC COLOR ROJO	ML	6.63	130.49	865.15
6.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE FASCIA DE PVC	M2	26.96	60.65	1,635.12
	SUBTOTAL CUBIERTAS Y CIELO FALSOS				76,603.85
7.00	PISOS Y CERAMICAS				
7.01	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE 30X30 COLOR GRIS PERLA PARA INTERIORES INCLUYE FRAGUADO	M2	11.15	890.20	9,925.73
7.02	PISO DE LADRILLO TERRAZO ORIGINAL DE 30X30 COLOR ROJO PARA EXTERIORES INCLUYE FRAGUADO	M2	17.84	875.00	15,610.00
7.03	CERAMICA DE PARED COLOR BLANCO DE 20 X 30 CMS H : 1.50	M2	36.76	990.00	36,392.40
	SUBTOTAL PISOS Y CERAMICAS				61,928.13

8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.01	CIRCUITO DE ILUMINACION HASTA 15 AMP, 2#14 THHN COLOR NEGRO,DUCTO PVC CONDUIT DE 1/2 TIPO PESADO CEDULA 40	ML	34.06	325.00	11,069.50
8.02	INTERRUPTOR SENCILLO	U	8.00	550.00	4,400.00
8.03	SUMINISTRO DE LAMINA LED 1 X 40	U	3.00	1,385.26	4,155.78
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR VAIVEN SENCILLO	U	2.00	500.30	1,000.60
8.05	CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	U	1.00	3,550.00	3,550.00
8.06	ATERRIJAZE DEL CENTRO DE CARGA CON VARILLA DE COBRE	U	6.85	750.00	5,137.50
8.07	ACOMETIDA ELECTRICA CABLE THWW 2#6,1THWC#V8	ML	50.00	1,260.00	63,000.00
8.08	MUFA DE 2"	U	1.00	1,475.00	1,475.00
8.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCOS AHORRATIVOS	U	8.00	525.00	4,200.00
	SUBTOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS				97,988.38
9.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4 SDR 41	ML	23.89	55.20	1,318.73
9.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2 SDR B 41	ML	20.00	96.15	1,923.00
9.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2 SDR 26	ML	21.06	69.80	1,469.99
9.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC	GBL	1.00	1,100.00	1,100.00
9.05	CAJA DE VALVULA Y MEDIDOR DE 40 X 30 X 40 CMS INCLUYE VALVULA DE PASO	U	30.27	350.75	10,617.20
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO MODELO EDERLY CADET TAZA ELONGADA INCLUYE ACCESORIOS	U	1.00	6,191.20	6,191.20
9.07	URINARIO COLECTIVO DE CONCRETO DE 1.22 X 0.41	U	1.00	2,812.71	2,812.71
9.08	CAJA DE REGISTRO DE 0.65 M X 0.65 M X 0.90 M	U	2.00	4,402.37	8,804.74
9.09	LAVAMANOS DE CONCRETO DE 1.70X0.60 MTS	U	1.00	9,916.10	9,916.10
9.10	CAJA DE REGISTRO DE 0.40 M X 0.40 M X0.50M	U	1.00	3,073.39	3,073.39
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INCLUYE ACCESORIOS	U	6.00	5,231.20	31,387.20
9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PVC DE 2 INYECTADA	U	1.00	2,550.00	2,550.00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON HG DE 2	U	6.00	465.00	2,790.00
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				83,954.26
10.00	PUERTAS Y VENTANAS				
10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1 X 2.1 M DE LAMINA METALICA DE 1/16 INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1X1 Y ANTICORROSIVO BLANCO	U	1.00	10,650.00	10,650.00
10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.7X 2.1 M DE LAMINA METALICA DE 1/16 INCLUYE PASADOR Y SUJETADOR DE ACERO INOXIDABLE MARCO DE TUBO INDUSTRIAL DE 1X1 Y ANTICORROSIVO BLANCO	U	6.00	8,500.00	51,000.00
10.03	VENTANA DE REJILLA METALICA	M2	5.13	1,600.00	8,208.00
10.04	ACERA DE ACCESO A MODULO SANITARIOS	M2	20.00	494.47	9,889.35
	SUBTOTAL PUERTAS Y VENTANAS+B94:B95				79,747.35
11.00	PINTURA				
11.01	PINTURA Y SELLADOR DE ACEITE MATE A DOS MANOS	M2	94.79	299.25	28,365.91
	SUBTOTAL PINTURA				28,365.91
	SUB.- TOTAL (LPS)				718,255.96
	TOTAL LPS.				718,255.96

PROYECTO : INSTITUTO JACOBO V CARCAMO
UBICACION: ARENAL YORO
PROPIETARIO :ING. MARIO LOPEZ
PRESUPUESTO : tanque 2500 lts = 661.38 galones

No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	LIMPIEZA GENERAL EN TERRENO	DIA	0.30	998.50	299.55
1.02	TRAZADO Y MARCADO	M3	16.00	135.40	2,166.40
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				2,465.95
2.00	EXCAVACIONES				
2.01	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMIDURO)	M3	2.55	697.25	1,777.99
2.02	RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECTO (INCLUYE ACARREO)	M3	2.34	993.75	2,325.38
	SUBTOTAL EXCAVACIONES				4,103.36
3.00	ACARREOS				
3.01	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	3.31	269.00	890.39
	TOTAL ACARREOS				890.39
3.00	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				
3.01	COLUMNA 20X20 4 # 3 Y #2A 0.20 CONCRETO 1:2:2	ML	13.40	999.27	13,390.16
3.02	ZAPATA AISLADA 0.70 X 0.70 X 0.25 5#4 AMBOS SENTIDOS CTO 1:2:2	UNIDAD	4.00	1,110.00	4,440.00
3.03	VIGA DE 20 X 20 4#3 #2 A 0.15 CONCRETO 1:2:2	ML	10.40	915.35	9,519.64
3.04	LOSA DE CONCRETO ESPESOR : 0.15ARMADA CON #3 A CADA15 CMS A.A CTO 1:2:2	M2	4.00	1,550.00	6,200.00
3.05	TALLADO DE ELEMENTOS	ML	37.60	150.00	5,640.00
3.06	REPELLO Y AFINADO	M2	11.68	270.00	3,153.60
3.07	RELLENO CON CAPAS DE ARENA 0.15 CADA CAPA	M3	0.10	975.90	97.59
3.08	CABLE PARA PENDOLA DE 1/4	ML	10.00	75.00	750.00
3.09	GRAPA PARA CABLE DE 1/4	UNIDAD	10.00	55.00	550.00
3.10	TENSOR DE 1/2	UNIDAD	4.00	98.00	392.00
	SUBTOTAL CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				44,132.99
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS				
4.01	TANQUE DE 2500 LTS	U	1.00	10,350.00	10,350.00
4.02	PILETA DE ASEO 0.80 X 0.80 X 0.80	U	1.00	4,500.00	4,500.00

	SUBTOTAL PAREDES				14,850.00
5.00	PINTURA				
5.01	PINTURA DE ACEITE Y SELLADOR APLICADA A DOS MANOS MINIMO	M2	19.20	283.25	5,438.40
	SUBTOTAL REPELOS Y REVOQUES				5,438.40
	SUB.- TOTAL (LPS)				
	TOTAL LPS.				71,881.09

PROYECTO : INSTITUTO JACOBO V CARCAMO
 UBICACION: ARENAL YORO
 PROPIETARIO :ING. MARIO LOPEZ
 PRESUPUESTO :OBRAS DE MITIGACION

No	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	PU	TOTAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	OBRAS DE MITIGACION	GBL	1.00	226,550.19	226,550.19
	SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				226,550.19

INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO TOTAL LPS.	1,016,687.24
--	--------------



Ing. Mario Lopez
 Representante Legal



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00016972

ARENAL

19 de julio de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE

L 266,521.21

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON VEINTIUN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00016972

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

02553

CONCEPTO DEL PAGO


PAGO DE Segundo desembolso del 30% del contrato Proyecto construccion de Modulo sanitario y tanque de agua 2500 Lts y obra adicionales en el Instituto Jacobo V. Carcamo del Casco Urbano del Municipio (Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Segundo desembolso del 30% del contrato Proyecto construccion de Modulo sanitario y tanque de agua 2500 Lts y obras adicionales en el Instituto Jacobo V. Carcamo del Casco Urbano del Municipio (Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar)</p> 			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / C.R. (05-23) - 12PTT34501

CHEQUE No. 00016972

BALANCE



4
3
