

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

DPLP



Informe de Proyectos de Inversión. Enero 2017

I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Gobernabilidad y Descentralización
Nombre del Proyecto:	Construcción del Edificio de aulas N° 14 de la UPNFM, Campus Central
Ubicación del Proyecto:	Tegucigalpa, Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán
Propósitos:	Demanda satisfecha de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.
Descripción del Proyecto:	El proyecto "Construcción del Edificio de aulas N°14 de la UPNFM", servirá para generar mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de espacios Pedagógicos adecuados a las exigencias del entorno educativo en que se desenvuelve el Centro de Investigación Educativa.

II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Mejorar en un 5% el acceso a Educación Superior en el área de la docencia de la población de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.
Impacto ambiental:	El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se desarrollará el proyecto.
Detalles del contacto:	Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores, 50499411275, jalvarez@upnfm.edu.hn
Fuentes de financiamiento:	Tesoro Nacional
Propuesta del Proyecto	L. 36,246,000.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	2013
Estado actual del proyecto	Etapas de Construcción
Costo de financiación(proyectada):	L. 38,158,282.70
Fecha de finalización (proyectada):	Abril de 2017

III. Ejecución del Proyecto

Relación de la planificación con los productos entregados de manera trimestral:

Se han hecho avances significativos en la obra con relación al mes anterior como se muestra en las fotografías.

Variación en el costo total del proyecto:

No se puede determinar ya que el proyecto se encuentra en ejecución.

Variación en el alcance y duración del proyecto:

Ninguna

Razones de los cambios

Ninguna


Responsable de la elaboración del informe (nombre y firma)

Luis Eduardo Alvarenga

31 de enero de 2017



Fotografías del avance del proyecto:

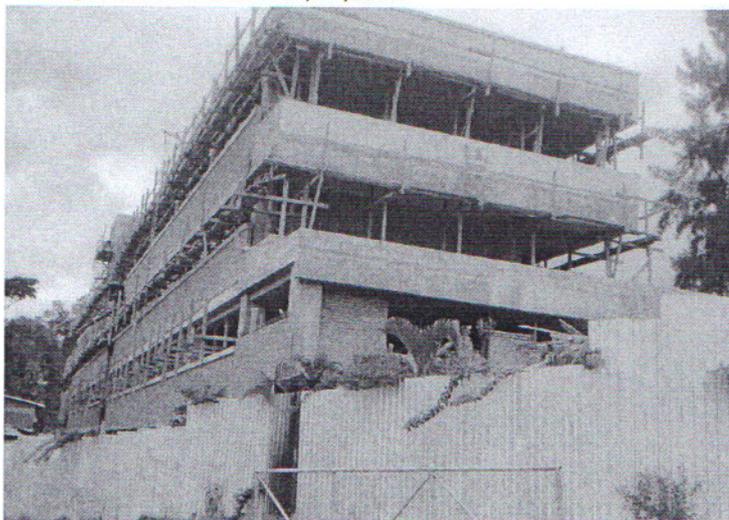

I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Desarrollo e inclusión social
Nombre del Proyecto:	Construcción y equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Ubicación del Proyecto:	Nacaome, Departamento de Valle
Propósito:	Mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación docente en la zona sur, procurar crear las condiciones óptimas para el desarrollo de la labor administrativa y académica con calidad.
Descripción del Proyecto:	El proyecto "Construcción y equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM", servirá para generar mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de espacios Pedagógicos adecuados a las exigencias del entorno educativo en que se desenvuelve el Centro Universitarios Regional de Nacaome.

II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Mejorar en un 5% el acceso a Educación Superior en el área de la docencia de la población de Nacaome, Departamento de Valle.
Impacto ambiental:	El proyecto no generará impactos negativos en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Detalles del contacto:	Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores, 50499411275, jalvarez@upnfm.edu.hn
Fuentes de financiamiento:	Tesoro Nacional
Propuesta del Proyecto	L. 49,001,200.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Según nota de prioridad N° 000000216 oficio DGIP-036 -16, mayo 2016
Estado actual del proyecto	Etapas de pre inversión
Costo de financiación (proyectada 2016):	L. 13,000,000.00
Fecha de finalización (proyectada):	Septiembre de 2018

I. Identificación del Proyecto

Propietario del proyecto:	Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Sector, Sub sector:	Gobernabilidad y Descentralización
Nombre del Proyecto:	"Construcción de la Calle Interna del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán"
Ubicación del Proyecto:	San Pedro Sula, Cortés
Propósito:	Mejorar la cobertura de los servicios educativos a nivel superior en la formación docente en la zona sur, procurar crear las condiciones óptimas para el desarrollo de la labor administrativa y académica con calidad.
Descripción del Proyecto:	El proyecto "Construcción y equipamiento del Centro Universitario Regional de Nacaome de la UPNFM", servirá para generar mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de espacios Pedagógicos adecuados a las exigencias del entorno educativo en que se desenvuelve el Centro Universitarios Regional de Nacaome.

II. Elaboración del Proyecto

Alcance del proyecto:	Mejorar en un 5% el acceso a Educación Superior en el área de la docencia de la población de San Pedro Sula, Cortés.
Impacto ambiental:	El proyecto no generará impactos negativos en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial
Impacto en el terreno y asentamientos:	No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Detalles del contacto:	Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores, 50499411275, jalvarez@upnfm.edu.hn
Fuentes de financiamiento:	Tesoro Nacional
Propuesta del Proyecto	L. 8.144.660,00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Según nota de prioridad N° 000000 oficio DGIP-
Estado actual del proyecto	Etapa de pre inversión
Costo de financiación (proyectada 2016):	L. 4,977,000.00
Fecha de finalización (proyectada):	mayo de 2017

III. Ejecución del Proyecto

Relación de la planificación con los productos entregados de manera trimestral:

Se han ejecutado el proyecto conforme a la descripción inicial del mismo.

Variación en el costo total del proyecto:

No se puede determinar ya que el proyecto se encuentra en ejecución.

Variación en el alcance y duración del proyecto:

Ninguna

Razones de los cambios

Ninguna

Responsable de la elaboración del informe (nombre y firma)

Luis Eduardo Alvarenga

31 de enero de 2017



Fotografías del diseño y del proyecto:

