

PARA: **ABG. MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO**
Jefe del Departamento de Transparencia y Anticorrupción

DE: **LIC. ASÍS CASTELLANOS ÁLVAREZ**
Jefe de Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

FECHA: 4 de septiembre de 2024

ASUNTO: **RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN**




En respuesta al **MEMORANDO-ADUANAS-DTA-395-2024**, recibido en fecha 16 de agosto de 2024, referente a proporcionar información en torno a la ejecución de proyectos del mes de agosto del año en curso.

Se remite la siguiente documentación:

1. Nota aclaratoria.
2. Informe de transparencia (reporte de infraestructura del mes de agosto 2024).

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente.

C.C. Abog. Fausto Cáliz Márquez / Director Ejecutivo de ADUANAS
C.C. Arq. Gretell Cáliz / Gerente Nacional de Proyectos
C.C. Archivo

NOTA ACLARATORIA

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), por medio de la presente hace constar que según lo establecido en los Lineamientos para la Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el apartado Programas y Proyectos, instruye literalmente lo siguiente: **“Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la institución obligada según la fase del proyecto”**. Estos detalles se encuentran a continuación:

1. Identificación del proyecto.
2. Elaboración del proyecto.
3. Ejecución del proyecto.
4. Finalización del proyecto.

Se adjunta la constancia de avance del proyecto que se comenzó en el mes de agosto de 2024.

Asimismo, cabe señalar que dicha Unidad Administradora de Proyectos de ADUANAS es únicamente gestora de proyectos. La ejecución y manejo de fondos nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera. Durante la ejecución de los proyectos asignados a la Unidad, esta es responsable de dar el visto bueno de las actividades realizadas con el fin de que dicha gerencia proceda con los pagos que correspondan.

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los cuatro (4) días mes de septiembre de 2024.



Lic. Asís Castellanos Álvarez
Jefe de la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

“Mejoramiento de la infraestructura de las aduanas de Guasaule y la fraternidad, pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras” regido por la licitación pública nacional LPN-ADUANAS-OBRAS-001-2024.

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Jefe de la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- Mejoramiento de la infraestructura de las aduanas de Guasaule y la fraternidad, pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la licitación pública nacional lpn-aduanas-obras-001-2024

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Aldea San Juan, Municipio del Triunfo, Departamento de Choluteca, Aduana de Guasaule, Frontera entre Honduras y Nicaragua.

PROPÓSITO

El propósito del proyecto es mejorar la infraestructura física del edificio de apartamentos de la Aduana de Guasaule y el mejoramiento de la infraestructura del edificio administrativo de la Aduana de la Fraternidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura de los apartamentos, que contempla el suministro e instalación de lámina de techo, repello y pulido de paredes, instalación de generador eléctrico, suministro e instalación de puertas, suministro e instalación de ventanas, suministro e instalación de barreras vehiculares, construcción de muro perimetral, adoquinamiento de los estacionamiento y adecuación de áreas verdes.

- En el caso de la Aduana de la Fraternidad se realizará el cambio de canales de agua lluvia y la construcción de plumas metálicas tanto en ingreso como en salida de la Aduana.

2. ELABORACION DEL PROYECTO

ALCANCE

Esta readecuación busca las mejoras en las instalaciones de los apartamentos de la Aduana de Guasaule para contar con instalaciones óptimas para todos los colaboradores en la Aduana.

- Entre ellas involucra:
- la infraestructura física (puertas, ventanas, pisos).
- Readecuación del Anden y Oficinas.
- Pintura y acabados.
- Mobiliario.
- Instalaciones Hidrosanitarias.
- Instalaciones Eléctricas.

En la Aduana de la Fraternidad se realizará el cambio de canales de agua lluvia y la construcción de plumas metálicas tanto en ingreso como en salida de la Aduana.

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:
Aire: Ruidos debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de demolición.
Aire: Partículas de polvo generadas por actividades de demolición los cuales son de carácter temporal.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Jefe de Unidad de Cooperación Externa y Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniera Edis Corrales/ Constructora Corrales Ingenieros S. DE. R. L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Página 2 de 5

La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras

[@aduanashonduras](mailto:info@aduanas.gob.hn)    www.aduanas.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

- Fondos propios de la Institución, para la contratación de una empresa por medio de licitación pública para el desarrollo del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **14.776.271,12 millones de lempiras.**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Segundo Trimestre del 2024

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el oferente **CONSTRUCTORA CORRALES INGENIEROS S. DE. R. L. DE C.V.**

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de 14,776,271.12 millones de lempiras.

Las inversiones realizadas son las siguientes:

Desmontajes de techos, ventanas, puertas, canales de agua lluvia, demoliciones, construcción de cimentaciones para paredes y muro perimetral, construcción de soleras y castillos, instalación de puertas y ventanas nuevas, instalación de pérgolas, balcones, instalación de cielo falso de PVC y tabla yeso, instalación de piso de porcelanato y cerámica en baños y cocina, repello, pulido de paredes, pintura en paredes, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, mejoramiento de áreas verdes, construcción y nivelación de áreas de estacionamiento.

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 24 de febrero de 2025

PORCENTAJE DE AVANCE

- 6% (porcentaje validado al 31 de agosto de 2024)

3. EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL



- Está en la fase de construcción por lo que no se ha hecho entrega de ningún producto todavía.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- No hay obras adicionales.


VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

- No hay variación en el alcance ni tampoco variación en la duración del proyecto



RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS

- No hay cambios.

ESQUEMA

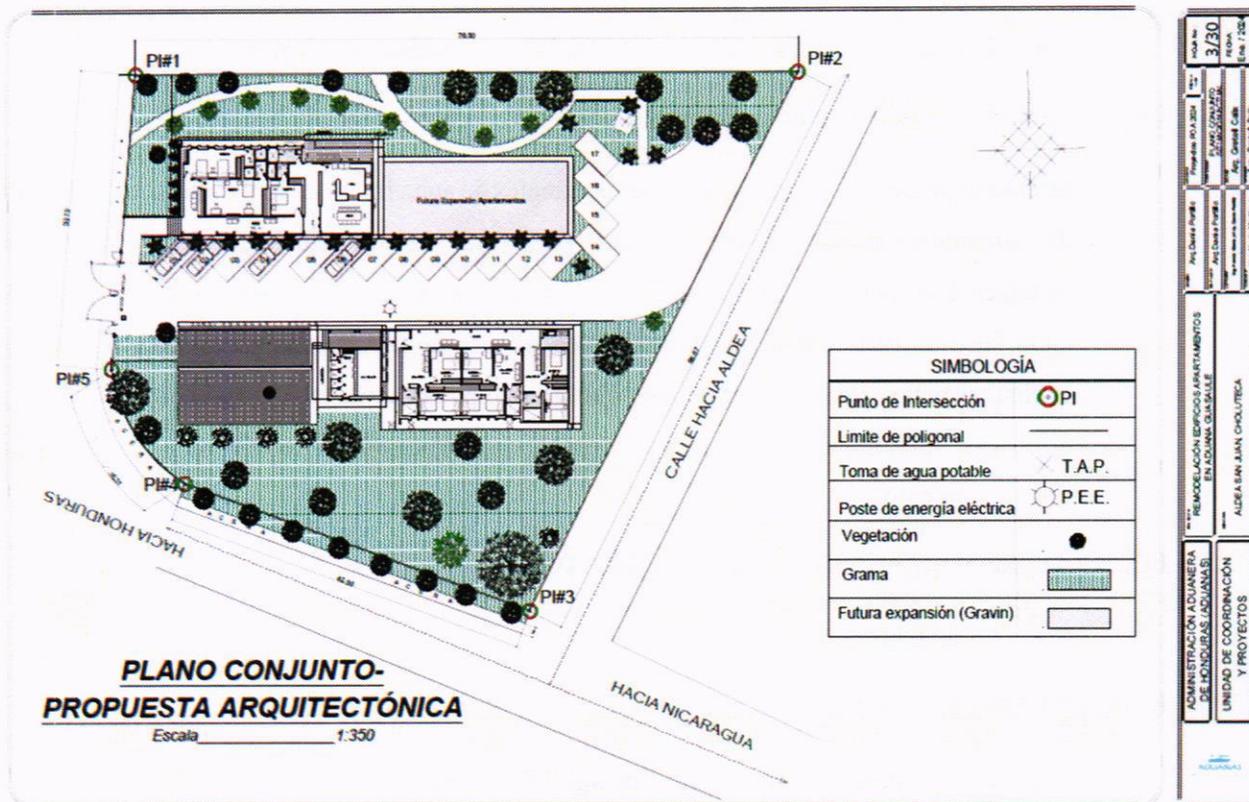

FOTOGRAFÍAS

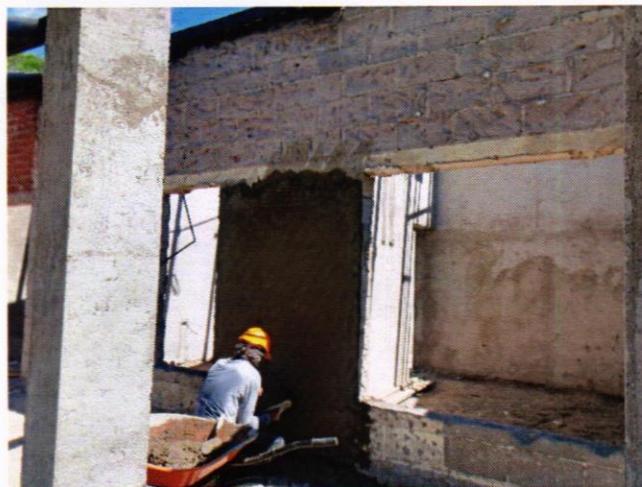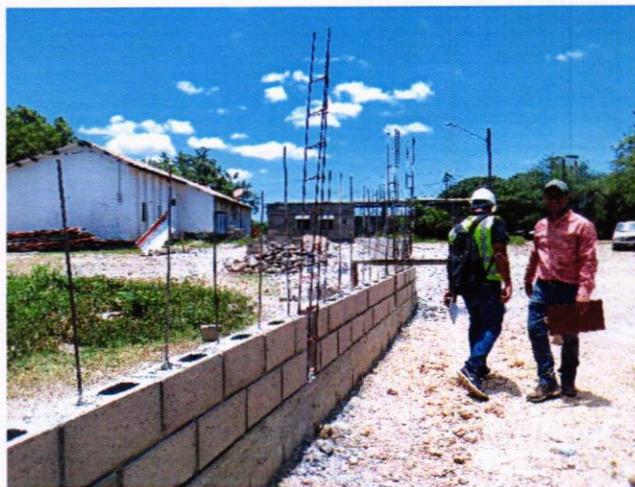

"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"

