



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024  
Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12440

L.: 266,521.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14939

Fecha de Emision: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE

Id/RTN: 0607198800113

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripcion:



Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Módulos Sanitarios y Tanque de agua elevado 2500 Lts y obras adicionales en el Instituto Jacobo V. Cárcamo (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 016 001 000 23400 11-011-08	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PRI5-6 TANQUE DE AGUA DE 2,500 GAL Y PILETA Y OBRAS ADICIONALES INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	266,521.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	266,521.21
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>266,521.21</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  	

Recibido por: Selvin Javier Baquedano Valle  
 Identidad No.: 0607198800113

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9sMTTnxVmpyDxCozM2ADCAhRldWA5dl8cR4mai6eBrVvWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S  
 AhEX5o4v0knFTKcisXICOBLO81Np9hXm/4





Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024  
Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12440

L.: 266,521.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14939

Fecha de Emision: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE

Id/RTN: 0607198800113

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripcion:

Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Módulos Sanitarios y Tanque de agua elevado 2500 Lts y obras adicionales en el Instituto Jacobo V. Cárcamo (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 016 001 000 23400 11-011-08	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PRI5-6 TANQUE DE AGUA DE 2.500 GAL Y PILETA Y OBRAS ADICIONALES INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	266,521.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	266,521.21
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>266,521.21</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde, (sa):

Recibido por: Selvin Javier Baquedano Valle  
Identidad No.: 0607 198800113

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yWSTnx/VmpyDxCozmLADCAhRIdWA5dl8cR4mai6eBrVvWCANIQuFQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S  
AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOI81Np9hXm/4



*Alcaldía Municipal*  
*Municipalidad de Arenal*  
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



## AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al

Señor (A): **SELVIN JABIER BAQUEDANO VALLE** Con tarjeta de

Identidad No. **0607-1988-00113**

La cantidad de Lps **266,521.21**

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON  
VEINTIUN CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de:

Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Módulos Sanitarios y Tanque de agua elevado 2500 Lts y obras adicionales en el Instituto Jacobo V. Cárcamo (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar)

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 14 días del mes Agosto del Año 2024.

\_\_\_\_\_  
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal



ARENAL. Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



## INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO:

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo:	<i>Int- Jacovo V. Corcama</i>		
Código SACE:			
Nivel Educativo:			
Matricula SACE:		No. Docentes:	
Departamento:	Yoro	Municipio:	<i>Arenal</i>
Dirección:	<i>Cosío Urbano</i>		
Coordenadas:	<i>15.3729790</i>		
	<i>-86.9234515</i>		

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:	<i>Construcción Nueva</i>			Construcción Nueva / Reparación / Remodelación / Construcción y Reparación	
Población Beneficiaria:					
Descripción general del proyecto a ejecutar:					
No. Aulas Nuevas:		No. De Módulos Sanitarios Nuevos:	<input checked="" type="checkbox"/>	Contraparte:	L.
No. Aulas reparadas:		No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L.
Entidad Ejecutora:	Alcaldía Municipal/ Otras				
Fuente de financiamiento	FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS				
Fecha de inicio Programada:		Fecha Final Programada:			
Fecha de finalización:		Duración de ejecución:			
Avance (%):	100%	Estado:	<i>70%</i>		

Educación	<b>FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI	
	<b>PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	

**TABLA DE CUMPLIMIENTO:**

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	/		
2. Cuenta con mano de obra calificada	/		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	/		<i>hoy observaciones</i>
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	/		
5. Cuenta con Rotulo informativo del Proyecto a ejecutarse.	/		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo	/		

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

*Fortalecer de 2500 lbs las columnas a 1.55 y no a 1.30*

**ENCARGADO/SUPERVISOR:**

Nombre completo:	<i>Elliot Nuñez</i>
Cargo:	<i>Control de Calidad</i>
Fecha de Evaluación:	

  
 Ing. Rimsky Elliot Núñez  
 Técnico Supervisor del Proyecto  
 DIGECEBI

Responsable de la Obra:	
-------------------------	--

**ALCALDIA MUNICIPAL  
ARENAL-YORO**

**INFORME DE AVANCE No.2 (70%)**

**CENTROS EDUCATIVOS:**

- INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO**
- KINDER GABRIELA MISTRAL**
- CEB. LUCAS QUEZADA.**
- ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE**

**FECHA:**

**13-AGOSTO-2024**

**EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES  
BAQUEDANO S. de R.L.**

## **CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE YORO.**

EN TODO LOS CENTROS EDUCATIVOS SE ESTA TRABAJANDO EN LAS INSTALACION DE PAREDES, FUNDICION DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES: COLUMNAS, CASTILLOS, JAMBAS Y SOLERAS CARGADOR.

EN LAS PAREDES INTERIORES LA SUPERVISION AUTORIZO USAR BLOQUE DE 5" PORQUE EN ESE MOMENTO NO HABIA PRODUCCION DE BLOQUE DE 4" Y SU PRODUCCION TARDARIA 2 SEMANAS.

SE ESTA FINALIZANDO LA CONSTRUCCION DE LOS TANQUES EN LOS 3 CENTROS EDUCATIVOS CORREPONDIENTE **KINDER GABRIELA MISTRAL, INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO, CEB. LUCAS QUEZADA.**

SE ESTA TERMINADO LA FOSA SEPTICA TIPO II EN EL **CEB LUCAS QUEZADA** TAMBIEN SE FUNDIERON LOS FIRMES DE CONCRETO, SE TERMINO LA TUBERIA SANITARIA COMO SER: SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE CON SUS REPECTIVOS CAJAS DE REGISTRO FINALIZANDO 15 DE AGOSTO.

EL DIA 30 DE JULIO INGRESO EL MATERIAL PISO DE GRANITOS Y TERRAZOS.

SE HIZO LA COMPRA DE LOS 3 TANQUES DE 2500 LTS

SE HIZO LA COMPRA DE LAS PLACAS CONMEMORATIVAS TIPO MARMOL DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS.

SE ESTA FINALIZANDO LA CULATAS PARA LA ESTRUCCURA DE TECHO.


NOTA:

SE TUVO PROBLEMAS CON EL ABASTECIMIENTO DE MADERA POR FALTA DE PRODUCCION EN LOS ACERRADEROS CERCANOS.

TAMBIEN HUBO ATRAZO DE UNA SEMANA Y MEDIA POR PARTE DE LA BLOQUERA LA MODERNA CON LOS ULTIMOS BLOQUE DE 6".

**ACTIVIDADES:**



**INSTITUTO JACOBO V CARCAMO, MODULO SANITARIO Y TANQUE.**

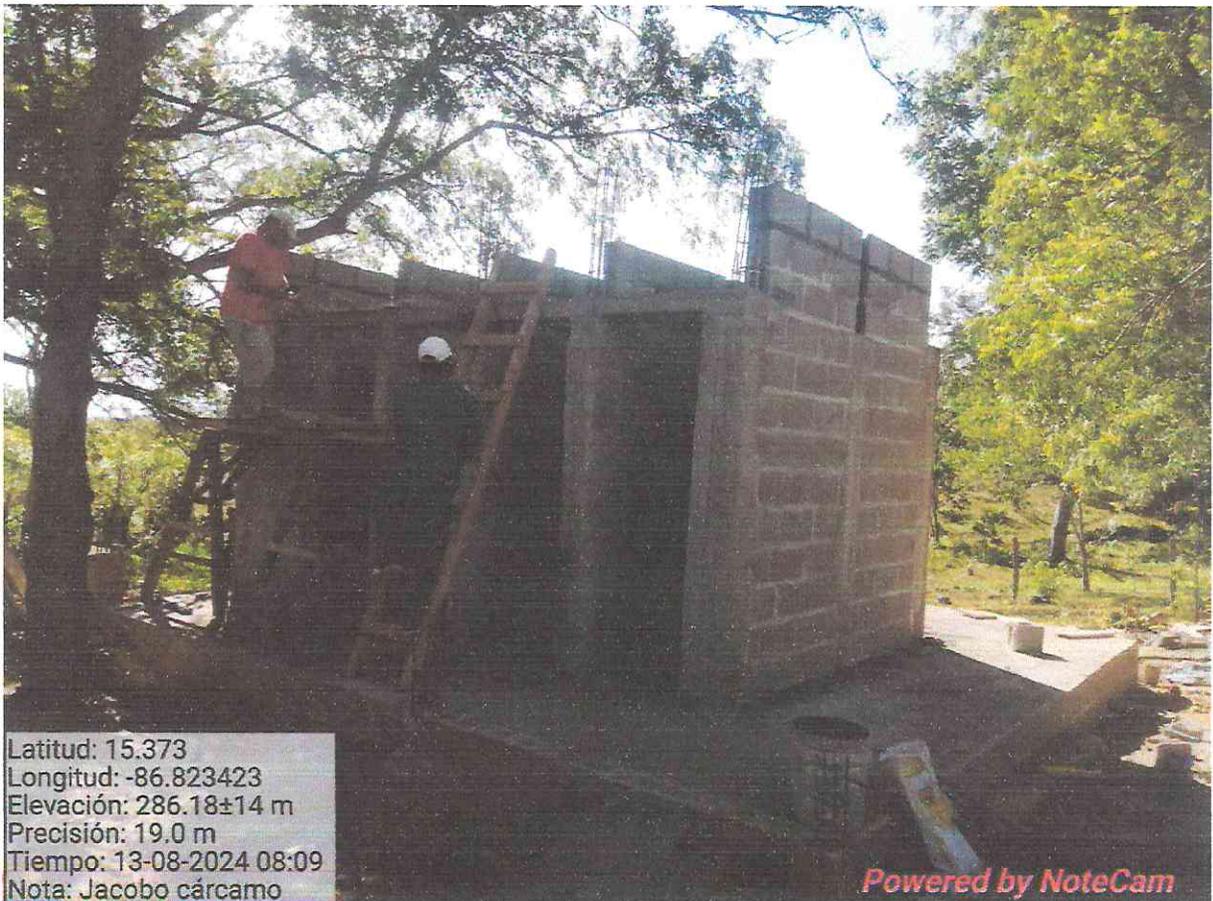



**ACTIVIDADES:**

**KINDER GABRIELA MISTRAL, MODULO SANITARIO Y TANQUE.**

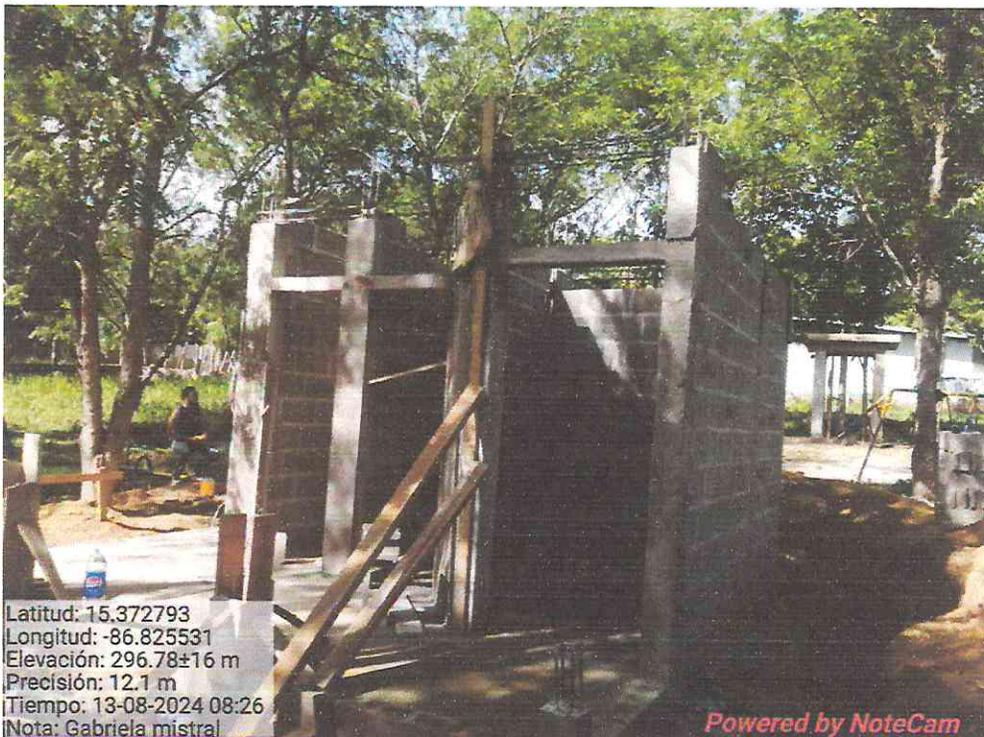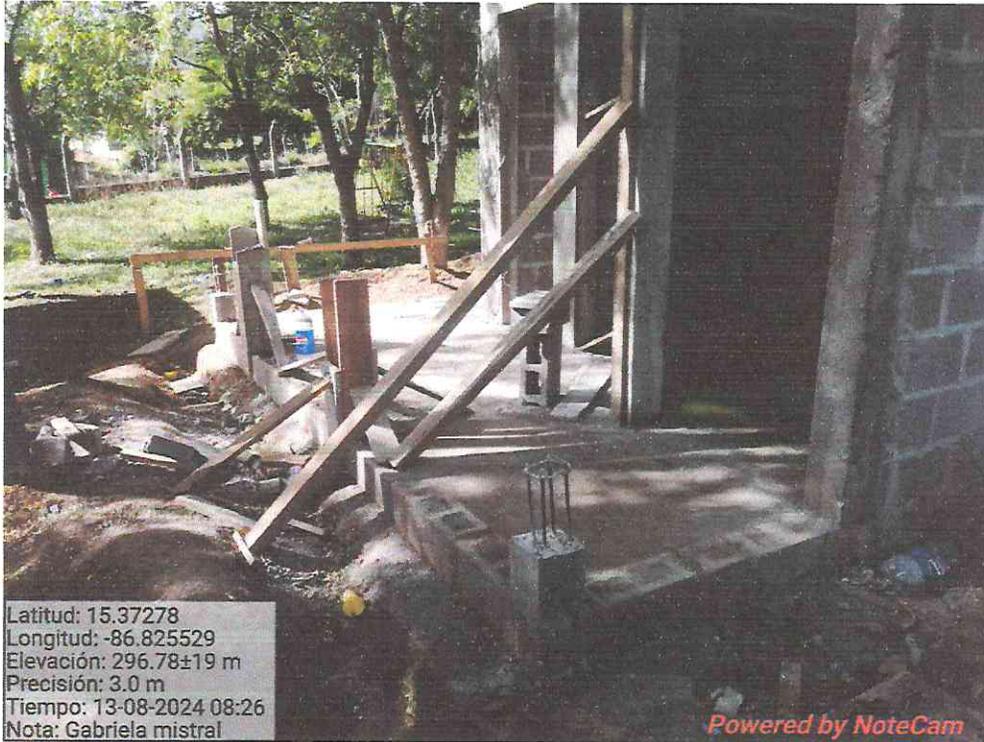







Latitud: 15.372438  
Longitud: -86.825814  
Elevación: 302.97±4 m  
Precisión: 42.5 m  
Tiempo: 13-08-2024 08:25  
Nota: Gabriela mistral

Powered by NoteCam

**ACTIVIDADES:**


**CEB LUCAS QUEZADA, FOSA SEPTICA TIPO II, MODULO SANITARIO Y TANQUE.**




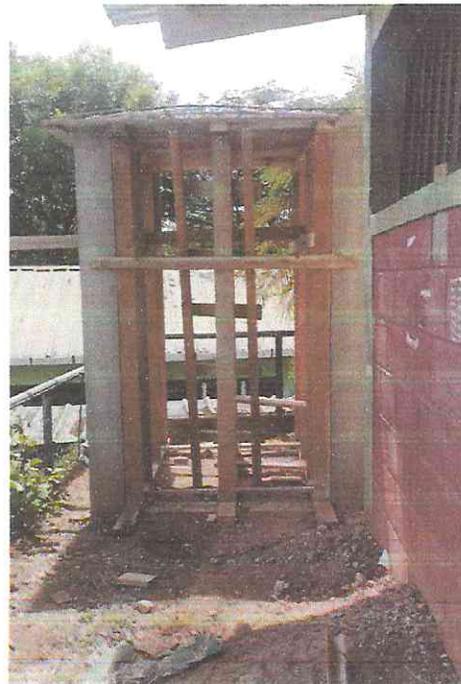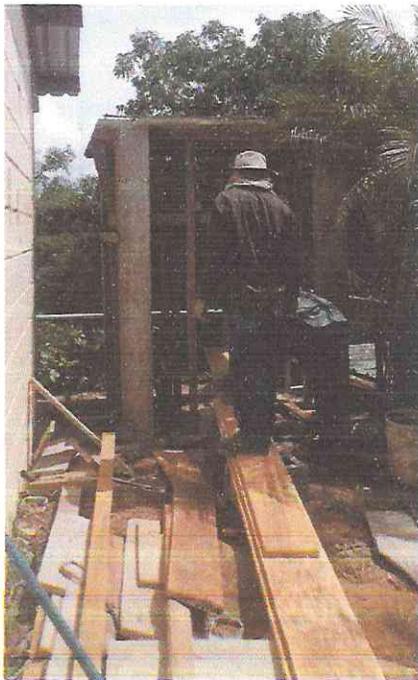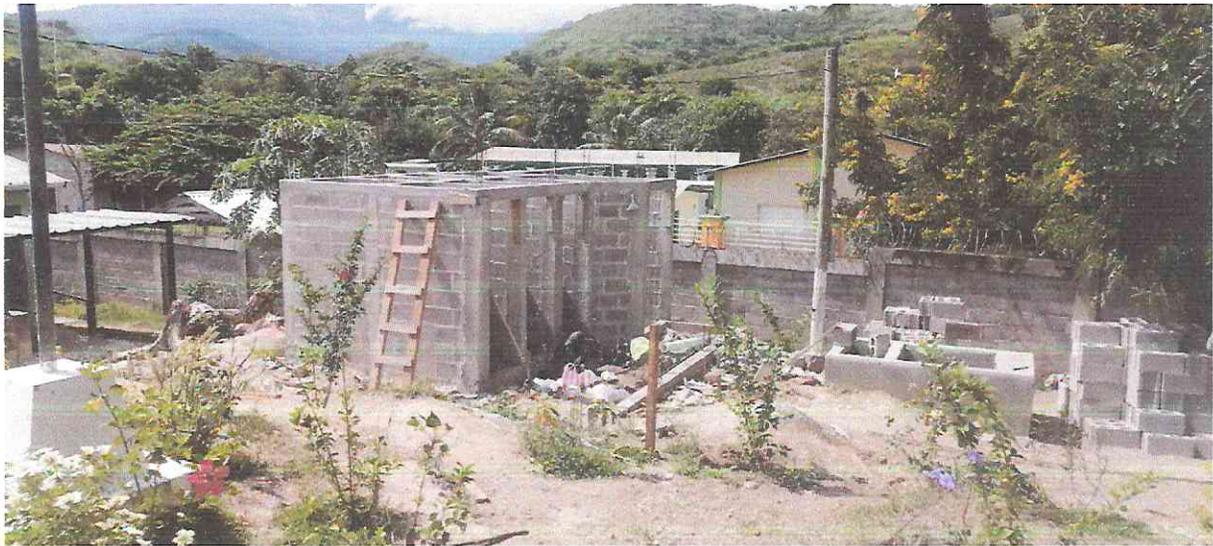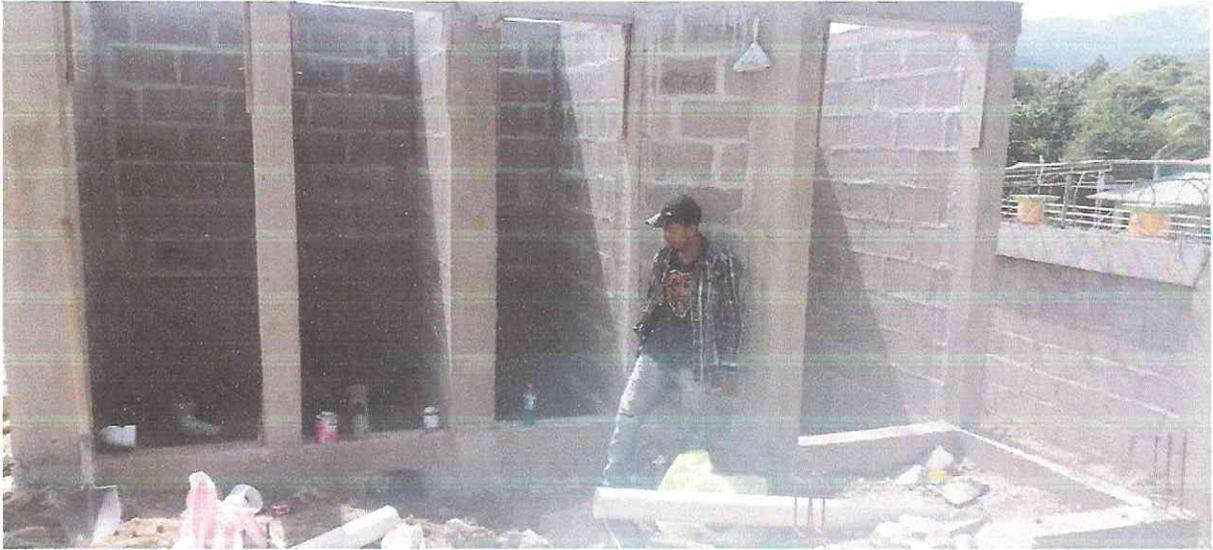





**ACTIVIDADES:**

**ESCUELA CARLOS IZAGUIRREB AULA 6X8 MODULO SANITARIO.**

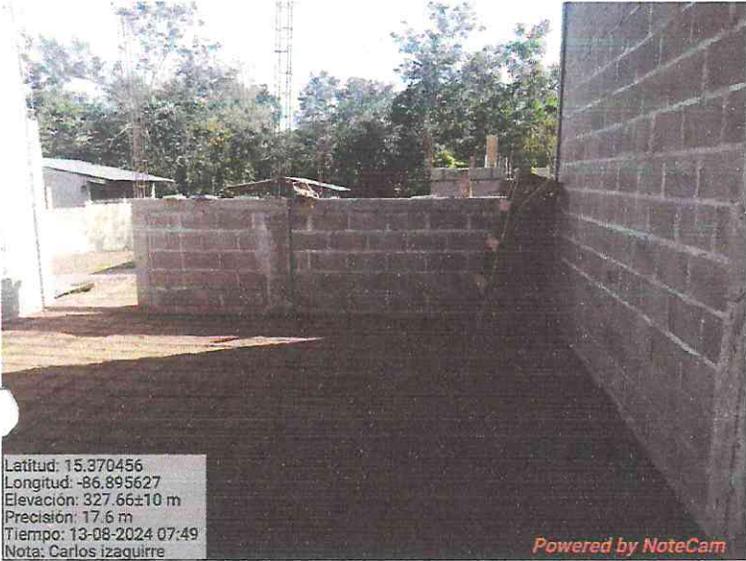

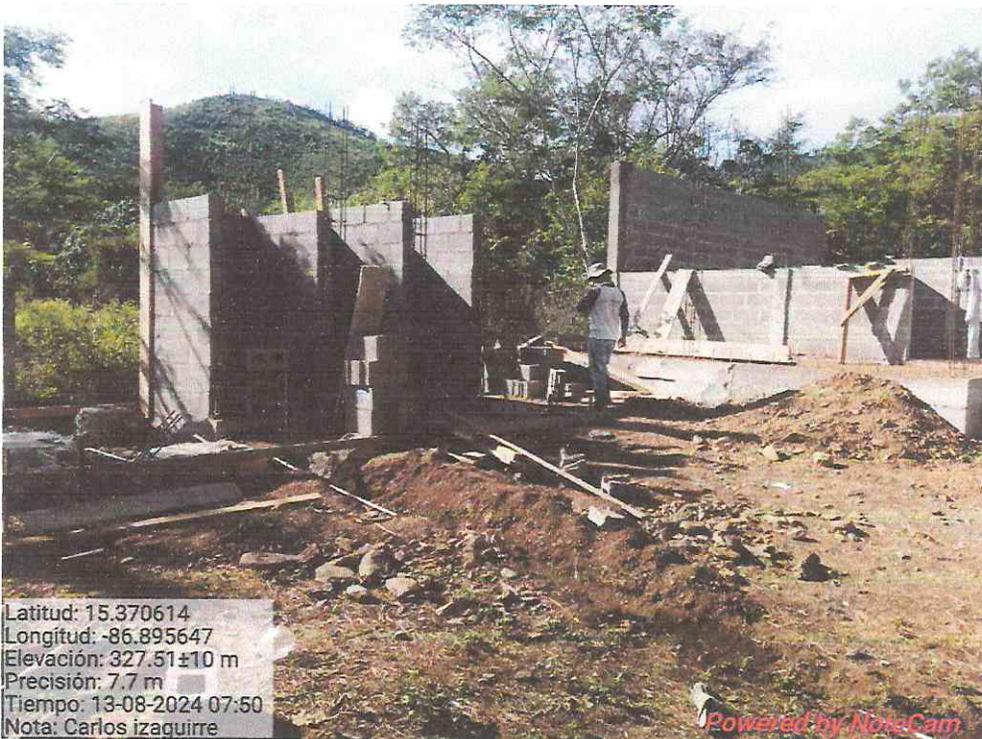

**PLACAS CONMEMORATIVAS:**

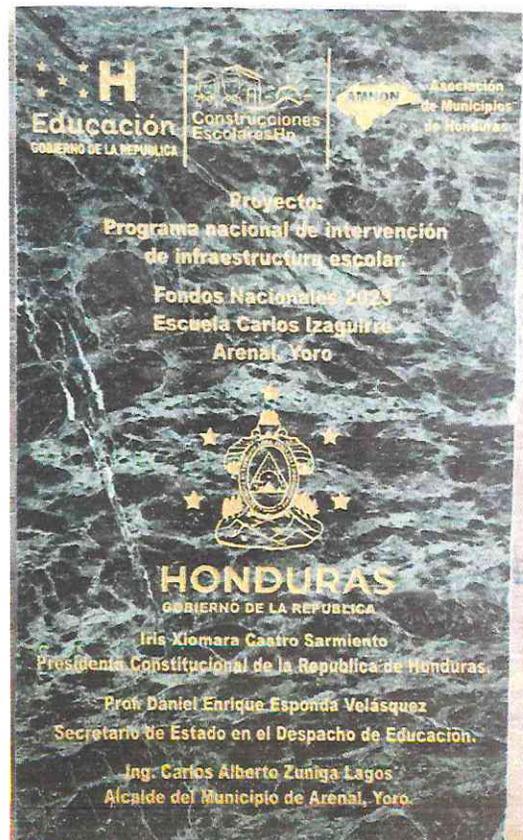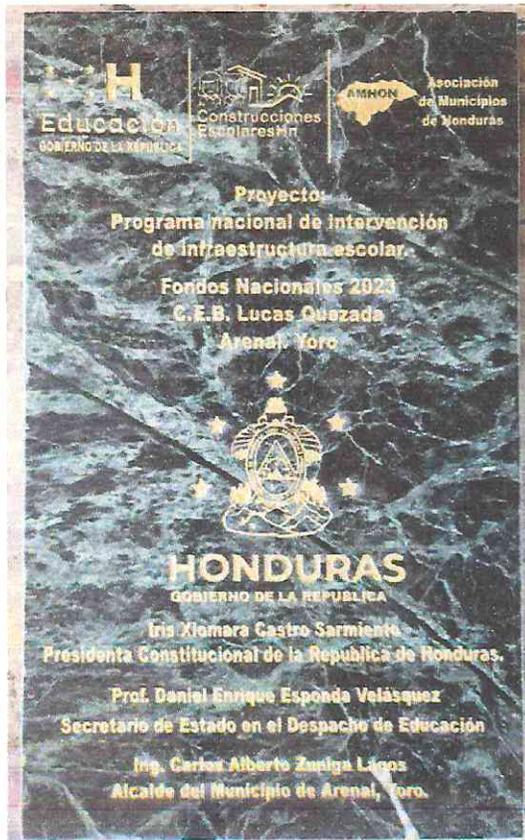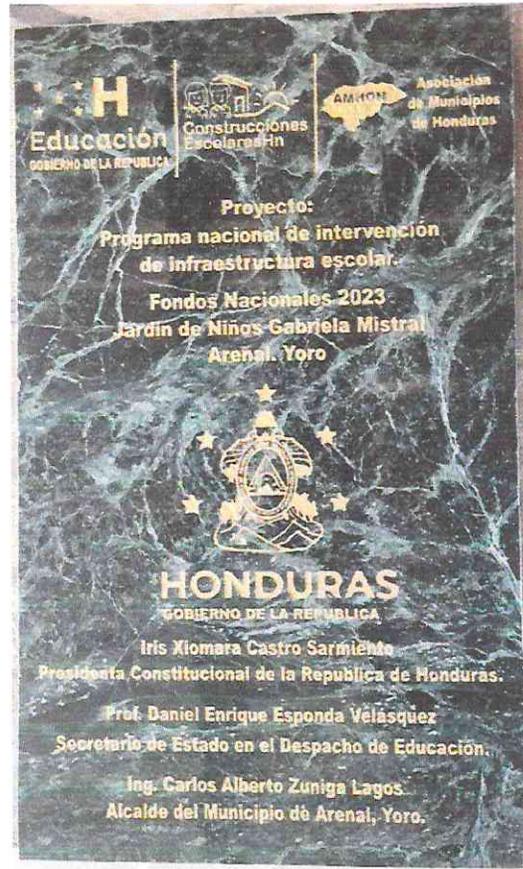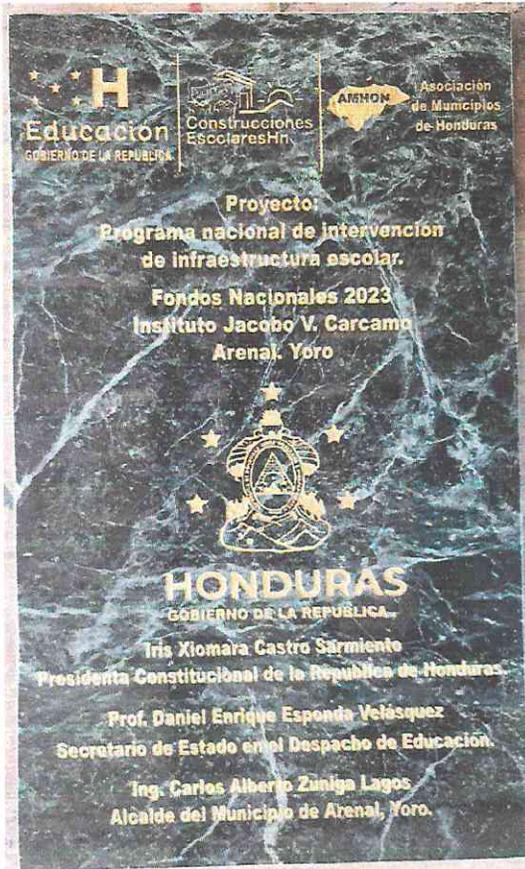



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00017145**

ARENAL

14 de agosto de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE

L 266,521.21

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON VEINTIUN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆③⑆0⑆30⑆4⑆0000③⑆0⑆10⑆9③⑆25⑆7⑆000⑆1⑆7⑆1⑆4⑆5

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Módulos Sanitarios y Tanque de agua elevado 2500 Lts y obras adicionales en el Instituto Jacobo V. Cárcamo (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Módulos Sanitarios y Tanque de agua elevado 2500 Lts y obras adicionales en el Instituto Jacobo V. Cárcamo (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar)			



CHEQUE No. 00017145

BALANCE



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0400, 2545-0700 / CR.05-231 - 12PTT24501
