



*Republica de Honduras*  
*Alcaldía Municipalidad de Taulabe, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

**DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAMPO MES DE SEPTIEMBRE 2024**

**INFORME UTM**

**INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024**

Sirva el presente para dar a conocer las diferentes actividades que formaron parte de las intervenciones de la Unidad Tecina Municipal (UTM). Visitas Técnicas

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	LUGAR DE VISITA	DETALLE	RECORRIDO
2/9/024	Ing. Joel Nolasco (UTM) Chofer Elvis Nolasco.	Casco Urbano de Taulabe.	Excavación de tipo 2 suelo semi duro, para construcción de pozo séptico, Gestionando de parte de Municipalidad.	N/A
5/9/024	Ing. Joel Nolasco (UTM), Admón. Lorenzo Flores.	Comunidad de los Llanos.	Supervisión de realización de plante de 7x10 en kínder de niños en la comunidad de los Llanos, Gestionando de parte de Municipalidad.	N/A
11/9/024	Ing. Joel Nolasco (UTM).	Casco Urbano de Taulabe.	Supervisión de proyecto, Construcción de muro perimetral en bodega municipal. Gestionando de parte de Municipalidad.	N/A
13/9/024	Ing. Joel Nolasco (UTM).	Casco Urbano de Taulabe.	Supervisión de proyecto, suministro de pintura para parque central de Taulabe y instalación de pintura en cancha deportiva, Gestionando de parte de Municipalidad.	N/A
14/9/024	Ing. Joel Nolasco (UTM Chofer Elvis Nolasco.	Casco Urbano de Taulabe.	Supervisión de proyecto, suministro de pintura para parque central de Taulabe y instalación de pintura en cancha deportiva, Gestionando de parte de Municipalidad.	N/A
19/9/024	Ing. Joel Nolasco (UTM),	Casco Urbano de Taulabe.	Reparación en calle principal de Taulabe por mal estado, se construyó una pastilla de concreto hidráulico de 3 x 5 metros, Gestionando de parte de Municipalidad.	N/A
20/9/024	Ing. Joel Nolasco (UTM), Chofer Elvis Nolasco.	Comunidad de San Antonio de Yurés.	Construcción de cerco perimetral en del CEPREB Nuevo Amanecer.	N/A
20/9/024	Ing. Joel Nolasco (UTM),	Casco Urbano de Taulabe.	Reparación en calle principal de Taulabe por mal estado, se construyó una pastilla de concreto hidráulico de 3 x 5 metros, Gestionando de parte de Municipalidad.	N/A
20/9/024	Ing. Joel Nolasco (UTM) Chofer de la municipalidad	Comunidad de Sabanas	Supervisión de mantenimiento del crematorio de nivel 2. Gestionado por la municipalidad de Taulabe.	N/A
26/9/024	Ing. Joel Nolasco (UTM) Admón., Ing. Lorenzo.	Casco Urbano de Taulabe.	Excavación de cimentación para muro de bodega municipal.	N/A



---

**Ing. Joel Nolasco**

**JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**



*Republica de Honduras*  
*Alcaldía Municipal de Taubabé*  
*Taubabé; Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

**DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**  
**CUADRO RESUMEN DE CONTRATOS MES SEPTIEMBRE 2024**

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	DETALLE	PROYECTO O ACTIVIDAD	EJE	CONTRATISTA	LUGAR
16/9/2024	Ing. Joel Nolasco (UTM)	Informe de Supervisión	Mantenimiento del crematorio nivel 2	Infraestructura Vial	CONSTRATISTA JORGRE PINEDA.	Carretera que conduce a la comunidad de Sabanas.



**Jefe de Unidad Técnica Municipal**  
Ing. Joel Nolasco



*Republica de Honduras C.A*



*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*

Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

### INFORME DE SUPERVISION #1

**Nombre del proyecto:** Excavación de tipo 2 suelo semi duro, para construcción de pozo séptico.

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Casco Urbano de Taulabe.

Realización por jornales de la municipalidad, no hay contrato.

#### Responsables:

**Ejecutor:** Municipalidad de Taulabe.

**Supervisor:** Ing. Joel Nolasco.

#### Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	30 de septiembre de 2024.
Fecha de inicio de Proyecto	2 de septiembre de 2024.
Fecha Final de Proyecto	4 de septiembre de 2024.

#### Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	x	Operador de Maquinaria.	x
Con lluvia		Malo		Ayudantes	x
				Peón	x

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** El trabajo se realizó de la mejor manera.

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno  Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se realiza la limpieza de la zona que fue la más pertinente para realizar el proyecto.
- Se realiza la excavación con mano de obra y de forma manual, para la Construcción de Fosa Séptica
- Una vez realizada toda la excavación de proceder a Cuadrar la excavación, dejando los niveles correspondientes.


**CONCLUSIONES:**

- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo en la realización de la actividad.



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING JOEL NOLASCO

## ANEXOS FOTOGRAFICOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

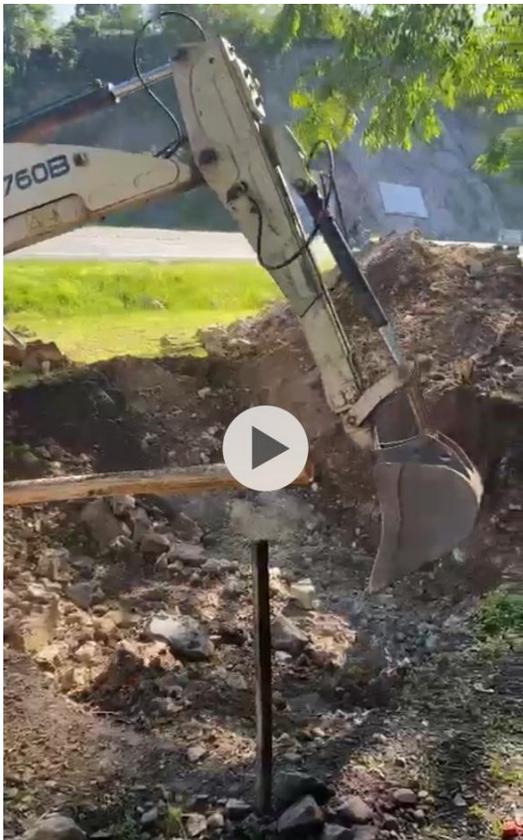





*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

**Nombre del proyecto:** Supervisión de realización de plantel de 7x10 en kínder de niños.

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Comunidad de los Llanos

Realización por jornales de la municipalidad, no hay contrato.

**Responsables:**

**Ejecutor:** Municipalidad de Taulabe.

**Supervisor:** Ing. Joel Nolasco.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	<b>Estimación de Avance: 100%</b>
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	30 de septiembre de 2024.
<b>Fecha de inicio de Proyecto</b>	5 de septiembre de 2024.
<b>Fecha Final de Proyecto</b>	5 de septiembre de 2024.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia	x	Bueno	x	Operador de Maquinaria.	x
Con lluvia		Malo		Ayudantes	x
				Peón	x

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** El trabajo se realizó de la mejor manera.

**No suficiente:**

**Rechazado:**


**CALIDAD DE OBRA:** Bueno  Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se realiza la limpieza de la zona que fue la más pertinente para realizar el proyecto.
- Se realiza la excavación con retroexcavadora se removi6 material del mismo terreno para anivelar el terreno.
- Una vez realizada toda la excavaci6n de proceder a Cuadrar la excavaci6n, dejando los niveles correspondientes.

**CONCLUSIONES:**

- La ejecuci6n de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad T6cnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones clim6ticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo en la realizaci6n de la actividad.



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING JOEL NOLASCO

## ANEXOS FOTOGRAFICOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS







*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

**Nombre del proyecto:** Supervisión de proyecto, Construcción de muro perimetral en bodega municipal.

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Casco Urbano de Taulabe.

Realización por jornales de la municipalidad, no hay contrato.

**Responsables:**

**Ejecutor:** Municipalidad de Taulabe.

**Supervisor:** Ing. Joel Nolasco.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	<b>Estimación de Avance: 100%</b>
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	30 de septiembre de 2024.
<b>Fecha de inicio de Proyecto</b>	11 de septiembre de 2024.
<b>Fecha Sigue en construcción de Proyecto</b>	26 de septiembre de 2024.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia	x	Bueno	x	Albañil.	x
Con lluvia		Malo		Ayudantes	x
				Peón	x

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** El trabajo se realizó de la mejor manera.

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno  Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se realiza la limpieza de la zona que fue la más pertinente para realizar el proyecto.
- Se realiza la excavación con mano de obra y de forma manual, para la Construcción de Fosa Séptica
- Una vez realizada toda la excavación de proceder a Cuadrar la excavación, dejando los niveles correspondientes.

**CONCLUSIONES:**


- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo en la realización de la actividad.



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING JOEL NOLASCO

## ANEXOS FOTOGRAFICOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS



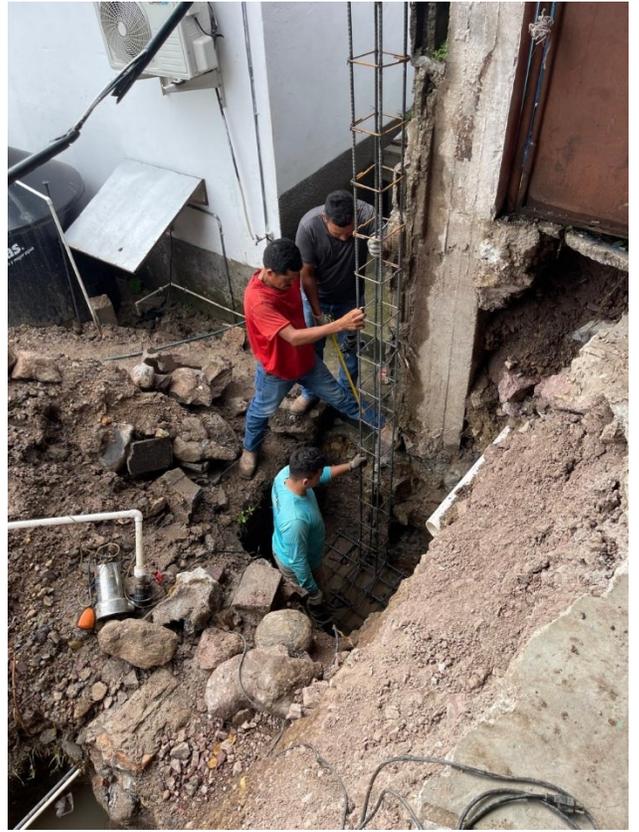



*Republica de Honduras C.A*



*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*

Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

### INFORME DE SUPERVISION #1

**Nombre del proyecto:** Supervisión de proyecto, suministro de pintura para parque central de Taulabé e instalación de pintura en cancha deportiva.

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Barrio Santa Barbara.

Realización por jornales de la municipalidad, no hay contrato.

#### Responsables:

**Ejecutor:** Municipalidad de Taulabé.

**Supervisor:** Ing. Joel Nolasco.

#### Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	30 de septiembre de 2024.
Fecha de inicio de Proyecto	14 de septiembre de 2024.
Fecha Final de Proyecto	14 de septiembre de 2024.

#### Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	x	Pintor.	x
Con lluvia		Malo		Ayudantes	x
				Peón	x

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** El trabajo se realizó de la mejor manera.

**No suficiente:**

**Rechazado:**


**CALIDAD DE OBRA:** Bueno  Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se realiza la limpieza de la zona que fue la más pertinente para realizar el proyecto.
- Se instalo un base color azul en la cancha, para poder borrar el color anterior y se adhiera la pintura nueva.
- Se hizo el trasado y marcado de la cancha, para poder utilizar la pintura blanca para definir las áreas de juego y saques del mismo.

**CONCLUSIONES:**

- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo en la realización de la actividad.



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING JOEL NOLASCO

## ANEXOS FOTOGRAFICOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS





*Republica de Honduras C.A*



*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*

Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

### INFORME DE SUPERVISION #1

**Nombre del proyecto:** Supervisión de proyecto, suministro de pintura para parque central de Taulabe.

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Casco Urbano de Taulabe.

Realización por jornales de la municipalidad, no hay contrato.

#### Responsables:

**Ejecutor:** Municipalidad de Taulabe.

**Supervisor:** Ing. Joel Nolasco.

#### Según Estimación:

<b>Estimación de campo: 100%</b>	<b>Estimación de Avance: 100%</b>
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	30 de septiembre de 2024.
<b>Fecha de inicio de Proyecto</b>	12 de septiembre de 2024.
<b>Fecha Final de Proyecto</b>	14 de septiembre de 2024.

#### Observaciones Generales:

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia	x	Bueno	x	Jefe de Pintura.	x
Con lluvia		Malo		Ayudantes	x
				Peón	x

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** El trabajo se realizó de la mejor manera.

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno  Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se realiza la limpieza de la zona que fue la más pertinente para realizar el proyecto.
- Se procedió a lijar las bancas, fuentes de agua, bordillos y kiosco principal de parque, para limpiar todo mojado o sucio que estuviera en las estructuras.
- Se instaló una base color azul en las estructuras que se ya se había planificado de igual forma con el color amarillo, para poder borrar el color anterior y se adhiera la pintura nueva.
- Se hizo el trasado y marcado de la cancha, para poder utilizar la pintura blanca para definir las áreas.

**CONCLUSIONES:**

- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo en la realización de la actividad.



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING JOEL NOLASCO

**ANEXOS FOTOGRAFICOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**







*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

**Nombre del proyecto:** Reparación de calle principal de Taulabé.

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Casco Urbano de Taulabé.

Realización por jornales de la municipalidad, no hay contrato.

**Responsables:**

**Ejecutor:** Municipalidad de Taulabé.

**Supervisor:** Ing. Joel Nolasco.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	<b>Estimación de Avance: 100%</b>
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	30 de septiembre de 2024.
<b>Fecha de inicio de Proyecto</b>	19 de septiembre de 2024.
<b>Fecha Final de Proyecto</b>	19 de septiembre de 2024.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia	x	Bueno	x	Operador de Maquinaria.	x
Con lluvia		Malo		Ayudantes	x
				Peón	x

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** El trabajo se realizó de la mejor manera.

**No suficiente:**

**Rechazado:**


**CALIDAD DE OBRA:** Bueno  Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se realiza la limpieza de la zona que fue la más pertinente para realizar el proyecto.
- Se realizó el trazo y marcado del área dañada (baches en calle asfáltica).
- Se desistió la carpeta asfáltica en mal estado y se procedió a compactar el área de trabajo.
- Se realizó una dosificación de concreto de 3000 psi, 1:2:2 de proporción.
- Se afinó y niveló conforme a pendiente establecida.
- Se dio tiempo de curado de 12 días.

**CONCLUSIONES:**

- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo en la realización de la actividad.



SUPERVISION UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL  
ING JOEL NOLASCO

## ANEXOS FOTOGRAFICOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS





*Republica de Honduras C.A*



*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*

*Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.*

*RTN 0321-9001-034-319.*

INFORME DE SUPERVISION #2  
Del 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2024

*ING. JOEL NOLASCO SUPERVISOR.*

**PROYECTO EN EJECUCION – CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, EN KINDER NUEVO AMANECER Ccpreb.**

Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral de en Nuevo Amanecer, Municipio de Taulabé, comunidad de San Antonio de Yurés. Un cerco perimetral es una barrera o límite que se coloca alrededor de un área específica con el propósito de proteger, delimitar o asegurar dicho espacio. Un cerco perimetral de malla ciclónica es una barrera de seguridad construida con alambre de acero galvanizado tejido en forma de cadena, también conocido como malla ciclónica. Este tipo de cerca se utiliza comúnmente para delimitar y proteger áreas, como propiedades residenciales, industriales o comerciales. La malla ciclónica está formada por eslabones entrelazados que crean una estructura resistente y duradera.

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORMACIÓN GENERAL

#### Proyecto

- CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA.

#### Ubicación

- Kínder Nuevo Amanecer, comunidad de San Antonio de Yurés, del Municipio de Taulabé, Comayagua, Honduras. Con coordenadas UTM= 16P 398143.96 m E, 1640578.33 m N.

#### Plazo de ejecución

- 21 días Hábiles.

#### Ejecutor

- Municipalidad de Taulabé, Comayagua. Atreves de patronato.

#### Supervisor

- Ing. Joel Nolasco

## 2 AVANCE FÍSICO

Fecha de inicio 21/08/2024----- Avance Actual 0%

Fecha de finalización 14/09/2024 -----Avance físico 100%

Plazo contractual 21 días -----Tiempo transcurrido 16 días

Ampliación de tiempo 0 días -----Tiempo pendiente 0 días

Plazo autorizado 21 días -----Cierre del informe 30/09/2024

Final autorizado 14/09/2024

#### **Observaciones Generales:**

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Albañil	X
Con lluvia		Malo		Ayudantes	X
				Peón	

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS**

- Ancho de Cimentación 30cm.
- Fondo de Cimentación 50cm.
- Cama de piedra de canto, aproximadamente de 10 A 20 pulgadas, porcentaje de Volumen cubico de la obra de 70%.
- Dosificación de Mortero 1:4.
- Los tubos galvanizados chapa 16 de diámetro de 2 pulgadas tendrán una altura neta de 6 Pie, llevarán arriostres en las esquinas y a cada 20 ml de cerco. El arriostre se pondrá a 45 grados aproximadamente.
- Malla ciclón de 6 Pie de altura y un largo de 30 metros.
- Varilla de 3/8 milimétrica para fijar la malla ciclón, Altura de 5 Pie.

## **CONCLUSIONES:**

- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo de ninguna clase.



---

**SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING JOEL NOLASCO**

# ANEXOS, REGISTRO FOTOGRAFICO







*Republica de Honduras C.A*



*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*

*Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.*

*RTN 0321-9001-034-319.*

**INFORME DE SUPERVISION #1**

**Del 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024**

**ING. JOEL NOLASCO SUPERVISOR.**

**Proyecto Ejecutado – Mantenimiento del Crematorio Municipal, En la Comunidad de Sabanas.**

**Justificación Del Proyecto**

El proyecto del Mantenimiento surge ante el incremento del volumen de desechos sólidos lo que ha imposibilitado el poder garantizar la prestación del servicio de tren de aseo a la ciudadanía que reside en el casco urbano y alrededores del municipio de Taulabé.

Actual se encuentra en malas condiciones para la prestación del servicio. Ya que las lluvias han venido a destruir lo que es el plantel 2 donde se desechan los residuos del casco urbano.

**OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:**

Mantener en condiciones aceptables el lugar utilizado para la Disposición Final de Desechos Sólidos; de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente.

- **Eficiencia Operativa:** Mantener los hornos y otros equipos en óptimas condiciones para maximizar la eficiencia del proceso de cremación.
- **Cumplimiento Normativo:** Asegurarse de que todas las operaciones cumplan con las regulaciones locales, nacionales e internacionales relacionadas con el manejo de restos humanos y emisiones.
- **Reducción de Costos:** Minimizar los costos de reparación y operación mediante un mantenimiento preventivo adecuado que evite fallos inesperados.
- **Limpieza y Sanitización:** Mantener un entorno limpio y higiénico, tanto en las áreas de trabajo como en las instalaciones utilizadas por los familiares.
- **Durabilidad del Equipo:** Extender la vida útil de los equipos mediante un mantenimiento regular y adecuado.

## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del proyecto:** Mantenimiento de calle principal y plantel 2 del crematorio municipal, En la Comunidad de Sabanas.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Comunidad de Sabanas.

Realizador por contratista.

#### Responsables:

**Ejecutor:** Municipalidad de Taulabe.

**Supervisor:** Ing. Joel Nolasco.

<b>Estimación de campo: 100%</b>	<b>Estimación de Avance: 100%</b>
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	30 de septiembre de 2024.
<b>Fecha de inicio de Proyecto</b>	20 de septiembre de 2024.
<b>Fecha Final de Proyecto</b>	25 de septiembre de 2024.

### Observaciones Generales:

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Operador	X
Con lluvia		Malo		Ayudantes	X
				Peón	

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS**

- I. Limpieza general y conformación del terreno (eliminar de manera eficaz los piedras o ramas que impidan la correcta ejecución de la obra) de acuerdo a la disponibilidad o condiciones del terreno, la limpieza se hará con tractor Oruga D6 para mayor eficiencia del trabajo, se llevara la basura hasta las áreas correspondientes.
- II. Escarificación del terreno existente; (remover con MOTONIVELADORA); (de ser necesario) todo aquello que obstaculicé el mantenimiento correcto de la obra, realizar la con eficacia mantenimiento de la calle principales en el crematorio, para obtener una mejor superficie del terreno siendo más sólidos.
- III. Mejoramiento y ampliación de calzada calles que conducen al nivel 2 del crematorio con balastro para solidificar la calle y con su respectiva cuneta según disponga en sitio.
- IV. Compactación del suelo escarificado con Rodillo compactador de 12 toneladas, para alcanzar una estabilidad del terreno deseado, para evitar la porosidad en carreteras y material suelto, compactación de toda la superficie de la carretera y material que se encuentre en la misma.

## **CONCLUSIONES:**

- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo de ninguna clase.





---

**SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**  
**ING JOEL NOLASCO**

## ANEXOS, REGISTRO FOTOGRAFICO



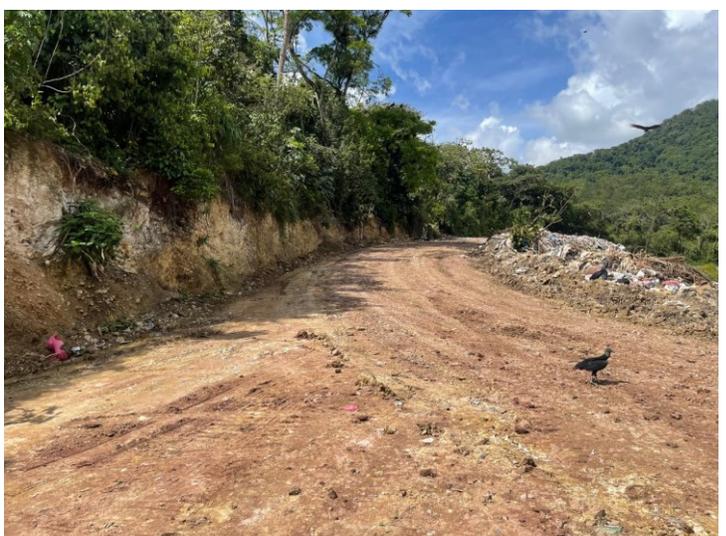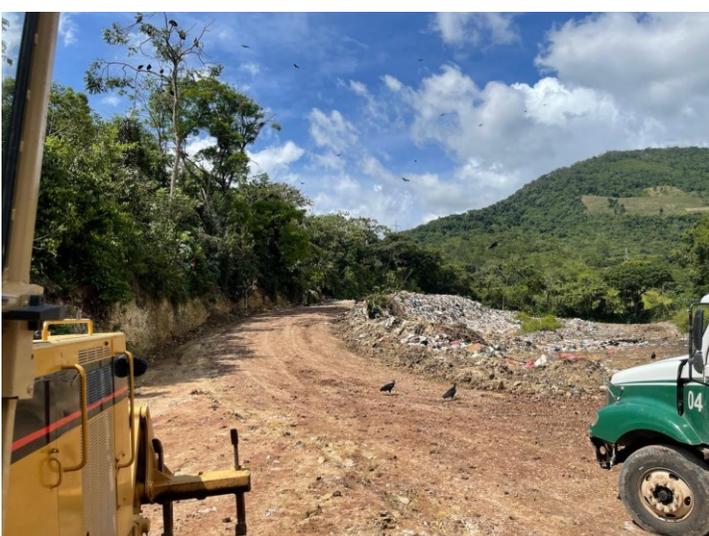



C
