



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS



DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es

LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS

No.	DESCRIPCIÓN	CHECK	OBSERVACIONES
1	Nota dirigida al ministro		
2	Cronograma		
3	Registro fotográfico		
4	Mano de obra contratada		
5	Ficha de supervisión municipal		
6	Facturas, cheques y recibos		
7	Contrato de adquisición de servicios		
8	Orden de inicio		
9	Acta de recepción final de proyecto		
10	Certificación de punto de acta para liquidación de proyectos		
11	Ficha de liquidación municipal		
12	Ficha de socialización de proyectos		
13	Constancias y Certificados • Comisionado Municipal y Transparencia. • Patronato u organización civil. • Certificado del Supervisor SIT. • Visto bueno del gobernador.		



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE
POTRERILLOS**

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



**“PAVIMENTACION CON CONCRETO
CICLOPEO E=20, EN LA ALDEA BUENA
VISTA, EN EL MUNICIPIO DE
POTRERILLOS, CORTES”**

Camino
Productivos



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



Potreriillos Cortes 29 de febrero de 2024.

Ingeniero: Octavio pineda

Ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT

Su Oficina

Estimado Ingeniero

Reciba un cordial y afectuoso saludo deseándole éxitos y bendiciones en sus delicadas funciones.

Por este medio y de la manera más atenta y respetuosa, pido de su apoyo en la aprobación del informe de liquidación por la ejecución del proyecto: Pavimentación Con Concreto Ciclópeo E=20 del municipio de Potrerillos del departamento de Cortes, el cual, gracias al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y demás entidades involucradas, vino a ser una respuesta efectiva e inminente para nuestro municipio, fomentando el desarrollo del mismo.

Agradeciendo la atención a la presente, se suscribe de usted.

Atentamente,



Carlos Noe Rivera Manzanares

ALCALDE MUNICIPAL DE POTRERILLOS CORTES



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, la liquidación del proyecto pavimentación con concreto E=20, el cual se llevó a cabo en la aldea buena vista , ubicado en el Municipio de potrerillos, en el Departamento de Cortes; dicho Municipio cuenta con una gran diversidad de necesidades de infraestructura en caminos productivos, las cuales pudieron resolverse gracias a las gestiones del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), por medio del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos.



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS

[illegible]



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS



DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(FOTOS GEOREFERENCIADAS CON LA APLICACIÓN DE LA SIT)



ROTULO DE PRESENTACION DEL PROYECTO A
DESARROLLAR

15.207379

-87.973125



ROTULO DE PRESENTACION DEL PROYECTO A
DESARROLLAR

15.209505

-87.970489



REPLANTEO DE MEDIDAS Y SU TOPOGRAFIA

15.207379

-87.973125



CORTE Y RETIRO DE MATERIAL INERTE

15.209505

-87.970489



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

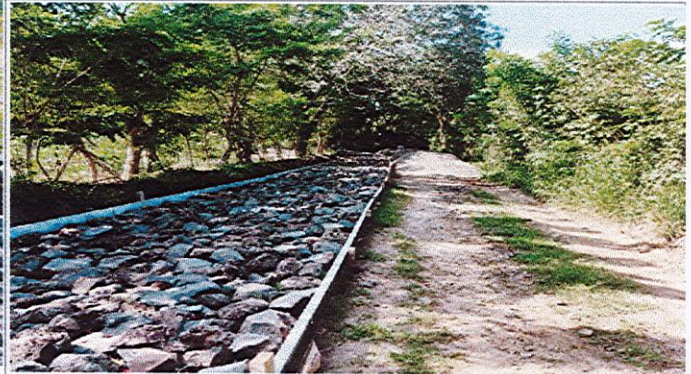
munipot@yahoo.es



COLOCACION DE NIVELETAS Y EMPEDRADO

15.207379

-87.973125



COLOCACION DE NIVELETAS Y EMPEDRADO

15.209505

-87.970489



FUNDICION DE CONCRETO

15.207379

-87.973125



FUNDICION DE CONCRETO

15.207379

-87.973125



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



COLOCACION DE NIVELETAS Y EMPEDRADO

395478

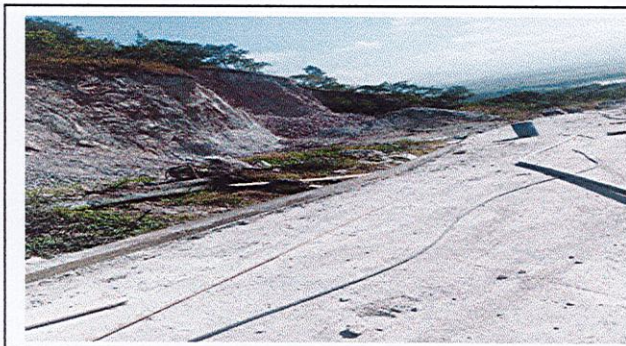
1681495



FUNDICION DE CONCRETO

395568

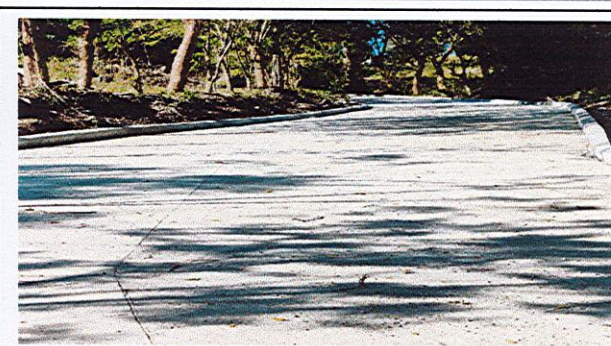
1681634



FINALIZACION DE OBRA

15.207379

-87.973125



FINALIZACION DE OBRA

15.209505

-87.970489



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

(EN CASO DE HABERSE REALIZADO OBRAS COMPLEMENTARIAS)



PINTADO DE BORDILLOS

15.207379

-87.973125



PINTADO DE BORDILLOS

15.209505

-87.970489



PINTADO DE BORDILLOS

15.207379

-87.973125



PINTADO DE BORDILLOS

15.209505

-87.970489



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS



DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es

MANO DE OBRA CONTRATADA

Nombre Completo	DNI	Cargo
Johan Jacobo Murillo Hernández	0505-1998-00199	Ayudante
Roel De Jesús Mejía Rivera	0510-1984-00323	Jefe de obra
Carlos Roberto Molina Martínez	0505-1989-00196	ayudante
Luis Amílcar Ávila Zambrano	0505-1978-00612	Ayudante
Paulino Gómez López	1003-1984-00128	Ayudante
Brayan Iván Benavidez	0505-1993-00219	Ayudante
Miguel Ángel reyes Martínez	0501-1984-04247	Ayudante
Luis Alonzo corea ramos	0502-1963-00529	Albañil
Fredy Edgardo Villamil Sánchez	0511-2001-02879	Ayudante
Saúl Edgardo García Umanzor	0512-1983-00802	Ayudante
Rene López Alvarado	0507-1988-00260	Ayudante
Pedro Antonio Mejía mateo	0406-1977-00073	Jefe de obra
Mario Edilberto Suazo	0505-1998-00443	Ayudante
José clemente Gómez	1003-1999-00059	Ayudante
Noel Sánchez	1003-1998-00073	Ayudante
Ángel Yovany Bardales	0505-1992-00020	Ayudante



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS



DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es

Mario cruz	0507-1989-00249	Ayudante
José pedro Cruz	0507-1986-01986	Ayudante
Julio Cruz	0507-1984-00737	Ayudante
Nelson Javier Mejía	0505-1981-00350	Ayudante
Enrique José López	1003-1967-00409	Ayudante
José Hernández	1003-1976-00129	Ayudante
Adalberto Ramírez	0505-1983-00363	Ayudante
Carlos Roberto molina Martínez	0505-1989-00196	Ayudante
Cristian Joel Mendoza Gómez	1003-2004-00437	Ayudante
Delcin Yovany Castillo García	0505-2002-00274	Ayudante
Elvin Noel Bardales Hernández	0505-1990-00325	Ayudante
Gustavo Adolfo Romero Gonzales	0310-1982-00334	Ayudante
José Noel Del Cid Alemán	0505-1992-00337	Ayudante
José pablo Lemus Jovel	0505-1989-00644	Ayudante
Selvin Alvarenga Santiago	0502-1992-01386	Ayudante
José Raúl Lemus	0505-1984-00409	Ayudante
Lisandro Rubén Del Cid	0505-1998-00009	Ayudante
Melvin Yovany Del Cid	0505-1983-00473	Ayudante
Omar Guevara Melgar	0505-1991-00267	Ayudante



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es






**FICHAS DE CAMPO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MUNICIPAL PARA
EL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20 EN ALDEA
BUENA VISTA, MUNICIPIO DE POTRERILLOS, DEPARTAMENTO DE
CORTES.**

	FCP-002 2023	FICHA DE CAMPO DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE PROYECTO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	
---	-------------------------	---	---


1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión Municipal		3. Reporte	
Código CP (Correlativo)	Nombre del Proyecto	Aldea Beneficiada	Nombre del Supervisor(a) Municipal		Número de Ficha:	1
FCP-09005568	PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO E=20	ALDES BUENA VISTA, NUEVO MUNDO, LA SABANA ZUALES	MARCO MUÑOZ			
			DNI del Supervisor(a)			
			0501 1983 03554			
Tipo de Proyecto:	PAVIMENTACION CICLOPEO E=20	Fecha de Inicio de la obra	Cargo del Supervisor(a)		Fecha de inicio del reporte:	11-nov
Coordenadas del Inicio de la obra:	15.207379 -87.973125	Empleos Directos	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL			
Coordenadas del final de la obra:	15.209905 -87.970489	Empleos Indirectos	Número telefónico		Fecha de final del reporte:	25-nov
			96641616			
Duración del Proyecto:	90 DIAS	20	Correo Electrónico			
			marco_munoz13@hotmail.com			

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto		6. Metros Lineales Interventados a la fecha	
Rótulo Original de Proyecto de Caminos Productivos:	Sí ☒ Cambios ☐			180 MTL	
Estado del tiempo:	NUBLADO			8. Avance Financiero del proyecto	
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	3.1KM				
7. Recursos Presentes en Obra				Monto Ejecutado a la fecha:	L.298,522.50
Personal/Mano de Obra:	Suficientes y Adecuados ☒ Insuficientes ☐			Monto Total del proyecto:	L.2000,000.00
Materiales:	Suficientes y en Bodega ☒ Insuficientes ☐			Porcentaje de avance financiero:	20%
Equipos y herramientas:	Suficientes y operativos ☒ Insuficientes ☐	L. COMO EL ACARREO, LA CONFORMACION DE SUB			

9. Avance Físico Por Actividades del Proyecto					
No.	Actividades realizadas	Unidad	Cantidad Ejecutada	Cantidad Total de Actividad	Porcentaje de avance físico de actividad
1	REPLANTEO Y NIVELACION	MTL	500	500	1%
2	CORTE DE MATERIAL	MTL	500	500	2%
3	ACARREO DE MATERIAL	MTL	500	500	3%
4	CONFORMACION DE SUBRASANTE	MTL	500	500	4%
5	COLOCACION DE LAS NIVELETAS Y EL EMPEDRADO	MTL	180	180	10%
6	FUNDICION CON CONCRETO/ PRIMER TRAMO 180 MTL	MTL	180	180	20%
Total de avance físico de obra:			Total de Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance Físico Total
			6		20%

10. Registro Fotográfico a Color		
		
ACARREO DE MATERIAL SELECTO	COLOCACION DE NIVELETA Y EMPEDRADO	FUNDICION DE CONCRETO

11. Reporte de Imprevistos






Firma y Sello del Supervisor(a) Municipal

	FCP-002 2023	FICHA DE CAMPO DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE PROYECTO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	 Secretaría de Infraestructura y Transporte
---	-------------------------------	---	---


1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión Municipal		3. Reporte	
Código CP (Correlativo)	Nombre del Proyecto	Aldes Beneficiada	Nombre del Supervisor(a) Municipal	Número de Ficha:	2	
FCP-09905568	PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO E=20	ALDES BUENA VISTA, NUEVO MUNDO, LA SABANA ZUARES	MARCO MUÑOZ			
			DNI del Supervisor(a)			
			0501 1983 03554			
Tipo de Proyecto:	PAVIMENTACION CICLOPEO E=20	Fecha de Inicio de la obra	Cargo del Supervisor(a)	Fecha de inicio del reporte:	01-dic	
Coordenadas del inicio de la obra:	15.207379	01-oct	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL			
	-87.973125	Empleos Directos	Número telefónico			
Coordenadas del final de la obra:	15.209505	35	96475690	Fecha de final del reporte:	30-dic	
	-87.970489	Empleos Indirectos	Correo Electrónico			
Duración del Proyecto:	90 DIAS	20	marco_munoz13@hotmail.com			

4. Situación de Campo			5. Breve Descripción del Proyecto		6. Metros Lineales intervenidos a la fecha	
Rótulo Original de Proyecto de Caminos Productivos:	SI	☒ Cambios ☐			345 MT	
Estado del tiempo:	DESPEJADO				8. Avance Financiero del proyecto	
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	3.1KM				Monto Ejecutado a la fecha:	
7. Recursos Presentes en Obra					1,498,522.50	
Personal/Mano de Obra:	Suficientes y Adecuados	☒			Monto Total del proyecto:	
	Suficientes y en Bodega	☒			1,2000,000.00	
Materiales:	Suficientes y operativos	☒			Porcentaje de avance financiero:	
Equipos y herramientas:		☒			40%	

9. Avance Físico Por Actividades del Proyecto					
No.	Actividades realizadas	Unidad	Cantidad Ejecutada	Cantidad Total de Actividad	Porcentaje de avance físico de actividad
1	COLOCACION DE LAS NIVELETAS Y EL EMPEDRAO	MTL	165	165	30%
2	FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO E= 20	MTL	165	165	40%
Total de avance físico de obra:			Total de Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance Físico Total
			2		40

10. Registro Fotográfico a Color		
		
COLOCACION DE PIEDRA BASALTICA	FUNDICION	FUNDICION

11. Reporte de Imprevistos



	
Firma y Sello del Supervisor(a) Municipal	

	FCP-002 2023	FICHA DE CAMPO DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE PROYECTO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	
---	-------------------------------	---	---


1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión Municipal		3. Reporte	
Código CP (Correlativo)	Nombre del Proyecto	Aldes Beneficiada	Nombre del Supervisor(a) Municipal		Número de Ficha:	3
FCP-002	PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20	ALDES BUENA VISTA, NUEVO MUNDO, LA SABANA ZUARES	MARCO MUÑOZ			
			DNI del Supervisor(a)			
			0901 1983 03554			
Tipo de Proyecto:	PAVIMENTACION CICLOPEO E=20	Fecha de Inicio de la obra	Cargo del Supervisor(a)		Fecha de Inicio del reporte:	02-ene
Coordenadas del inicio de la obra:	395478 1681495	01-oct	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL			
Coordenadas del final de la obra:	395568 1681634	Empleos Directos	Número telefónico		Fecha de final del reporte:	29-ene
Duración del Proyecto:	90 DIAS	6	96475690			
		Empleos Indirectos	Correo Electrónico			
			marco_munoz13@hotmail.com			

4. Situación de Campo				5. Breve Descripción del Proyecto		6. Metros Lineales intervenidos a la fecha	
Rótulo Original de Proyecto de Caminos Productivos:			Si	x	Cambios		690MTL
Estado del tiempo:			NUBLADO				
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:			3.1KM				
7. Recursos Presentes en Obra							
Personal/Mano de Obra:	Suficientes y Adecuados	x	Insuficientes				
Materiales:	Suficientes y en Bodega	x	Insuficientes				
Equipos y herramientas:	Suficientes y operativos	x	Insuficientes				
					FUNDICION DE CONCRETO Y CORTES DE JUNTAS		

9. Avance Físico Por Actividades del Proyecto					
No.	Actividades realizadas	Unidad	Cantidad Ejecutada	Cantidad Total de Actividad	Porcentaje de avance físico de actividad
1	COLOCACION DE LAS NIVELITAS Y EL EMPEDRADO	MTL	180	180	20%
2	FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO E= 20	MTL	180	180	20%
3	COLOCACION DE LAS NIVELITAS Y EL EMPEDRADO	MTL	165	165	40%
4	FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO E= 20	MTL	165	165	40%
5	CORTE DE JUNTAS	MTL	180	180	20%
Total de avance físico de obra:			Total de Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance Físico Total
			5		70%

10. Registro Fotográfico a Color		
		
cortes de junta	fundicion de concreto	fundicion de concreto

11. Reporte de Imprevistos


 Firma y Sello del Supervisor(a) Municipal




	FCP-002 2023	FICHA DE CAMPO DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL DE PROYECTO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	
---	-------------------------------	---	---


1. Datos Generales del Proyecto			2. Datos de Supervisión Municipal		3. Reporte	
Código CP (Correlativo)	Nombre del Proyecto	Aldes Beneficiada	Nombre del Supervisor(a) Municipal	Número de Ficha:	4	
FCP-002	PAVIMENTACION CICLOPEO E=20	ALDES BUENA VISTA, NUEVO MUNDO, LA SABANA, ZUALES	MARCO MUÑOZ			
			DNI del Supervisor(a)			
			0501 1983 03554			
Tipo de Proyecto:	PAVIMENTACION CICLOPEO E=20	Fecha de Inicio de la obra	Cargo del Supervisor(a)	Fecha de Inicio del reporte:	30-ene	
Coordenadas del inicio de la obra:	395478 1681495	01-oct	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL			
Coordenadas del final de la obra:	395568 1681634	Empleos Directos	Número telefónico			
Duración del Proyecto:	90 DIAS	Empleos Indirectos	Correo Electrónico	Fecha de final del reporte:	29-feb	
		6	marco_munoz13@hotmail.com			

4. Situación de Campo		5. Breve Descripción del Proyecto		6. Metros Lineales intervenidos a la fecha	
Rótulo Original de Proyecto de Caminos Productivos:	Sí ☒ Cambios ☐	CRETO, CORTES DE JUNTAS, CONSTRUCCION DE BORDILLOS		1034 MT	
Estado del tiempo:	NUBLADO			3. Avance Financiero del proyecto	
Distancia al proyecto desde casco urbano más cercano:	3.1KM			Monto Ejecutado a la fecha:	L.1448,523.00
7. Recursos Presentes en Obra				Monto Total del proyecto:	L.2060,000.00
Personal/Mano de Obra:	Suficientes y Adecuados ☒ Insuficientes ☐			Porcentaje de avance financiero:	80%
Materiales:	Suficientes y en Bodega ☒ Insuficientes ☐				
Equipos y herramientas:	Suficientes y operativos ☒ Insuficientes ☐				

9. Avance Físico Por Actividades del Proyecto					
No.	Actividades realizadas	Unidad	Cantidad Ejecutada	Cantidad Total de Actividad	Porcentaje de avance físico de actividad
1	COLOCACION DE LAS NIVELITAS Y EL EMPEDRADO	MTL	180	180	60%
2	FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO E= 20	MTL	180	180	60%
3	COLOCACION DE LAS NIVELITAS Y EL EMPEDRADO	MTL	164	164	100%
4	FUNDICION DE PAVIMENTO CICLOPEO E= 20	MTL	164	164	100%
5	CORTE DE JUNTAS	MTL	180	180	100%
6	CONSTRUCCION DE BORDILLO	MTL	1019	1019	100%
Total de avance físico de obra:			Total de Actividades del Proyecto		Porcentaje de Avance Físico Total
			6		100%

10. Registro Fotográfico a Color		
		
construccion de bordillos	construccion de bordillos	final de la obra

11. Reporte de Imprevistos


Firma y Sello del Supervisor(a) Municipal





**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE
POTRERILLOS**

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



**FACTURAS, RECIBOS,
CHEQUES
TODO A NOMBRE DE LA
ALCALDÍA CON RTN**

CUADRO DE RESUMEN FINANCIERO

DESCRIPCION TIPO DE PAGO	# DECHEQUE	FECHA	REFERENCIA	% AVANCE DE OBRA	% FINANCIERO	SALDO
ESTIMACION N° 1	4448	11/11/2023	PAGO DEL 15% SOBRE EL MONTO REPLANTEO Y NIVELACION CORTE Y ACARREO DE MATERIAL CONFORMACION SUBRASANTE COLOCACION NIVELETAS Y EMPEDRADO FUNDICION DE CONCRETO 180MTL	20%	20%	298,552.50
ESTIMACION N° 2	4521	27/11/2023	COLOCACION NIVELETAS Y EMPE FUNDICION DE CONCRETO 165MTL CORTE DE JUNTAS	40%	40%	200,000.00
ESTIMACION N° 3	4778	10/01/2024	COLOCACION NIVELETAS Y EMPE FUNDICION DE CONCRETO MTL180 COLOCACION NIVELETAS Y EMPEDRADO FUNDICION DE CONCRETO 165MTL CORTE DE JUNTAS	70%	60%	500,000.00
ESTIMACION N° 4	4969	09/02/2024	COLOCACION NIVELETAS Y EMPE FUNDICION DE CONCRETO MTL180 COLOCACION NIVELETAS Y EMPEDRADO FUNDICION DE CONCRETO MTL164 CORTE DE JUNTAS CONSTRUCCION DE BORDILLO 1019 MTL	100%	80%	450,000.50
ESTIMACION N° 5	5130	08/03/2024	FINALIZACION OBRA		98%	541,627.00
OBRA COMPLEMENTARIA	5149	15/03/2024	PINTADO DE BORDILLO		100%	9,850.00
MONTO TOTAL						2,000,000.00

POSICION



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S DE R.L.DE C.V.
UBICACIÓN DEL PROYECTO	ALDEA BUENA VISTA
FECHA DE ORDEN DE INICIO	11 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO	29 DE FEBRERO 2024
SUPERV	Unidad Tecnica Municipal
COSTO TOTAL	1,990,150.00

ESTIMACION N° 1			ORDEN DE PAGO: 4448		FECHA DE PAGO: 11/11/2023
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES		CANTIDADES CONTRATADAS		TOTAL (LPS)	SALDO RESTANTE DE LA ESTIMACION N° 1 (LPS)
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	
1	REPLANTEO Y NIVELACION (TEOLIOTO)	GLOBAL	1.00	9000	9,000.00
2	CORTE MATERIAL	M2	500.00	20.00	10,000.00
3	ACARREO DE MATERIAL	MP-KM	500.00	14	7,000.00
4	CONFORMACION SUBRESANTE	M2	1666.67	18.98	31,633.39
5	COLOCACION NIVELETAS EMPEDRADO	MTL	180.00	229.01	41,221.83
6	FUNDICION DE CONCRETO	M2	540.00	370.37	200,000.00
SUB TOTAL (LPS)					298,855.22
					1691,627.50

ING. MARCO ANTONIO MUÑOZ SILVA
 U.T.M



POTRERILLOS, CORTÉS
BO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL DE POTRERILLOS, CORTÉS.
Cuenta N°. 112070090572

CHEQUE No. 00004448

POTRERILLOS

11 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S DE R L DE C V

298,522.50

Páguese a la orden de

L

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

Carlos Voo Rivera *MDZ*

10120707910011207009057200004448

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS

Nº ORDEN DE PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE Pago de Anticipo del 15% : Proyecto de Construcción de Pavimento de Concreto Cidlopeo E=20 CM .Aldea Buena Vista. Municipio de Potrerillos Cortes. (Fondos del Programa de Intervención de Caminos Productivos).	298,522.50
CHEQUE N°.	HECHO POR	REVISADO POR
00004448		RECIBI CONFORME





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673-8183/ 2673-8651

munipot@yahoo.es



RECIBO POR 298,552.50


Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON CINCUENTA CENTAVOS (298,552.50).**

Por concepto de pago correspondiente de la primera estimación de acuerdo a los avances del proyecto del valor total de contrato de **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN QUE CONSTA DE QUINIENTOS METROS LINEALES POR 6 METROS DE ANCHO EQUIVALENTE A 3000 MTS2 Y 20 CENTIMETROS DE ESPESOR UBICADO EN LA ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO.**

Según contrato adjunto.

Potreriillos, Cortes

11 DE NOVIEMBRE DEL 2023


COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES
RTN 0511-1973-001171



COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S. DE R. L. DE C. V.

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

PROPIETARIO: BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES RTN: 05019019099732
BO. MANUEL BONILLA, 2 CUADRAS AL SUR DE ELEKTRA, VILLANUEVA, CORTÉS
Correo: comercializadorasuazoflores@yahoo.com Tel.: 9737-1553

C.A.I.: 584E41-4FD67B-574A84-83F9C8-71CA9F-3F

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	Nov.	2023

Cliente: Municipalidad de Potrerillos Cortés

RTN: 05059995151014

Dirección: Potrerillos Cortés, Bo San Miguel

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	IMPORTE
	Primera estimacion por proyecto de pavimento con concreto Ciclopico en una area de 500 metros de largo por 6 metros de ancho en Aldea Buena Vista.			298,522.50

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Docientos Noventa y Ocho mil quinientos Veintidos
centavos.

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

FIRMA



Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 298,522.50

FACTURA 000-001-01-00 000110



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:

NOMBRE DEL CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S DE R.L.DE C.V.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

ALDEA BUENA VISTA

FECHA DE ORDEN DE INICIO

11 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO

29 DE FEBRERO 2024

SUPERVION

Unidad Tecnica Municipal

COSTO TOTAL

1,990,150.00

ESTIMACION N° 2			ORDEN DE PAGO: 4521			FECHA DE PAGO: 27/11/2023	
	PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES	CANTIDADES CONTRATA			TOTAL (LPS)	SALDO RESTANTE DE LA ESTIMACION N° 1 (LPS)	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U			
1	COLOCACION NIVELETAS EMPEDRADO	MTL	165.00	249.82	41,221.83	1,691,627.50	
2	FUNDICION CON CONCRETO	M2	495.00	320.76	158,778.17		
SUB TOTAL (LPS)					200,000.00	SALDO RESTANTE AL COSTO TOTAL DEL PROYECTO (LPS 1,990,150.00)	
						1,491,627.50	

ING. MARCO ANTONIO MUÑOZ SILVA
U.T.M





POTRERILLOS, CORTÉS
80. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL DE POTRERILLOS, CORTÉS.
Cuenta N°. 112070090572

POTRERILLOS

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00004521

2 de diciembre de 2023

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S DE R L DE C V

200,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

Carlos José Ruera

101207079100112070090572100004521

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS

Nº ORDEN DE PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE Pago de Primera Estimación : Proyecto de Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo F=20 CM ,Aldea Buena Vista, Municipio de Potrerillos Cortes. (Pondos del Programa de Intervención de Caminos Productivos).	200,000.00
CHEQUE N°.	HECHO POR	REVISADO POR
00004521		RECIBI CONFORME





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673-8183/ 2673-8651

munipot@yahoo.es



RECIBO POR 200,00.00

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, la cantidad de **DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (200,00.00).**

Por concepto de pago correspondiente de la primera estimación de acuerdo a los avances del proyecto del valor total de contrato de **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN QUE CONSTA DE QUINIENTOS METROS LINEALES POR 6 METROS DE ANCHO EQUIVALENTE A 3000 MTS2 Y 20 CENTIMETROS DE ESPESOR UBICADO EN LA ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO.**

Según contrato adjunto.

Potrerillos, Cortes

02 DE DICIEMBRE DEL 2023



COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES

RTN 0511-1973-001171

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S. DE R. L. DE C. V. "La factura es beneficio de todos, Exijala"

PROPIETARIO: BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES RTN: 05019019099732 C.A.I.: 584E41-4FD67B-574A84-83F9C8-71CA9F-3F
BO. MANUEL BONILLA, 2 CUADRAS AL SUR DE ELEKTRA, VILLANUEVA, CORTÉS
Correo: comercializadorasuazoflores@yahoo.com Tel.: 9737-1553

CONTADO ☐CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
4	12	2023

Cliente: Municipalidad de PatzúnRTN: 05059995151014Dirección: B. San Miguel

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DECUENTOS Y PUNTAJES OTORGADOR	IMPORTE
	segunda estimación por proyecto de pavimento con concreto ciclopélico en zona obra de 500 MT metros oblongo por 6 metros de ancho en el B. San Miguel			209000.00

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

1 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

FIRMA

**FACTURA** 000-001-01-00 **000112**

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 209000.00



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:

NOMBRE DEL CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S DE R.L.DE C.V.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

ALDEA BUENA VISTA

FECHA DE ORDEN DE INICIO

11 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO

29 DE FEBRERO 2024

SUPERVION

Unidad Tecnica Municipal

COSTO TOTAL

1,990,150.00

ESTIMACION N° 3			ORDEN DE PAGO: 4778			FECHA DE PAGO:10/01/2024
ITEM	PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES	CANTIDADES CONTRATADAS			TOTAL (LPS)	SALDO RESTANTE DE LA ESTIMACION N° 2 (LPS)
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U		
1	COLOCACION NIVELETAS EMPEDRADO	MTL	345.00	238.96	82,443.66	1,491,627.50
2	FUNDICION CON CONCRETO	M2	1035.00	306.82	317,556.34	
3	CORTE DE JUNTA 3.00X 1.5 MTS	MTL	180.00	277.77	50,000.00	SALDO RESTANTE AL COSTO TOTAL DEL PROYECTO (LPS 1,990,150.00)
4	CONSTRUCCION BORDIO	M2	495.00	101.01	50,000.00	
SUB TOTAL (LPS)					500,000.00	991,627.50

ING. MARCO ANTONIO MUÑOZ SILVA
U.T.M





**ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS, CORTÉS**
BO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL DE POTRERILLOS, CORTÉS.
Cuenta N°. 112070090572

CHEQUE No. 00004778

POTRERILLOS
Lugar y Fecha

10 de Enero de 2024

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES SDE RL DE CV L **500,000.00**

Páguese a la orden de

QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Carlos Noel Rivera
Firma(s)

0012070790011207009057200004778

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS

N° ORDEN DE PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS
	Pago por construcción de pavimento con concreto ciclópeo en que consta de quinientos metros lineales por seis metros de ancho equivalentes a 3000 M ² Y 20 centímetros de espesor ubicado en Aldea buena vista del MUNICIPIO	
CHEQUE N°. 00004778	HECHO POR	REVISADO POR
		RECIBÍ CONFORME

00778



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673-8183/ 2673-8651

munipot@yahoo.es



RECIBO POR 500,00.00

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, la cantidad de **QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (500,00.00)**.

Por concepto de pago correspondiente de la primera estimación de acuerdo a los avances del proyecto del valor total de contrato de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN QUE CONSTA DE QUINIENTOS METROS LINEALES POR 6 METROS DE ANCHO EQUIVALENTE A 3000 MTS² Y 20 CENTIMETROS DE ESPESOR UBICADO EN LA ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO.
Según contrato adjunto.

Potrerillos, Cortes

10 DE ENERO DEL 2024

X

B. Flores



COMERCIALIZADORA SUÁZO FLORES
RTN 0511-1973-001171

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S. DE R. L. DE C. V. "La factura es beneficio de todos, Exijala"

PROPIETARIO: BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES RTN: 05019019099732
BO. MANUEL BONILLA, 2 CUADRAS AL SUR DE ELEKTRA, VILLANUEVA, CORTÉS
Correo: comercializadorasuazoflores@yahoo.com Tel.: 9737-1553

C.A.I.: 584E41-4FD67B-574A84-83F9C8-71CA9F-3F

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	1	2024

Cliente: *Municipalidad de Patzún*

RTN: *05059995151014*

Dirección: *B. San Miguel*

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADOS	IMPORTE
	<i>por concepto construcción de pavimento con concreto ciclopico en que consta de quinientos metros lineales por seis de ancho equivalente a 3000 MTS 2 y 20 centímetros de espesor ubicado en el área hacia el municipio de patzún</i>			<i>500,000.00</i>

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

1 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta

Registro SAG No.

N° Const. Registro Exonero

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00

000115

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	<i>500,000.00</i>

BE F. M. P. S. DE R. L. C. A. 9500-1257-1993-4228 RTN 05019019099732 • Certificado No. 9231-22-19500-16



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:

NOMBRE DEL CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S DE R.L.DE C.V.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

ALDEA BUENA VISTA

FECHA DE ORDEN DE INICIO

11 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO S/C

29 DE FEBRERO 2024

SUPERVISION

Unidad Tecnica Municipal

COSTO TOTAL

1,990,150.00

ESTIMACION N° 4			ORDEN DE PAGO: 4778			FECHA DE PAGO:10/01/2024	
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES		CANTIDADES CONTRATADAS			TOTAL (LPS)	SALDO RESTANTE	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U		DE LA ESTIMACION N° 3 (LPS)	
1	COLOCACION NIVELETAS EMPEDRADO	MTL	344.00	239.66	82,443.66	991,627.50	
2	FUNDICION CON CONCRETO	M2	1032.00	307.71	317,556.34	SALDO RESTANTE AL COSTO TOTAL DEL	
3	CORTE DE JUNTA 3.00X 1.5 MTS	MTL	180.00	277.77	50,000.50	PROYECTO (LPS 1,990,150.00)	
SUB TOTAL (LPS)					450,000.50	541,627.00	

ING. MARCO ANTONIO MUNOZ SILVA

U.T.M





POTRERILLOS, CORTÉS
BO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL DE POTRERILLOS, CORTÉS.
Cuenta N°. 112070090572

CHEQUE No. 00004969

POTRERILLOS

10 de febrero de 2024

Lugar y Fecha

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S DE R L DE C V

450,000.50

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Carlos José Rivera
Firma(s)

⑈0⑆207079⑆00⑆⑆2070090572⑈00004969

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS

Nº ORDEN DE PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE Pago de Proyecto de Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo R=20 CM ,Aldea Buena Vista, Municipio de Potrerillos Cortes.	450,000.50
CHEQUE N°.	HECHO POR	REVISADO POR
00004969		RECIBÍ CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, CR (02-20) *11P137352

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

69600



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673-8183/ 2673-8651

munipot@yahoo.es



RECIBO POR 450,000.50

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS CON CINCUENTA CENTAVOS (450,000.50).**

Por concepto de pago correspondiente de la cuarta estimación de acuerdo a los avances del proyecto del valor total de contrato de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN QUE CONSTA DE QUINIENTOS METROS LINEALES POR 6 METROS DE ANCHO EQUIVALENTE A 3000 MTS² Y 20 CENTIMETROS DE ESPESOR UBICADO EN LA ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO.

Según contrato adjunto.

Potrerillos, Cortes

09 DE FEBRERO DEL 2024

**COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES
RTN 0511-1973-001171**



COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S. DE R. L. DE C. V.**"La factura es beneficio de todos, Exijala"**

PROPIETARIO: BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES RTN: 05019019099732
BO. MANUEL BONILLA, 2 CUADRAS AL SUR DE ELEKTRA, VILLANUEVA, CORTÉS
Correo: comercializadorasuazoflores@yahoo.com Tel.: 9737-1553

C.A.I.: 584E41-4FD67B-574A84-83F9C8-71CA9F-3F

CONTADO ☐

DIA

MES

AÑO

CREDITO ☐Cliente: Municipalidad de PatzúnRTN: 05059995151014Dirección: B San Miguel

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS V. REBAJAS OTORGADOR	IMPORTE
	cuarto estimación por proyecto de pavimentación con concreto ciclopico en una area de 500 metros de largo por 6 metros de ancho en calle Buena Vista			450,000.50

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

1 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 450,000.50

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00 000119



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



NOMBRE
DEL

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:

NOMBRE DEL CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S DE R.L.DE C.V.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

ALDEA BUENA VISTA

FECHA DE ORDEN DE INICIO

11 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO S/C

29 DE FEBRERO 2024

SUPERVISI

Unidad Tecnica Municipal

COSTO TO

1,990,150.00

ESTIMACION N° 5			ORDEN DE PAGO: 5130			FECHA DE PAGO: 27/11/2023
ITEM	PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES	CANTIDADES CONTRATADAS			TOTAL (LPS)	SALDO RESTANTE DE LA ESTIMACION N° 4 (LPS)
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U		
1	FINAL DEL PROYECTO				541,627.00	541,627.00
SUB TOTAL (LPS)					541,627.00	SALDO RESTANTE AL COSTO TOTAL DEL PROYECTO (LPS 1,990,150.00) 9,850.00

ING. MARCO ANTONIO MUÑOZ-SILVA
U.T.M





POTRERILLOS, CORTÉS
BO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL DE POTRERILLOS, CORTÉS.
Cuenta N°. 112070090572

POTRERILLOS

8 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S DE R L DE C V

541,627.00

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Carlos José Rivera
Firma(s)

[Signature]

15012070791001120700905721100005130

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS

N° ORDEN DE PAGO	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE Pago de Quinta y Ultima Estimación del Proyecto de Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo Aldea Buena Vista.	541,627.00
CHEQUE N°. 00005130	HECHO POR	REVISADO POR
		RECIBI CONFORME





**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673-8183/ 2673-8651

munipot@yahoo.es



RECIBO POR 541,627.00

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, la cantidad de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS (541,627.00).**

Por concepto de pago correspondiente de la quinta estimación de acuerdo a los avances del proyecto del valor total de contrato de **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN QUE CONSTA DE QUINIENTOS METROS LINEALES POR 6 METROS DE ANCHO EQUIVALENTE A 3000 MTS2 Y 20 CENTIMETROS DE ESPESOR UBICADO EN LA ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO.**

Según contrato adjunto.

Potreriillos, Cortes

08 DE MARZO DEL 2024

X



**COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES
RTN 0511-1973-001171**

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S. DE R. L. DE C. V.**"La factura es beneficio de todos, Exijala"**

PROPIETARIO: BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES RTN: 05019019099732
BO. MANUEL BONILLA, 2 CUADRAS AL SUR DE ELEKTRA, VILLANUEVA, CORTÉS
Correo: comercializadorasuazoflores@yahoo.com Tel.: 9737-1553

C.A.I.: 584E41-4FD67B-574A84-83F9C8-71CA9F-3F

CONTADO ☐CREDITO ☐

DIA

MES

AÑO

9

3

2024

Cliente: Municipalidad de PatzúnRTN: 050599951510Dirección: B. San Miguel

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
	Quinto y ultimo estimarios por			541,627.00
	proyecto de pavimentación con			
	concreto ciclopico en una area			
	de 500 MT de largo por 6 metros de			
	ancho en aldea Buena Vista			

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

1 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Importe Exento / ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR 541,627.00

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

N° Const. Registro Exonerado:

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00 000123



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:

NOMBRE DEL CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S DE R.L.DE C.V.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

ALDEA BUENA VISTA

FECHA DE ORDEN DE INICIO

11 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO S/C

29 DE FEBRERO 2024

SUPERVISION

Unidad Tecnica Municipal

COSTO TOTAL

1,990,150.00

ESTIMACION N° 6			ORDEN DE PAGO: 5149			FECHA DE PAGO:15/03/2024	
ITEM	PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES	CANTIDADES CONTRATADA			TOTAL (LPS)	SALDO RESTANTE	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U		OBRA COMPLEMENTARIA(LPS 9,850.00)	
1	PINTADO DE BORDILLO	GLOBAL	1.00	9,850	9,850.00	9,850.00	
SUB TOTAL (LPS)					-	SALDO RESTANTE AL COSTO TOTAL DEL PROYECTO (LPS 2,000,000.00)	
					-		

ING. MARCO ANTONIO MUÑOZ SILVA

U.T.M





POTRERILLOS, CORTÉS
BO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL DE POTRERILLOS, CORTÉS.
Cuenta N°. 112070090572

POTRERILLOS

15 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S DE RL DE CV

L

9.850.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.


Firma(s)

Carlos José Rivera

001207079100112070090572100005149

ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTÉS

N° ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE Pago de ADENDUM A CONTRATO: Proyecto de Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo R=20 CM ,Aldea Buena Vista, Municipio de Potrerillos Cortes.	9.850.00
CHEQUE N°. 00005149	HECHO POR	REVISADO POR <i>IB</i> RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. de C.V.

01149

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, /CR/(02-20) • 11PT31552



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673-8183/ 2673-8651

munipot@yahoo.es



RECIBO POR 9,850.00.00

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos Cortes, la cantidad de **NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (9,850.00)**.

Por concepto de pago correspondiente debido aquel el proyecto no tiene dentro de sus actividades a realizar el pintado de los bordillos, y que se realizó una ampliación monetaria con un coste de 9,850.00 lempiras de acuerdo a los avances del proyecto del valor total de contrato de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN QUE CONSTA DE QUINIENTOS METROS LINEALES POR 6 METROS DE ANCHO EQUIVALENTE A 3000 MTS² Y 20 CENTIMETROS DE ESPESOR UBICADO EN LA ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO.

Según contrato adjunto.

Potreriillos, Cortes

15 DE MARZO DEL 2024

**COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES
RTN 0511-1973-001171**



COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S. DE R. L. DE C. V. "La factura es beneficio de todos, Exijala"

PROPIETARIO: BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES RTN: 05019019099732 C.A.I.: 584E41-4FD67B-574A84-83F9C8-71CA9F-3F
BO. MANUEL BONILLA, 2 CUADRAS AL SUR DE ELEKTRA, VILLANUEVA, CORTÉS
Correo: comercializadorasuazoflores@yahoo.com Tel.: 9737-1553

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	3	2024

Cliente: Municipalidad de Patzún RTN: 050599951510

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS V. RESCATE O. TIRADOR	IMPORTE
	pago de ADEUDOS a contrato			9850.00
	proyecto de construcción de pavimento			
	de concreto ciclopico			
	aldea Bruno Viteri Patzún			
	Cortés			

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

1 T/D • Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

noventa mil ochocientos cincuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

N° Orden de Compra Exentas

Registro SAG No.

N° Const. Registro Exonerado

FIRMA

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9850.00

FACTURA 000-001-01-00 000124



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE
POTRERILLOS**

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



**CONTRATOS DE ADQUISICIÓN
DE OBRAS Y SERVICIOS**



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO CORTÉS
HONDURAS, C.A.**
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26
Email: munipot@yahoo.es



**CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN EL
SECTOR ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS CORTES POR EL VALOR
DE LPS. 1, 990, 150.00**

Nosotros: Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes Representado por El Ingeniero **Carlos Noé Rivera Manzanares**, Hondureño, Mayor de edad, Casado, con DNI 0505-1976-00407, extendida en Potrerillos, Cortes, en su condición Alcalde Municipal de Potrerillos Departamento de Cortes por el Tribunal Supremo Electoral con acuerdo en Punto Único de la Sesión Celebrada y Publicado en el diario oficial la Gaceta el 28 de Diciembre del Año Dos Mil Veintiuno y habiendo tomado Posesión del cargo el día 25 de Enero del Año Dos Mil, y con domicilio ubicado en el Barrio las Flores con Casa Número 217, y con facultades suficientes para celebrar este tipo de actos que en adelante se llamara Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes, y por otra parte el señor **BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES**, con DNI 0511-1973-00117, mayor de edad, casado, hondureño y representante de COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S. DE R. L. DE C.V. y que en adelante se denomina el Contratista, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN EL SECTOR ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS CORTES**. **CLAUSULA PRIMERA:** Dicho Proyecto fue aprobado en sesión de corporación municipal y fue adjudicado mediante **Acta 0055-2023 punto número 9 en acuerdos y resoluciones inciso "H"**. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a ejecutar para El Contratante la realización de este proyecto conforme a las buenas prácticas, ética profesional y de acuerdo con las instrucciones emanadas por parte del Contratante a través de los funcionarios de la UTM, **CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO** **APORTES / OBRAS A REALIZAR:** Se fijan el monto total del contrato por la suma Un Millón Novecientos Noventa Mil Ciento Cincuenta Lempiras con 00/100 (Lps. 1, 990, 150.00). **LAS OBRAS A REALIZAR INCLUYEN:**

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Materiales					
1	CRAYOLAS	UNID	1.00	474.05	474.05
2	CUERDA	YARDA	100.00	20.00	2,000.00
3	CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BOLSA	2,981.91	212.00	632,164.92
4	ARENA DE RIO LAVADA	M3	175.93	400.00	70,373.08
5	GRAVA DE RIO	M3	175.93	500.00	87,966.35
6	PIEDRA DE RIO	M3	447.29	400.00	178,914.60

7	AGUA	M3	110.33	150.00	16,549.60
8	CLAVOS	LB	214.70	60.00	12,881.85
9	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	5,352.53	30.00	160,575.85
Total					1,161,900.30
Mano de Obra					
10	ALBAÑIL	JDR	506.92	500.00	253,462.35
11	CARPINTERO	JDR	238.55	500.00	119,276.40
12	AYUDANTE	JDR	566.56	300.00	169,968.87
13	PEON	JDR	59.64	250.00	14,909.55
Total					557,617.17
Herramienta					
14	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	149.10	170.00	25,346.24
Total					25,346.24
Equipo					
15	TANQUE CISTERNA	hr	11.93	650.00	7,752.97
16	MOTONIVELADORA	hr	11.93	2,953.45	35,227.69
17	VIBRO COMPACTADORA	hr	11.93	1,792.72	21,382.92
Total					64,363.57
Costo directo					1,809,227.27
Provisionales				10%	180,922.73
Gran Total					1,990,150.00

Si la Municipalidad de **Potrerillos** ó a conveniencia del contratante se decide en el transcurso del proyecto eliminar o aumentar obras del presente monto del contrato, estas se reducirán o incrementarán en base a los precios listados en este contrato. **CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO.** El Monto del Contrato será cancelado de la forma siguiente: Se le entregara un 15% como anticipo el cual es equivalente a DOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS. **(Lps. 298,522.50)** quedando una diferencia de UN MILLON SEIS CIENTOS NOBENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS. **(Lps. 1, 691,627.50)** mismos que será pagado por estimaciones según el avance de la obra. Según el informe del Jefe de la Unidad Técnica Municipal quien hará la supervisión de las obras hasta su total cancelación. **CLAUSULA QUINTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:** 1) SE HARA LA LIMPIEZA INICIAL 2) SE HARA EL TRAZO Y LA NIVELACION SEGÚN PLANOS. 3) SE HARA LA CONFORMACION USANDO UNA MOTONIVELADORA Y UN VIBROCOMPACTADOR DE 6 TON.4) SE CONSTRUIRA 3,000.00 MT2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO, E=0.20 MTS. 5) SE CONSTRUIRAN LOS BORDILLOS DE CONCRETO. **CALUSULA SEXTA: DE EXCLUSIVIDAD DE EQUIPO Y PERSONAL:** a) Es de carácter obligatorio presentar al supervisor de las obras , listado del personal que laborara en dicha obra, además de un listado de equipo, es obligatorio también para el CONTRATISTA mantener durante la totalidad de la ejecución el proyecto la totalidad del personal listado, debiendo informar al CONTRANTANTE cualquier cambio requerido, dentro de una semana previa a los cambios y/o modificaciones solicitadas, para ser aprobadas por parte del

CONTRATANTE. Se entiende la exclusividad del equipo asignado al proyecto como: la totalidad del equipo listado deberá estar asignado en forma exclusiva en el proyecto objeto de este contrato. b) El CONTRATISTA deberá mantener en condiciones óptimas de trabajo todo el equipo asignado al proyecto, pudiendo retirar del proyecto el equipo único y exclusivamente con la aprobación por escrito del CONTRATANTE d) El contratista deberá presentar la constancia de pago a cuenta actualizado de lo contrario se le hará la retención del 12.5% del valor total del contrato. **CLAUSULA**

SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO: Para la ejecución del proyecto contemplado en este contrato, el contratista se compromete y obliga a terminar las mismas a satisfacción del Contratante en un plazo de **Noventa días calendario** contados a partir de la fecha en que **La Municipalidad de Potrerillos** emita la Orden de Inicio al **contratista** más un plazo de 1 día para el traslado de maquinaria y equipos a la zona. El plazo de Ejecución se modificará por tema de Emergencias, Lluvias o por aumento en las cantidades de obra de acuerdo al aumento en la actividad y a lo indicado por la Supervisión.

CLAUSULA OCTAVA: SUPERVISION: 1) **La Municipalidad de Potrerillos** designará al Ingeniero de la Unidad Técnica Municipal UTM para supervisar los trabajos además de la supervisión del representante de la UMA 2) El Contratante y la Supervisión tendrán plena autorización y facultad para suministrar al Contratista y en el curso de la ejecución de la Obra, planos o instrucciones adicionales que resulten necesarias para la debida y adecuada ejecución del Proyecto y; 3). **La Municipalidad de Potrerillos** velarán porque las actividades se realice de acuerdo a lo indicado en los documentos contractuales y para tal efecto realizará cuantas inspecciones sean convenientes y sin hacerlo del conocimiento del Contratista, para lo cual este dará toda la colaboración necesaria, además un funcionario de Ambiente UMA, para verificar que los trabajos no tengan un impacto negativo en el ambiente, y la sociedad civil estará representada a través de la comisión de transparencia y comisionado municipal. **CLAUSULA NOVENA: CONTROL DE LAS OBRAS A DIARIO:** Se mantendrá en el proyecto una Bitácora de trabajo a cargo del ing. asignado por la municipalidad que supervisara el proyecto además de un libro de CONTROL, el cual deberá estar disponible en el proyecto tanto para la supervisión como para el personal autorizado por **La Municipalidad de Potrerillos** "Para efectos de pago hacia el CONTRATISTA, se tomará en cuenta única y exclusivamente el informe de UTM.

CLAUSULA DECIMA: SANCIONES ECONOMICAS: Para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de El Contratista, El Contratante le impondrá sanciones económicas, aplicando un monto de DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS. (Lps. 19, 901.50) diarios que equivale al 1% del valor del contrato por cada día de retraso en la entrega del proyecto sin causa justificada, **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL MONTO Y**


AL PLAZO DEL CONTRATO: El Contrato podrá ser modificado tanto en tiempo como en su monto, de común acuerdo entre las partes. En casos de variaciones en el monto, estos se harán mediante modificaciones. Modificaciones al monto original por menos del 10 % de monto del contrato podrán realizarse a través de orden de cambio que emitirá el Contratante. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:**

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Se entenderá caso fortuito o fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilita el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales, se reconocen como causa de fuerza mayor y/o entre otras: a) guerra, rebelión y motines b) huelga, excepto aquella de empleados del Contratista c) desastre naturales, tales como terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones, Lluvias u otras causas reconocidas como fuerza mayor. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES Y DAÑOS:** El Contratista será responsable de toda reclamación civil proveniente por daños y perjuicio a su propio personal o a terceras personas en cualquier actividad llevada a cabo de mala fe o dolo por el incumplimiento de este Contrato.- Asimismo el Contratista exonera a el Contratante de toda

reclamación, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las leyes laborales de previsión o seguridad social que este a su servicio. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS:** Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación y efectos del contrato se tratará de resolver entre ambas partes, elaborándose el respectivo documento. A falta del acuerdo, El Contratante tiene el derecho de interpretar el presente contrato y resolver las dudas que requiera su cumplimiento. Dicha prerrogativa se ejercitará por medio del órgano administrativo de mayor jerarquía responsable de dicho contrato. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION:** El presente contrato podrá resolverse sin responsabilidad alguna para ninguna de las partes por las causa siguientes: a) Si en cualquier momento la ejecución del proyecto ha alcanzado el límite establecido en el presente contrato. b) En caso fortuito o fuerza mayor si este no puede ser resuelto por las partes c) por las demás establecidas en el artículo 127 de la Ley de contratación del Estado. Si el desfase en el avance respecto a lo programado en el tiempo de ejecución del proyecto llegare a alcanzarun 5% en relación al programa total, el Contratante podrá rescindir el Contrato. f) Por comprobada negligencia en la ejecución de las obras objeto de este contrato, g) Insuficiente cantidad de mano de obra, h) Mala calidad en la mano de obra, i) Por abandono comprobado de las obras por un período consecutivo de tres días calendario en forma continua, **DECIMA SEXTA: GARANTIAS:** a) **GARANTIA DE ANTICIPO:** EL CONTRATISTA le dará una garantía por el valor del anticipo a favor de la Municipalidad de Potrerillos, Cortes, la cual puede ser una garantía bancaria o fianza bancaria según art 107 de la ley de contratación del estado equivalente al 15% del valor total del contrato. B) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO** El contratista dará una garantía por cumplimiento de contrato equivalente al 15% del valor total del contrato a entregar durante el periodo estimado debiendo renovarse treinta días antes de cada vencimiento la cual puede ser una garantía bancaria o fianza bancaria. C) **GARANTIA DE CALIDAD DE LA OBRA:** El contratista dará una garantía por calidad de obra equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato la cual puede ser una garantía bancaria o fianza bancaria, para lo cual el contratista sustituirá la garantía de cumplimiento del contrato por una garantía de calidad de la obra una vez efectuada la recepción final de la obra con vigencia por el tiempo previsto en el contrato. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: VIGENCIA:** La vigencia de este contrato surtirá sus efectos, a partir de la fecha en que se emita la respectiva orden de inicio, tanto el Contratante como el Contratista manifiestan estar de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas de este contrato y captan en su totalidad el mismo, comprometiéndose a su fiel cumplimiento y estará vigente hasta que las partes cumplan con las obligaciones en el mismo y se extiendan el acta de recepción definitiva. En fe de lo cual, firmamos en la ciudad de Potrerillos, Municipio de Cortes, a los 11 Días del Mes Noviembre del Año Dos Mil Veinte y Tres.



ING. CARLOS NOE RIVERA MANZANARES
ALCALDE MUNICIPAL

13 
BERNABE ANTENOR SUAZO
DNI 0511-1973-00117
CONTRATISTA





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO CORTÉS
HONDURAS, C.A.
Tel. 673 81 83 /84 24 Fax: 673- 90 26
Email: munipot@yahoo.es



ORDEN DE CAMBIO #1

**CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
CICLOPEO EN EL SECTOR ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE
POTRERILLOS CORTES POR EL VALOR DE LPS. 1, 990, 150.00**


Nosotros: Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes Representado por El Ingeniero **Carlos Noé Rivera Manzanares**, Hondureño, Mayor de edad, Casado, con DNI 0505-1976-00407, extendida en Potrerillos, Cortes, en su condición Alcalde Municipal de Potrerillos Departamento de Cortes por el Tribunal Supremo Electoral con acuerdo en Punto Único de la Sesión Celebrada y Publicado en el diario oficial la Gaceta el 28 de Diciembre del Año Dos Mil Veintiuno y habiendo tomado Posesión del cargo el día 25 de Enero del Año Dos Mil, y con domicilio ubicado en el Barrio las Flores con Casa Número 217, y con facultades suficientes para celebrar este tipo de actos que en adelante se llamara Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes, y por otra parte el señor **BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES**, con DNI 0511-1973-00117, mayor de edad, casado, hondureño y representante de COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S. DE R. L. DE C.V. y que en adelante se denomina el Contratista, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN EL SECTOR ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS CORTES. CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:** Manifiesta el señor **BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES** que dicho proyecto fue aprobado en sesión de corporación municipal. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE ESTA MODIFICACION:** Sigue manifestando el señor **BERNABE ANTENOR SUAZO FLORES** que dentro del contrato se estableció como título del contrato **POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN EL SECTOR ALDEA BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS CORTES**, y dentro del contrato original en su **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL MONTO Y AL PLAZO DEL CONTRATO:** El Contrato podrá ser modificado tanto en tiempo como en su monto, de común acuerdo entre las partes. En casos de variaciones en el monto, estos se harán mediante modificaciones. Modificaciones al monto original por menos del 10 % de monto del contrato podrían realizarse a través de orden de cambio que emitirá el Contratante; modificaciones superiores al 10% en el monto del contrato serán realizadas a través de una modificación al contrato. Y su **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Se entenderá caso fortuito o fuerza mayor, todo acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, que imposibilita el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales, se reconocen como causa de fuerza mayor y/o entre otras: a) guerra, rebelión y motines b) huelga, excepto aquella de empleados del Contratista c) desastre naturales, tales como terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones, lluvias u otras causas reconocidas como fuerza mayor. También Tomando en cuenta la Orden de Inicio que la finalización era al 23 de Marzo del 2024. Y Cumpliendo con lo establecido en la ley de contratación del estado en su **ARTÍCULO 72.-Plazo de ejecución.** El Contratista deberá ejecutar la

obra en el plazo convenido. Si la demora se produjere por causas no imputables al Contratista, incluyendo, pero no limitándose a la falta de pago en la forma y plazos especificados en el Contrato, la Administración autorizará la prórroga del plazo por un tiempo igual al atraso y la falta de entrega de la información a tiempo.

Y ARTÍCULO 121.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS. La Administración podrá modificar por razón de interés público, los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley y sus normas reglamentarias, y **ARTÍCULO 123.-** Fundamento y efectos. Toda modificación deberá ser debidamente fundamentada y procederá cuando concurren circunstancias imprevistas al momento de la contratación o necesidades nuevas, de manera que esa sea la única forma de satisfacer el interés público perseguido. **CLAUSULA TERCERA:** Debido a que el proyecto no tiene dentro de sus actividades a realizar el pintado de los Bordillos, y que se realizó una ampliación monetaria con un costo de Lps. 9,850.00 siendo un monto total del proyecto de Lps. 2,000,000.00. **CLAUSULA CUARTA: RATIFICACION:** Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas que anteceden, las ratifican y se obligan al cumplimiento de las mismas, En fe de lo cual, firmamos en la ciudad de Potrerillos, Municipio de Cortes, a los Veinte y Nueve Días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veinte y Cuatro.



Ing. CARLOS NOE RIVERA MANZANARES
ALCALDE MUNICIPAL



COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES, DE S. DE R.L. DE C.V.
BERNABE ANTONOR SUAZO FLORES
CONTRATISTA



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE
POTRERILLOS**

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



**ORDEN DE INICIO
Y
ACTA DE RECEPCIÓN**



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS



DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es

ORDEN DE INICIO

Señores: Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

Atendiendo lo estipulado en el Dictamen (DAP-CP-320) del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos se le extiende la Orden de Inicio para la ejecución del Proyecto "pavimentación con concreto ciclópeo e=20".

TIEMPO DE DURACIÓN: 90 DÍAS

FECHA DE INICIO: 11/11/2023

FINALIZACIÓN DE LA OBRA: 15/03/2024

La coordinación del proyecto se hará a través de la Unidad Técnica Municipalidad correspondiente al Municipio de Potrerillos, Departamento de cortes.

Potrerillos, cortes; 15 de marzo del 2024

Atentamente,



Alcalde(sa) Municipal



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS



DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es

ACTA DE RECEPCIÓN

Nombre del proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO E=20

No. Dictamen: DAP-CP-320

Departamento: CORTES

Municipio: POTRERILLOS

Aldea: BUENA VISTAS


Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES S. DE R. L. DE C. V., cumpliendo con lo estipulado en el Dictamen (**DAP-CP-320**) y demás documentos contractuales. A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá conectar con la comunidad beneficiada y/o con la Institución del Estado relacionada(s) con el tipo de obra ejecutada para que asuman la responsabilidad que corresponde.

En Fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

Potrerillos, cortes; 15 marzo del 2024

Contratista

Supervisor(a) Municipal



Alcalde(sa) Municipal



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE
POTRERILLOS**

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



**CERTIFICACIÓN DE PUNTO
DE ACTA PARA LIQUIDACIÓN
DE PROYECTOS, FIRMADO
POR CORPORACIÓN
MUNICIPAL**



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

HONDURAS, C.A.

Tel. 2673-8183/ 2673-8651



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal de Potrerillos Departamento de Cortes, **CERTIFICA:** Que en Sesión Ordinaria Celebrada, por la Honorable Corporación Municipal, El Día Jueves 13 de Marzo del Año Dos Mil Veinticuatro, Según Acta No. 0069-2024, **Punto 8. INFORMES.** Inciso (E)

EI ING. CARLOS NOE RIVERA MANZANRES, Alcalde Municipal, Le Informa a La Honorable Corporación Municipal, Que el Día Miércoles 20 del Presente Mes de Marzo del 2024, Hora 10 A.M. Se estará Inaugurando el Tramo de Pavimento de 500 Metros Lineales, que se construyó en La Calle Contiguo a La Aldea de Buena Vista de este Municipio, Por lo que ya fueron **INVITADOS** La Abogada. **ALEXA DINORAH SOLORZANO ARAGON**, Gobernadora Departamental de Cortes y al Ing. **OCTAVIO PINEDA**, Ministro de (**SIT**) en Representación del Gobierno de la República, Proyecto que fue Adjudicado de Conformidad a lo que establece La Ley de Contratación del Estado y las normas establecida por **Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)** y en Conjunto con **Caminos Productivos**, De Igual Manera está **INVITANDO** a la Honorable Corporación Municipal, a la Inauguración de tan Importante Proyecto.

Se Extiende la Presente **CERTIFICACION** en El Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes, a los 16 Días del Mes de Marzo del Año Dos Mil Veinticuatro.



ALEJANDRO DUARTE GARCIA
Secretario Municipal



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE
POTRERILLOS**

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es





**FICHA DE LIQUIDACIÓN
MUNICIPAL**

	FCP-005 2023	FICHA DE LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA FINAL DE PROYECTO DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS			
MUNICIPIO: Potrerillos			DEPARTAMENTO: Cortes		
MONTO DEL DESEMBOLSO: 2,000,000.00			FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACIÓN: 18/03/2024		
1. Aspectos Generales del Proyecto					
Correlativo	Tipo de Proyecto	Nombre del Proyecto		Aldes Beneficiada	
SIT-CP09-0505-000168	Pavimentacion con concreto ciclopeo E=20	Pavimentacion con concreto ciclopeo E=20		Buena Vistas, sabana de Suarez, Nuevo Mundo, las animas.	
Fecha del Desembolso		Ubicación del Proyecto		Duración del Proyecto	
10/08/2023				DIAS: 90	
Fecha de Inicio del Proyecto		Georeferencia de Inicio del Proyecto		Fecha de Finalización del Proyecto	
30/10/2023		Lat: 15.207379 Long: -87.973125		29/02/2024	
Población Beneficiada		Georeferencia de Final del Proyecto		Captura de Pantalla del Tramo	
7080		Lat: 15.209505 Long: -87.970489			
Empleos Directos		Ubicación de Socialización del Proyecto			
35		15.204815, -87.974916			
Empleos Indirectos		Fecha y Hora de Socialización del Proyecto			
20		30/05/2023 HORA: 17:00			
2. Datos Generales de Supervisión					
Nombre de Alcalde(a) Municipal		Nombre del Técnico Supervisor(a) Municipal		Nombre del Supervisor(a) SIT	
Carlos Noe Rivera Manzanares		Marco Antonio Muñoz Silva		VICTORIA ALEJANDRA ORTEGA VASQUEZ	
DNI del Alcalde(a)		DNI del Técnico Supervisor(a) Municipal		DNI del Supervisor(a) SIT	
0505 1978 00407		0501 1983 03554		0501-1983-08605	
Teléfono		Teléfono		Teléfono	
31886851		96641616		32541727	
Correo electrónico		Correo electrónico		Correo electrónico	
cnoearca@yahoo.com		marco_munoz13@hotmail.com		va.ortega9@gmail.com	
3. Estado Financiero del Proyecto					
		Monto en Números	Monto en letras		
Monto Total Aprobado SIT		L. 2,000,000.00	Dos millones lempiras exacto		
Aporte Municipal		L.			
Costo Total del Proyecto		L. 2,000,000.00	Dos millones lempiras exacto		
4. Reporte de Obra					
Descripción del Proyecto:				Metros Lineales	Ancho en metros
pavimentacion con concreto ciclopeo E=20 ;50% de piedra y 50% de concreto				500	6
Desglose de Actividades del Proyecto:					
No.	Actividades Realizadas	Unidad	Cantidad	Valor (en números y en letras)	
1	REO , CONFORMACION SUB RASANTE /COLOCACION DE NIVELETAS Y EMPEDRADO 345 MTL, APLICACIÓN CO	MTL	345	498,522 .50	
				CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL	
2	Y EMPEDRADO MTL,APLICACIÓN CONCRETO CICLOPEO E=20 PRIMER TRAMO COMPLEMETARIO 172MTL	MTL	345	500,000.00	
				QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS	

3	LOCACION DE NIVELETAS Y EMPEDRADO / APLICACIÓN CONCRETO CICLOPEO E=20 SEGUNDO TRAMO 344	MTL	344	450,000.50
				CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL LEMP
4	CONSTRUCCION 1019 ML BORDILLOS, FINALIZACION DE PROYECTO	MTL	1019	541,627.00
				QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISI
SUBTOTAL:				1,990,150.00
				CIENTOS NOVENTA MILCIENTO CINCIEN LEM
Obras Complementarias Por Excedente (Si Aplica)				
Descripción		Unidad	Cantidad	Valor (en números y en letras)
PINTADO DE BORDILLOS		MTL	1019	9,850.00
				NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPI
TOTAL DEL PROYECTO:				2,000,000.00
				DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

5. Registro Fotográfico		
Fotografía del Antes de la Obra	Fotografía de Avance de Obra	Fotografía de Obra Terminada
		
REPLANTEO	FUNDICION DE PRIMER TRAMO	OBRA FINALIZADA

6. Imprevistos y Retrasos		
No.	Descripción	Duración (en días)
1	fenomenos naturales torrenciales de agua e inundaciones	43
2		

7. Firmas		
		
Firma y sello del Alcalde Municipal	Firma y sello del Supervisor Técnico Municipal	Firma y sello del Técnico Supervisor SIT



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE
POTRERILLOS**

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



**FICHA DE SOCIALIZACIÓN DE
PROYECTOS**



FCP-008
2023

FORMATO DE FICHA DE SOCIALIZACIÓN PARA
PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS



SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Nombre de los Proyectos:	Pavimentación con concreto ciclópeo e=20
1. Departamento:	Cortes
2. Municipio:	Potreriillos
3. Aldeas beneficiadas:	Buena vista, la sabana de Suarez, nuevo mundo, las animas
4. Fecha:	30 mayo del 2023
5. Hora de inicio:	17:00
6. Hora de cierre:	18:00
7. Lugar:	Buena vista
OBJETIVO DE LA SOCIALIZACIÓN	
Dar a conocer a las comunidades beneficiadas con el Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos, los proyectos a ejecutarse asegurando la participación ciudadana mediante el desarrollo de la socialización.	
PUNTOS RESOLUTIVOS	
Se socializo y aprobó la CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CICLOPEO , en aldea buena vista en el Municipio de Potrerillos, Departamento de Cortes, mediante el convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte, la secretaria de Estado en los Despachos Gobernación Justicia Y Descentralización, la Red Solidaria y la Asociación de Municipio de Honduras.	



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
ALCALDE





NOMBRE, FIRMA Y SELLO
DEL SECRETARIO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL

Anexar la siguiente documentación

- A. Lista de asistencia.
- B. Acta de certificación de la socialización debidamente firmada por el alcalde y el secretario de la corporación municipal.
- C. Imágenes de la jornada informativa.

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Nº identidad	Edad	Organización (si aplica)	Teléfono	Firma
Mario Hernández	1217-1966-00150	57		9364 7537	
Maria Marta Sorto	1003-1975-0034	48		9473-8098	
Mario Edilberto Sosa	0505-1998-00413	25		9964-0197	Mario Hernandez
Nolvia Hernández S	0505-1991-00326	32		9503-13-54	Nolvia Hernández
Jose Delcy López	0507-1987-00549	37		948-82-99	Delcy Jose Lopez
Tomas Gomez	1003-1974-00458	49		965382-33	Tomas Gomez
Jose Angel Bardales	0310-1959-00080	63		9679-44-59	Jose A. Bardales
Juan DE La Cruz Sanchez	1003-1967-00421	52		9889-11-00	Juan de la Cruz Sanchez
Maria Sorto	1003-1986-00326	43		9786-83-01	Maria Sorto
Marleny E. Lopez	0507-1985-00676	38		9820 4028	Marleny Lopez
Fanny Hernández	0505-1986-00006	27		- -	Fanny Hernandez
Jose clemente Gomez	1003-1999-00059	22		9468-0563	Jose Clemente Gomez
Eligio Sanchez	1003-1963-00384	60		9713-27-24	Eligio Sanchez
Angel Yovany Bardales	0505-1992-00020	31		9752-0664	Angel Y. Bardales
Noel Sanchez A.	1003-1998-00073	25		- -	Noel Sanchez A
Ramiro Sanchez P	1003-1975-00260	48		9768-0180	Ramiro Sanchez
Wilmer Amaya	1003-1979-00341	44		9535 3561	Wilmer Amaya
René Lopez Nvarado	0507-1988-00260	35		9816-50-88	René Lopez



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE
POTRERILLOS**

DEPARTAMENTO DE CORTES

TEL. 2673-8183 / 8156

munipot@yahoo.es



**CONSTANCIAS Y
CERTIFICADOS.**



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Tel. 2673-8183/ 2673-8651

munipot@yahoo.es



Potreriillo, cortes, 29 febrero 2024

CONSTANCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL Y LA COMISIÓN CIUDADANA DETRANSparencia

El que suscribe, en calidad de Representación de la Comisión Ciudadana de Transparencia de Potrerillos, cortes, hace constar lo Siguiende: Que, habiendo llevado a cabo un proceso de Revisión, la Comisión Ciudadana de Transparencia del Municipio de potrerillos, cortes, ha dado el visto bueno a la liquidación de los proyectos de Construcción financiados por el Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos; Dichos proyectos, detallados a continuación, han sido ejecutados de acuerdo a los perfiles de proyectos Establecidos por el mencionado programa:

1. Nombre del Proyecto: pavimentación con concreto ciclópeo e=20, Monto Asignado: 2, 000,000.00 Aldea o Comunidad: buena vista.

La Comisión Ciudadana de Transparencia ha llevado a cabo una visita de campo, observando que los Recursos asignados por la presidenta Xiomara Castro a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), A través del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos, se han utilizado de manera Adecuada y eficiente, garantizando la correcta ejecución de los proyectos mencionados.

Asimismo, se ha constatado que los resultados obtenidos de dichos proyectos contribuyen de manera Significativa al mejoramiento de los caminos productivos de nuestra comunidad, promoviendo el Desarrollo económico y social en el municipio.

Por lo tanto, la Comisión Ciudadana de Transparencia de Karen Yesenia Bejarano Domínguez, avala la liquidación de los proyectos de construcción Financiados por el Programa Nacional de Intervención a Caminos, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de Todos los involucrados en su ejecución.

Se extiende la presente constancia a solicitud de los interesados, para los fines que estimen Convenientes.

Atentamente,

Karol Alonzo

Karol Yadira Alonzo santos

Teléfono: 98450378

Correo: [no tiene](#)

Representante de la Comisión Ciudadana de Transparencia

Karen Yesenia Bejarano Domínguez

Karen Yesenia Bejarano Domínguez

Teléfonos: 32541946

Correo: Karen_mario31@hotmail.com



Representante de la Comisión Ciudadana de Transparencia

Comisionado municipal y comisión ciudadana de transparencia Registro Municipal: oficina de gobernabilidad y transparencia de la municipalidad de potrerillos cortes.

Potreriillos, cortes a los 12 noviembre 2022



ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES

Tel. 2673-8183/ 2673-8651

munipot@yahoo.es



CONSTANCIA DEL PATRONATO U ORGANIZACIÓN CIVIL

Por medio de la presente, el [Nombre de la Organización Civil o patronato], debidamente juramentado

He inscrito en los registros municipales, emite la siguiente constancia:

Que habiendo realizado un seguimiento del proyecto pavimentación con concreto ciclópeo e=20, ubicado en aldea buena vista, se certifica que el mencionado proyecto ha sido debidamente finalizado.


Durante el periodo de ejecución del proyecto, se ha evidenciado una adecuada calidad en la ejecución de las obras y la utilización de los recursos asignados.

El proyecto pavimentación con concreto ciclópeo e=20 ha generado impactos positivos significativos en el área circundante, Beneficiando a la comunidad local en términos de mejoramiento de acceso para poder sacar los cultivos de la zona. Además, se Destaca la participación activa y comprometida del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través De la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y demás entidades involucradas en la Implementación del proyecto.

Por lo tanto, en virtud de lo anteriormente expuesto, la presente constancia tiene el propósito de Otorgar fe y legalidad sobre la entrega de la obra y su contribución al desarrollo y bienestar de la Comunidad.

Se extiende la presente constancia a solicitud de la Alcaldía de potrerillos, en el Departamento de cortes y para los fines que estime conveniente.

Atentamente,


Juan de la cruz Sánchez
Teléfono: 98981100
Correo: no tiene



Presidente de Patronato de Pro Mejoramiento Registro Municipal

Patronato de Pro Mejoramiento Registro Municipal: Oficina de Gobernabilidad y Transparencia de la Municipalidad de Potrerillos, Cortes.

Potrerillos, cortes a los 12 noviembre 2022

Ciudad de **Potrerillos** Fecha: **20 marzo 2024**

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

Yo, **Victoria Alejandra Ortega Vásquez**, Arquitecto Supervisor designado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), por medio de la presente certifico que, tras una exhaustiva revisión y evaluación, se ha procedido a la aprobación de la liquidación de los proyectos ejecutados por la Municipalidad de Potrerillos, en el departamento de **Cortes**, a través de los fondos recibidos por el "Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos" de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).


Los proyectos ejecutados, detallados a continuación, han sido objeto de análisis y supervisión técnica por parte del equipo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) bajo mi responsabilidad:

- ☐ Nombre del Proyecto: **PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO E=20CM DE 3000 PSI**, Monto Asignado: **L. 2, 000,000.00** Aldea o Comunidad: **Aldea Buena Vista** Correlativo: **SIT-CP09-0505000168**.

Durante el proceso de supervisión, se verificó que los proyectos se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones técnicas y los lineamientos establecidos por el "Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos". Asimismo, se constató que los recursos asignados han sido utilizados de manera adecuada, transparente y eficiente.

Esta certificación se emite a solicitud de la Alcaldía Municipal de **Potrerillos** y para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



Victoria Alejandra Ortega Vásquez.

Ingeniero Supervisor SIT

Teléfono: **3254-1727**, Correo: va.ortega9@gmail.com



**ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES**

Tel. 2673-8183/ 2673-8651

munipot@yahoo.es



CONSTANCIA DE VISTO BUENO DEL GOBERNADOR

Yo, Alexa Dinorah Solórzano Aragón, en mi calidad de Gobernadora del Departamento de cortes, por medio de la presente, otorgo mi visto bueno al expediente de liquidación presentado por la alcaldía del municipio de potrerillos pertenecientes a este departamento, correspondiente a los proyectos ejecutados a través del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos.

Mediante una revisión del expediente de liquidación, he verificado la correcta documentación y el Cumplimiento de los procedimientos establecidos. Asimismo, se ha constatado que los proyectos Ejecutados han generado impactos positivos en la mejora de los caminos productivos, promoviendo el Desarrollo económico y social de las comunidades beneficiadas.

Esta constancia válida el cumplimiento satisfactorio de los proyectos ejecutados por las alcaldías, así Como la correcta liquidación de los recursos asignados. Reconozco el esfuerzo y compromiso del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Y demás entidades involucradas en la implementación del proyecto.

Potrerillos cortes, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,

Alexa Dinorah Solórzano Aragón
Gobernadora del Departamento de cortes

23 DE MAYO DE 2024

RECEPCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO

ALCALDE

Carlos Noe Rivera

Su oficina

Reciba un cordial y afectuoso saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones, por medio de la presente, notificamos la recepción a la corporación municipal de POTRERILLOS del departamento CORTES, del informe de liquidación correspondiente a la ejecución de los proyectos:

- Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo con correlativo SIT-CP09-0505-000168.

El informe presentado será revisado por el equipo del Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), para verificar la información proporcionada y emitir la constancia de liquidación a cada proyecto que cumpla con los requisitos del programa.

Agradecemos permanecer en total disposición para cualquier solicitud de documentación o en su defecto la subsanación necesaria en cumplimiento al Decreto Legislativo 129-2022.

Reiteramos que la correcta liquidación de cada proyecto es obligatoria para la emisión del certificado de solvencia municipal correspondiente.

Atentamente,


LIC. ALLAN FERNANDO IRAHETA GUZMÁN



PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS	
 HONDURAS	RECIBIDO <u>Allan Iraheza</u>
	FECHA <u>23/05/2024</u>
	HORA <u>03:08 PM</u>
