



ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL. 2444-3100/1686



ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON

SEGUNDO INFORME DE "PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADENO,
COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO
DE COLON".

UBICACIÓN: CIUDAD DE TOCOA, MUNICIPIO DE TOCOA, DEPARTAMENTO
DE COLON

PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES

ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE TOCOA COLON



15 de Abril de 2024

Tocoa, Colón

CONTENIDO

- I. INTRODUCCION
 - a. Periodo del Informe.
 - b. Antecedentes del proyecto.

- II. RESUMEN EJECUTIVO FINANCIERO
 - a. Cuadro Resumen

- III. DESCRIPCION DEL PROYECTO
 - a. Localización del Proyecto
 - b. Financiamiento
 - c. Unidad Ejecutora

- IV. INFORME DE CONSTRUCCION
 - a. Actividades Realizadas
 - b. Personal del Contratista
 - c. Equipo Utilizado
 - d. Análisis del cumplimiento del Plan de Trabajo
 - e. Resumen de Estimación

- V. INFORME DEL COORDINADOR/SUPERVISOR
 - a. Actividad a realizar por la coordinación/supervisión
 - b. Reuniones de trabajo

- VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- VII. ANEXOS
 - a. Fotografías

I. INTRODUCCION

En el presente documento se da a conocer el Informe No. 1 de avance de obra de las actividades que se han realizado hasta este periodo en el "Proyecto construcción de Pavimento Hidráulico". Este **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"**.

Este importante proyecto está siendo financiado con fondos Municipales.

La ejecución del proyecto de pavimentación está a cargo de la Empresa CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. de R.L. (CONDELSA)

a. Periodo del Informe

El periodo de labores en la ejecución del proyecto consta desde el 15 de MARZO al 15 de Abril del 2024.

b. Antecedentes del proyecto.

La Alcaldía Municipal de Tocoa, Colón ha realizado numerosos trabajos para reparar y mantener en buen estado las calles de tierra de la Ciudad de Tocoa. Estos esfuerzos han sido infructuosos ya que en la temporada de invierno las abundantes lluvias sobre la zona, con un promedio de 3,000 a 3,500 mm al año y el que esta calle sirva como corredero natural de las aguas lluvias, provocan que rápidamente se dañen, constantemente los patronatos solicitan que se atiendan esta calles la municipalidad de Tocoa prioriza repara y mantener lasa calle que dan acceso a centro educativo públicos y privados. El trabajo ha sido para remediar o apalea un poco la dificultad para circular, es por eso que se plantea la construcción de esta calle que daría una solución definitiva.

Por todo lo anterior y pensando en impulsar el desarrollo de la ciudad de Tocoa Colón, se ha puesto a disposición Fondos de inversión en Infraestructura a través de la de la municipalidad de Tocoa Colón con el objetivo de desarrollar el proyecto: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"**. Para ejecutar obras de Infraestructura Municipal, que

beneficiarán de forma significativa a la ciudad de Tocoa Colón, así como el nivel de vida de sus pobladores, se beneficiaran una cantidad de 4 mil habitantes 1800 mil hombres y 2200 mil mujeres de forma indirecta con la ejecución del proyecto.


II. RESUMEN EJECUTIVO FINANCIERO

a. Cuadro resumen hasta la fecha:

1	Nombre de la Empresa	Empresa CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. de R.L. (CONDELSA)
2	Fecha de Inicio	15 de febrero del 2024
3	Fecha de Estimación No.1	01 de abril del 2024
5	Monto del Contrato	Lps. 2,995,804.31
6	Orden de Cambio	Si
7	Modificaciones del Plazo (Nuevas fechas de culminación)	Si habrá, está por definir
8	Modificaciones en Monto contractual.	Si hay
9	Monto ejecutado (L)	Lps. 3,259,824.12
11	Monto Facturado (L)	Lps. 1,219,607.99
12	% de Avance fisico programado	100%
13	% de Avance fisico ejecutado	100%
14	% de Avance financiero Program.	100%
15	% de Avance financiero ejecutado	100%
16	Plazo contractual original	60 días calendario
17	Plazo contractual modificado	No aplica

III. DESCRIPCION DEL PROYECTO

a. Localización del Proyecto

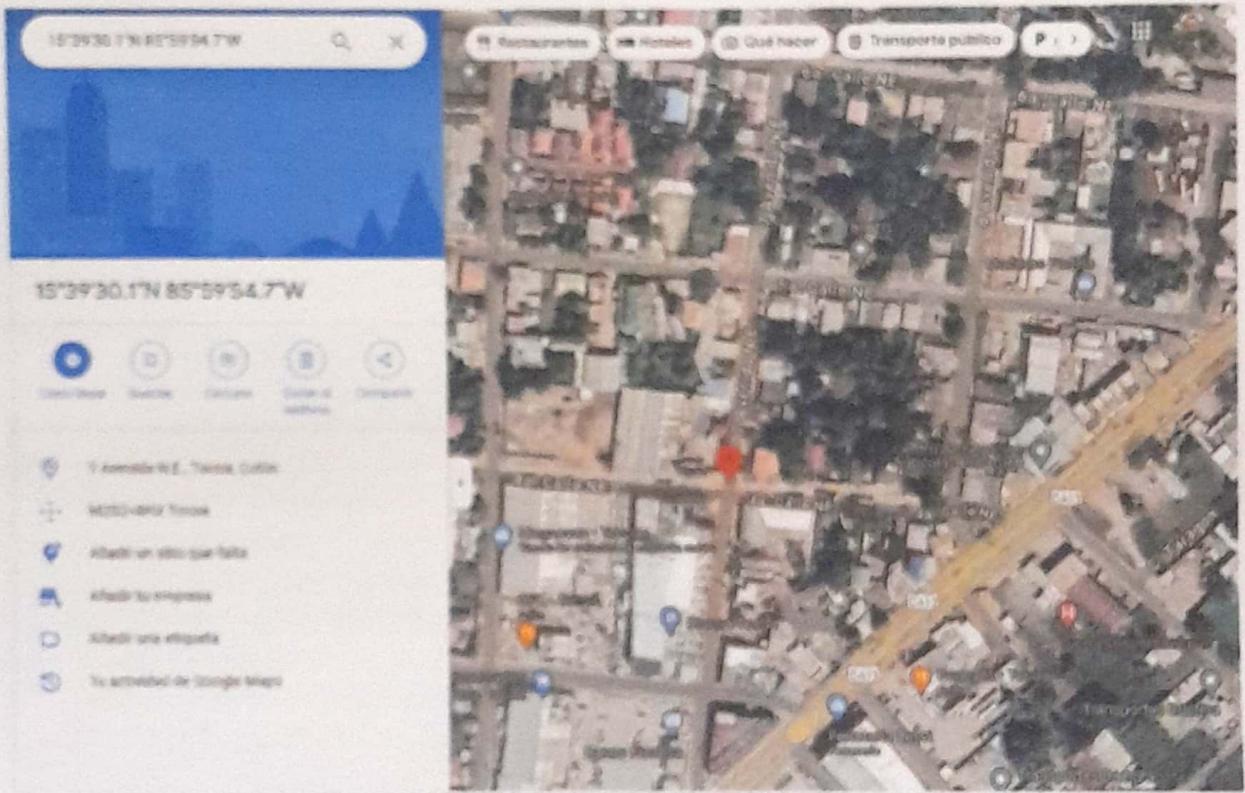

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON”.

b. Fuente de Financiamiento

La construcción del Proyecto **“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON”.**

Está siendo financiado por la Municipalidad de Tocoa Colón.

c. Unidad Ejecutora

La Municipalidad de Tocoa Colón por medio de departamento de ingeniería e infraestructura municipal.

INFORME DE CONSTRUCCION HASTA LA FECHA

Según el avance de obra en las actividades realizadas durante el periodo del 15 de febrero al 15 de marzo del 2024, se alcanzó el 53.72% acumulado de ejecución del proyecto, el cual corresponde al monto total del proyecto, con monto de Lps. 2, 995,804.31

Las actividades que se realizaron durante este periodo de labores en el proyecto, fueron las siguientes:

CONTRATO ORIGINAL

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M2	1,710.00	54.51	93,212.10
2	MATERIAL SELECTO PARA SUB-BASE	M3	256.50	493.22	126,510.93
3	CONFORMACION CON COMPACTADORA (SUB-RASANTE)	M2	1,710.00	196.71	336,374.10
4	CONCRETO DE 280 KG/CM	M2	1,710.00	1,141.63	1,952,187.30
5	ACERA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR	M2	362.00	755.80	273,599.60
6	BORDILLO RECT. 0.15X0.15 CONC. 1:2:2	ML	362.00	590.94	213,920.28
TOTAL					2,995,804.31

OBRA ADICIONAL

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M2	142.20	54.51	7,751.32
2	MATERIAL SELECTO PARA SUB-BASE	M3	21.33	493.22	10,520.38
3	CONFORMACION CON COMPACTADORA (SUB-RASANTE)	M2	142.20	196.71	27,972.16
4	CONCRETO DE 280 KG/CM	M2	142.20	1,141.63	162,339.79
5	ACERA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR	M2	41.25	755.80	31,176.75
6	BORDILLO RECT. 0.15X0.15 CONC. 1:2:2	ML	29.20	590.94	17,255.45
6	LEVANTAMIENTO DE POZO DE INSPECCION	UNIDAD	4.00	1,750.99	7,003.96
TOTAL					264,019.81

a. Actividades realizadas en este Periodo (15 de marzo al 01 de abril)

TRAZADO Y MARCADO

Este trabajo consiste en trazar y nivelar el corte de sub rasante, nivelar el relleno con material selecto para la rasante

Concreto de 280 kg/cm

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de mezcla de concreto hidráulico como estructura del pavimento con o sin refuerzo; Dicho concreto se elaboró mediante uso de concretera, realizando el vibrador con vibrador mecánico. Incluye el encofrado y curado del concreto.

Acera de un metro de ancho

Este trabajo consistirá en la construcción de aceras de concreto sobre una cama de asiento conformada y compactada a las dimensiones, líneas y niveles indicados en los planos u ordenados por el Ingeniero.

Bordillo de Concreto

Este trabajo consistirá en la construcción de aceras de concreto sobre una cama de asiento conformada y compactada a las dimensiones, líneas y niveles indicados en los planos u ordenados por el Ingeniero.

b. Personal del Contratista

No.	Descripción	Cantidad
1	Ingeniero	1
2	Maestro de Obra	1
3	Albañil	2
4	Ayudantes	5

5	Peón	6
6	Operador de Equipo	1

c. Equipo Utilizado

No.	Descripción	Cantidad
1	Vibro compactadora	1
2	Pick Up	1
3	Herramienta Menor	Varios
4	Cortadora de Concreto	1
5	Mixer de 7 m3	1

d. Análisis del cumplimiento del Plan de Trabajo

En este periodo de ejecución no se han presentado inconvenientes, se está cumpliendo con forme el cronograma de actividades. El contratista ha mostrado un buen rendimiento en la ejecución de las actividades propuestas cumplir.

e. Resumen de Estimaciones.

La Municipalidad de Tocoa Colón, realizó el pago total de la estimación #2 del proyecto ya que la empresa no solicito anticipo con el valor de Lps. 1,219,607.99, que equivale al 46.28% del total del proyecto, alcanzando un porcentaje acumulado de avance de obra del 100% de ejecución.



ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL.2444-3100/1686



V. INFORME DEL COORDINADOR/SUPERVISOR

a. Actividad a realizar por la coordinación/supervisión

- Se ha mantenido constante interacción con el Contratista para dar seguimiento a los trabajos a desarrollar, para que estos sean ejecutados de una forma correcta y adecuada, respetando el diseño los correctos procedimientos constructivos.
- Se realizaron reuniones con el Contratista, El Sr. Alcalde Municipal, y la Unidad de desarrollo Social Comunitario, estas reuniones se realizaban en el Sitio del Proyecto y así como también en la municipalidad de Tocoa.

b. Reuniones de trabajo

Existieron reuniones de trabajo, previamente coordinadas para fijar la fecha, hora y sitio, con la Unidad de Desarrollo Social Comunitario municipal, así como también con el Contratista ejecutor del Proyecto, para la toma de decisiones referente a la realización de las

Item	Monto del Contrato	Monto Desembolsado (100%)
	Lps. 2, 995,804.31	Lps. 3,259,824.12

actividades correspondientes al 100% del Proyecto.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se le ha pedido al Contratista que cumpla con las instrucciones y recomendaciones por parte de Coordinación/Supervisión, así como las especificaciones técnicas y documentos contractuales.
- Se han cumplido las actividades de construcción en este periodo, en el cual lo tiene estipulado en el cronograma de trabajo.



ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL.2444-3100/1686




El Contratista es el responsable de todas las actividades concernientes al "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON", el cual pertenece al municipio de Tocoa, departamento de Colón, así como la calidad del mismo.

ANEXOS




ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL.2444-3100/1686

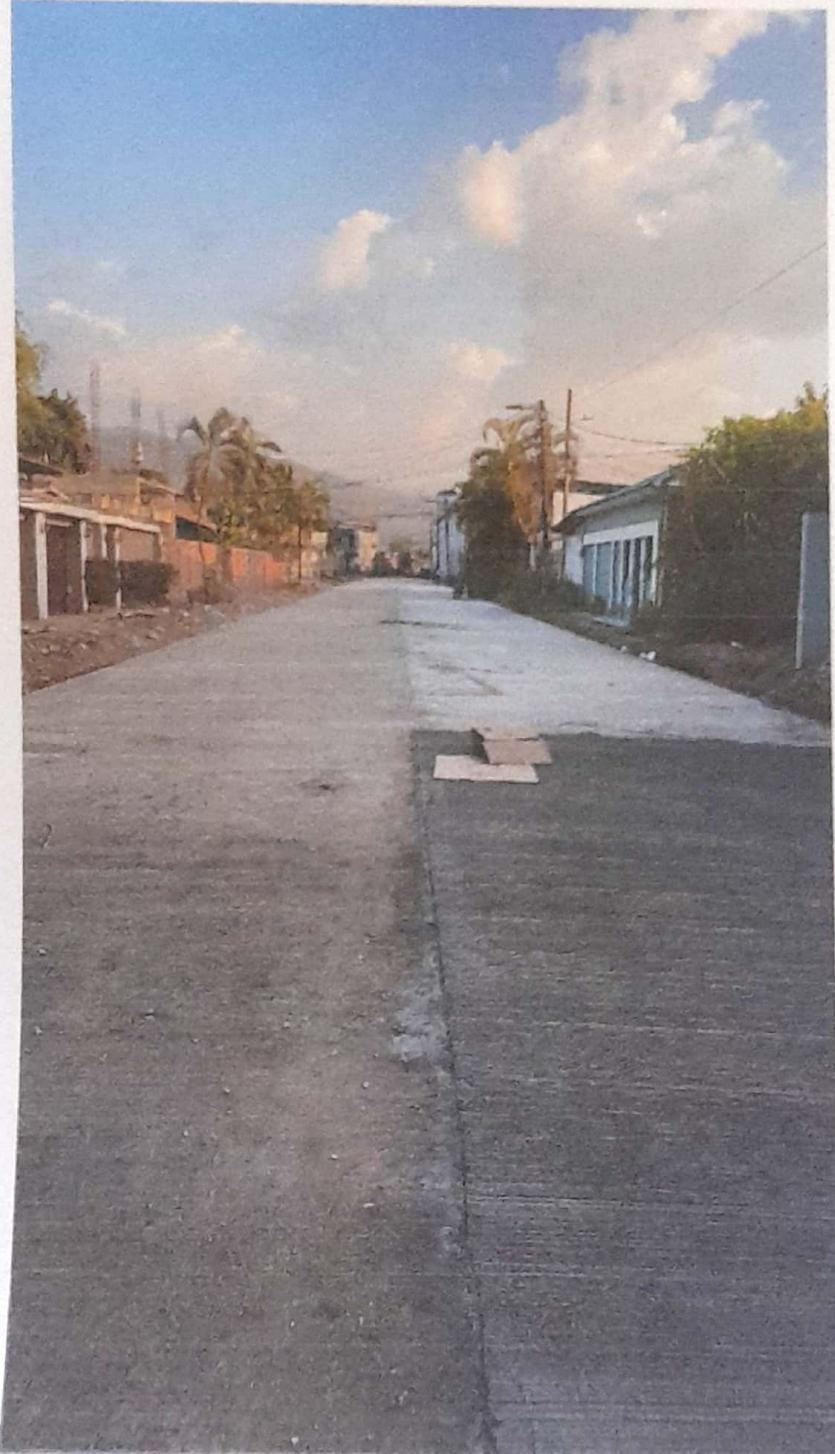

Período: 2022-2026

Arda Jancy Martínez Alcaldé Municipal



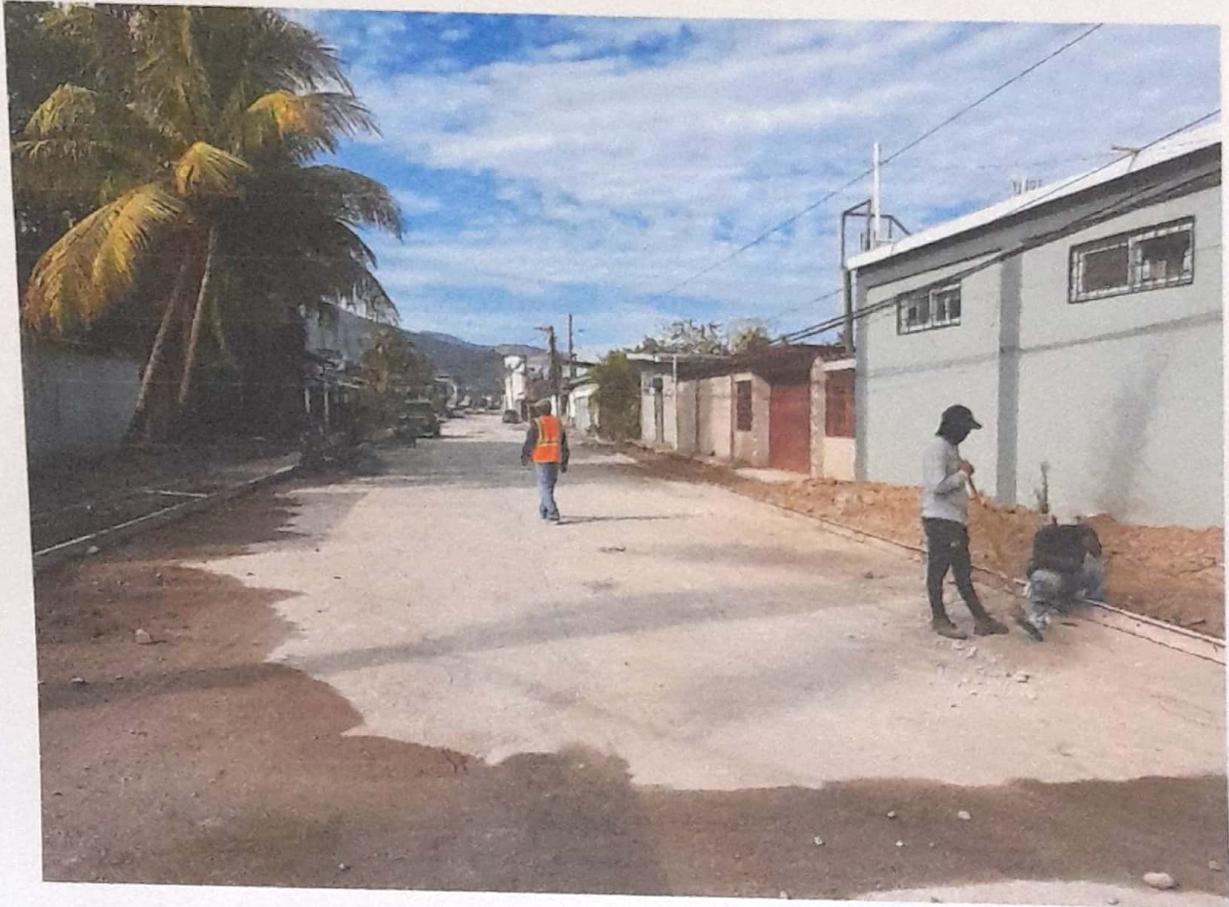



ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL. 2444-3100/1686



Proyecto: 2025-2026

Adán Funes Martínez, Alcalde Municipal



Tocoa, Colón de 01 de Abril de 2024

Ref. LP-AMTC-001-2024

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO,
COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO
DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Adán Fúnez Martínez
Alcalde Municipal
Su oficina:

Estimados Alcalde,

De manera muy especial me dirijo a usted para solicitar el pago de estimación #2, en lempiras Lps. 1,219,607.99 del LP-AMTC-001-2024 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Atentamente;

Ing. Carlos Oswaldo Sandoval
Depto. de Ingeniería Civil
Alcaldía Municipal de Tocoa, Colón





ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA No.2



PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

CONTRATISTA: CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. DE R.L. "CONDELSA"

CONTRATO ORIGINAL					ACUMULADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACION			TOTAL ACUMULADO			AVANCE %	
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	AVANCE %
1	TREZADO Y MARCADO	M2	1,710.00	54.51	93,212.10	1,710.00	54.51	93,212.10				1,710.00	54.51	93,212.10	100.00%
2	MATERIAL SELECTO PARA SUB-BASE	M3	256.50	493.22	126,510.93	256.50	493.22	126,510.93				256.50	493.22	126,510.93	100.00%
3	CONFORMACION CON COMPACTADORA (SUB-BASANTE)	M2	1,710.00	196.71	336,374.10	1,710.00	196.71	336,374.10				1,710.00	196.71	336,374.10	100.00%
4	CONCRETO DE 200 KG/CM	M2	1,710.00	1,141.63	1,952,187.30	1,300.00	1,141.63	1,484,119.00	410.00	1,141.63	468,068.30	1,710.00	1,141.63	1,952,187.30	100.00%
5	ACERA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR	M2	362.00	755.80	273,599.60	0.00	755.80	-	362.00	755.80	273,599.60	362.00	755.80	273,599.60	100.00%
6	BORDILLO SECT. 0.15X0.15 CONC. 1:2:2	Ml	362.00	590.94	213,920.28	0.00	590.94	-	362.00	590.94	213,920.28	362.00	590.94	213,920.28	100.00%
TOTAL					2,995,804.31	2,040,216.13			955,588.18			2,995,804.31			85.71

OBRA ADICIONAL					ACUMULADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACION			TOTAL ACUMULADO			AVANCE %	
Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	AVANCE %
1	TREZADO Y MARCADO CON TRIDOLITO	M2	140.20	54.51	7,751.32	0.00	54.51	-	140.20	54.51	7,751.32	140.20	54.51	7,751.32	100.00%
2	MATERIAL SELECTO PARA SUB-BASE	M3	21.33	493.22	10,520.38	0.00	493.22	-	21.33	493.22	10,520.38	21.33	493.22	10,520.38	100.00%
3	CONFORMACION DE SUB-RAZANTE	M2	140.20	196.71	27,972.16	0.00	196.71	-	140.20	196.71	27,972.16	140.20	196.71	27,972.16	100.00%
4	CONCRETO 4.000 Psi e=0.15 m	M2	140.20	1,141.63	162,339.79	0.00	1,141.63	-	140.20	1,141.63	162,339.79	140.20	1,141.63	162,339.79	100.00%
5	ACERA DE CONCRETO DE 5CM DE ESPESOR	M2	41.25	755.80	31,176.75	0.00	755.80	-	41.25	755.80	31,176.75	41.25	755.80	31,176.75	100.00%
6	BORDILLO DE CONCRETO 0.15X0.15 CONC. 1:2:2	Ml	29.20	590.94	17,255.45	0.00	590.94	-	29.20	590.94	17,255.45	29.20	590.94	17,255.45	100.00%
7	LEVANTAMIENTO DE POZOS DE INSPECCION	UNIDAD	4.00	1,750.99	7,003.96	0.00	1,750.99	-	4.00	1,750.99	7,003.96	4.00	1,750.99	7,003.96	100.00%
TOTAL					264,019.81	264,019.81			264,019.81			264,019.81			100.00%

Total bruto	1,119,607.99
(-) Amortizacion del 15% de esta estimacion	
Neto a recibir	1,119,607.99

Total Anticipo Recibido:	0.00
Retenido en estimaciones anteriores:	0.00
Retenido esta estimación:	0.00
Por Amortización:	0.00



[Handwritten Signature]
TESORERO ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA



ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA No.2

PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON

CONTRATISTA: CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. DE R.L. "CONDELSA"

CONTRATO ORIGINAL					ACUMULADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACION			TOTAL ACUMULADO			AVANCE %
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	AVANCE %
TRABAJOS MANO DE OBRAS	M2	1,710.00	54.51	93,212.10	1,710.00	54.51	93,212.10	-	54.51	-	1,710.00	54.51	93,212.10	100.00%
MATERIAL SELECTIVO PARA GRADASE	M3	256.50	493.22	126,510.93	256.50	493.22	126,510.93	-	493.22	-	256.50	493.22	126,510.93	100.00%
CONCRETO PARA CARRETERA (SUB-BASANTE)	M2	1,710.00	196.71	336,374.10	1,710.00	196.71	336,374.10	-	196.71	-	1,710.00	196.71	336,374.10	100.00%
CONCRETO PARA PAVIMENTO	M2	1,710.00	1,141.63	1,952,187.30	1,300.00	1,141.63	1,484,119.00	410.00	1,141.63	468,068.30	1,710.00	1,141.63	1,952,187.30	100.00%
MATERIAL DE CONCRETO DE UNO (1) ESPESOR	M2	362.00	755.80	273,599.60	0.00	755.80	-	362.00	755.80	273,599.60	362.00	755.80	273,599.60	100.00%
MATERIAL DE CONCRETO DE UNO (1) ESPESOR	ML	362.00	590.94	213,920.28	0.00	590.94	-	362.00	590.94	213,920.28	362.00	590.94	213,920.28	100.00%
TOTAL				2,995,804.31			2,040,216.13			955,588.18			2,995,804.31	85.71

OBRA ADICIONAL					ACUMULADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACION			TOTAL ACUMULADO			AVANCE %
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	AVANCE %
TRABAJOS MANO DE OBRAS	M2	142.20	54.51	7,751.32	0.00	54.51	-	142.20	54.51	7,751.32	142.20	54.51	7,751.32	100.00%
MATERIAL SELECTIVO PARA GRADASE	M3	21.33	493.22	10,520.38	0.00	493.22	-	21.33	493.22	10,520.38	21.33	493.22	10,520.38	100.00%
CONCRETO PARA CARRETERA (SUB-BASANTE)	M2	142.20	196.71	27,972.16	0.00	196.71	-	142.20	196.71	27,972.16	142.20	196.71	27,972.16	100.00%
CONCRETO PARA PAVIMENTO	M2	142.20	1,141.63	162,339.79	0.00	1,141.63	-	142.20	1,141.63	162,339.79	142.20	1,141.63	162,339.79	100.00%
MATERIAL DE CONCRETO DE UNO (1) ESPESOR	M2	41.25	755.80	31,176.75	0.00	755.80	-	41.25	755.80	31,176.75	41.25	755.80	31,176.75	100.00%
MATERIAL DE CONCRETO DE UNO (1) ESPESOR	ML	29.20	590.94	17,255.45	0.00	590.94	-	29.20	590.94	17,255.45	29.20	590.94	17,255.45	100.00%
MATERIAL DE CONCRETO DE UNO (1) ESPESOR	UNIDAD	4.00	L 1,750.99	7,003.96	0.00	1,750.99	-	4.00	1,750.99	7,003.96	4.00	1,750.99	7,003.96	100.00%
TOTAL				264,019.81						264,019.81			264,019.81	

Total bruto	1,219,607.99
(-) Amortizacion del 15% de esta estimacion	
Neto a recibir	1,219,607.99

Total Anticipo Recibido:	0.00
Retenido en estimaciones anteriores:	0.00
Retenido esta estimacion:	0.00
Por Amortizar:	



FELIX FIGUEROA
TESORERO ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA





ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL.2444-3100/1686



ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON

PRIMER INFORME DE "PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO,
COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO
DE COLON".


UBICACIÓN: CIUDAD DE TOCOA, MUNICIPIO DE TOCOA, DEPARTAMENTO
DE COLON

PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES

ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE TOCOA COLON

15 de MARZO de 2024

Tocoa , Colón



CONTENIDO

- I. INTRODUCCION
 - a. Periodo del Informe.
 - b. Antecedentes del proyecto.

- II. RESUMEN EJECUTIVO FINANCIERO
 - a. Cuadro Resumen

- III. DESCRIPCION DEL PROYECTO
 - a. Localización del Proyecto
 - b. Financiamiento
 - c. Unidad Ejecutora

- IV. INFORME DE CONSTRUCCION
 - a. Actividades Realizadas
 - b. Personal del Contratista
 - c. Equipo Utilizado
 - d. Análisis del cumplimiento del Plan de Trabajo
 - e. Resumen de Estimación

- V. INFORME DEL COORDINADOR/SUPERVISOR
 - a. Actividad a realizar por la coordinación/supervisión
 - b. Reuniones de trabajo

- VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- VII. ANEXOS
 - a. Fotografías

I. INTRODUCCION

En el presente documento se da a conocer el Informe No. 1 de avance de obra de las actividades que se han realizado hasta este periodo en el "Proyecto construcción de Pavimento Hidráulico". Este **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"**.

Este importante proyecto está siendo financiado con fondos Municipales.

La ejecución del proyecto de pavimentación está a cargo de la Empresa CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. de R.L. (CONDELSA)

a. Periodo del Informe

El periodo de labores en la ejecución del proyecto consta desde el 15 de FEBRERO al 15 de MARZO del 2024.

b. Antecedentes del proyecto.

La Alcaldía Municipal de Tocoa, Colón ha realizado numerosos trabajos para reparar y mantener en buen estado las calles de tierra de la Ciudad de Tocoa. Estos esfuerzos han sido infructuosos ya que en la temporada de invierno las abundantes lluvias sobre la zona, con un promedio de 3,000 a 3,500 mm al año y el que esta calle sirva como corredero natural de las aguas lluvias, provocan que rápidamente se dañen, constantemente los patronatos solicitan que se atiendan esta calles la municipalidad de Tocoa prioriza repara y mantener lasa calle que dan acceso a centro educativo públicos y privados. El trabajo ha sido para remediar o apalear un poco la dificultad para circular, es por eso que se plantea la construcción de esta calle que daría una solución definitiva.

Por todo lo anterior y pensando en impulsar el desarrollo de la ciudad de Tocoa Colón, se ha puesto a disposición Fondos de inversión en Infraestructura a través de la de la municipalidad de Tocoa Colón con el objetivo de desarrollar el proyecto: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"**. Para ejecutar obras de Infraestructura Municipal, que

beneficiarán de forma significativa a la ciudad de Tocoa Colón, así como el nivel de vida de sus pobladores, se beneficiaran una cantidad de 4 mil habitantes 1800 mil hombres y 2200 mil mujeres de forma indirecta con la ejecución del proyecto.


II. RESUMEN EJECUTIVO FINANCIERO

a. Cuadro resumen hasta la fecha:

1	Nombre de la Empresa	Empresa CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. de R.L. (CONDELSA)
2	Fecha de Inicio	15 de febrero del 2024
3	Fecha de Estimación No.1	15 de Marzo del 2024
5	Monto del Contrato	Lps. 2,995,804.31
6	Orden de Cambio	No hay
7	Modificaciones del Plazo (Nuevas fechas de culminación)	Si habrá, está por definir
8	Modificaciones en Monto contractual.	Aun no hay
9	Monto ejecutado (L)	Lps. 2,040,216.13
11	Monto Facturado (L)	Lps. 2,040,216.13
12	% de Avance fisico programado	53.72%
13	% de Avance fisico ejecutado	53.72%
14	% de Avance financiero Program.	53.72%
15	% de Avance financiero ejecutado	53.72%
16	Plazo contractual original	60 días calendario
17	Plazo contractual modificado	No aplica

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

a. Localización del Proyecto

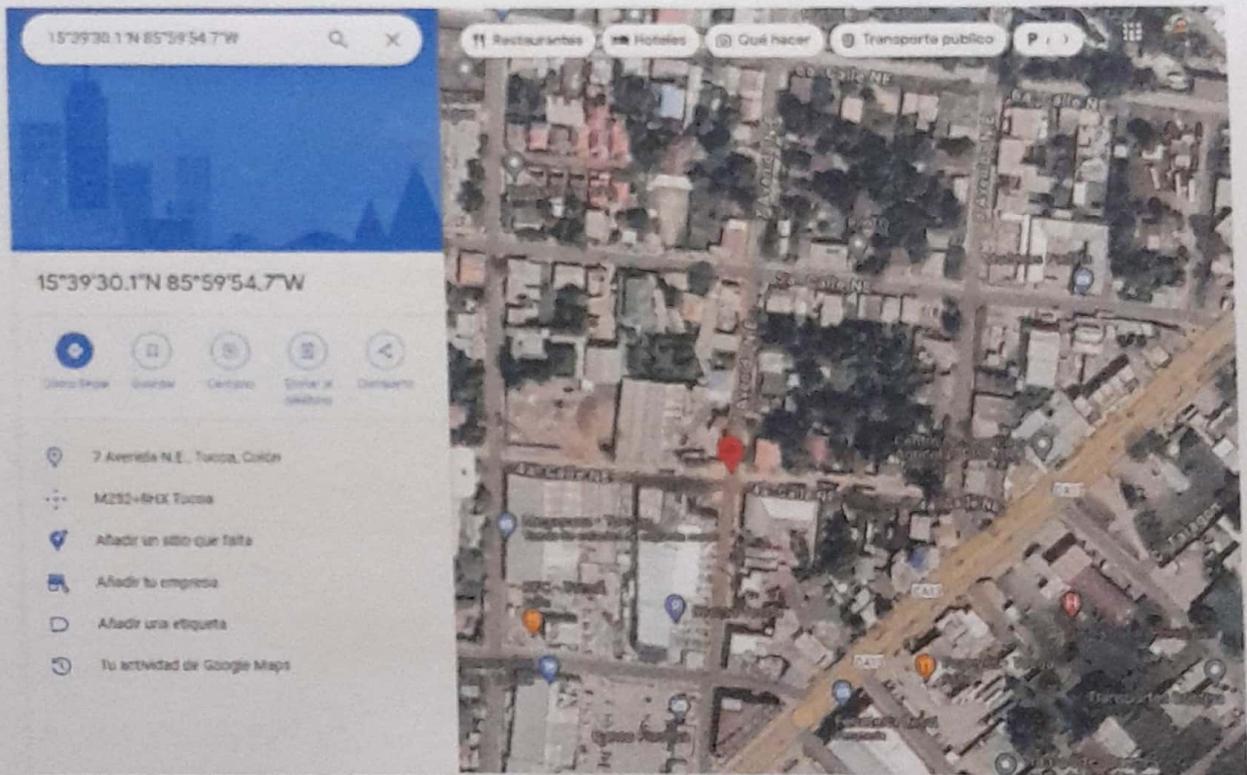

“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON”.

b. Fuente de Financiamiento

La construcción del Proyecto **“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON”.**

Está siendo financiado por la Municipalidad de Tocoa Colón.

c. Unidad Ejecutora

La Municipalidad de Tocoa Colón por medio de departamento de ingeniería e infraestructura municipal.

INFORME DE CONSTRUCCION HASTA LA FECHA

Según el avance de obra en las actividades realizadas durante el periodo del 15 de febrero al 15 de marzo del 2024, se alcanzó el 53.72% acumulado de ejecución del proyecto, el cual corresponde al monto total del proyecto, con monto de Lps. 2, 995,804.31

Las actividades que se realizaron durante este periodo de labores en el proyecto, fueron las siguientes:

CONTRATO ORIGINAL

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M2	1,710.00	54.51	93,212.10
2	MATERIAL SELECTO PARA SUB-BASE	M3	256.50	493.22	126,510.93
3	CONFORMACION CON COMPACTADORA (SUB-RASANTE)	M2	1,710.00	196.71	336,374.10
4	CONCRETO DE 280 KG/CM	M2	1,710.00	1,141.63	1,952,187.30
5	ACERA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR	M2	362.00	755.80	273,599.60
6	BORDILLO RECT. 0.15X0.15 CONC. 1:2:2	ML	362.00	590.94	213,920.28
TOTAL					2,995,804.31

a. Actividades realizadas en este Periodo (15 de febrero al 15 de marzo)

TRAZADO Y MARCADO

Este trabajo consiste en trazar y nivelar el corte de sub rasante, nivelar el relleno con material selecto para la rasante

Concreto de 280 kg/cm

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de mezcla de concreto hidráulico como estructura del pavimento con o sin refuerzo; Dicho concreto se elaboró mediante uso de concreteira, realizando el vibrador con vibrador mecánico. Incluye el encofrado y curado del concreto.

Acera de un metro de ancho

Este trabajo consistirá en la construcción de aceras de concreto sobre una cama de asiento conformada y compactada a las dimensiones, líneas y niveles indicados en los planos u ordenados por el Ingeniero.

Bordillo de Concreto

Este trabajo consistirá en la construcción de aceras de concreto sobre una cama de asiento conformada y compactada a las dimensiones, líneas y niveles indicados en los planos u ordenados por el Ingeniero.

b. Personal del Contratista

No.	Descripción	Cantidad
1	Ingeniero	1
2	Maestro de Obra	1
3	Albañil	2
4	Ayudantes	5
5	Peón	6
6	Operador de Equipo	1

c. Equipo Utilizado

No.	Descripción	Cantidad
1	Vibro compactadora	1
2	Pick Up	1

3	Herramienta Menor	Varios
4	Cortadora de Concreto	1
5	Mixer de 7 m3	1

d. Análisis del cumplimiento del Plan de Trabajo

En este periodo de ejecución no se han presentado inconvenientes, se está cumpliendo con forme el cronograma de actividades. El contratista ha mostrado un buen rendimiento en la ejecución de las actividades propuestas cumplir.

e. Resumen de Estimaciones.

La

Ítem	Monto del Contrato	Monto Desembolsado (100%)
	Lps. 2, 995,804.31	Lps. 2,040,216.13

Municipalidad de Tocoa Colón, realizo el pago total de la estimación #1 del proyecto ya que la empresa no solicito anticipo con el valor de Lps. 2,040,216.13, que equivale al 53.72% del total del proyecto, alcanzando un porcentaje acumulado de avance de obra del 53.72% de ejecución.



V. INFORME DEL COORDINADOR/SUPERVISOR

a. Actividad a realizar por la coordinación/supervisión

- Se ha mantenido constante interacción con el Contratista para dar seguimiento a los trabajos a desarrollar, para que estos sean ejecutados de una forma correcta y adecuada, respetando el diseño los correctos procedimientos constructivos.
- Se realizaron reuniones con el Contratista, El Sr. Alcalde Municipal, y la Unidad de desarrollo Social Comunitario, estas reuniones se realizaban en el Sitio del Proyecto y así como también en la municipalidad de Tocoa.

b. Reuniones de trabajo

Existieron reuniones de trabajo, previamente coordinadas para fijar la fecha, hora y sitio, con la Unidad de Desarrollo Social Comunitario municipal, así como también con el Contratista ejecutor del Proyecto, para la toma de decisiones referente a la realización de las actividades correspondientes al 100% del Proyecto.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se le ha pedido al Contratista que cumpla con las instrucciones y recomendaciones por parte de Coordinación/Supervisión, así como las especificaciones técnicas y documentos contractuales.
- Se han cumplido las actividades de construcción en este periodo, en el cual lo tiene estipulado en el cronograma de trabajo.

El Contratista es el responsable de todas las actividades concernientes al "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON", el cual pertenece al municipio de Tocoa, departamento de Colón, así como la calidad del mismo.




ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL.2444-3100/1686



ANEXOS


Periodo: 2022-2026

Adán James Martínez | Alcalde Municipal

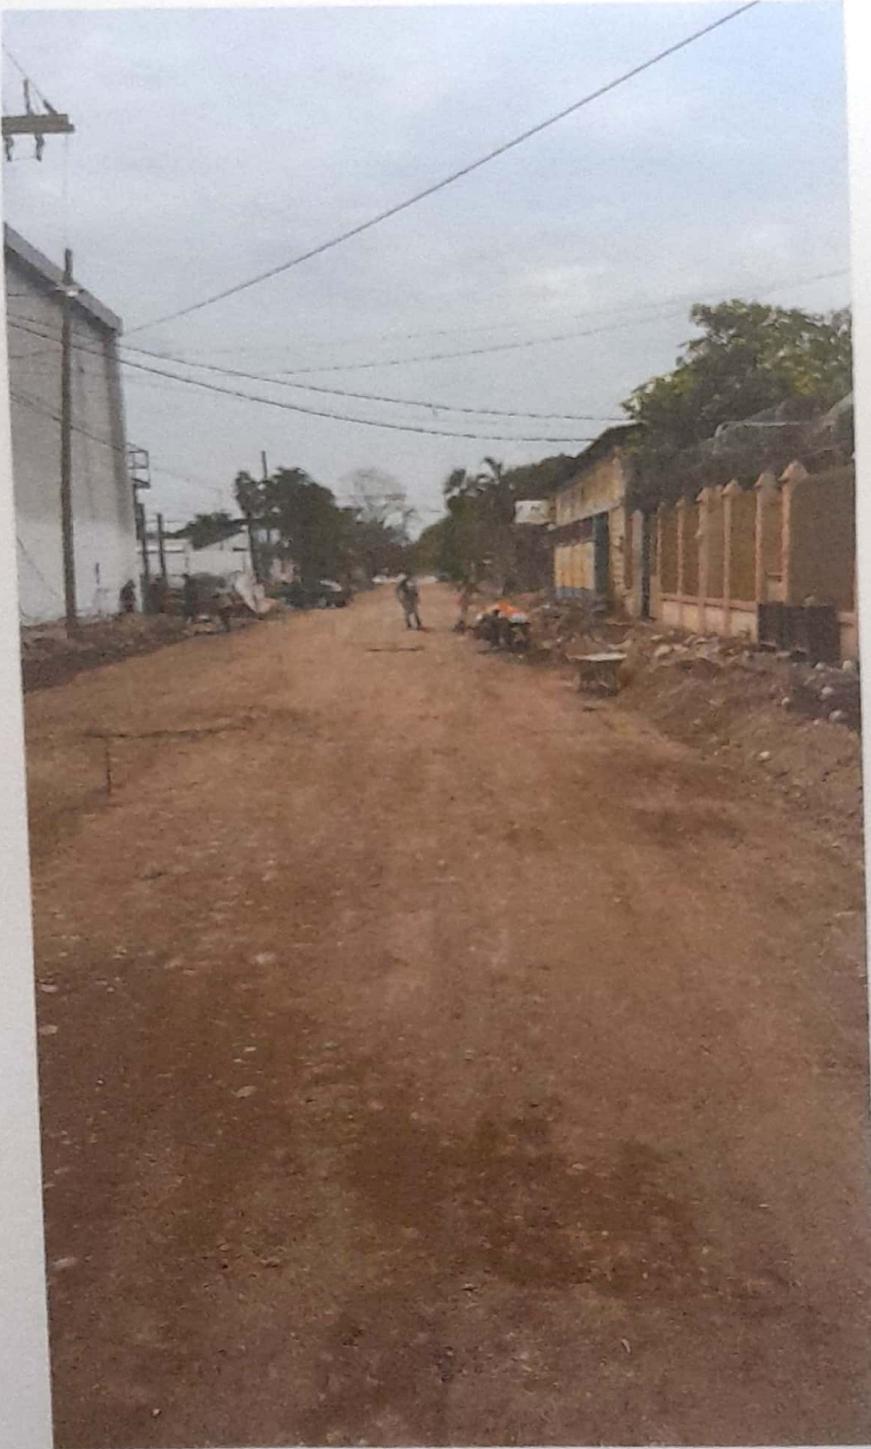




ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL. 2444-3100/1686

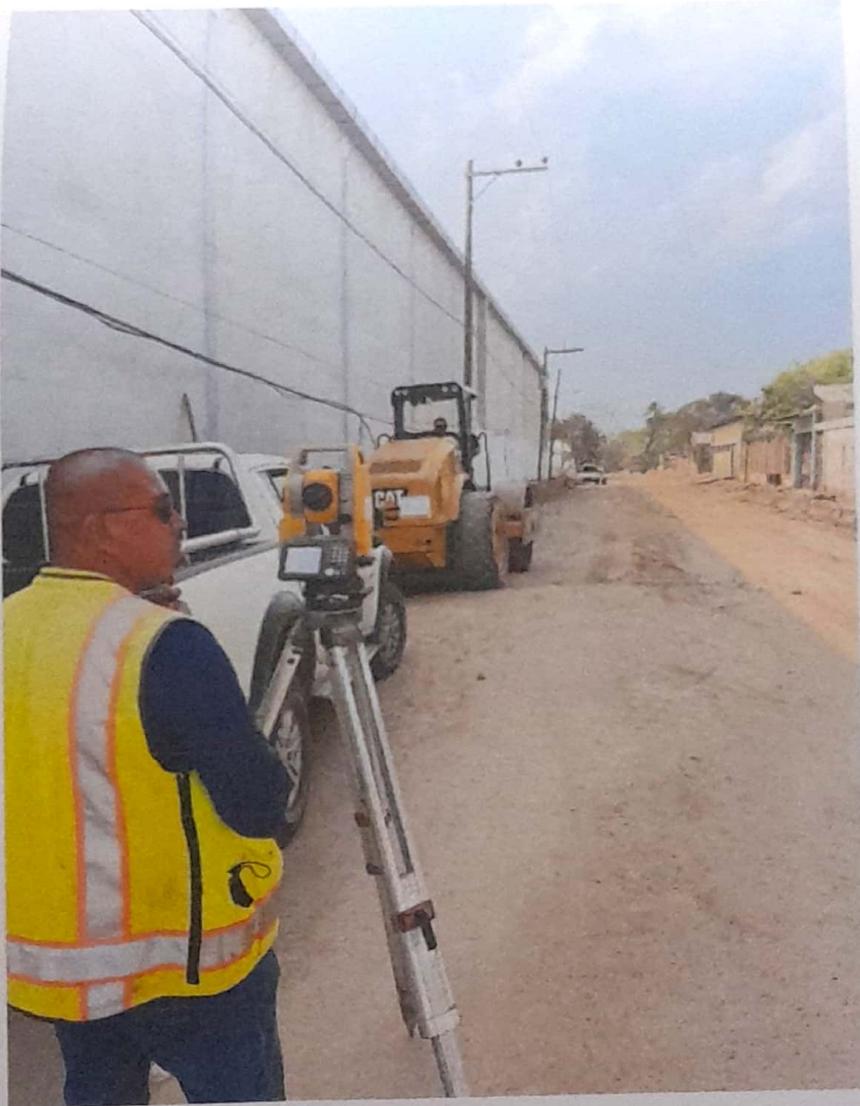

Periodo: 2022-2026

Aida Jancy Martínez Alcaldía Municipal



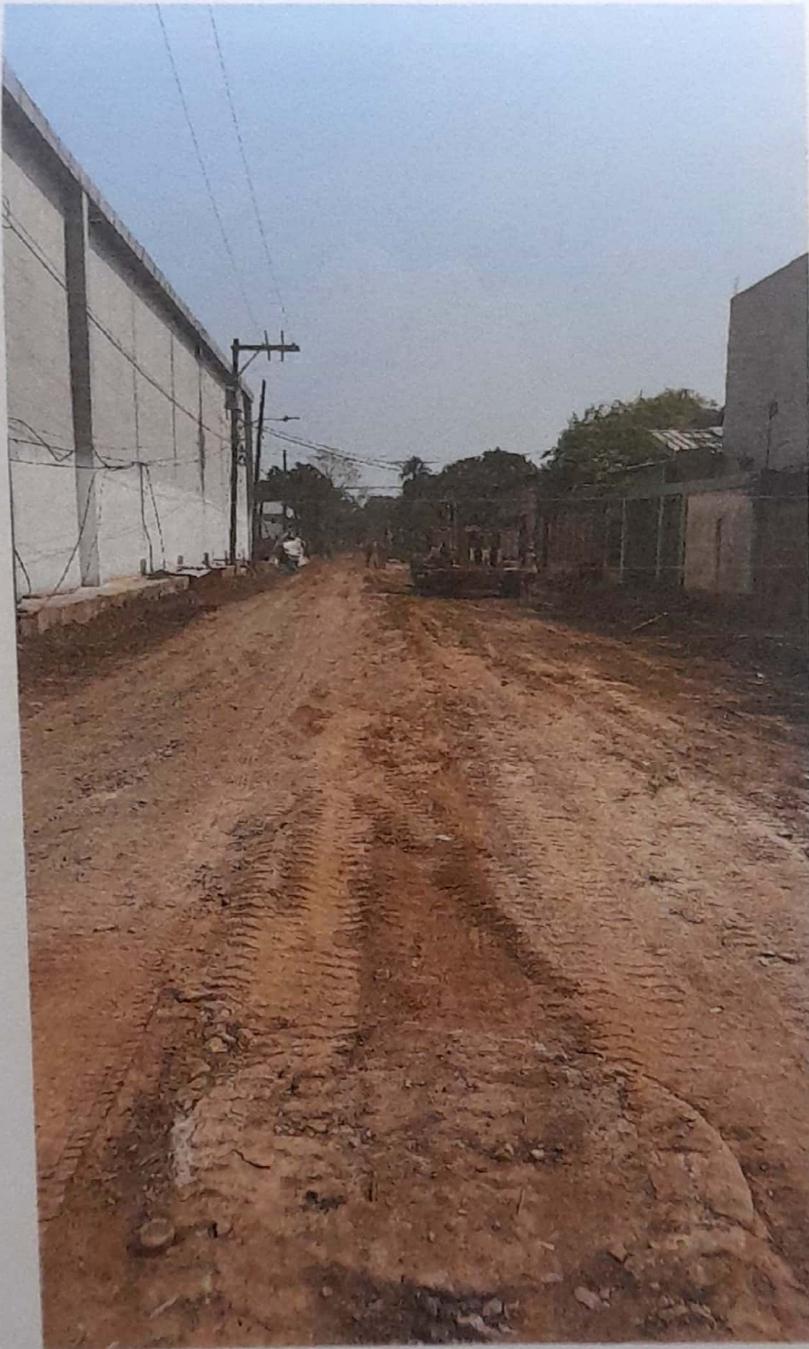





ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL.2444-3100/1686





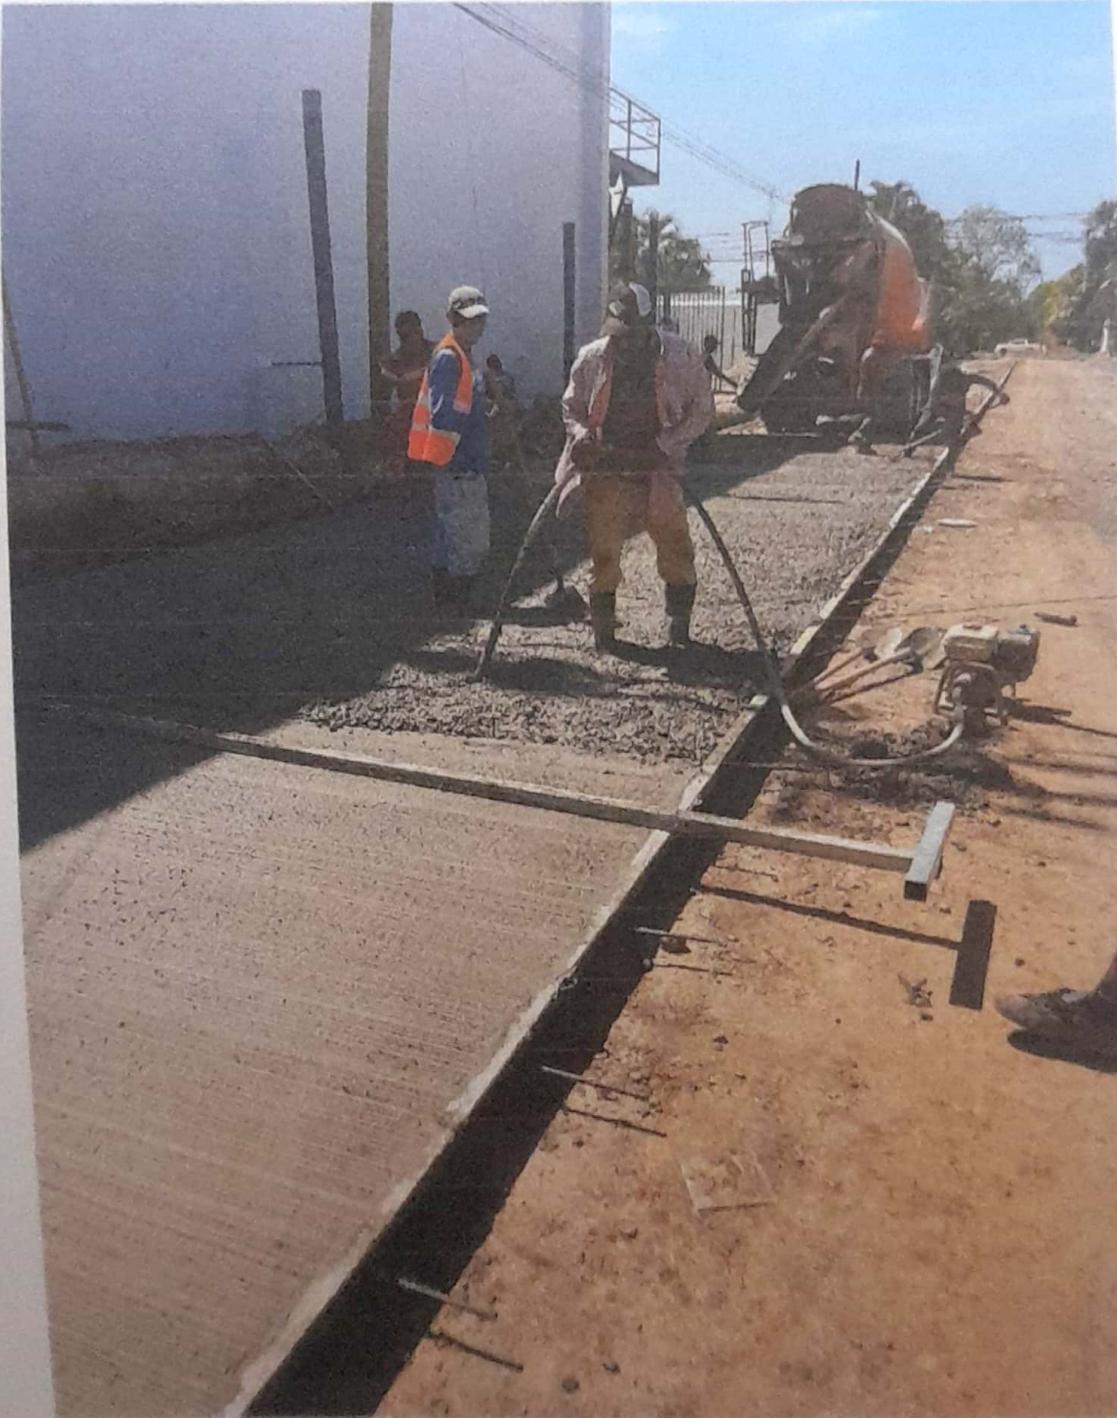

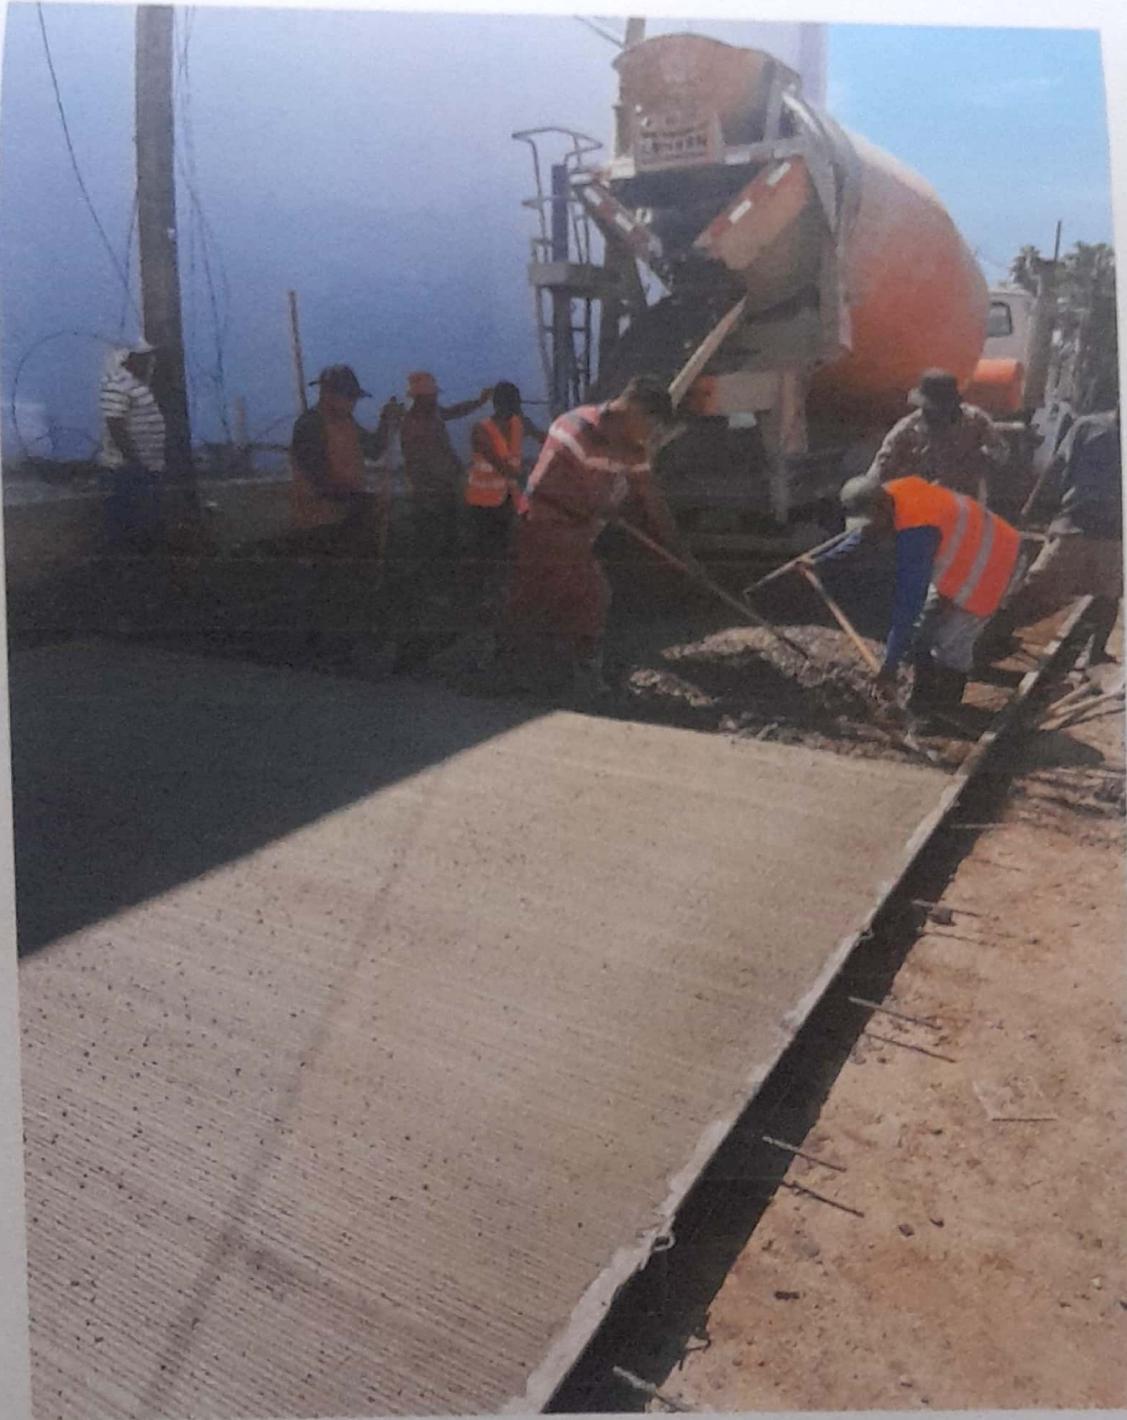



ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL.2444-3100/1686



Tocoa, Colón de 08 de marzo de 2024

Ref. LP-AMTC-001-2024

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO,
COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO
DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Adán Fúnez Martínez
Alcalde Municipal
Su oficina:

Estimados Alcalde,

De manera muy especial me dirijo a usted para solicitar el pago de estimación #1, en
lempiras Lps. 2,040,216.13 del LP-AMTC-001-2024 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL
MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Atentamente;

Ing. Carlos Oswaldo Sandoval
Depto. de Ingeniería Civil
Alcaldía Municipal de Tocoa, Colón





ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA No.1

PROYECTO: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

CONTRATISTA: CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. DE R.L. "CONDELSA"

CONTRATO ORIGINAL					ACUMULADO ANTERIOR			ESTA ESTIMACION			TOTAL ACUMULADO			AVANCE %	
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M2	1,730.00	54.51	93,212.10	0.00	54.51	-	1,730.00	54.51	93,212.10	1,730.00	54.51	93,212.10	100.00%
2	MATERIAL SELECTO PARA SUB-BASE	M3	236.30	493.22	118,510.93	0.00	493.22	-	236.30	493.22	118,510.93	236.30	493.22	118,510.93	100.00%
3	CONFORMACION CON CONTRACTADORA (SUB-BASANTE)	M2	1,730.00	196.71	338,374.10	0.00	196.71	-	1,730.00	196.71	338,374.10	1,730.00	196.71	338,374.10	100.00%
4	CONCRETO DE 280 KG/CM3	M3	1,730.00	1,151.63	1,992,387.30	0.00	1,151.63	-	1,730.00	1,151.63	1,992,387.30	1,730.00	1,151.63	1,992,387.30	76.02%
5	ACERA DE CONCRETO DE 5 CMs DE ESPESOR	M2	362.00	735.80	273,999.60	0.00	735.80	-	362.00	735.80	273,999.60	362.00	735.80	273,999.60	0.00%
6	BORDELLO RECT. D.15x0.15 CONC. 1:2:7	M	867.00	595.94	514,660.78	0.00	595.94	-	867.00	595.94	514,660.78	867.00	595.94	514,660.78	0.00%
TOTAL					2,995,804.31						2,040,216.13			2,040,216.13	53.72

Total bruto	2,995,804.31
(-) Amortización del 15% de esta estimación	449,370.65
Neto a recibir	2,546,433.66

Total Anticipo Recibido:	0.00
Retenido en estimaciones anteriores:	0.00
Retenido esta estimación:	0.00
Por Amortizar:	0.00

ING. ERIC BENUEL DEL CID
CONDELSA

TECNICO ALBERTA PRINCIPAL DE TOCOA

ING. CARLOS...
DEPTO. INGENIERIA CIVIL
MUNICIPAL DE TOCOA
DEPTO. INGENIERIA CIVIL
TOCOA COLON

ORDEN DE INICIO

Ref. LP-AMTC-001-2024
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO,
COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO
DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Tocoa, Colon de 12 de febrero de 2024



CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. DE R.L.
(CONDELSA)

Su oficina:

Estimados Señores,

En atención a lo dispuesto en el contrato firmado con la Municipalidad de Tocoa Colón, para la ejecución del contrato de la referencia, por este medio le estamos instruyendo para que a partir de la fecha pueda dar inicio a las actividades contempladas en el referido contrato.

Atentamente;



Adán Fúnez Martínez
Alcalde Municipal de Tocoa, Colón



NOTA DE ADJUDICADO

Ref. LP-AMTC-001-2024

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO,
COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO
DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Tocoa, Colon de 07 de febrero de 2024

**CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. DE R.L.
(CONDELSA)**

Su oficina:


Estimados Señores,

De manera muy especial me dirijo a ustedes con referencia al proceso LP-AMTC-001-2024 que corresponde a la contratación del proyecto "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON". Financiado con fondos Municipales.

Al respecto, me permito comunicarle que el proceso en mención, le ha sido, Por un monto DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 31/100 (LPS.2, 995,804.31).

Agradeciéndole la atención prestada me es grato suscribirme de ustedes.

Atentamente;


Adán Fúnez Martínez
Alcalde Municipal de Tocoa, Colón



CONTRATO POR OBRA DETERMINADA PARA LA CONSTRUCCION DE
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY
PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE,
EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Nosotros, **ADAN FUNEZ MARTINEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, Empresario del transporte, con domicilio y residencia en el municipio de Tocoa Colon, Departamento de Colon, actuando en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de Tocoa, Departamento de Colon, Identidad número 0209-1950-00007 electo en elecciones generales celebradas el 28 de Noviembre del 2021, según CREDENCIAL extendida por El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL N° 2617-2021, Punto III del acta N° 74-2021 Fecha 20 de Diciembre de 2021. Juramentado por la Gobernador Departamental de Colon el 25 de Enero del 2022 según ACTA número 165-2022 ACTA DE TOMA DE POSESION. Estando por lo tanto facultado para ejercer la representación de la Municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **EL PROPIETARIO**, y la Empresa Constructora **CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS (CONDELSA)**, sociedad constituida mediante instrumento público número 400 de fecha 03 de Junio de 2008 autorizado en la ciudad de Tocoa Departamento de Colon. ante los oficios del Notario Delma Cristela Lanza, e inscrita bajo el número 6 tomo 4; representada legalmente por Gerente General, mayor de edad, Ingeniero Civil inscrito en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras con número CICH 4068, hondureño, con tarjeta de Identidad número 0801-1982-12198, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato, que ha sido adjudicado mediante proceso de LICITACION PRIVADA Número 001-2024, y que se regirá por las cláusulas, condiciones y especificaciones que a continuación se enumeran:


ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, posterior a la evaluación de las ofertas económicas presentadas mediante LICITACION PRIVADA AMTC No.001-2024, se procedió a la adjudicación de la oferta más ventajosa para la Municipalidad de Tocoa Colon.

1. En este contrato las palabras y expresiones, utilizadas, tendrán el mismo significado que en las respectivas condiciones Generales y especiales del contrato a las que se hace referencia en adelante y las mismas se consideraran parte de este contrato y se leerán e interpretaran como parte del mismo.
2. Los siguientes documentos constituyen parte integral del presente contrato, adjunto a esta y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el:
 - I. Bases Administrativas
 - II. Llamado a Licitación.
 - III. Contexto
 - IV. Instrucciones Especiales a los Oferentes (IEO)
 - V. Criterios de Evaluación
 - VI. Especificaciones Técnicas
 - VII. Planos y Otros.
 - VIII. Formularios Tipo.



A.M.T.C.

3. El contratista por este medio se obliga a desarrollar la obra contratada con apego estricto a los documentos componentes del contrato, de acuerdo con el programa de trabajo aprobado, en un plazo de sesenta (60) días calendario.
4. El contratante por este medio se compromete a pagar el contratista como retribución por la ejecución y terminación de las obras y la subsanación de los efectos el precio del contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecida en este.
5. El monto del contrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 31/100 (LPS.2, 995,804.31).
6. Modificación del contrato. Toda modificación de las cláusulas del presente contrato se hará por escrito y firmado por las partes contratantes, y bajo los fundamentos legales establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, y de las disposiciones generales de Presupuesto; en lo que se refiere a las modificaciones se requiere una ORDEN DE CAMBIO y/o MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, aprobada por la MUNICIPALIDAD DE TOCOA COLON.
7. En fe de lo anterior para constancia las partes contratantes suscriben el presente Contrato en la ciudad de Tocoa Colon, departamento de Colón, a los 09 días del mes de Febrero del año 2024.



ADAN FUNEZ MATINEZ
ALCALDE MUNICIPAL
TOCOA COLÓN

ING. JORGE DEL CID SANTOS
CONSULTORES CONSTRUCTORES
DEL CID SANTOS (CONDELSA)



ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL.2444-3100/1686



Tocoa, Colón de 01 de Abril de 2024

Ref. LP-AMTC-001-2024

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO,
COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO
DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Adán Fúnez Martínez
Alcalde Municipal
Su oficina:

Estimados Alcalde,

De manera muy especial me dirijo a usted para solicitar el pago de estimación #2, en
lempiras Lps. 1,219,607.99 del LP-AMTC-001-2024 "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL
MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Atentamente;

Ing. Carlos Oswaldo Sandoval
Depto. de Ingeniería Civil
Alcaldía Municipal de Tocoa, Colón





ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL.2444-3100/1686



Tocoa, Colón de 08 de marzo de 2024

Ref. LP-AMTC-001-2024

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO,
COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO
DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Adán Fúnez Martínez
Alcalde Municipal
Su oficina:

Estimados Alcalde,

De manera muy especial me dirijo a usted para solicitar el pago de estimación #1, en lempiras Lps. 2,040,216.13 del LP-AMTC-001-2024 ""PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Atentamente;

Ing. Carlos Oswaldo Sandoval
Depto. de Ingeniería Civil
Alcaldía Municipal de Tocoa, Colón



Presentación De Oferta

Tocoa, Colón, 2024

ADAN FUNEZ MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Referencia: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Señor alcalde Municipal

Luego de haber examinado los Términos De Referencia No. AMTC-001-2024 incluyendo las Modificaciones No. NINGUNA y las Aclaraciones No. NINGUNA, en representación de la Empresa Constructora **CONDELSA S DE R.L** nos ofrecemos a proveer los servicios de construcción de obras del proyecto: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON" de conformidad con dichos documentos, por la suma Dos millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos cuatro lempiras con 31/100 (2,995,804.31)


Asimismo, declaramos que:

- Conocemos y estamos de acuerdo con cada una de las Cláusulas y su cláusula de los Términos De Referencia, conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de cantidades y Actividades de obra.
- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar esta o ninguna otra de las Ofertas que reciban.
- Aceptamos que la municipalidad de Tocoa, proceda a hacer todas las verificaciones que considere Necesaria de la información que presentamos en nuestra Oferta.

Debidamente autorizado, por y en nombre de la Empresa Constructora CONDELSA S DE R.L, firmo y sello la presente.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: Jorge Benueal Delcid Santos





"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Estacion 0+190

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO	M2	1,710.00	L. 54.51	L. 93,212.10
2	MATERIAL SELECTO PARA SUB-BASE	M3	256.50	L. 493.22	L. 126,510.93
3	CONFORMACIÓN DE SUB RAZANTE	M2	1,710.00	L. 196.71	L. 336,374.10
4	CONCRETO DE 4,000 PSO e=15 cm	M2	1,710.00	L. 1,141.63	L. 1,952,187.30
5	ACERA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR	M2	362.00	L. 755.80	L. 273,599.60
6	BORDILLO DE CONCRETO DE 0.15X0.15 CONC, 1:2:2	ML	362.00	L. 590.94	L. 213,920.28
TOTAL					L. 2,995,804.31


ING. JORGE BENÚEL DEL CID SANTOS
GERENTE GENERAL
CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS, S. DE R.L.

Presentación De Oferta

Tocoa, Colón, 2024

ADAN FUNEZ MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Referencia: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON

Señor alcalde Municipal


Luego de haber examinado los Términos De Referencia No. AMTC-001-2024 incluyendo las Modificaciones No. NINGUNA y las Aclaraciones No. NINGUNA, en representación de la Empresa CONSTRUCTORA PAYES S DE R.L nos ofrecemos a proveer los servicios de construcción de obras del proyecto: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON de conformidad con dichos documentos, por la suma Dos millones novecientos noventa y siete mil noventa lempiras con ochenta y seis centavos (2,997.090.86) Asimismo, declaramos que:

- Conocemos y estamos de acuerdo con cada una de las Cláusulas y su cláusula de los Términos De Referencia, conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de cantidades y Actividades de obra.
- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar esta o ninguna otra de las Ofertas que reciban.
- Aceptamos que la municipalidad de Tocoa, proceda a hacer todas las verificaciones que considere Necesaria de la información que presentamos en nuestra Oferta.

Debidamente autorizado, por y en nombre de la Empresa Constructora payes s de r.l , firmo y sello la presente.

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante: Maritza Yaneth Saavedra






CONSTRUCTORA
PAYES S. DE R.L.

ENTRADA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA
18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALICATADO Y MARCADO	M2	1,710.00	L. 58.41	L. 99,881.10
ALCANTARILLADO SELECTO PARA SUB-BASE	M3	256.50	L. 506.92	L. 130,024.98
FORMACIÓN DE SUB RASANTE CON CEMENTO VELADORA	M2	1,710.00	L. 203.14	L. 347,369.40
CONCRETO DE 280 KG/CM	M2	1,710.00	L. 1,123.71	L. 1,921,544.10
DE UN METRO DE ANCHO	M2	362.00	L. 772.54	L. 279,659.48
ALCANTARILLADO RECT 0.15X0.15 CONC. 1:2:2	ML	362.00	L. 603.90	L. 218,611.80
TOTAL				L. 2,997,090.86


MARITZA YANETH SAAVEDRA
GERENTE GENERAL



OFERTA ORIGINAL

PROCESO AMT-001-2024

**PROYECTO: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO,
COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA
DEPARTAMENTO DE COLON"**

ALCADIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON

ENERO 2024

Presentación De Oferta

Tocóa, Colón, 2024

DAN FUNEZ MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Referencia: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

Señor alcalde Municipal

Después de haber examinado los Términos De Referencia No. AMTC-001-2024 incluyendo las modificaciones No. NINGUNA y las Aclaraciones No. NINGUNA, en representación de la Empresa Constructora **SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE R.L** nos ofrecemos proveer los servicios de construcción de obras del proyecto; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON" de conformidad con dichos documentos, por la suma **Dos millones novecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y un lempiras con 34/100 (2,998,991.34)**

En el mismo, declaramos que:

- Conocemos y estamos de acuerdo con cada una de las Cláusulas y su cláusula de los Términos De Referencia, conocemos y entendemos los planos, especificaciones técnicas y lista de cantidades y Actividades de obra.
- Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar esta o ninguna otra de las Ofertas que reciban.
- Aceptamos que la municipalidad de Tocoa, proceda a hacer todas las verificaciones que considere Necesaria de la información que presentamos en nuestra Oferta.



Legalmente autorizado, por y en nombre de la Empresa Constructoras **SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE R.L**, firma y sello la presente.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: **Samir Enrique Gonzales**

ACCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE CALLE DEL PODER CIUDADANO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DO Y MARCADO	M2	1,700.00	L. 59.32	L. 100,844.00
IAL SELECTO PARA SUB-BASE	M3	256.50	L. 450.88	L. 115,650.72
FORMACIÓN DE SUB RASANTE NIVELADORA	M2	1,710.00	L. 191.00	L. 326,610.00
ESTRUCTURA DE 280 KG/CM	M2	1,710.00	L. 1,150.41	L. 1,967,201.10
DE UN METRO DE ANCHO	M2	362.00	L. 764.18	L. 276,633.16
DE 0.15X0.15 CONC. 1:2:2	ML	362.00	L. 585.78	L. 212,052.36
TOTAL				L. 2,998,991.34



SAMIR ENRIQUE GONZALES LABORIEL
 GERENTE GENERAL



ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL.2444-3100/1686



4 de enero 2024

Presente.

Estimados, CONSULTORES CONSTRUCTORES DEL CID SANTOS S. de R.L. (CONDELSA)

Por este medio, **La Municipalidad de Tocoa**, tiene el agrado de invitar a su empresa a participar en la LP 006-2022 del proyecto:

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

La entrega de la documentación y visita de campo:

El miércoles 10 de enero de 2024, en oficinas de Municipalidad de Tocoa, Colón. Siempre utilizar todas las medidas de bio-seguridad establecidas.
La visita de campo, No es obligatoria.

Presentación de Oferta:


El miércoles 31 de enero del 2024 en las Oficinas de Oficina de Infraestructura, Barrio Abajo en la alcaldía Municipal de Tocoa, Hora: 2:00 am

En espera de su confirmación y puntual asistencia.

Atentamente;

Ing. Carlos Sandoval
Depto. de Ingeniería

Andrés J. Martínez Alcalde Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL
TOCOA, COLON, HONDURAS, C.A.
TEL.2444-3100/1686



4 de enero 2024

Presente.

Estimados, CONSTRUCTORA PAYES S. DE R.L.

Por este medio, **La Municipalidad de Tocoa**, tiene el agrado de invitar a su empresa a participar en la LP 001-2024 del proyecto:

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL CA-13 CITY PLACE A CALLE DOL PODER CIUDADENO, COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON"

La entrega de la documentación y visita de campo:

El miércoles 10 de enero de 2024, en oficinas de Municipalidad de Tocoa, Colón. Siempre utilizar todas las medidas de bio-seguridad establecidas.
La visita de campo, No es obligatoria.

Presentación de Oferta:

El miércoles 31 de enero del 2024 en las Oficinas de Oficina de Infraestructura, Barrio Abajo en la alcaldía Municipal de Tocoa, Hora: 2:00 am

En espera de su confirmación y puntual asistencia.

Atentamente;

Ing. Carlos Sandoval
Depto. de Ingeniería
