

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Marcovia, 09 de diciembre de 2024

NOTA INFORMATIVA

Por medio de la presente envío documentación del proceso de **Licitación Privada LP-01-2024** para el proyecto de **Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo en San José de las Conchas, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.**

Sin otro particular.

Por Director

José Daniel Maldonado

Admón. Unidad de Infraestructura





Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46308

L.: 178,489.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8500

Fecha de Emisión: 21/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 12468

Paguese a: VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Id/RTN: 0601198405972

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Accidente

PAGO AL SR. VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION #3 DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPE E=20CM EN SAN JOSE DE LAS CONCHAS (CAMINOS PRODUCTIVOS), MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L. 1, 492.321.19 VALOR DE (ESTIMACION N.1 L. 438,897.07), VALOR DE ESTIMACION N.2 L. 446,223.39 Y ESTIMACION N.3 L.223, 111.70 MENOS DEDUCCION DEL 20% ANTICIPO DE ESTA ESTIMACION L. 44,622.34 TOTAL A PAGAR L. 178,489.36 QUEDANDO UN SALDO ACTUAL DEL CONTRATO L. 384,089.03

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 072 000 001 47210 11-011-04	Construcción de Pavimento con Concreto Ciclope en San José De Las Conchas en el Municipio de Marcovia, departamento de Choluteca (caminos Productivos)	178,489.36

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	CONVENIO ENTRE ALCALDIA Y LA SECRETARIA DE ESTADO PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS	178,489.36
Monto Total:		178,489.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	178,489.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	178,489.36

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Vasco Aguilar Alvarez
10601198405972

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxv2R/ypwgW4fZi9m...+G74MMXm3lRj+Qs6VrvkjiRogwVsJTihKuqEWRx26OMisXIkQUF/UDFHPdIH4z2YcoVELLISJ WMLUD3icgSYAvFot+NUEERNhbrkjuSNugJTdl1z1/...

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 21 MES Noviembre AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Vasos Adalid Aguilar Alvarez

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 178,489.36

Ciento Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos
Ochenta y Nueve con treinta y seis Centos
POR CONCEPTO DE: Pago al Sr. Vasos Adalid
Aguilar pa. Concepto de pago estimado #3
Del Contrato Construcción de pavimento de concreto

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

IDENTIDAD NO, 0601198405992

FIRMA  

VO BO ALCALDE MUNICIPAL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Para:

José Nahún Calix
Alcalde Municipal



De:

Lic. José Daniel Maldonado
Unidad de Infraestructura



Asunto:

Lo Descrito

Fecha:

14 de noviembre de 2024

Sirva la presente para solicitarle Autorice el pago al señor Vasco Adalid Aguilar Álvarez, por concepto de pago Estimación # 3 del contrato "Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo e=20cm en San José de las Conchas", Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Valor total del contrato	-----	L. 1, 492, 321.19
Valor de Estimación N° 1	-----	L. 438, 897.07
Valor de Estimación N° 2	-----	L. 446, 223.39
Valor de Estimación N° 3	-----	L. 223, 111.70
Menos deducción 20% anticipo de esta estimación	-----	44 622.34
Total a pagar	-----	L. 178, 489.36

Total a pagar (Ciento Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Lempiras con Treinta y Seis Centavos).

SALDO ACTUAL DEL CONTRATO ----- **L. 384, 089.03**

Cc. Archivo



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011984059720**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS

EL MARCOVIA
S. C. A.
2072



de obra

ESTA ESTIMACIÓN				ESTIMACIÓN ACUMULADA				POR EFECTUAR			
Cantidad	P. Unitario	Total	% de Avance	Cantidad	P. Unitario	Total	% de Avance	Cantidad	P. Unitario	Total	% de Avance
	L 7.70	L -	0%	1,739.88	L 7.70	L 13,397.08	100%	-	L 7.70	L -	0%
	L 481.25	L -	0%	173.99	L 481.25	L 83,732.69	100%	-	L 481.25	L -	0%
	L 33.46	L -	0%	386.64	L 33.46	L 12,938.13	100%	-	L 33.46	L -	0%
	L -	L -	0%			L 110,067.90	100%		L -	L -	0%
	L 1,001.55	L -	0%	86.99	L 1,001.55	L 87,124.83	100%	-	L 1,001.55	L -	0%
	L -	L -	0%			L 87,124.83	100%		L -	L -	0%
60.00	L 3,718.53	L 223,111.70	17%	245.00	L 3,718.53	L 911,039.42	70%	102.98	L 3,718.53	L 382,934.04	30%
		L 223,111.70	17%			L 911,039.42	70%			L 382,934.04	30%
	L 1,155.00	-	0%	-	L 1,155.00	-	0%	1.00	L 1,155.00	L 1,155.00	100%
	L -	-	0%		L -	-	0%		L 1,155.00	L 1,155.00	100%
		L 223,111.70	15%			L 1108,232.15	74%			L 384,089.04	26%

L	1492,321.19
L	438,897.07
L	446,223.39
L	223,111.70
L	1108,232.15
L	384,089.03



INFORME DE AVANCE DE OBRA

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”

Alcaldía Municipal de Marcovia

**UBICACIÓN: San Jose de Las Conchas, Municipio de Marcovia,
Departamento Choluteca.**

**Constructor Obras civiles
ING. VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ CICH 4833**



MARCOVIA, CHOLUTECA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024



Marcovia, Choluteca 13 de noviembre del 2024

Sr. Alcalde

Jose Nahun Calix Alvarez

Distinguido alcalde:

Adjunto remito a usted el informe #3 de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**
"correspondiente al periodo del 7 al 13 de noviembre del 2024.

Acorde y conforme a las cláusulas contractuales del contrato

Sin otro particular

Atentamente,

Daniel Maldonado
Infraestructura.



Contenido

1) INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	4
1.1. Nombre del Proyecto	4
1.2. Financiamiento	4
1.3. Unidad Ejecutora	4
1.4. Descripción de las obras de construcción	4
1.5. Localización del Proyecto	4
2) INFORME DE CONSTRUCCION	5
2.1. Periodo del informe:	5
2.2. El resumen del contrato de construcción:	5
2.3. Breve análisis del cumplimiento del programa de trabajo	5
2.4. Las actividades realizadas	5
2.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA	6
2.6. Equipo y herramientas del contratista:	6
2.7. Estado del tiempo	7
2.8. Programa de trabajo	7
3) INFORME DE LA SUPERVISION	7
3.1. Ente supervisor	7
3.2. La supervisión realizó las siguientes actividades:	7
4) OBSERVACIONES	7
5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	8
6) INFORME FOTOGRAFICO	9



1) INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”

1.2. Financiamiento

Alcaldía municipal de Marcovia 100%

1.3. Unidad Ejecutora


Alcaldía municipal de Marcovia

1.4. Descripción de las obras de construcción

Construcción pavimento ciclópeo de 4.5 m de ancho y 20 cm de espesor desde muelle hasta calle principal.

1.5. Localización del Proyecto

El proyecto se construye en el departamento de Choluteca, municipio de Marcovia en San Jose de las Conchas

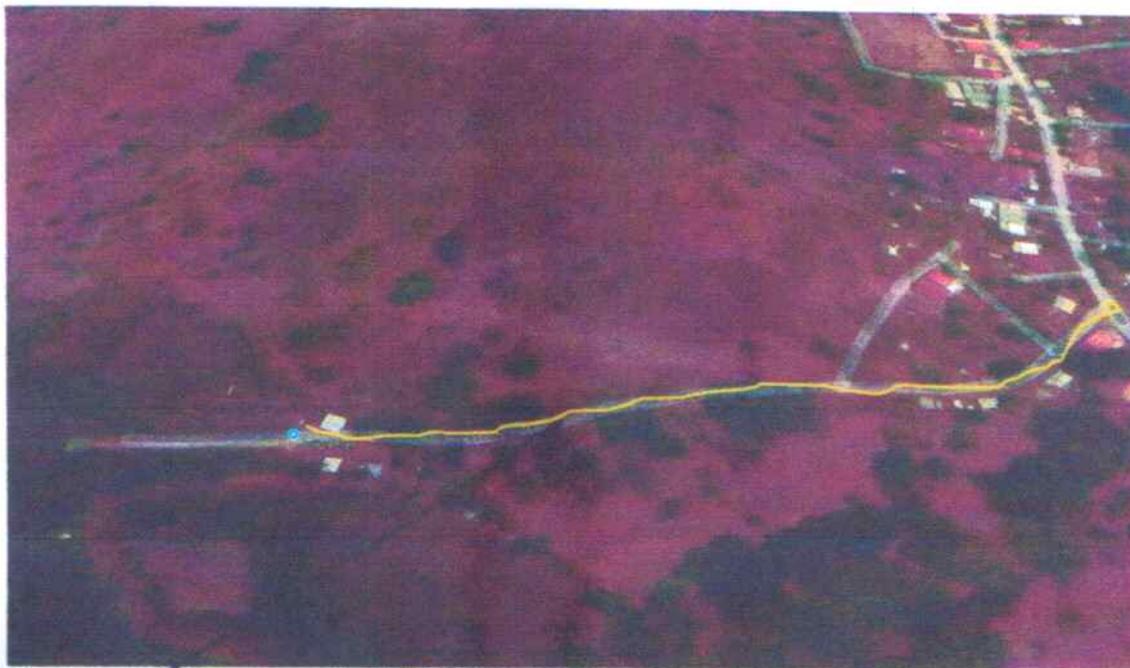

Pavimento / Coordenadas UTM 16P 456775.63 m E 1472656.12 m N



2) INFORME DE CONSTRUCCION

2.1. Periodo del informe:

Este informe se elabora con las actividades realizadas en el proyecto durante el 7 al 13 de noviembre del 2024.

2.2. El resumen del contrato de construcción:

CONCEPTO	CONTRATISTA
Nombre de contratista	Vasco Adalid Aguilar Alvarez
Fecha de Inicio	18 de octubre 2024
Fecha de Terminación	18 de enero del 2024
Monto contractual	Lps. 1,492,321.19
Modificaciones de plazo (indicar nuevas fechas de terminación)	NO SE HA MODIFICADO
Modificaciones en monto (indicar nuevo monto contractual)	NO SE HA MODIFICADO
Monto ejecutado	Lps. 1,108,232.15
Monto facturado	Lps. 885,120.46
% de avance fisico programado	60%
% de avance fisico Ejecutado	70%
Monto de avance financiero programado	Lps. 895,392.71
Plazo contractual Original	90 dias
Plazo contractual modificado	No se ha modificado

2.3. Breve análisis del cumplimiento del programa de trabajo

Durante este período han caído tormentas muy fuertes lo cual afecta el avance de la obra pero esto no ha retrasado la ejecución de la obra .

2.4. Las actividades realizadas

Se han realizado las siguientes actividades durante este período:

No.	Renglon	CONTRATADO		% de Avance
		unidad	Cantidad	
1	PRELIMINARES			
1.1	Limpieza de Terreno	M2	1739.88	100%



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072



1.2	Excavacion de Material	M3	173.99	100%
1.3	Trazado y Maracado	ML	386.64	100%
SUBTOTAL				100%
2	RELLENO Y CONFORMACION			
2.1	Relleno y compactado con material selecto	M3	86.99	100%
SUBTOTAL				100%
3	CONCRETO CICLOPEO			
3.1	Concreto Ciclopeo e=20 cm proporcion 1:2:3	m3	347.98	70%
SUBTOTAL				70%
4	Obras Finales			
4.0	Limpieza Final	JRD	1.00	0%
SUBTOTAL				0%
TOTAL INVERSI				74%

2.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA

- 1 ingeniero residente
- 1 maestro de obra
- 3 albañiles
- 10 ayudantes
- 3 conductores
- 1 operador de retroexcavadora

2.6. Equipo y herramientas del contratista:

#	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Vehículo 4x4	1 unidad	Buen estado	ninguna
2	Plantas Generadoras	1 unidades	Buen estado	ninguna
3	Palas	12 unidades	Buen estado	ninguna
4	Piochas	2 unidades	Buen estado	ninguna
5	Barras	3 unidades	Buen estado	ninguna
6	Almárganas	3 unidades	Buen estado	ninguna
7	SERRUCHO	1 unidades	Buen estado	ninguna
8	Alicates	3 unidades	Buen estado	ninguna
9	Martillos	3 unidades	Buen estado	ninguna
10	Cubetas	8 unidades	Buen estado	ninguna
11	Puntas y cinceles	8 unidades	Buen estado	ninguna
12	Grifas	6 unidades	Buen estado	ninguna
13	Niveles	2 unidades	Buen estado	ninguna
14	Escuadras	3 unidades	Buen estado	ninguna
15	Sierras circulares	2 unidades	Buen estado	ninguna
16	taladros	1 unidades	Buen estado	ninguna
17	Motosierra	1 unidad	Buen estado	ninguna
18	Carretillas de mano	4 unidades	Buen estado	ninguna



19	Camión de 4 toneladas	1 unidad	Buen estado	ninguna
20	Volqueta de 15 m3	2 unidades	Buen estado	ninguna
21	Retroexcavadora	1 unidad	Buen estdo	ninguna

2.7. Estado del tiempo

Lluvias fuertes han caído en este periodo de no ser por estas lluvias el proyecto estaría en un mejor porcentaje de avance.

2.8. Programa de trabajo

Se adjunta la copia en los anexos, del programa de trabajo.

3) INFORME DE LA SUPERVISION

3.1. Ente supervisor

Las instituciones responsables de la supervisión son Alcaldía municipal de Marcovia y SIT con las cuales se ha sostenido constante comunicación y se han sostenido varias reuniones de trabajo.

3.2. La supervisión realizó las siguientes actividades:

Durante este periodo se ha tenido comunicación vía teléfono, correo electrónico y de manera presencial con los supervisores, se ha tenido la supervisión de la ing. Osmany Aguilera representante de SIT, también se ha tenido la visita de técnicos municipales y del alcalde municipal y de parte de la comunidad hemos tenido el acompañamiento de le presidente de los pescadores Carlos Peña para verificar el avance de la obra realizaron las siguientes actividades:

- ▶ Verificación de las actividades de las obras ejecutadas.
- ▶ Se hizo un control fotográfico del proyecto para tener a futuro el álbum fotográfico conforme avanza el proyecto.
- ▶ Inspección de los materiales a usar por el contratista para corroborar la calidad

4) OBSERVACIONES

El volumen de relleno considerado en la obra es de solo 5 cm lo cual dejaría una base no acta par el pavimento por lo cual al alcadia ha aprobado un volumen extra el cual será definido por los niveles y estará entre 15 y 20 cm.

Se ha instalado un alcantarilla de 24 pulgadas para aliviar un paso de agua natural que podría dañar la obra en el futuro.



5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


- La obra se ha construido siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo cual nos da como resultado una obra de calidad apta a las condiciones del sitio.



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072






6) INFORME FOTOGRAFICO

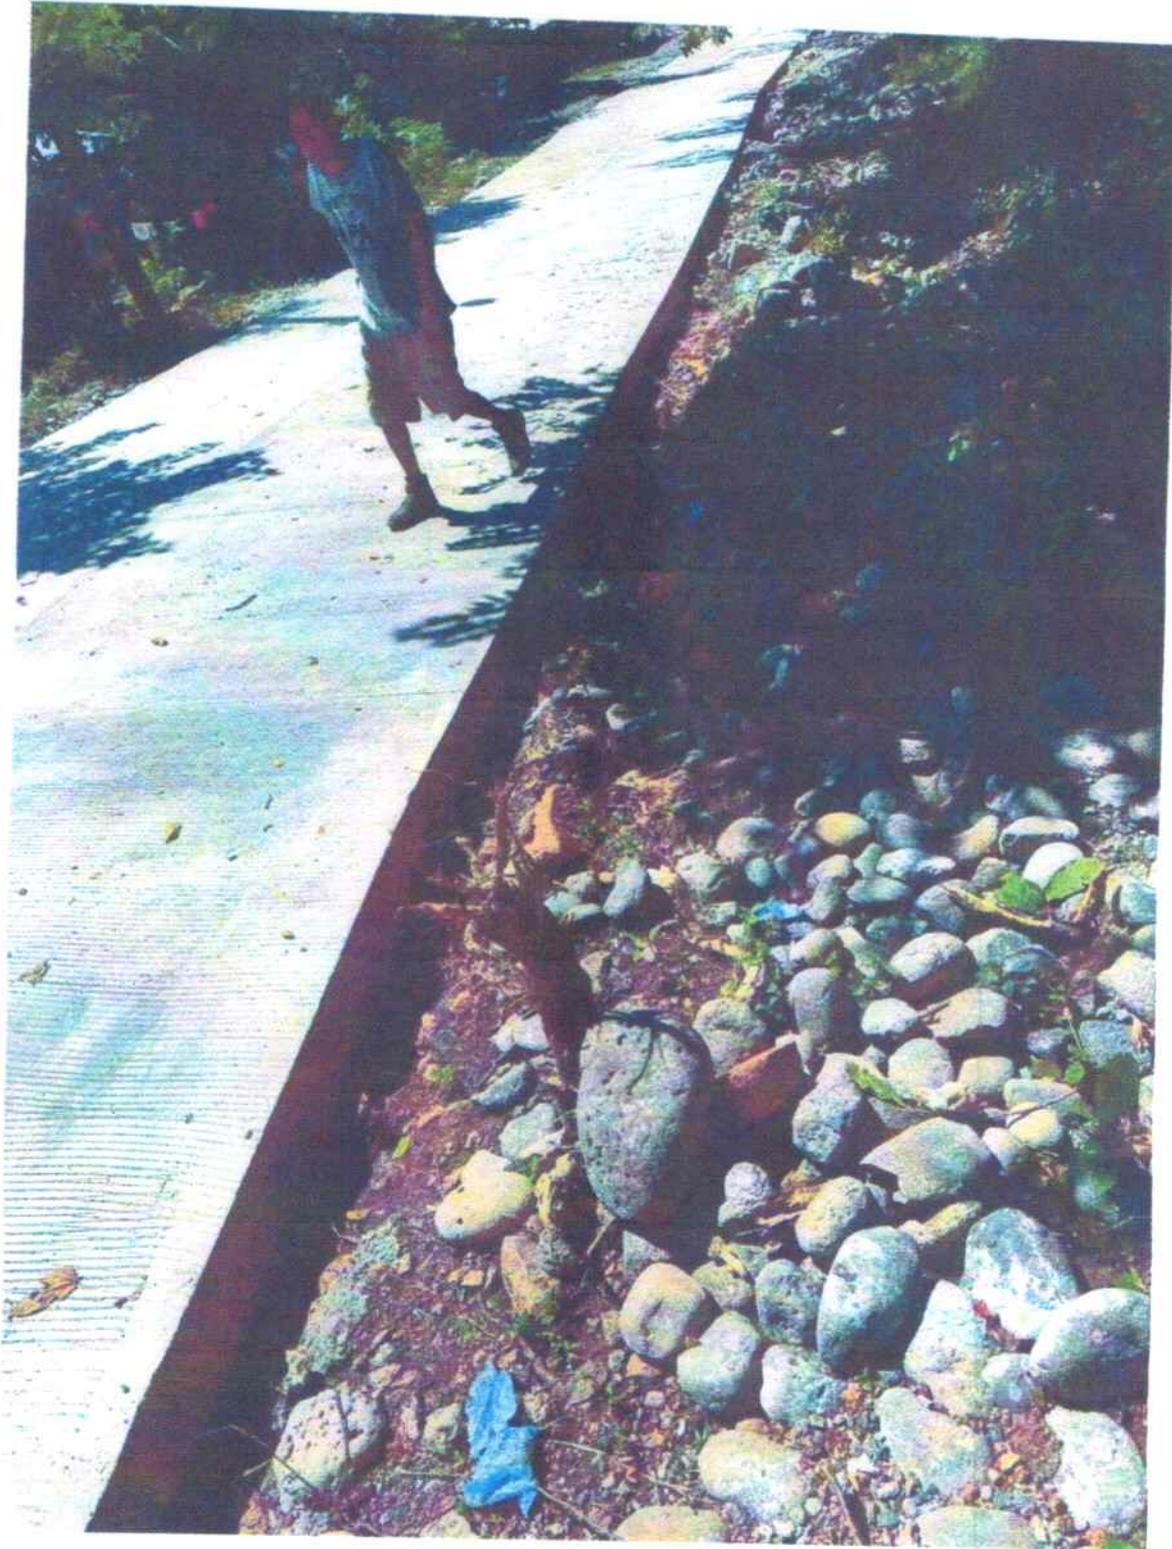





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072

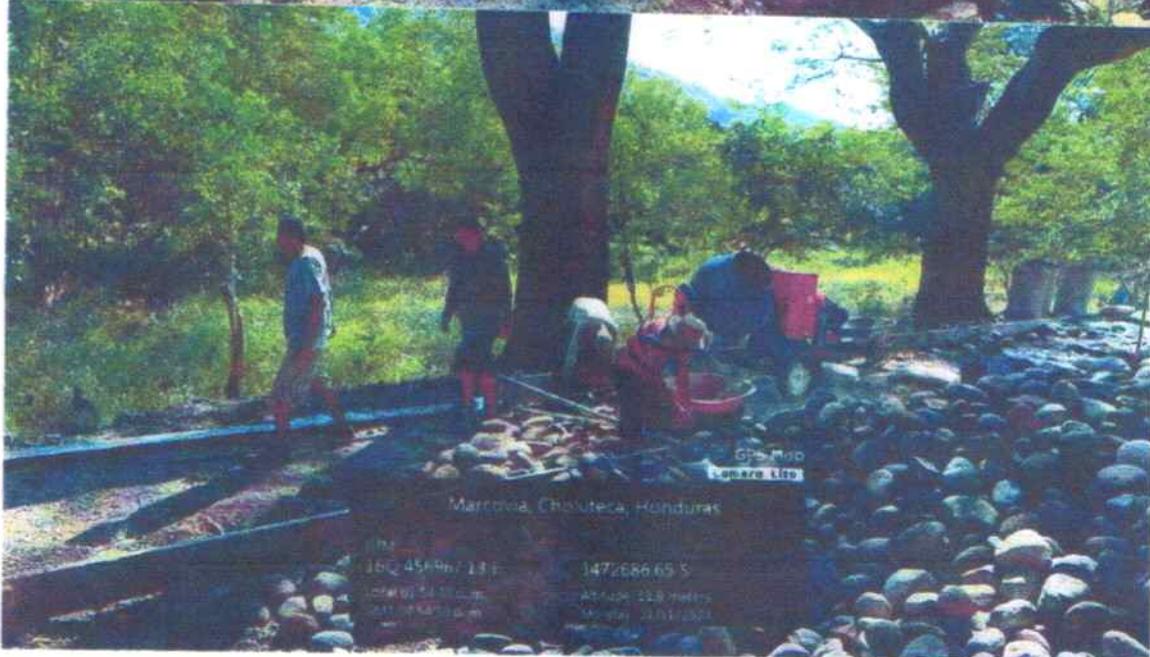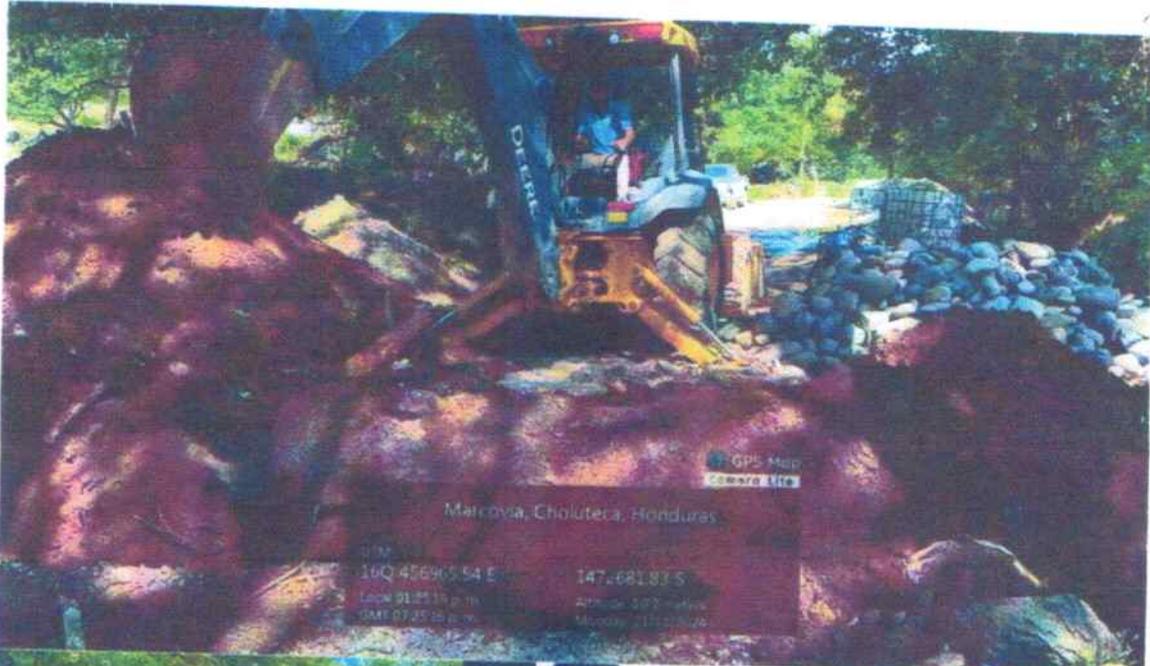


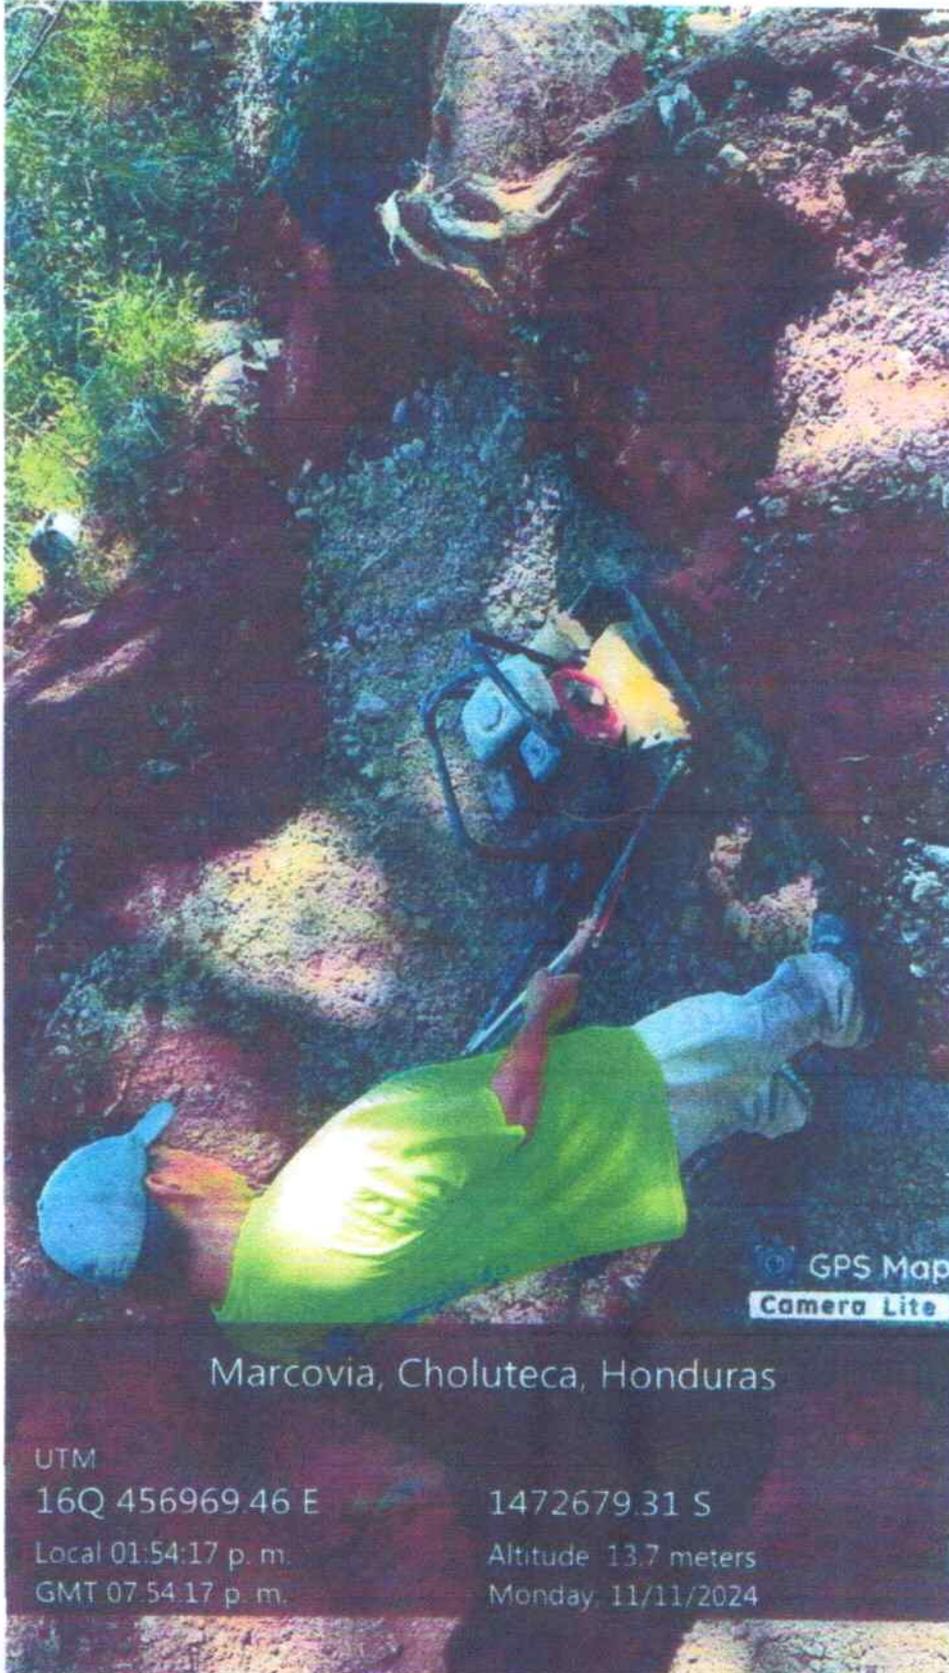


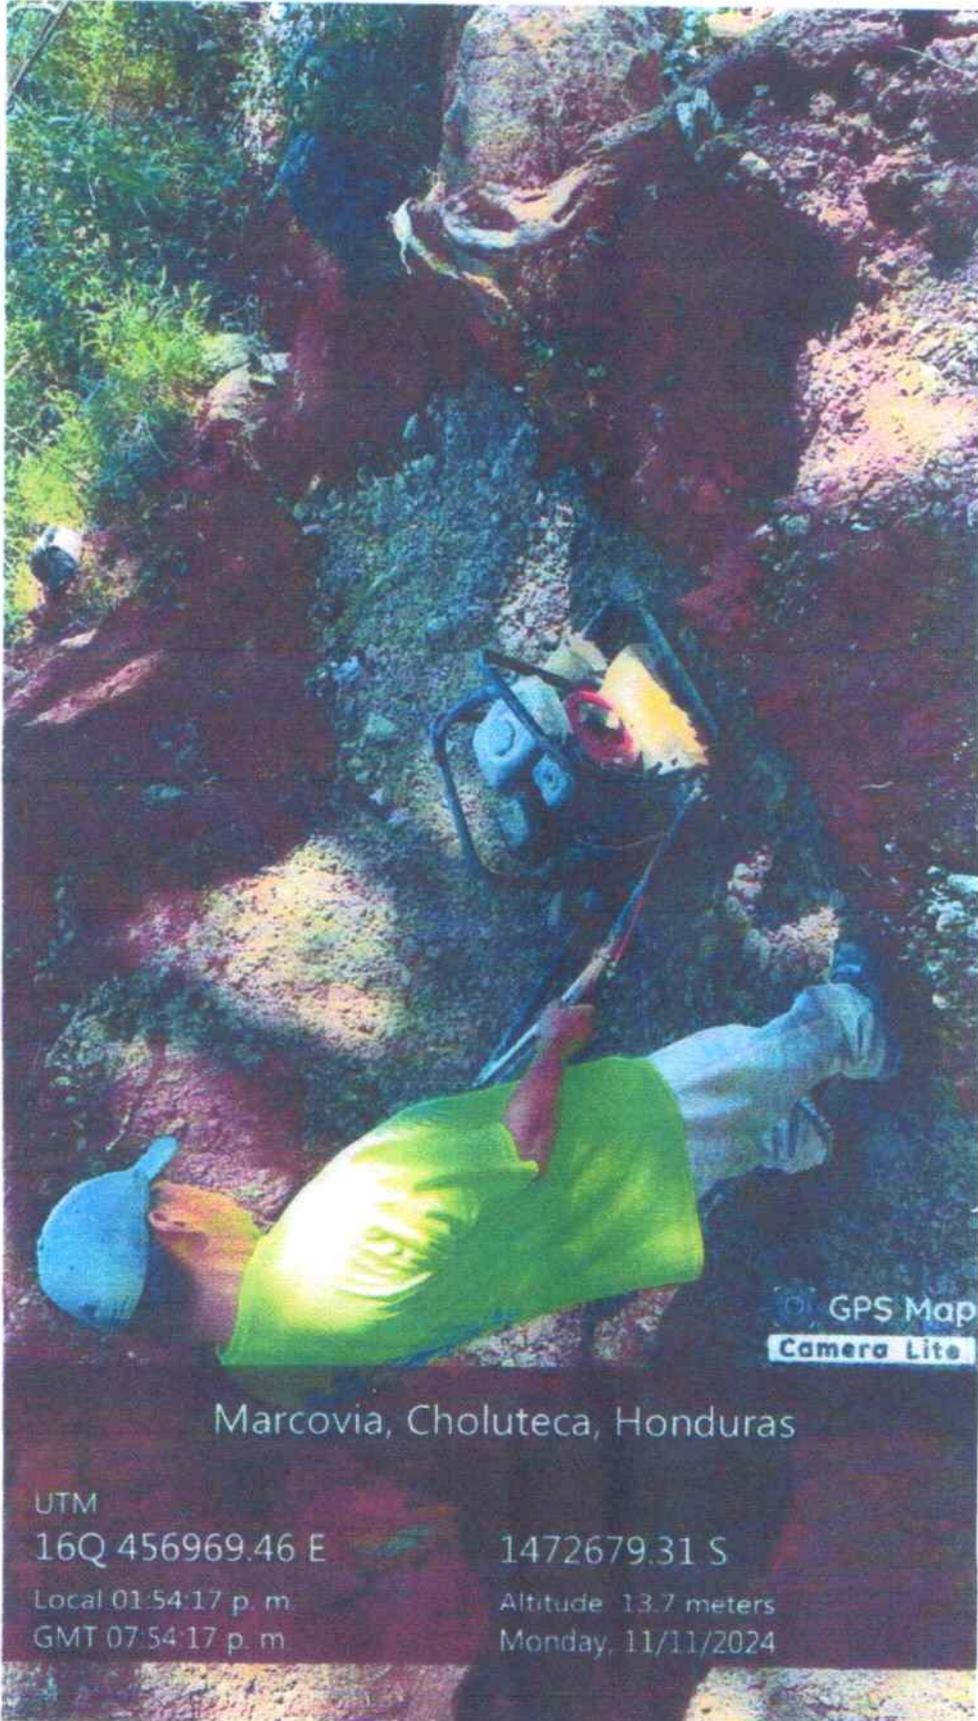

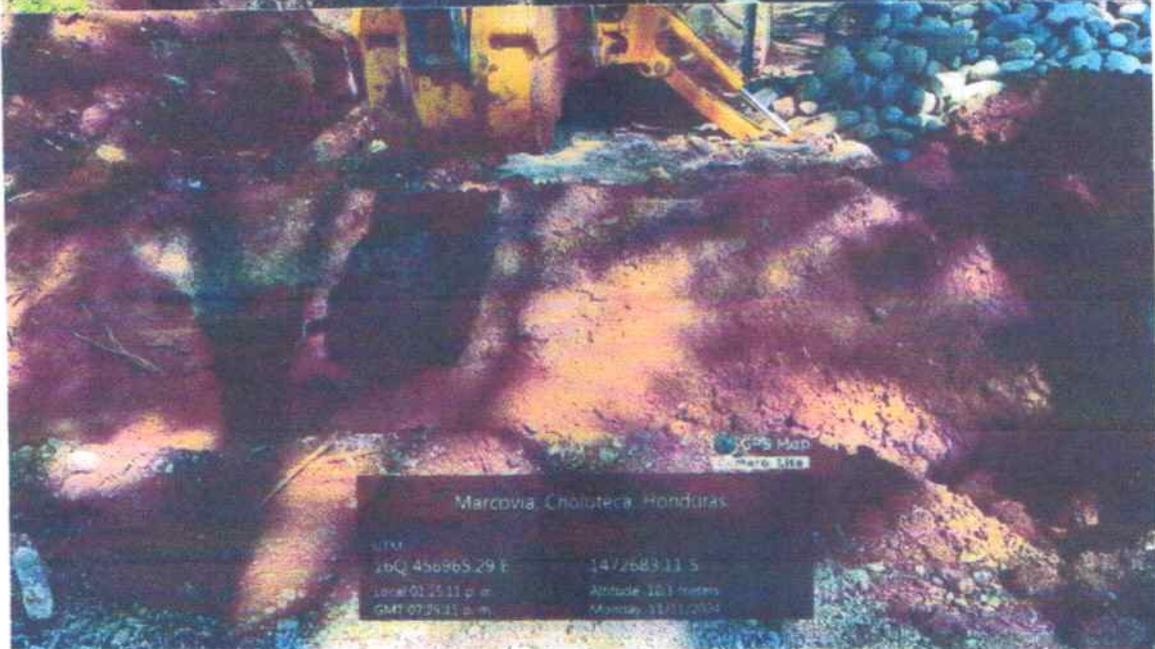



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072

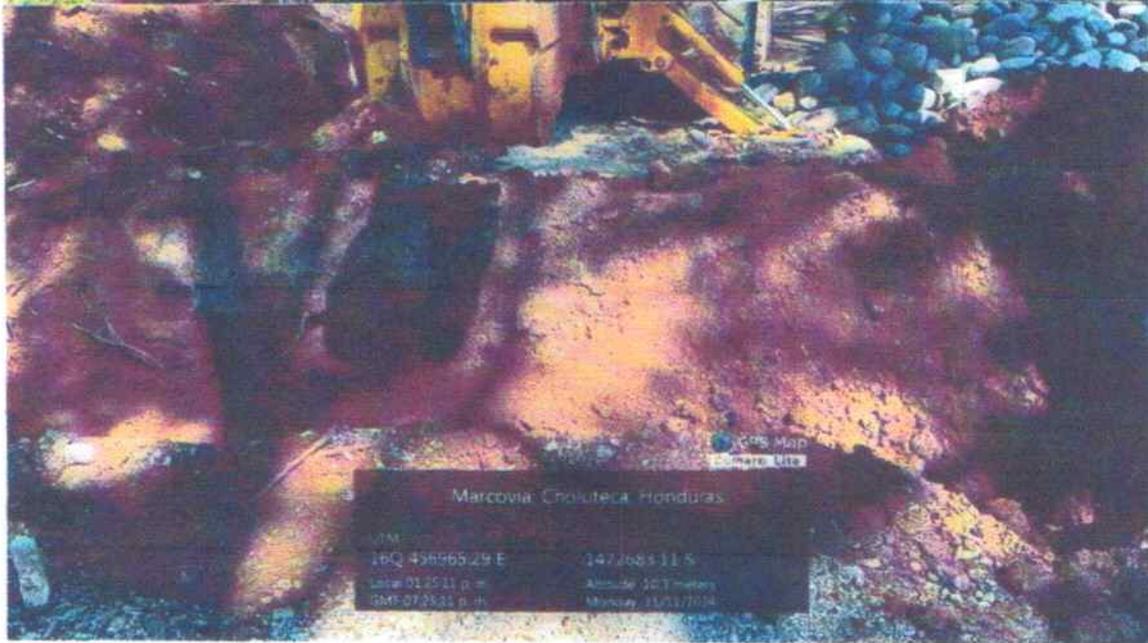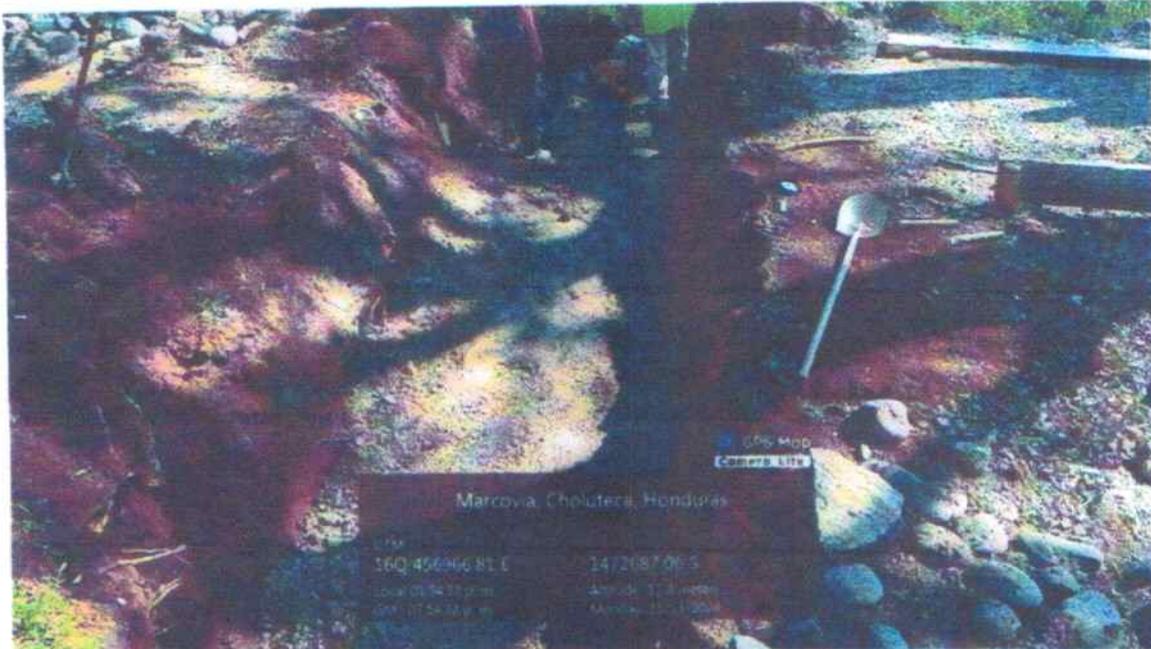

MARCOVIA

CHEQUE No. 00012468

Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, Frente a Plaza Ceiba,
Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072
Cuenta N°: 11-501-001904-3

Marcovia 21 Noviembre 2024
Lugar y Fecha

Vasco Adalid Aguilar Alvarez
Páguense a la orden de

L 178,489.36

Ciento Setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve con 36/100
Cantidad en letras Lempires

Banco de Occidente S.A.



Francis [Signature]
Circular stamp of the Municipality of Marcovia, Choluteca, Honduras.

⑆01501079⑆00115010019043⑆00012468

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
	<p>Pago al Sr Vasco Adalid Aguilar por concepto Estimación #3 contrato construcción de pavimento concreto ciclope E 20cm de San Jose de las Conchas. Caminos productivos.</p>		
		TOTAL	178,489.36
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
			RECIBIDO POR

N° 00012468



Obol [Signature]

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. T.S. 7140-0900, 2446-0790, C.P. 112-181, 65588-01, EN011000208W
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0900, 2446-0700, C.R. 112-181, 65555-01, EN011000208W

VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Bo. San Pedro Sur, 2.5 cuadras al oeste de Pollos Campeón
Choluteca, Honduras, C.A. // RTN. 06011984059720
TEL. (+504) 3207-3016 // E-mail: vaaa2006@hotmail.es

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES:

000-001-04-00000357

POR L. 170,409.36

Recibí de: Alcaldía municipal de MARCANIA RTN: _____

La suma neta de: cientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve ³⁴/₁₀₀

Por concepto de: pagos est. #2 proy. construcción de pavimento con concreto ciloblo en San José de las Cañas

CAI: 23207B-C80B4A-11A9E0-63BE03-0909E0-A4

28 de Noviembre del 2021

Total por Honorarios:	_____
Total de la Retención:	_____
Total Neto Recibido:	_____



Fecha límite de Emisión 27/09/2025
Rango Autorizado: 000-001-04-00000351 al 000-001-04-00000400

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0388 R.T.N. 0609-1993-000127 // SEP-2024 // 1COP. QUIM.
CERTIFICADO SAR: 9231-23-10909-137
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Copie Contabilidad
Copie Tesoreria

Municipalidad de Marcovia, Choluteca

155904

Firma y Sello Tesorero

Comprobante de Pago

RTN: 06079995201200

No. Recibo: 182665

Fecha Recibo: 21/11/2024

2024-11-21 09:59:38 AM

Nombre: Vasco Adalid Aguilar Alvarez

Dirección: marcovia

Detalle: Pago de suverencia

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111101	Impuesto Personal	1.00	642.56
11111817	Tasa Ambiental	1.00	10.00
Total			652.56

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
298504(Noviembre-2024).

Firma y Sello

Firma y Sello Tesorero



Original Contabilidad
Copie Contabilidad
Copie Tesoreria



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2024
Hora : 12:57 p.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46267

L.: 356,978.71

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8472

Fecha de Emisión: 7/11/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 12429

Paguese a: VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Id/RTN: 0601198405972

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO AL SR. VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION #2 DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPE E=20CM EN SAN JOSE DE LAS CONCHAS(CAMINOS PRODUCTIVOS), MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L. 1,492,321.19 VALOR DE (ESTIMACION N.1 L. 438,897.07), VALOR DE ESTIMACION N.2 L. 448,223.39 MENOS DEDUCCION DEL 20% ANTICIPO DE ESTA ESTIMACION L. 89,244.68 TOTAL A PAGAR L. 356,978.71 QUEDANDO UN SALDO ACTUAL DEL CONTRATO L. 607,200.73

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 072 000 001 47210 11-011-04	Construcción de Pavimento con Concreto Ciclope en San José De Las Conchas en el Municipio de Marcovia, departamento de Choluteca (caminos Productivos)	356,978.71

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

Banco Occidente

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	CONVENIO ENTRE ALCALDIA Y LA SECRETARIA DE ESTADO PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS	356,978.71
Monto Total:		356,978.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		356,978.71
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		356,978.71

Firma y Sello de Presupuestario: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesoreria: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA TESORERIA

Firma y Sello de Usuario: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

Recibido por: 0512

Identidad No.: 0512

0s+js/j9Jmc8WcR3xvF18QVcxvZR/ypw... WMLUD3icgSYAvFot+NUERNhbrkjuSNugJTdl1z17n78=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 7 MES Noviembre AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Vasco Adalid Aguilar Alvarez

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 356,978.71

Trescientos cincuenta y seis mil novecientos Setenta
y ocho con setenta y un centavos
POR CONCEPTO DE: pago estimacion #2 del
contrato construcción de pavimento con concreto
ciclopeo e=20cm.

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

IDENTIDAD NO, 06119840592

FIRMA  

VO BO ALCALDE MUNICIPAL  

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Para:

José Nahon Calix
Alcalde Municipal

De:

Lic. José Daniel Maldonado
Unidad de Infraestructura

Asunto:

Lo Descrito

Fecha:

07 de noviembre de 2024

Sirva la presente para solicitarle Autorice el pago al señor Vasco Adalid Aguilar Álvarez, por concepto de pago Estimación # 2 del contrato "Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo e=20cm en San José de las Conchas", Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Valor total del contrato ----- L. 1, 492, 321.19

Valor de Estimación N° 1 ----- L. 438, 897.07

Valor de Estimación N° 2 ----- L. 446, 223.39

Menos deducción 20% anticipo de esta estimación ----- 89, 244.68

Total a pagar ----- L. 356, 978.71

Total a pagar (Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Ocho Lempiras con Setenta y Un Centavos).

SALDO ACTUAL DEL CONTRATO ----- L. 607, 200.73

Cc. Archivo

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 06011984059720

VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores

Protestado
 Fecha de emisión: 20120622

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


 Director Ejecutivo


 Oficina de Asistencia al Contribuyente

El/la Contribuyente recuerde su obligación de declarar cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1049707 Transacción: F89FC4



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011984059720**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



Contrato de Obras: "CONSTRUCCION DE PAVIMEN
 Ubicación: SAN JOSE DE LAS CONCHAS, MARCOVIA
 Nombre del Contratista: Vasco Adalid Aguilar Alva
 Estimación No 2
 fecha 07/11/2024

No.	Item
1	PRELIMINARES
1.1	Limpeza de Terreno
1.2	Excavación de Material
1.3	Trazado y Marcado
	SUBTOTAL
2	RELLENO Y CONFORMA
2.1	Relleno y compactado con material selecto
	SUBTOTAL
3	CONCRETO CICLOPE
3.1	Concreto Ciclope e=20 cm proporción 1:2:3
	SUBTOTAL
4	Obras Finales
4.0	Limpeza Final
	SUBTOTAL
	TOTAL INVERSI

Monto Ejecutado este Periodo _____
 Amortización Anticipo _____
 Retención del ISR _____
 Total a pagar en este periodo _____

INFORME DE AVANCE DE OBRA

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”

Alcaldía Municipal de Marcovia

**UBICACIÓN: San Jose de Las Conchas, Municipio de Marcovia,
Departamento Choluteca.**

**Constructor Obras civiles
ING. VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ CICH 4833**

MARCOVIA, CHOLUTECA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024



Contenido

1) INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	4
1.1. Nombre del Proyecto	4
1.2. Financiamiento	4
1.3. Unidad Ejecutora.....	4
1.4. Descripción de las obras de construcción	4
1.5. Localización del Proyecto	4
2) INFORME DE CONSTRUCCION	5
2.1. Periodo del informe:.....	5
2.2. El resumen del contrato de construcción:.....	5
2.3. Breve análisis del cumplimiento del programa de trabajo.....	5
2.4. Las actividades realizadas	5
2.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA	6
2.6. Equipo y herramientas del contratista:.....	6
2.7. Estado del tiempo	7
2.8. Programa de trabajo.....	7
3) INFORME DE LA SUPERVISION	7
3.1. Ente supervisor	7
3.2. La supervisión realizó las siguientes actividades:.....	7
4) OBSERVACIONES	7
5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	8
6) INFORME FOTOGRAFICO	9



Marcovia, Choluteca 7 de noviembre del 2024

Sr. Alcalde

Jose Nahun Calix Alvarez

Distinguido alcalde:

Adjunto remito a usted el informe #1 de **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**
“correspondiente al periodo del 28 de octubre al 7 de noviembre del 2024.

Acorde y conforme a las cláusulas contractuales del contrato

Sin otro particular

Atentamente,



Daniel Maldonado
Infraestructura.



1) INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”

1.2. Financiamiento

Alcaldía municipal de Marcovia 100%

1.3. Unidad Ejecutora


Alcaldía municipal de Marcovia

1.4. Descripción de las obras de construcción

Construcción pavimento ciclópeo de 4.5 m de ancho y 20 cm de espesor desde muelle hasta calle principal.

1.5. Localización del Proyecto

El proyecto se construye en el departamento de Choluteca, municipio de Marcovia en San Jose de las Conchas

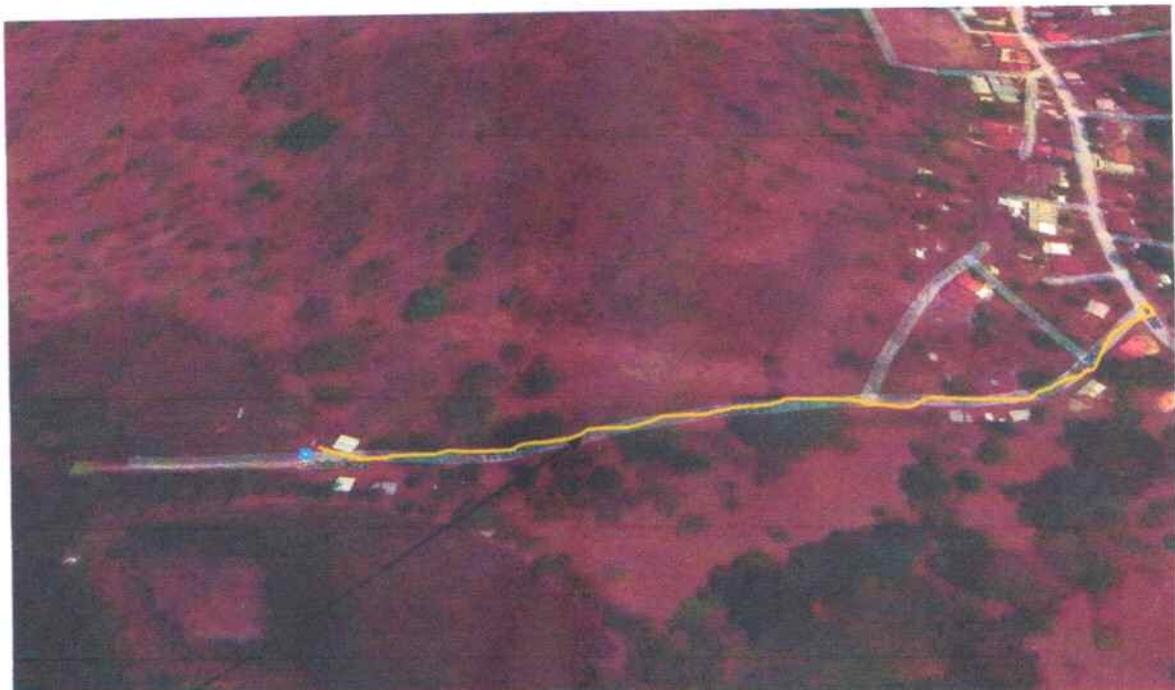

Pavimento / Coordenadas UTM 16P 456775.63 m E 1472656.12 m N



2) INFORME DE CONSTRUCCION

2.1. Periodo del informe:

Este informe se elabora con las actividades realizadas en el proyecto durante el 28 de octubre al 7 de noviembre del 2024.

2.2. El resumen del contrato de construcción:

CONCEPTO	CONTRATISTA
Nombre de contratista	Vasco Adalid Aguilar Alvarez
Fecha de Inicio	18 de octubre 2024
Fecha de Terminación	18 de enero del 2024
Monto contractual	Lps. 1,492,321.19
Modificaciones de plazo (indicar nuevas fechas de terminación)	NO SE HA MODIFICADO
Modificaciones en monto (indicar nuevo monto contractual)	NO SE HA MODIFICADO
Monto ejecutado	Lps. 885,120.46
Monto facturado	Lps. 438,897.07
% de avance físico programado	30%
% de avance físico Ejecutado	51%
Monto de avance financiero programado	Lps. 447,696.36
Plazo contractual Original	90 dias
Plazo contractual modificado	No se ha modificado

2.3. Breve análisis del cumplimiento del programa de trabajo

Durante este período han caído tormentas muy fuertes lo cual afecta el avance de la obra pero esto no ha retrasado la ejecución de la obra .

2.4. Las actividades realizadas

Se han realizado las siguientes actividades durante este período:

No.	Renglon	CONTRATADO		ESTIMACIÓN ACUMULADA
		unidad	Cantidad	% de Avance
1	PRELIMINARES			
1.1	Limpieza de Terreno	M2	1739.88	100%

INFORME DE AVANCE DE OBRA

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."

Alcaldía Municipal de Marcovia

**UBICACIÓN: San Jose de Las Conchas, Municipio de Marcovia,
Departamento Choluteca.**

**Constructor Obras civiles
ING. VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ CICH 4833**

MARCOVIA, CHOLUTECA 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024



1.2	Excavacion de Material	M3	173.99	100%
1.3	Trazado y Maracado	ML	386.64	100%
SUBTOTAL				100%
2	RELLENO Y CONFORMACION			
2.1	Relleno y compactado con material selecto	M3	86.99	100%
SUBTOTAL				100%
3	CONCRETO CICLOPEO			
3.1	Concreto Ciclopeo e=20 cm proporcion 1:2:3	m3	347.98	53%
SUBTOTAL				53%
4	Obras Finales			
4.0	Limpieza Final	JRD	1.00	0%
SUBTOTAL				0%
TOTAL INVERSI				59%

2.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA

- 1 ingeniero residente
- 1 maestro de obra
- 3 albañiles
- 10 ayudantes
- 3 conductores
- 1 operador de retroexcavadora

2.6. Equipo y herramientas del contratista:

#	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Vehículo 4x4	1 unidad	Buen estado	ninguna
2	Plantas Generadoras	1 unidades	Buen estado	ninguna
3	Palas	12 unidades	Buen estado	ninguna
4	Piochas	2 unidades	Buen estado	ninguna
5	Barras	3 unidades	Buen estado	ninguna
6	Almárganas	3 unidades	Buen estado	ninguna
7	SERRUCHO	1 unidades	Buen estado	ninguna
8	Alicates	3 unidades	Buen estado	ninguna
9	Martillos	3 unidades	Buen estado	ninguna
10	Cubetas	8 unidades	Buen estado	ninguna
11	Puntas y cinceles	8 unidades	Buen estado	ninguna
12	Grifas	6 unidades	Buen estado	ninguna
13	Niveles	2 unidades	Buen estado	ninguna
14	Escuadras	3 unidades	Buen estado	ninguna
15	Sierras circulares	2 unidades	Buen estado	ninguna
16	taladros	1 unidades	Buen estado	ninguna
17	Motosierra	1 unidad	Buen estado	ninguna
18	Carretillas de mano	4 unidades	Buen estado	ninguna



19	Camión de 4 toneladas	1 unidad	Buen estado	ninguna
20	Volqueta de 15 m3	2 unidades	Buen estado	ninguna
21	Retroexcavadora	1 unidad	Buen estado	ninguna

2.7. Estado del tiempo

Lluvias fuertes han caído en este periodo de no ser por estas lluvias el proyecto estaría en un mejor porcentaje de avance.

2.8. Programa de trabajo

Se adjunta la copia en los anexos, del programa de trabajo.

3) INFORME DE LA SUPERVISION

3.1. Ente supervisor

Las instituciones responsables de la supervisión son Alcaldía municipal de Marcovia y SIT con las cuales se ha sostenido constante comunicación y se han sostenido varias reuniones de trabajo.

3.2. La supervisión realizó las siguientes actividades:

Durante este periodo se ha tenido comunicación vía teléfono, correo electrónico y de manera presencial con los supervisores, se ha tenido la supervisión de la ing. Osmany Aguilera representante de SIT, también se ha tenido la visita de técnicos municipales y del alcalde municipal y de parte de la comunidad hemos tenido el acompañamiento de le presidente de los pescadores Carlos Peña para verificar el avance de la obra realizaron las siguientes actividades:

- ▶ Verificación de las actividades de las obras ejecutadas.
- ▶ Se hizo un control fotográfico del proyecto para tener a futuro el álbum fotográfico conforme avanza el proyecto.
- ▶ Inspección de los materiales a usar por el contratista para corroborar la calidad

4) OBSERVACIONES

El volumen de relleno considerado en la obra es de solo 5 cm lo cual dejaría una base no acta par el pavimento por lo cual al alcadia ha aprobado un volumen extra el cual será definido por los niveles y estará entre 15 y 20 cm.







5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


- La obra se ha construido siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo cual nos da como resultado una obra de calidad apta a las condiciones del sitio.



6) INFORME FOTOGRAFICO

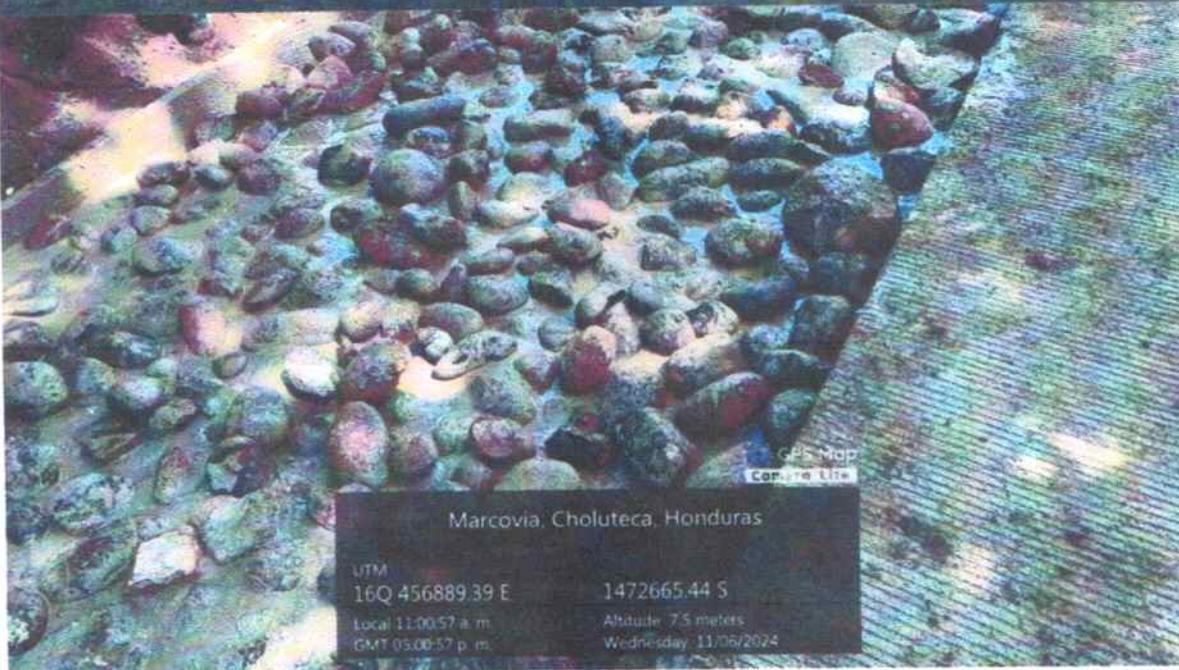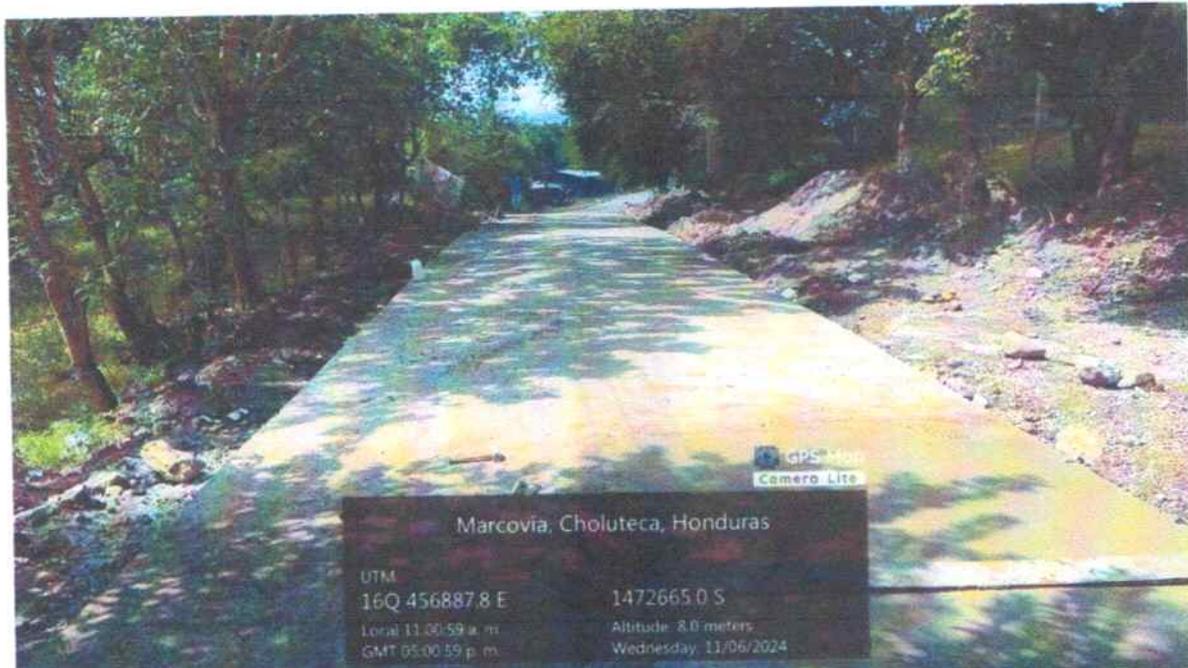

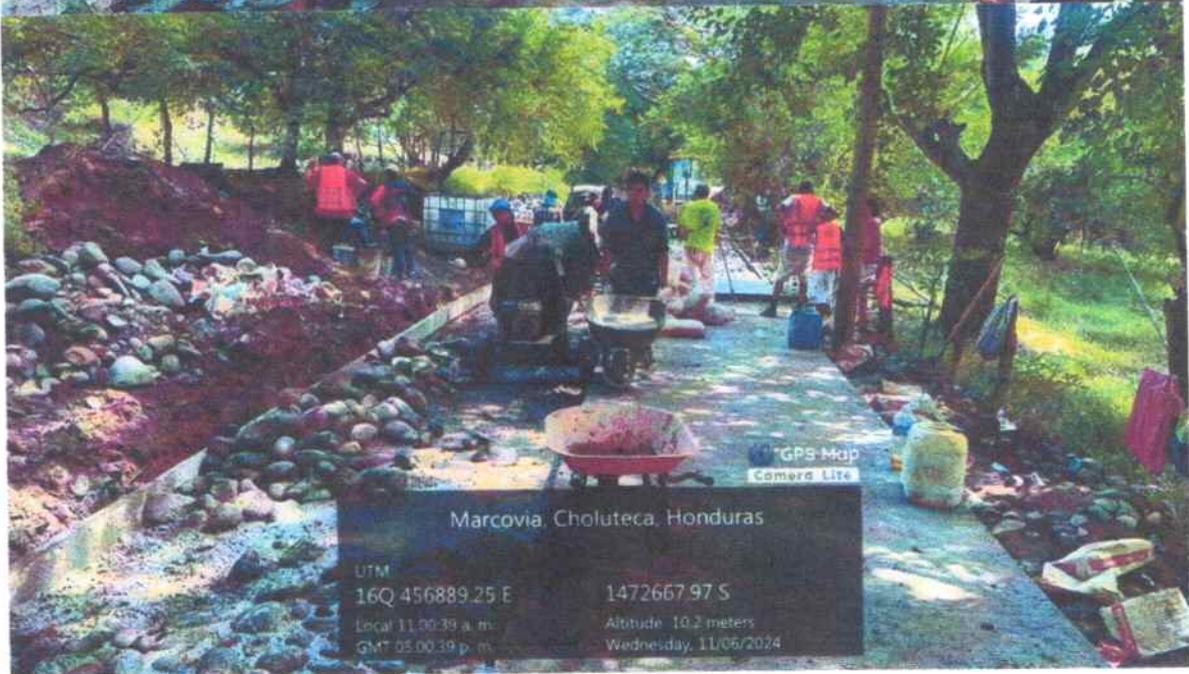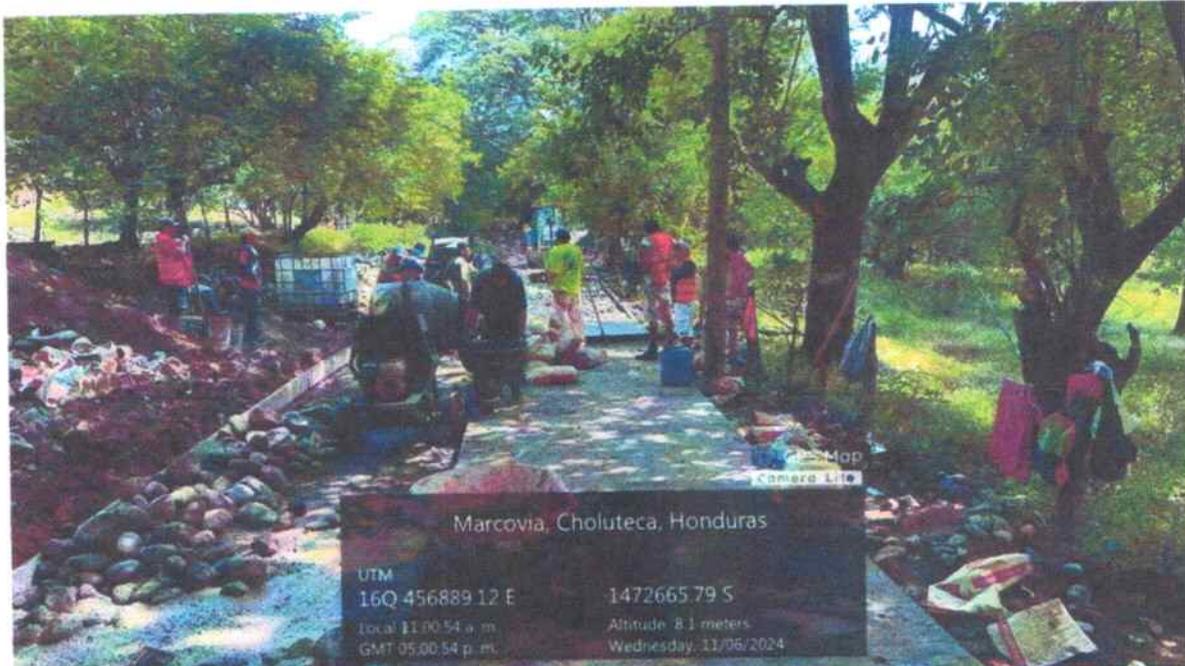


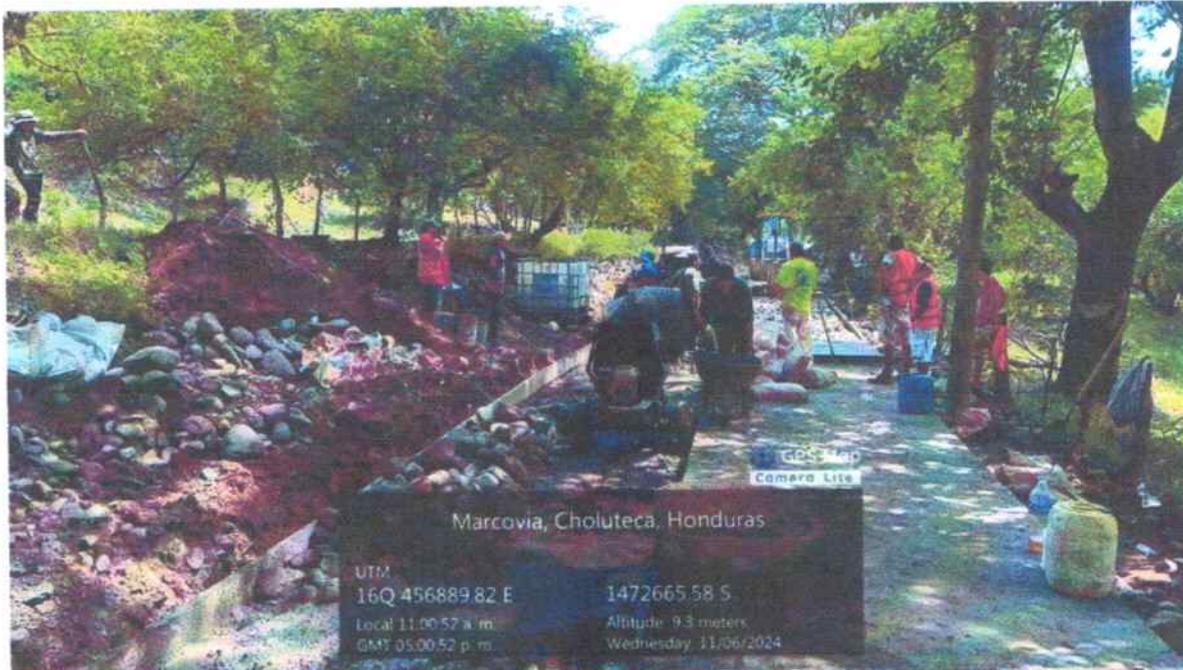

GPS Map
Camera Lite

Marcovia, Choluteca, Honduras



UTM	16Q 456889.82 E	1472665.58 S
Local	11:00:57 a. m.	Altitude: 9.3 meters
GMT	05:00:52 p. m.	Wednesday, 11/06/2024

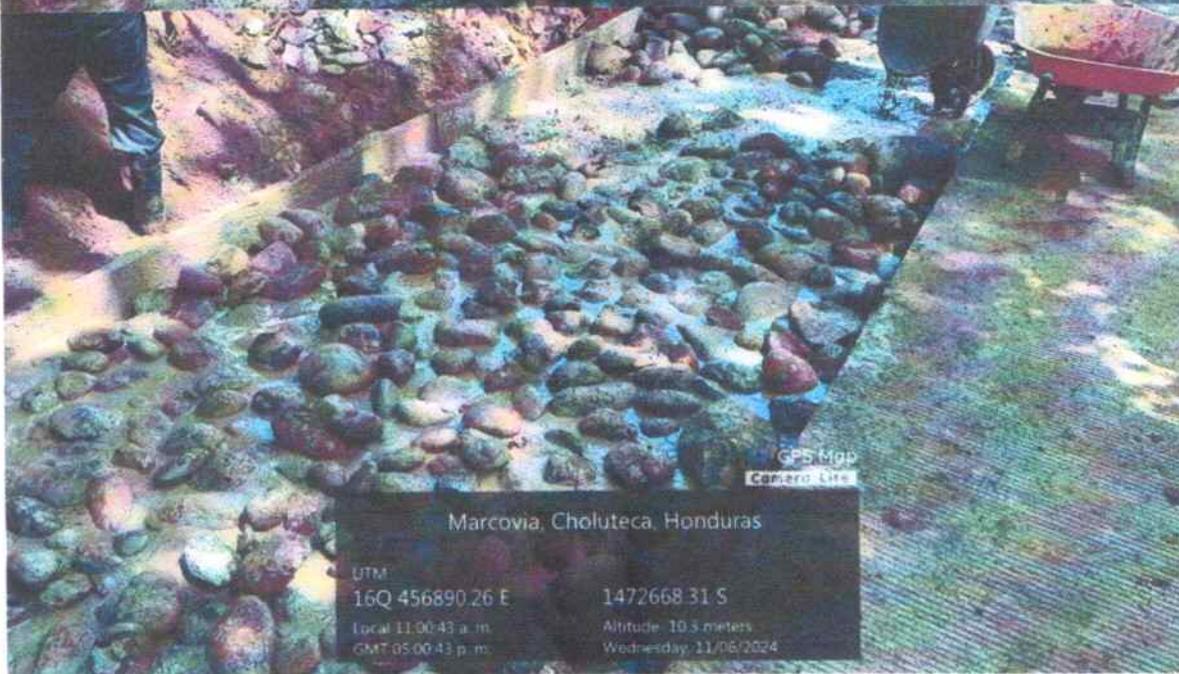


GPS Map
Camera Lite

Marcovia, Choluteca, Honduras

UTM	16Q 456890.26 E	1472668.31 S
Local	11:00:43 a. m.	Altitude: 10.3 meters
GMT	05:00:43 p. m.	Wednesday, 11/06/2024

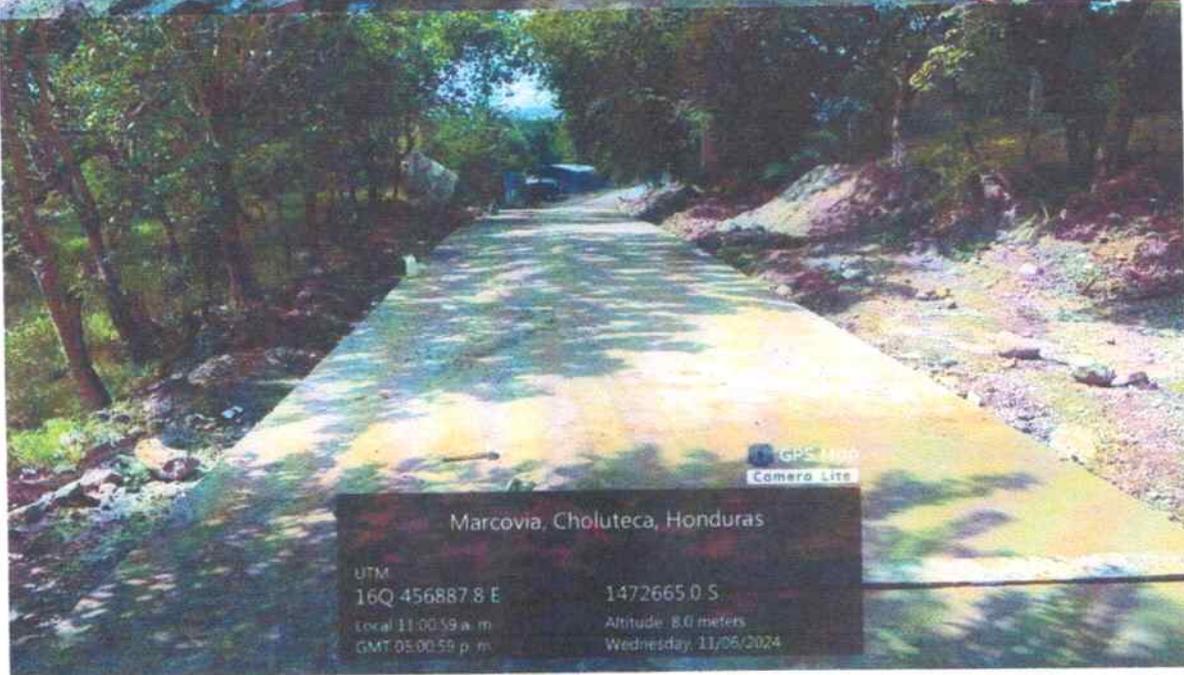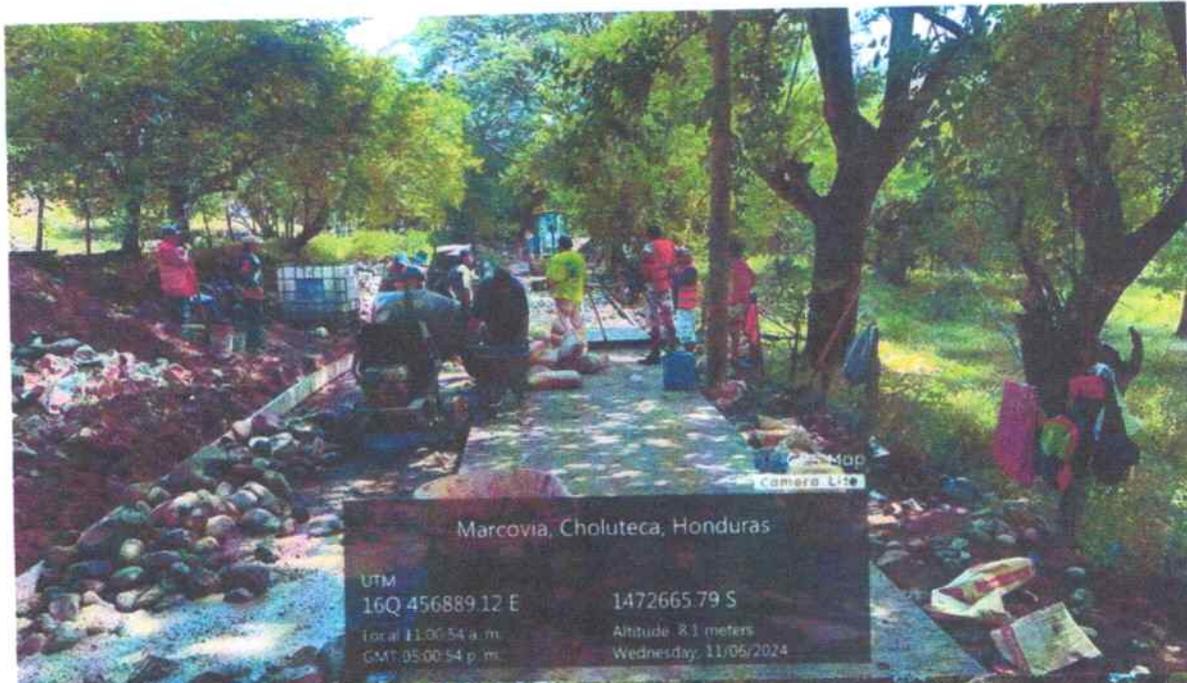

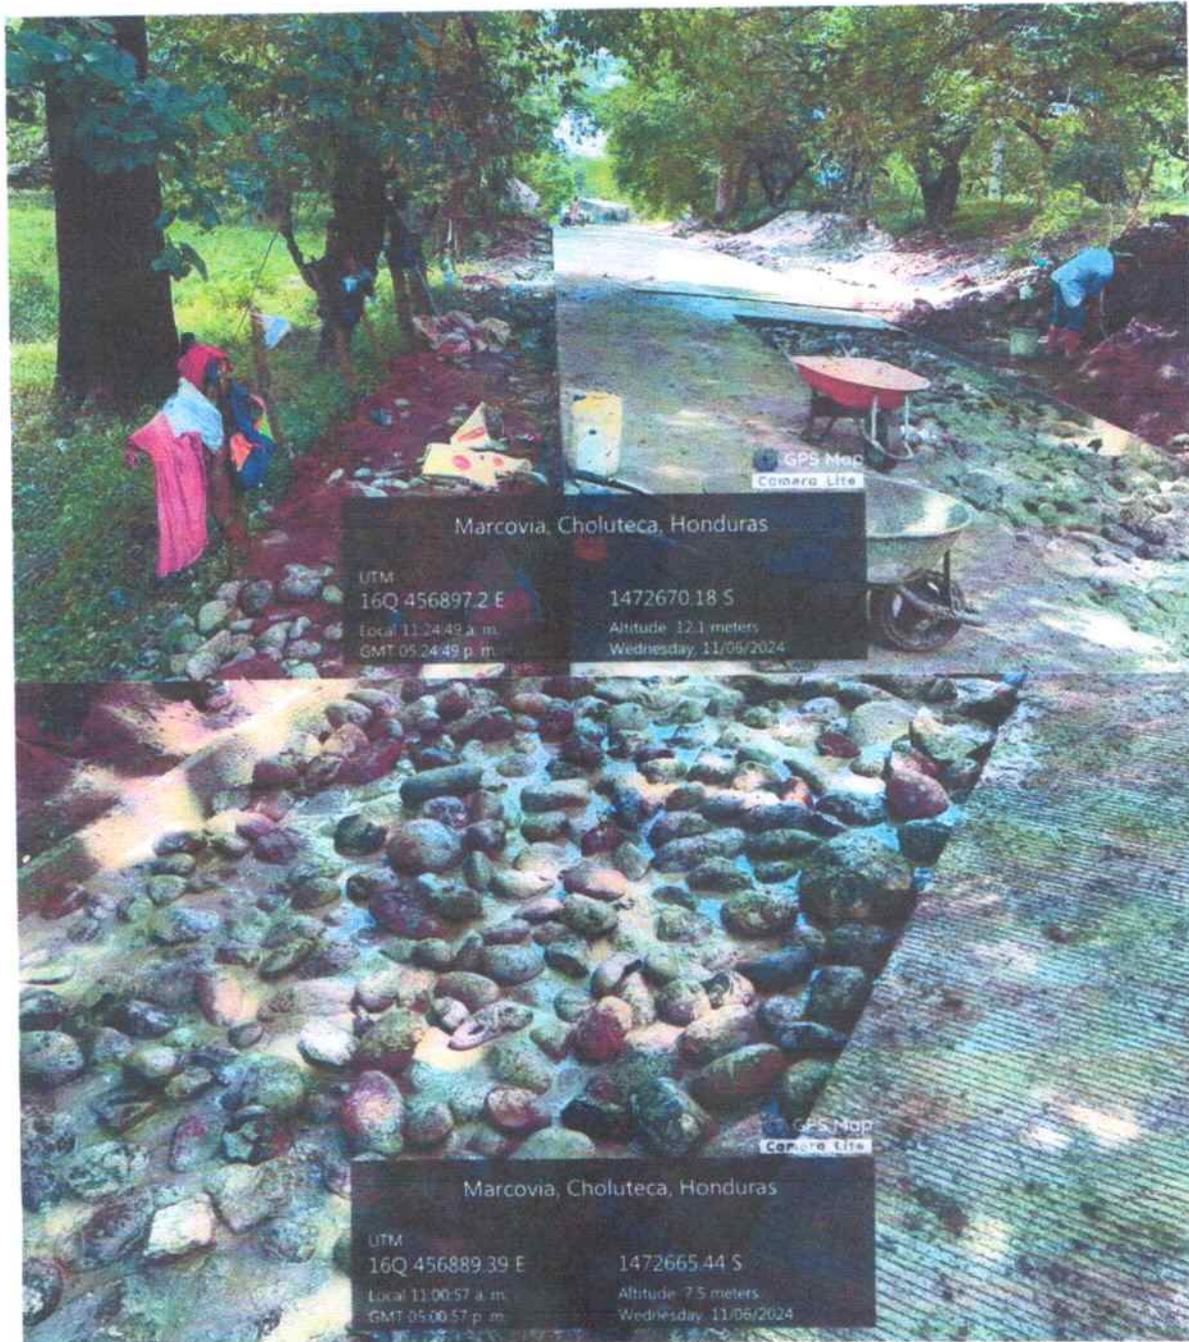

VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Bo. San Pedro Sur, 2.5 cuadras al oeste de Pollos Campeón
Choluteca, Honduras, C.A. // RTN. 06011984059720
TEL. (+504) 3207-3016 // E-mail: vaaa2006@hotmail.es

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES:

000-001-04-00000356

POR L. 356,978.71

Recibí de: Alcaldía municipal de Marcovia RTN 06079995201200

La suma neta de: Trescientos cincuenta y seis mil novecientos setenta y ocho con 7/100

Por concepto de: pago est # 2 proyecto const. de pavimento con concreto ciclopeo a=20cm en san José de Las Conchas

CAI: 23207B-C80B4A-11A9E0-63BE03-0909E0-A4


7 de noviembre del 2024


Vasco Adalid Aguilar Alvarez
FIRMA

Total por Honorarios: _____
Total de la Retención: _____
Total Neto Recibido: 356,978.71

Fecha límite de Emisión 27/09/2025
Rango Autorizado: 000-001-04-00000351 al 000-001-04-00000400

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-8988 R.T.N. 0909-1953-000127 // SEP-2004 // 1 COP. QUIM.
CERTIFICADO SAR // 8231-23-10500-137
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



25

MARCOVIA

Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, Frente a Plaza Cereza,
Marcovia, Choluteca, Tel: 2722-2071, 2722-2072
Cuenta N°.: 11-501-001904-3

CHEQUE No. 00012429

Marcovia 7 Noviembre 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Vasco Adalid Aguilar Alvarez

L. 356,978.71

Cantidad en letras Trescientos cincuenta y seis mil novecientos setenta y ocho con 71/100 Lempiras

 Banco de Occidente S.A.



01501079:00115010019043#00012429

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
	Pago concepto estimacion #2 construcción pavimento concreto ciclope E = 20 cm San Jose de las conchas. Valo. contrato 1,492,321.19 Estimacion #1 438,897.07 Estimacion #2 356,978.71 menos 20% anticipo		
	TOTAL		356,978.71
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
			

N° 00012429

060115640512

26

Municipalidad de Marcovia, Choluteca

155

Comprobante de Pago
RTN: 06079995201200

No. Recibo: 162084

Fecha Recibo: 07/11/2024

Identidad: 0801190405972

Nombre: Vasco Adalid Aguilar Alvarez

Dirección: Marcovia

Detalle: Pago de Solvencia

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111101	Impuesto Personal	1.00	1.265.12
1111107	Tasa Ambiental	1.00	13.00
		Total:	1.295.12

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
298136(Noviembre-2024).

Firma y Sello Tesorero



Impuesto Personal
Tasa Ambiental



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46231

L.: 351,117.66

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8463

Fecha de Emision: 1/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 12387

Paguese a: VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Id/RTN: 0601198405972

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Occidente

PAGO AL SR. VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION #1 DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPE E=20CM EN SAN JOSE DE LAS CONCHAS(CAMINOS PRODUCTIVOS), MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L. 1,492,321.19 VALOR DE ESTIMACION N.1 L. 438,897.07 MENOS DEDUCCION DEL 20% ANTICIPO DE ESTA ESTIMACION L. 87,779.41 TOTAL A PAGAR L. 351,117.66 QUEDANDO UN SALDO ACTUAL DEL CONTRATO L. 1,053,424.12

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 072 000 001 47210 11-011-04	Construcción de Pavimento con Concreto Ciclope en San José De Las Conchas en el Municipio de Marcovia, departamento de Choluteca (caminos Productivos)	351,117.66

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	CONVENIO ENTRE ALCALDIA Y LA SECRETARIA DE ESTADO PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS	351,117.66
Monto Total:		351,117.66

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	351,117.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	351,117.66

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0601198405972



Qs+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yQVgncCyQs6X+Q7+MMXm3IRj+Qs6VrvkjrOgwVsJTihKuqEWRx26OMisX1kQUF/UDFHPdIH4z2IYcoVELLIS.J WMLUD3icgSYAvFot+NUEERNhbrkjuSNugJTdl1z17n78=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 1 MES Noviembre AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Vasco Adalid Aguilar Alvarez

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 351,117.66

Trescientos cincuenta y un mil ciento dieciséis
con sesenta y seis centavos

POR CONCEPTO DE: Pago estimación N.º 1 del
contrato construcción de pavimento de concreto
Ciclopeo e = 20cm


SOLVENCIA MUNICIPAL

IDENTIDAD NO, 0601 1984 05972

FIRMA




VO BO ALCALDE MUNICIPAL




ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Para: José Nahur Calix
Alcalde Municipal

De: Lic. José Daniel Maldonado
Unidad de Infraestructura

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 31 de octubre de 2024

Sirva la presente para solicitarle Autorice el pago al señor Vasco Adalid Aguilar Álvarez, por concepto de pago Estimación # 1 del contrato "Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo e=20cm en San José de las Conchas", Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Valor total del contrato	L. 1, 492, 321.19
Valor de Estimación N° 1	L. 438, 897.07
Menos deducción 20% anticipo de esta estimación	87, 779.41
Total a pagar	L. 351, 117.66

Total a pagar (Trescientos Cincuenta y Un Mil Ciento Diecisiete Lempiras con Sesenta y Seis Centavos).

SALDO ACTUAL DEL CONTRATO ----- L. 1, 053, 424.12

Cc. Archivo



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011984059720**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



Contrato de Obras: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICL

Ubicación: SAN JOSE DE LAS CONCHAS, MARCOVIA, CHOLUTECA.

Nombre del Contratista: Vasco Adalid Aguilar Alvarez

Estimación No.1

fecha 29/10/2024

No.	Ranglon
1	PRELIMINARES
1.1	Limpeza de Terrano
1.2	Excavacion de Material
1.3	Trazado y Maracado
	SUBTOTAL
2	RELLENO Y CONFORMACION
2.1	Relleno y compactado con material selecto
	SUBTOTAL
3	CONCRETO CICLOPEO
3.1	Concreto Ciclopeo e=20 cm proporcion 1:2:3
	SUBTOTAL
4	Obras Finales
4.0	Limpeza Final
	SUBTOTAL
	TOTAL INVERSI

Monto Ejecutado este Periodo

Amortización Anticipo

Retención del ISR

Total a pagar en este periodo


José Daniel Maldonado
Proyectos Alcaldía

CHOLUTECA

INFORME DE AVANCE DE OBRA

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”

Alcaldía Municipal de Marcovia

**UBICACIÓN: San Jose de Las Conchas, Municipio de Marcovia,
Departamento Choluteca.**

**Constructor Obras civiles
ING. VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ CICH 4833**

MARCOVIA, CHOLUTECA 29 DE OCTUBRE DEL 2024





Contenido

1) INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	4
1.1. Nombre del Proyecto	4
1.2. Financiamiento	4
1.3. Unidad Ejecutora	4
1.4. Descripción de las obras de construcción	4
1.5. Localización del Proyecto	4
2) INFORME DE CONSTRUCCION	5
2.1. Periodo del informe:	5
2.2. El resumen del contrato de construcción:	5
2.3. Breve análisis del cumplimiento del programa de trabajo.....	5
2.4. Las actividades realizadas	5
2.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA	6
2.6. Equipo y herramientas del contratista:	6
2.7. Estado del tiempo	7
2.8. Programa de trabajo	7
3) INFORME DE LA SUPERVISION	7
3.1. Ente supervisor	7
3.2. La supervisión realizó las siguientes actividades:.....	7
4) OBSERVACIONES	7
5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	8
6) INFORME FOTOGRAFICO	9



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072



Marcovia, Choluteca 28 de octubre del 2024

Sr. Alcalde

Jose Nahun Calix Alvarez

Distinguido alcalde:

Adjunto remito a usted el informe #1 de **“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.** “correspondiente al periodo del 18 al 28 de octubre del 2024.

Acorde y conforme a las cláusulas contractuales del contrato

Sin otro particular

Atentamente,


Daniel Maldonado
Infraestructura





1) INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”

1.2. Financiamiento

Alcaldía municipal de Marcovia 100%

1.3. Unidad Ejecutora


Alcaldía municipal de Marcovia

1.4. Descripción de las obras de construcción

Construcción pavimento ciclópeo de 4.5 m de ancho y 20 cm de espesor desde muelle hasta calle principal.

1.5. Localización del Proyecto

El proyecto se construye en el departamento de Choluteca, municipio de Marcovia en San Jose de las Conchas

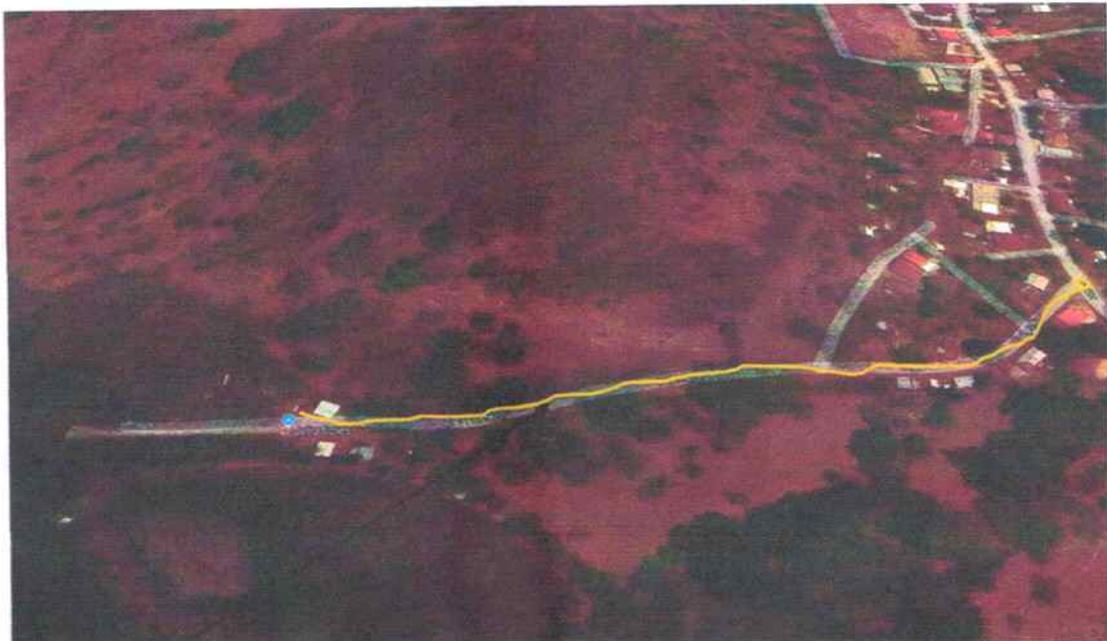

Pavimento / Coordenadas UTM 16P 456775.63 m E 1472656.12 m N



2) INFORME DE CONSTRUCCION

2.1. Periodo del informe:

Este informe se elabora con las actividades realizadas en el proyecto durante el 8 de julio al 8 de agosto del 2024.

2.2. El resumen del contrato de construcción:

CONCEPTO	CONTRATISTA
Nombre de contratista	Vasco Adalid Aguilar Alvarez
Fecha de Inicio	18 de octubre 2024
Fecha de Terminación	18 de enero del 2024
Monto contractual	Lps. 1,492,321.19
Modificaciones de plazo (indicar nuevas fechas de terminación)	NO SE HA MODIFICADO
Modificaciones en monto (indicar nuevo monto contractual)	NO SE HA MODIFICADO
Monto ejecutado	Lps. 438,897.07
Monto facturado	Lps. 0.00
% de avance físico programado	10%
% de avance físico Ejecutado	29%
Monto de avance financiero programado	Lps. 149,232.12
Plazo contractual Original	90 días
Plazo contractual modificado	No se ha modificado

2.3. Breve análisis del cumplimiento del programa de trabajo

Desde la fecha de inicio hasta la fecha actual que se preseta estimación 1 no han caído llluvias, la climatología ha sido favorable lo que ha permitido tener un avance mayor al programado.

2.4. Las actividades realizadas

Se han realizado las siguientes actividades durante este período:

No.	Renglon	CONTRATADO		
		unidad	Cantidad	% de Avance
1	PRELIMINARES			



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTEGA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072



1.1	Limpieza de Terreno	M2	1739.88	100%
1.2	Excavación de Material	M3	173.99	100%
1.3	Trazado y Marcado	ML	386.64	100%
SUBTOTAL				100%
2	RELLENO Y CONFORMACION			
2.1	Relleno y compactado con material selecto	M3	86.99	100%
SUBTOTAL				100%
3	CONCRETO CICLOPEO			
3.1	Concreto Ciclopeo e=20 cm proporcion 1:2:3	m3	347.98	21%
SUBTOTAL				21%
4	Obras Finales			
4.0	Limpieza Final	JRD	1.00	0%
SUBTOTAL				0%
TOTAL				31%

2.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA

- 1 ingeniero residente
- 1 maestro de obra
- 3 albañiles
- 10 ayudantes
- 3 conductores
- 1 operador de retroexcavadora

2.6. Equipo y herramientas del contratista:

#	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Vehículo 4x4	1 unidad	Buen estado	ninguna
2	Plantas Generadoras	1 unidades	Buen estado	ninguna
3	Palas	12 unidades	Buen estado	ninguna
4	Piochas	2 unidades	Buen estado	ninguna
5	Barras	3 unidades	Buen estado	ninguna
6	Almárganas	3 unidades	Buen estado	ninguna
7	SERRUCHO	1 unidades	Buen estado	ninguna
8	Alicates	3 unidades	Buen estado	ninguna
9	Martillos	3 unidades	Buen estado	ninguna
10	Cubetas	8 unidades	Buen estado	ninguna
11	Puntas y cinceles	8 unidades	Buen estado	ninguna
12	Grifas	6 unidades	Buen estado	ninguna
13	Niveles	2 unidades	Buen estado	ninguna
14	Escuadras	3 unidades	Buen estado	ninguna
15	Sierras circulares	2 unidades	Buen estado	ninguna
16	taladros	1 unidades	Buen estado	ninguna
17	Motosierra	1 unidad	Buen estado	ninguna



18	Carretillas de mano	4 unidades	Buen estado	ninguna
19	Camión de 4 toneladas	1 unidad	Buen estado	ninguna
20	Volqueta de 15 m3	2 unidades	Buen estado	ninguna
21	Retroexcavadora	1 unidad	Buen estado	ninguna

2.7. Estado del tiempo

Durante este periodo de ejecución no ha habido lluvias por lo cual no hay atrasos debido al estado del tiempo.

2.8. Programa de trabajo

Se adjunta la copia en los anexos, del programa de trabajo.

3) INFORME DE LA SUPERVISION

3.1. Ente supervisor

Las instituciones responsables de la supervisión son Alcaldía municipal de Marcovia y SIT con las cuales se ha sostenido constante comunicación y se han sostenido varias reuniones de trabajo.

3.2. La supervisión realizó las siguientes actividades:

Durante este periodo se ha tenido comunicación vía teléfono, correo electrónico y de manera presencial con los supervisores, se ha tenido la supervisión de la ing. Osmany Aguilera representante de SIT, también se ha tenido la visita de técnicos municipales y del alcalde municipal y de parte de la comunidad hemos tenido el acompañamiento de le presidente de los pescadores Carlos Peña para verificar el avance de la obra realizaron las siguientes actividades:

- ▶ Verificación de las actividades de las obras ejecutadas.
- ▶ Se hizo un control fotográfico del proyecto para tener a futuro el álbum fotográfico conforme avanza el proyecto.
- ▶ Inspección de los materiales a usar por el contratista para corroborar la calidad

4) OBSERVACIONES

El volumen de relleno considerado en la obra es de solo 5 cm lo cual dejaría una base no acta par el pavimento por lo cual al alcaldia ha aprobado un volumen extra el cual será definido por los niveles y estará entre 15 y 20 cm.



5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La obra se ha construido siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo cual nos da como resultado una obra de calidad apta a las condiciones del sitio.




ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072



6) INFORME FOTOGRAFICO





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072

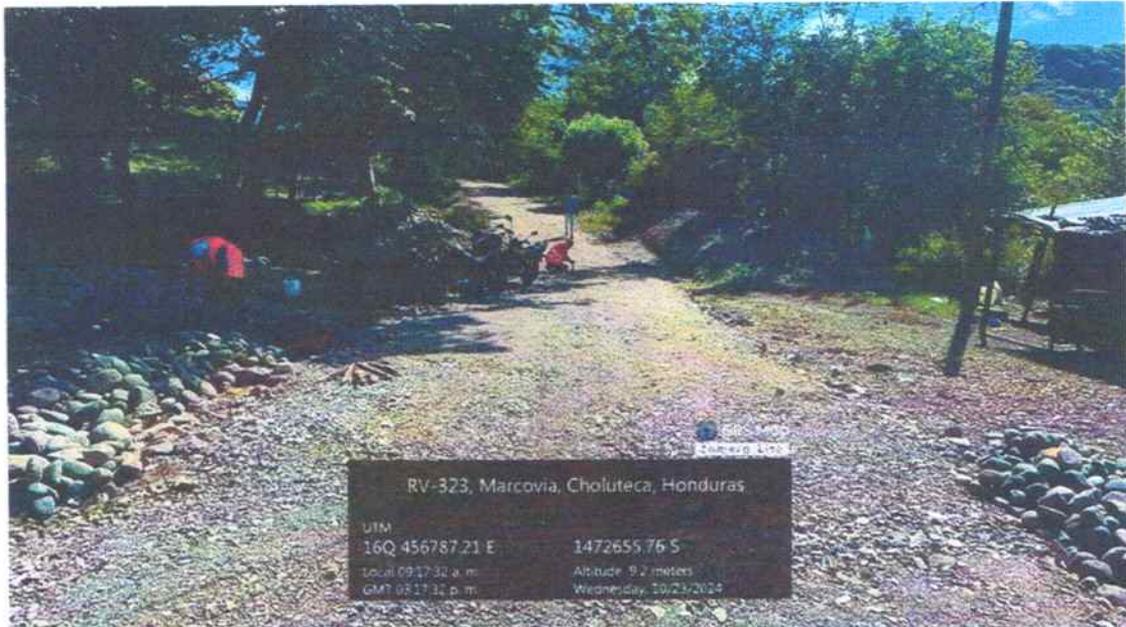




ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072

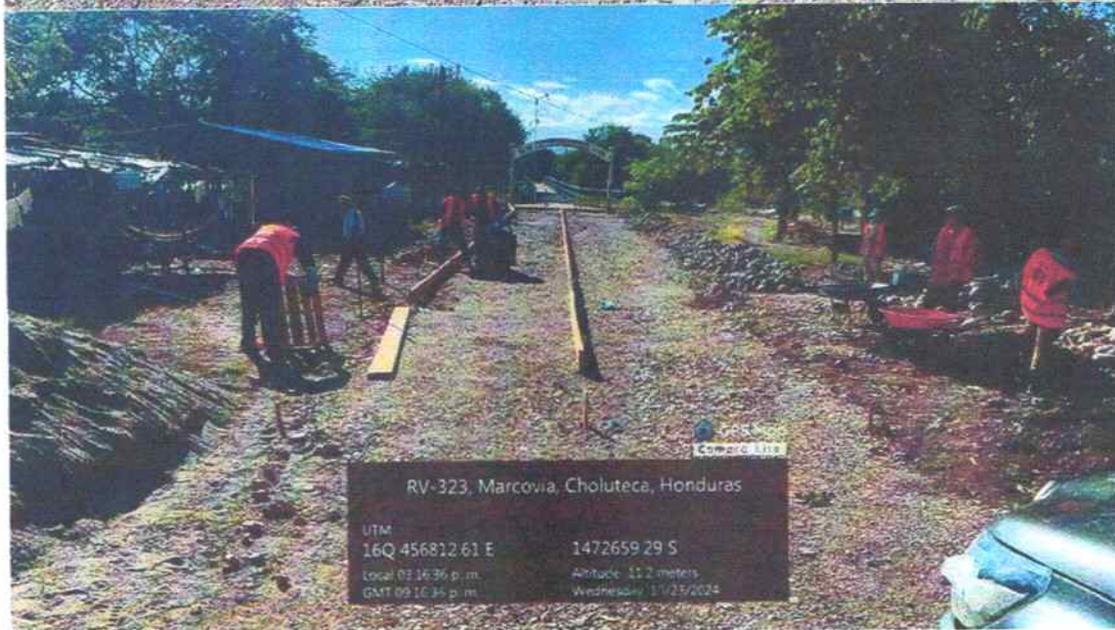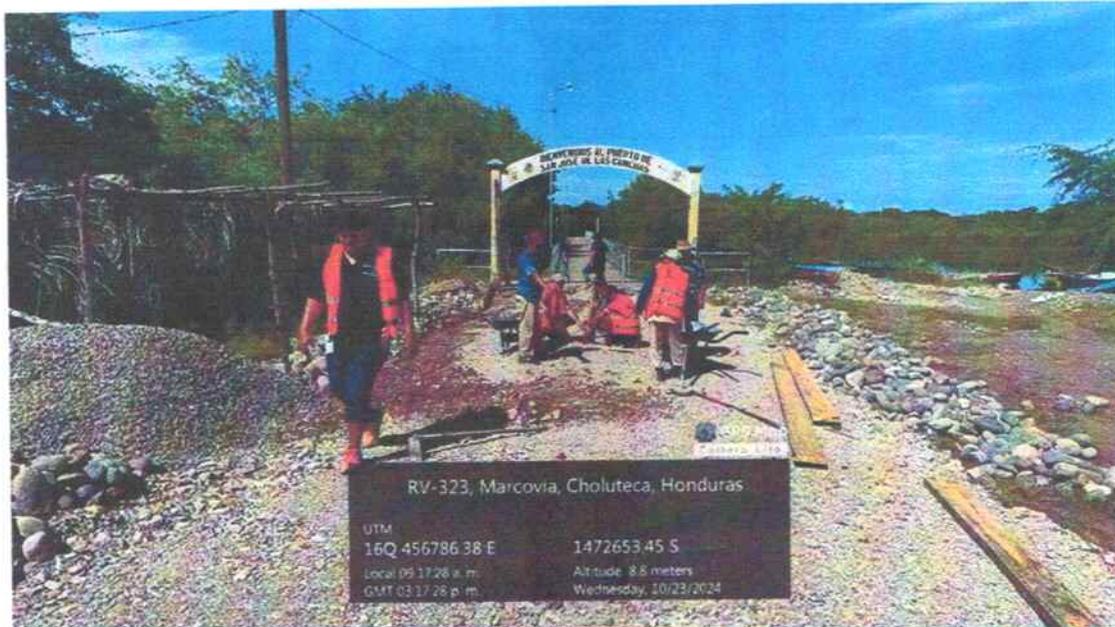





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072

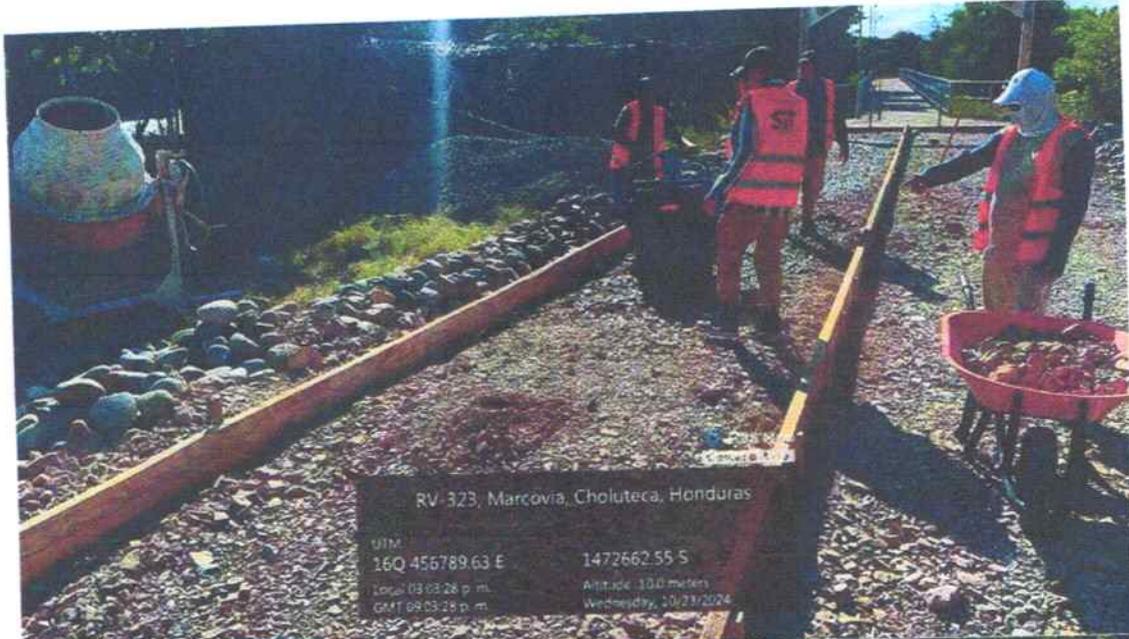





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072

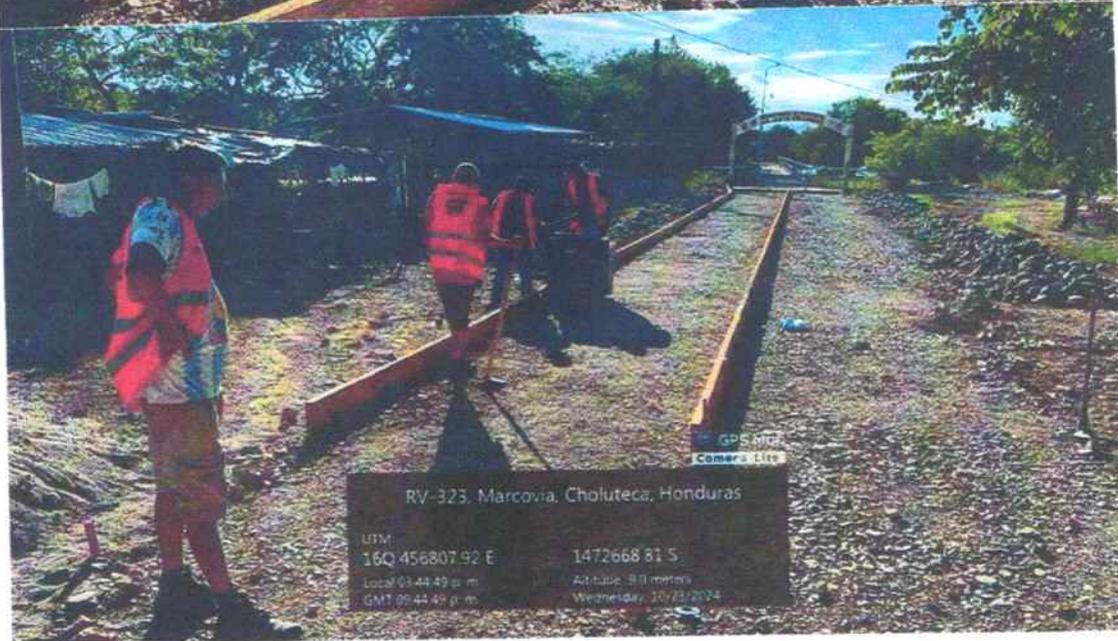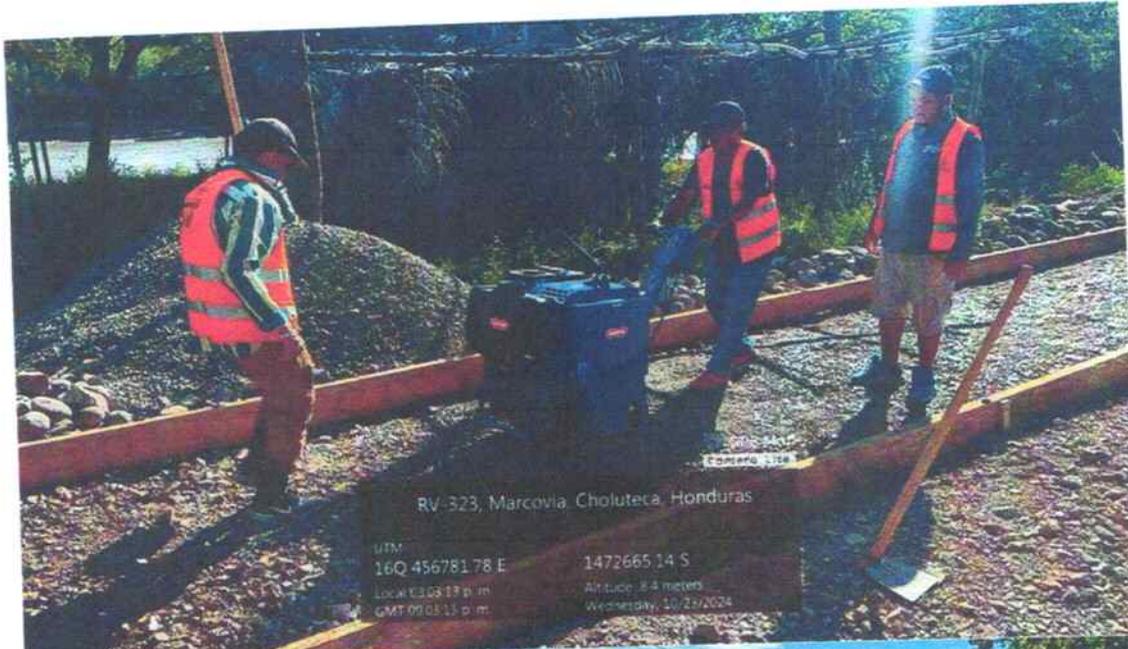



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
Tel. 2722-2071 / 2722-2072

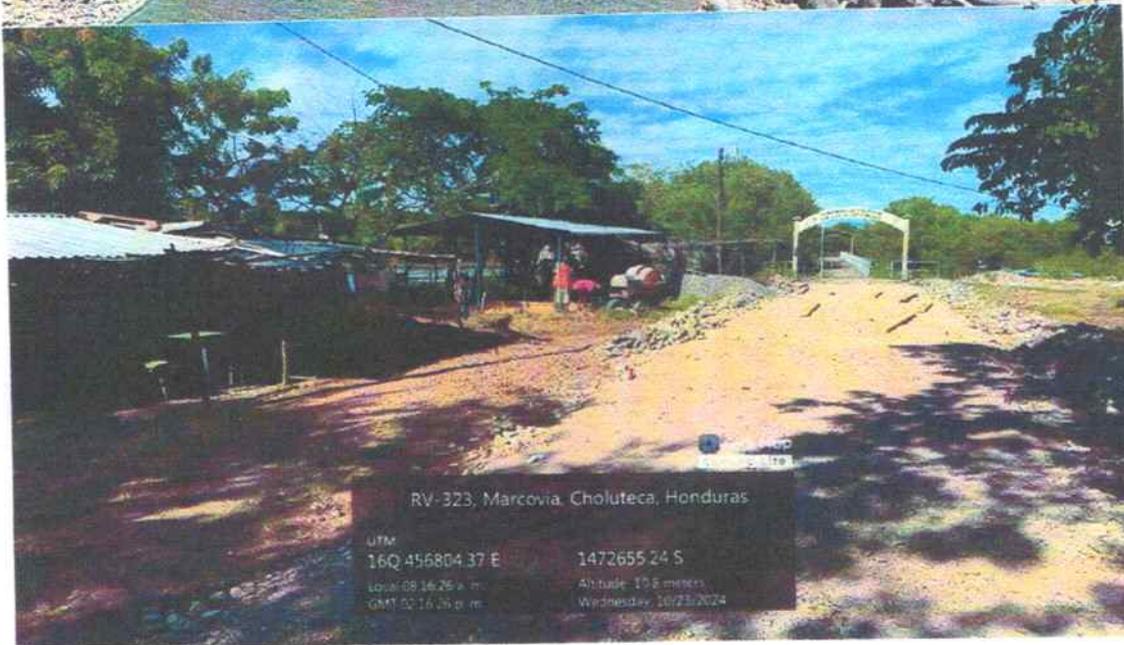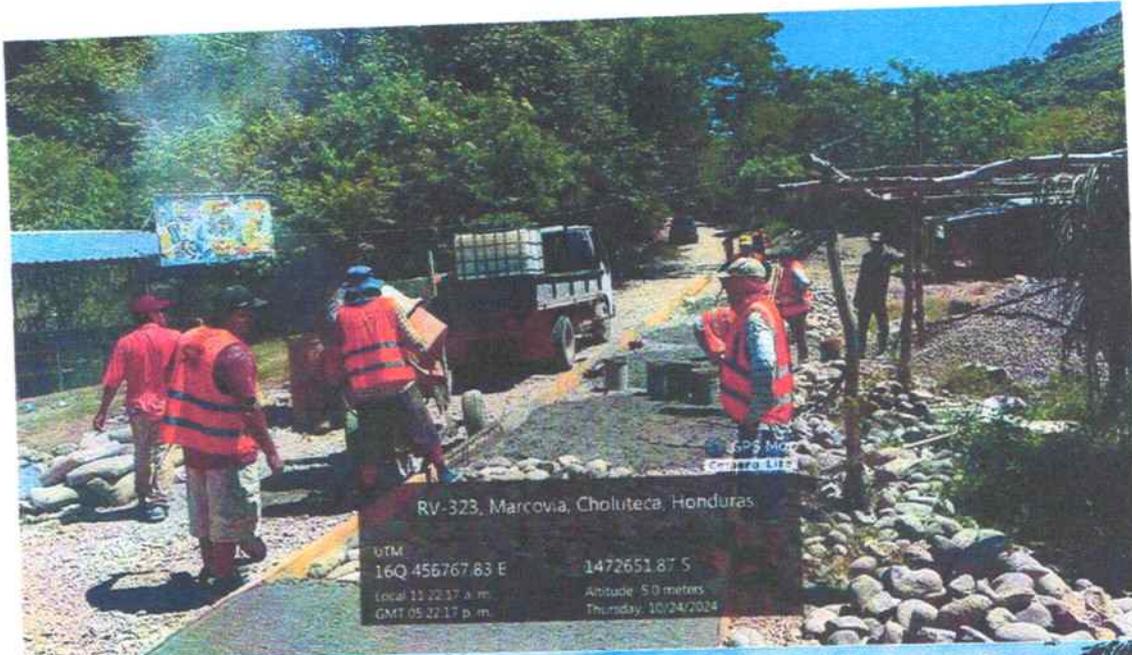

VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Bo. San Pedro Sur, 2.5 cuadras al oeste de Pollos Campeón
Choluteca, Honduras, C.A. // RTN. 06011984059720
TEL. (+504) 3207-3016 // E-mail: vaaa2006@hotmail.es

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES:

000-001-04-00000354

POR L. 351,117.66

Recibí de: Alcalde municipal de Marcovia

RTN: _____

La suma neta de: Trescientos cincuenta y un mil ciento diezyocho con 66/100

Por concepto de: Pago Est. #1 proyec. const. de Pavimento en concreto ciclopeo E=20cm en San José de las Conchas

31 de Octubre del 2024

CAI: 23207B-C80B4A-11A9E0-63BE03-0909E0-A4

Total por Honorarios: _____

Total de la Retención: _____

Total Neto Recibido: 351,117.66



Fecha límite de Emisión **27/09/2025**

Rango Autorizado: 000-001-04-00000351 al 000-001-04-00000400

Emp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2723-0268 R.T.N. 0800-1853-000127 // SEP-2024 // 1 COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Unidad Ejecutora:
Código Tributario:

Municipalidad de **Marcovia** Choluteca

155389

Comprobante de Pago
RTN: 00079995201200

No. Recibo: 152152

Fecha Recibo: 11/11/2024
Identificador: 1101182405972

Nombre: Vasco Adalid Aguilar Alvarez
Direccion: marcovia

Detalle: Pago de solvencia

Cuenta	Descripcion	Cantidad	Sub Total
1111101	Impuesto Personal	100	1,264.02
11111017	Tasa Ambiental	100	10.00
			1,274.02

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
297642(Noviembre-2024).

[Firma]
Firma y Sello



Unidad Ejecutora:
Código Tributario:

MARCOVIA

CHEQUE No. 00012387

Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, frente a Plaza Cívica,
Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072
Cuenta N°.: 11-501-001904-3

Marcovia 1 Noviembre 2024
Lugar y Fecha

Vasco Adalid Aguilar Alvarez
Páguese a la orden de

351,117.66

Trescientos cincuenta y un mil ciento diecisiete con 66/100
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.



⑆0 150 1079⑆00 1 150 100 19043⑆000 12387

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
	<p>Pago Sr Vasco Aguilar por concepto de pago estimación #1 Contrato construcción de pavimento concreto Ciclope E 20cm San Jose de las Lonchas camino Productivo valor 1,492,321.19 Estimación #1 438,897.07 menos deducción 20%.</p>		<p>351,117.66</p>
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	<p>APROBADO POR</p> <p></p> <p>000119640593</p>

P.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000 3443-0700. C.R. (12-19) 56668-01 * ENR11000209H

N° 00012387
