



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/05/2022

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: KMONTES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4026

L.: 721,585.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 112

Fecha de Emisión: 19/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER FERMIN CALIX MANUELES

Id/RTN: 12081973002231

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CON INTERCONEXION A LA RED EN LA ALDEA RANCHO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE AGUANQUETERIQUE LA PAZ. POR LA CANTIDAD DE L.721,585.92

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 06 003 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Electrificación en la Aldea el Rancho Grande	200,000.00
13 04 003 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Electrificación en la Aldea el Rancho Grande	521,585.92

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE PAGOS PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	721,585.92
Monto Total:		721,585.92

RESUMEN DE PAGOS ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	721,585.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	721,585.92

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

Javier Fermin Calix Manuales
12081973002231



MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Trabajo, Desarrollo y Transparencia



VAUCHER DE PAGO			
Fecha:	19 Mayo 2022	Orden N°	4026
		Cheque N°	81992822
Nombre Completo	Javier Fermín Calix Manueles	Identidad	1208-1973-00223
Cargo		Cantidad	LPS. 725,585.92
DESCRIPCION			
Pago de Segunda estimación de proyecto de electrificación con interconexión a la red en la aldea Rancho Grande en el municipio de Aguanqueterique, La Paz, por un monto de Lps. 725,585.92. exactos			
Forma de Pago		Efectivo	☐
Credito ☐	Contado ☐	Cheque	☒
Autorización de Pago		Realizo el Pago	
Cargo:	Alcalde Municipal	Cargo:	Tesorera Municipal
Nombre	Erlin Omar Rodríguez	Nombre	Xenia Isakelene Chérrez
Identidad	1202-1975-00082	Identidad	1202-1989-00152
Firma y sello		Firma y sello	
Fecha	19 Mayo 2022	Fecha	19 Mayo 2022
Recibe Conforme:			
Cargo:	Gerente Proyecto	Nombre:	Javier Fermín Calix
Fecha:	19-MAYO-2022	Identidad	1208197300223
Celular:	99282931	Firma	



10-701-00172-1
BANCA DE OCCIDENTE S.A.
CALLE 147, TEL. 2242-2242
PUEBLO NUEVO, HONDURAS

CHEQUE No. 81992822

Lugar y Fecha

19 Mayo 2022


Páguese a la orden de Xavier Fermen Calix Manueles


L 721,585.92

Cantidad en letras Setecientos Veintiun mil quinientos ochenta y cinco 92/100


Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



101701079100117010015729181992822



Bo. El Centro, Zona San Miguel, **No. FACTURA**
 Marcala la Paz. **000-001-01-00**
Tel: 3357-4865 **001079**

diconelec@gmail.com

Recibido

[illegible]


ESTIMACION NO. II
MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ

PROYECTO: PROYECTO CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION RURAL CON INTERCONEXION A LA RED
UBICACIÓN: EN LA ALDEA DE RANCHO GRANDE MUNICIPIO AGUANQUETERIQUE, LA PAZ.
EJECUTOR : DICONELEC S DE R.L.
ESTIMACION No. II

supervisor

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANT	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
	RANCHO GRANDE											
1	ESTRUCTURA TM -2T- 1F (p/34.5 KV)	C/U	19.00	6,517.24	123,827.56	19.00	123,827.56		0.00	19.00	123,827.56	
2	ESTRUCTURA TM-1-1F (p/34.5 KV)	C/U	3.00	2,681.03	8,043.09	3.00	8,043.09		0.00	3.00	8,043.09	100.0
3	ESTRUCTURA TM-2R-1F (p/34.5 KV)	C/U	4.00	2,758.62	11,034.48	4.00	11,034.48		0.00	4.00	11,034.48	100.0
4	ESTRUCTURA TM-2-1F (p/34.5 KV)	C/U	2.00	5,000.00	10,000.00	2.00	10,000.00		0.00	2.00	10,000.00	100.0
6	ESTRUCTURA A-I-2 (p/34.5 KV)	C/U	7.00	2,252.80	15,769.60	7.00	15,769.60		0.00	7.00	15,769.60	100.0
7	ESTRUCTURA A-I-4 (p/34.5 KV)	C/U	5.00	2,376.99	11,884.95	5.00	11,884.95		0.00	5.00	11,884.95	100.0
8	ESTRUCTURA A-I-6 (p/34.5 KV)	C/U	2.00	4,123.35	8,246.70	2.00	8,246.70		0.00	2.00	8,246.70	100.0
9	ESTRUCTURA A-I-1 (p/34.5 KV)	C/U	1.00	1,219.83	1,219.83	1.00	1,219.83		0.00	1.00	1,219.83	100.0
10	ESTRUCTURA B-II-1A	C/U	4.00	1,344.82	5,379.28	4.00	5,379.28		0.00	4.00	5,379.28	100.0
11	ESTRUCTURA B-II-2A	C/U	5.00	950.88	4,754.40	5.00	4,754.40		0.00	5.00	4,754.40	100.0
12	ESTRUCTURA B-II-3A	C/U	18.00	1,173.94	21,130.92	18.00	21,130.92		0.00	18.00	21,130.92	100.0
13	ESTRUCTURA B-II-4A	C/U	26.00	1,110.87	28,882.62	26.00	28,882.62		0.00	26.00	28,882.62	100.0
14	ESTRUCTURA B-II-IB	C/U	8.00	2,346.96	18,775.68	8.00	18,775.68		0.00	8.00	18,775.68	100.0
15	DETALLE DE NEUTRO B-I-1	C/U	1.00	490.00	490.00	1.00	490.00		0.00	1.00	490.00	100.0
16	DETALLE DE NEUTRO B-I-4	C/U	1.00	582.12	582.12	1.00	582.12		0.00	1.00	582.12	100.0
17	DETALLE DE NEUTRO B-I-3	C/U	1.00	727.65	727.65	1.00	727.65		0.00	1.00	727.65	100.0
15	G-I-1	C/U	6.00	595.00	3,570.00	6.00	3,570.00		0.00	6.00	3,570.00	100.0
16	G-I-2	C/U	20.00	820.00	16,400.00	20.00	16,400.00		0.00	20.00	16,400.00	100.0
17	G-I-4	C/U	2.00	727.65	1,455.30	2.00	1,455.30		0.00	2.00	1,455.30	100.0
18	RETENIDA RETENIDA RB	C/U	41.00	3,540.00	145,140.00	41.00	145,140.00		0.00	41.00	145,140.00	100.0
19	RETENIDA RETENIDA RTD	C/U	15.00	3,600.00	54,000.00	15.00	54,000.00		0.00	15.00	54,000.00	100.0
18	RETENIDA E-I-1	C/U	42.00	2,585.93	108,609.06	42.00	108,609.06		0.00	42.00	108,609.06	100.0
19	RETENIDA E-I-2	C/U	15.00	3,050.56	45,758.40	15.00	45,758.40		0.00	15.00	45,758.40	100.0
21	CONEXIÓN A TIERRA CT-LDX	C/U	38.00	921.19	35,005.22	38.00	35,005.22		0.00	38.00	35,005.22	0.0
22	ILUMINACION VP-AP, 100W	C/U	30.00	2,231.46	66,943.80		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
23	POSTE DE MADERA DE 45', CLASE 4	C/U	8.00	12,000.00	96,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
24	POSTE DE MADERA DE 40', CLASE 4	C/U	23.00	9,604.98	220,914.54		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
25	POSTE DE MADERA DE 35', CLASE 5	C/U	12.00	9,022.86	108,274.32		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
26	POSTE DE MADERA DE 30', CLASE 4	METRO	40.00	7,082.46	283,298.40		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
27	CABLE 1/4 ACERADO HILO DE GUARDA	C/U	7,415.00	33.00	244,695.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
28	CABLE # 2 ACSR S/F	C/U	3,796.00	40.74	154,649.04		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
29	CABLE # 1/0 ACSR S/F	C/U	8,200.00	43.65	357,930.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
30	CABLE # 1/0 AWG, TW	C/U	6,000.00	45.9	275,400.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
31	TRANSFOR. DE 15KVA, 34.5/19.9KV-240-11	C/U	6.00	61,733.82	370,402.92		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0
32	CUCHILLA PORTAFUSIBLE, 100 A, 27KV (34.5KV)		1.00	9,100.00	9,100.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.0

	SUB TOTAL PROYECTO		2,868,294.88		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	172,097.69	69,727	69,726.62		0.00	69,726.62	69,726.62	0.00
	UTILIDAD DEL PROYECTO	1.00	300,893.01	95,000	95,000.00		0.00	95,000.00	95,000.00	31.1
	TOTAL PROYECTO		3,341,285.58		721,585.92		0.00		721,585.92	21.1

FIRMA:   NOMBRE: _____ FECHA: _____	de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo la presente.





Servicios para Proyectos:

Industriales

Hidroeléctricos



Minería

Telecomunicaciones

Gubernamentales y Municipales

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES S de R.L.

***Ingeniería *Diseño *Presupuesto *Suministro *Construcción * Mantenimiento**

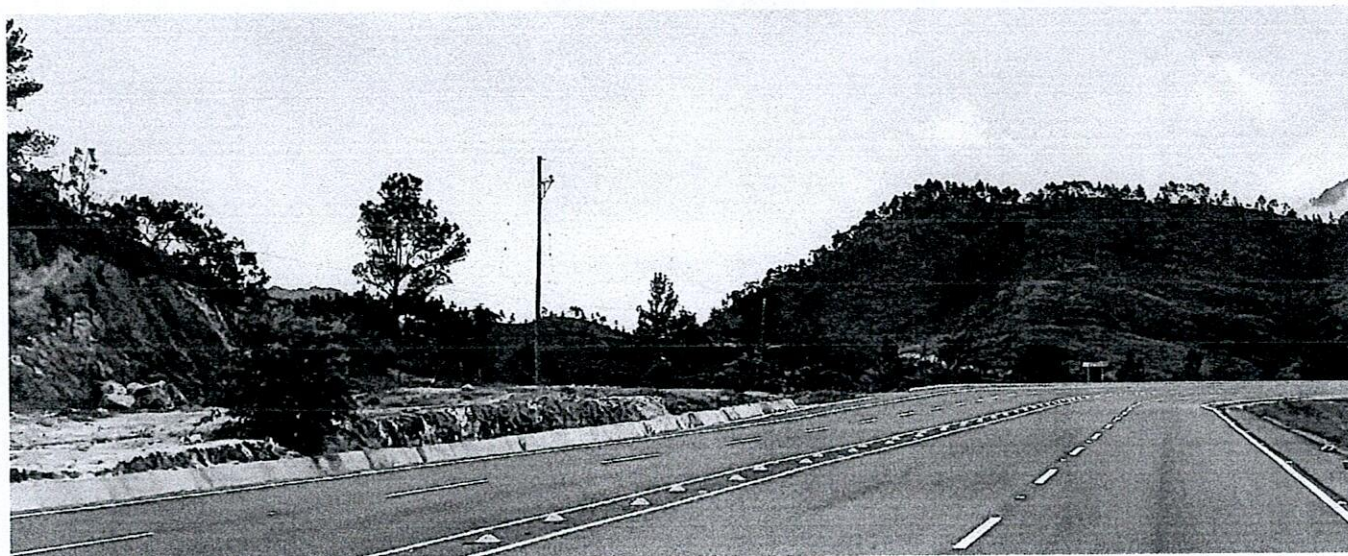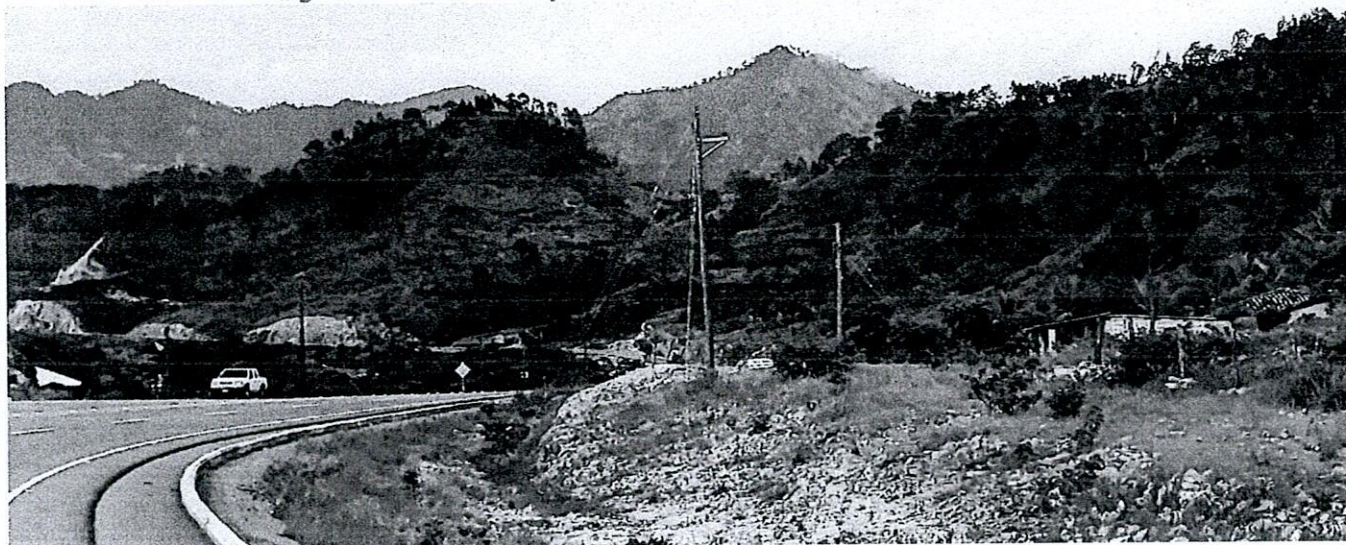

Diseños y Construcciones Electromecánicas y Civiles (Honduras y Nicaragua)

Oficina: Barrio San Rafael Marcala la Paz frente IHCAFE, Honduras, C.A. Cel : 00504-9928-2931



Email: cjavierfermin@yahoo.es Web: www.diconelec.com



Servicios para Proyectos:
Industriales
Hidroeléctricos
Minería
Telecomunicaciones
Gubernamentales y Municipales

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS Y CIVILES S de R.L.

***Ingeniería *Diseño *Presupuesto *Suministro *Construcción * Mantenimiento**

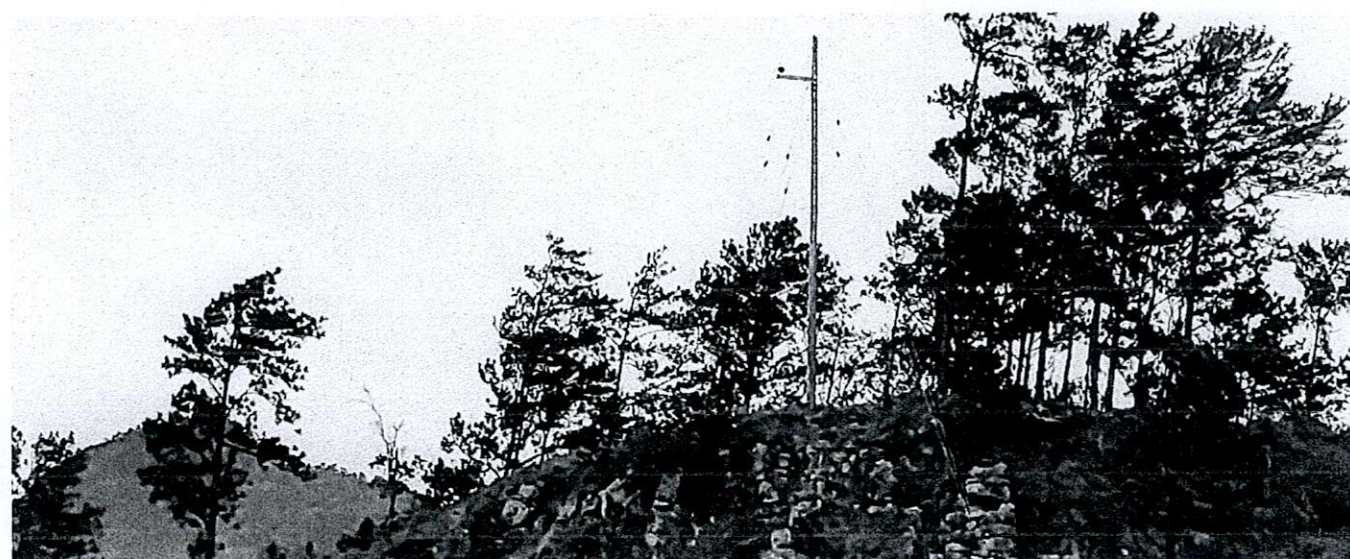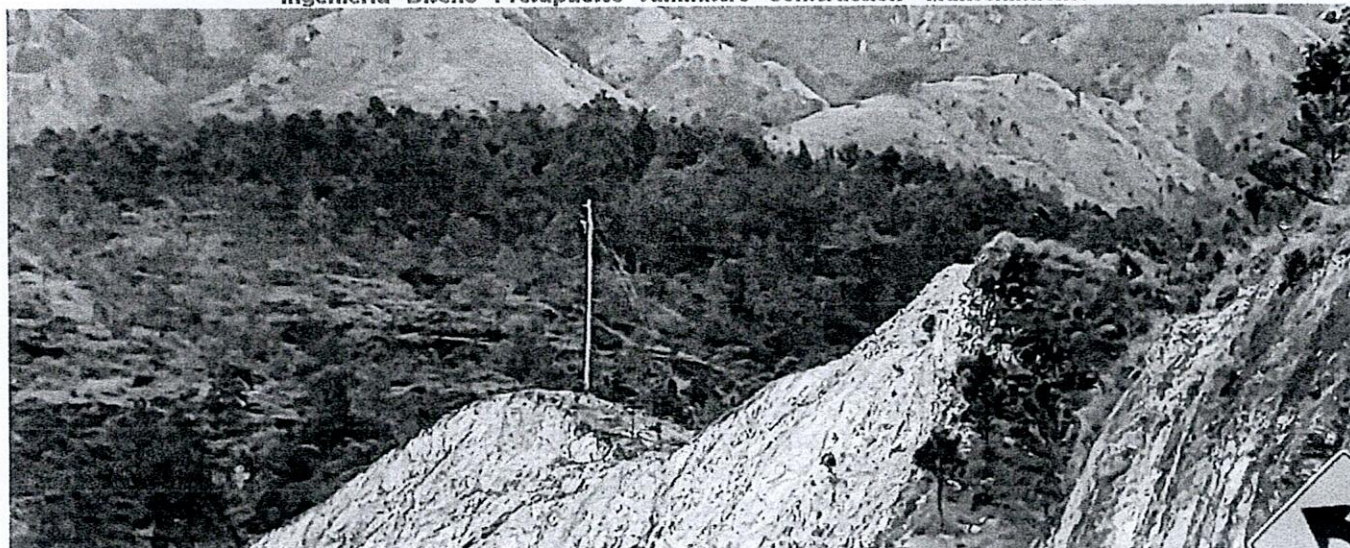

Diseños y Construcciones Electromecánicas y Civiles (Honduras y Nicaragua)
Oficina: Barrio San Rafael Marcala la Paz frente IHCAFE, Honduras, C.A. Cel : 00504-9928-2931
Email: cjavierfermin@yahoo.es Web: www.diconelec.com
