

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Marcovia, 10 de enero de 2025

NOTA INFORMATIVA

Por medio de la presente envío documentación del proceso de **Licitación Privada LP-01-2024** para el proyecto de **Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo en San José de las Conchas, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.**

Sin otro particular.

Por Dinora Lainez

José Daniel Maldonado

Admón. Unidad de Infraestructura





Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2024
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: JEISI.BORJAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46458

L.: 245,422.86

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8652

Fecha de Emisión: 6/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Id/RTN: 0601198405972

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO AL SR. VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO ESTIMACION #4 L. 306,778.58 MENOS DEDUCCION DEL 20% ANTICIPO DE ESTA ESTIMACION L. 61,355.72 DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPE E=20CM EN SAN JOSE DE LAS CONCHAS (CAMINOS PRODUCTIVOS), MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. VALOR DEL CONTRATO L. 1, 492,321.19 VALOR DE (ESTIMACION N.1 L. 438,897.07), VALOR DE ESTIMACION N.2 L. 446,223.39 Y ESTIMACION N.3 L.223, 111.70 MENOS DEDUCCION DEL 20% ANTICIPO DE ESTA ESTIMACION L. 44,622.34 TOTAL A PAGAR L. 178,489.36 MENOS ESTIMACION N.4 L. 306,778.58 MENOS DEDUCCION DEL 20% ANTICIPO DE ESTA ESTIMACION L. 61,355.72 QUEDANDO UN SALDO ACTUAL DEL CONTRATO L. 77,310.45 TOTAL A PAGAR L. 245,422.86

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 072 000 001 47210 11-011-04	Construcción de Pavimento con Concreto Ciclope en San José De Las Conchas en el Municipio de Marcovia, departamento de Choluteca (caminos Productivos)	245,422.86

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	CONVENIO ENTRE ALCALDIA Y LA SECRETARIA DE ESTADO PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS	245,422.86
Monto Total:		245,422.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	245,422.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	245,422.86

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0601198405972

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yQVgnhCyQs6X+G74MMXm3IRj+Qs6VrvkjlrOgwVsJTihKuqEWRx26OMisXikQUF/UDFHPdIH4z2IYcoVELLIS.J WMLUD3icgSYAvFot+NUeERNhbrkjuSNugJTdl1z17n78=

COMPROBANTE DE RECIBO

DIA 6 MES Diciembre AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA,
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

NOMBRE Vasco Abalid Aguilar Alvarez

RECIBI DE LA SEÑORA TESORERA LA CANTIDAD DE
LPS. 245,422.86

Doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintidos
con ochenta y seis centavos.


POR CONCEPTO DE: pago estimación #4

al Sr. Vasco Abalid Aguilar Alvarez por
contrato de construcción de pavimento con concreto Cidape

SOLVENCIA MUNICIPAL

IDENTIDAD NO, 0601 MSA 0592

FIRMA




VO BO ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Para:

José Nahum Cahix
Alcalde Municipal



De:

Lic. José Daniel Maldonado
Unidad de Infraestructura



Asunto:

Lo Descrito

Fecha:

27 de noviembre de 2024

Sirva la presente para solicitarle Autorice el pago al señor Vasco Adalid Aguilar Álvarez, por concepto de pago Estimación # 4 del contrato "Construcción de Pavimento con concreto ciclópeo e=20cm en San José de las Conchas", Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca.

Valor total del contrato	L.	1, 492, 321.19
Valor de Estimación N° 1	L.	438, 897.07
Valor de Estimación N° 2	L.	446, 223.39
Valor de Estimación N° 3	L.	223, 111.70
Valor de Estimación N° 4	L.	306, 778.58
Menos deducción 20% anticipo de esta estimación		61, 355.72
Total a pagar	L.	245, 422.86

Total a pagar (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintidós Lempiras con Ochenta y Seis Centavos).

SALDO ACTUAL DEL CONTRATO L. 77, 310.45



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011984059720**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 00011994059720

VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ
 Nombre o Razón Social

	Inscripciones
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Código de Emisión: 20120622

Este registro se funda en el Decreto N° 100 del 5 de Enero de 1974, reformado por el Decreto N° 266 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 266 del 10 de Agosto de 2002, Art. 66 del Decreto N° 266 del 10 de Agosto de 2002, Art. 29 del Decreto N° 266 del 10 de Agosto de 2002, Ley de Estructura Financiera y de la Protección Social, Art. 17 del Decreto 51-2005 del 10 de Abril de 2005, Art. 5 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20830 y el Reglamento N° 1973-1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20830 y el Reglamento N° 1973-1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20830.

[Handwritten Signature]



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Este contribuyente recuerda su obligación de concurrir a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario, para que pueda continuar realizando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Registro de Documentos: 001-112-1048707

Transacción: 000004



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011984059720**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
CHOLUTECA-HONDURAS, C.A.
 Tel. 2722-2071 / 2722-2072



Estimacion de Avance de obra

Contrato de Obras: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA."

Ubicación: SAN JOSE DE LAS CONCHAS, MARCOVIA, CHOLUTECA.

Nombre del Contratista: Vasco Adalid Aguilar Alvarez

Estimación No.4

fecha 26/11/2024

No.	Region	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR				ESTA ESTIMACIÓN				ESTIMACIÓN ACUMULADA				POR EFECTUAR				
		unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Cantidad	P. Unitario	Total	% de Avance	Cantidad	P. Unitario	Total	% de Avance	Cantidad	P. Unitario	Total	% de Avance	Cantidad	P. Unitario	Total	% de Avance	
1	PRELIMINARES																					
1.1	Limpieza de Terreno	M2	1739.88	L 7.70	L 13,397.08	1739.88	7.70	13,397.08	100%	L 7.70	L -	0%	1,739.88	L 7.70	L 13,397.08	100%	-	7.70	L -	0%		
1.2	Excavacion de Material	M3	173.99	L 481.25	L 83,732.69	173.99	481.25	83,732.69	100%	L 481.25	L -	0%	173.99	L 481.25	L 83,732.69	100%	-	481.25	L -	0%		
1.3	Trazado y Maracado	ML	386.64	L 33.46	L 12,938.13	386.64	33.46	12,938.13	100%	L 33.46	L -	0%	386.64	L 33.46	L 12,938.13	100%	-	33.46	L -	0%		
	SUBTOTAL				L 110,067.90			110,067.90	100%	L -	L -	0%		L 110,067.90	100%		L -	L -	0%			
2	RELLENO Y CONFORMACION																					
2.1	Releño y compactado con material selecto	M3	86.99	L 1,001.55	L 87,124.83	86.99	1,001.55	87,124.83	100%	L 1,001.55	L -	0%	86.99	L 1,001.55	L 87,124.83	100%	-	1,001.55	L -	0%		
	SUBTOTAL				L 87,124.83			87,124.83	100%	L -	L -	0%		L 87,124.83	100%		L -	L -	0%			
3	CONCRETO CICLOPEO																					
3.1	Concreto Ciclopeo e=20 cm proporción 1:2:3	m3	347.98	3,718.53	L 1,293,973.46	245.00	3,718.53	911,039.42	70%	82.50	L 3,718.53	L 306,778.58	24%	327.50	L 3,718.53	L 1,217,818.00	94%	20.48	L 3,718.53	L 76,155.46	6%	
	SUBTOTAL				L 1,293,973.46			911,039.42	70%	L 306,778.58	L 306,778.58	24%		L 1,217,818.00	94%		L 76,155.46	6%				
4	Obras Finales																					
4.0	Limpieza Final	JRD	1.00	1,155.00	L 1,155.00	0.00	1,155.00	-	0%	L 1,155.00	-	0%	-	L 1,155.00	-	0%	1.00	L 1,155.00	L 1,155.00	100%		
	SUBTOTAL				L 1,155.00			-	0%	L -	L -	0%		L -	0%		L 1,155.00	L 1,155.00	100%			
	TOTAL INVERSI				L 1,492,321.19			1,108,232.15	74%	L 306,778.58	L 306,778.58	21%		L 1,415,010.73	95%		L 77,310.46	L 77,310.46	9%			

Monto Ejecutado este Periodo	306,778.58
Amortización Anticipo	61,355.72
Retención del ISR	-
Total a pagar en este periodo	245,422.86

Monto Contratado	L 1,492,321.19
I Estimación	L 438,897.07
II Estimación	L 446,223.39
III Estimación	L 223,111.70
IV Estimación	L 306,778.58
Retenciones Acumuladas	-
Pagos Totales Acumulados	L 1,415,010.73
Saldo por Pagar	L 77,310.45

Daniel Meléndez
 Proyectos Municipales
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
 CHOLUTECA, HONDURAS

Vasco Adalid Aguilar Alvarez
 Contratista
 INGENIERO CIVIL
 18-03-10
 23-03-10
 C.I.C.H. N° 4933

Nahuri de la Cruz
 Alcalde Municipal
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA
 CHOLUTECA, HONDURAS

INFORME DE AVANCE DE OBRA

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”

Alcaldía Municipal de Marcovia

**UBICACIÓN: San Jose de Las Conchas, Municipio de Marcovia,
Departamento Choluteca.**

**Constructor Obras civiles
ING. VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ CICH 4833**

MARCOVIA, CHOLUTECA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024



Contenido

1) INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	4
1.1. Nombre del Proyecto	4
1.2. Financiamiento	4
1.3. Unidad Ejecutora.....	4
1.4. Descripción de las obras de construcción	4
1.5. Localización del Proyecto	4
2) INFORME DE CONSTRUCCION	5
2.1. Periodo del informe:.....	5
2.2. El resumen del contrato de construcción:.....	5
2.3. Breve análisis del cumplimiento del programa de trabajo	5
2.4. Las actividades realizadas	5
2.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA	6
2.6. Equipo y herramientas del contratista:.....	6
2.7. Estado del tiempo	7
2.8. Programa de trabajo.....	7
3) INFORME DE LA SUPERVISION	7
3.1. Ente supervisor	7
3.2. La supervisión realizó las siguientes actividades:.....	7
4) OBSERVACIONES	7
5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	8
6) INFORME FOTOGRAFICO	9



Marcovia, Choluteca 26 de noviembre del 2024

Sr. Alcalde

Jose Nahun Calix Alvarez


Distinguido alcalde:

Adjunto remito a usted el informe #4 de **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.**" correspondiente al periodo del 13 al 26 de noviembre del 2024.

Acorde y conforme a las cláusulas contractuales del contrato

Sin otro particular

Atentamente,



Daniel Maldonado
Infraestructura.



1) INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto

“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E= 20 CM EN SAN JOSÉ DE LAS CONCHAS, MUNICIPIO DE MARCOVIA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.”

1.2. Financiamiento

Alcaldía municipal de Marcovia 100%

1.3. Unidad Ejecutora


Alcaldía municipal de Marcovia

1.4. Descripción de las obras de construcción

Construcción pavimento ciclópeo de 4.5 m de ancho y 20 cm de espesor desde muelle hasta calle principal.

1.5. Localización del Proyecto

El proyecto se construye en el departamento de Choluteca, municipio de Marcovia en San Jose de las Conchas

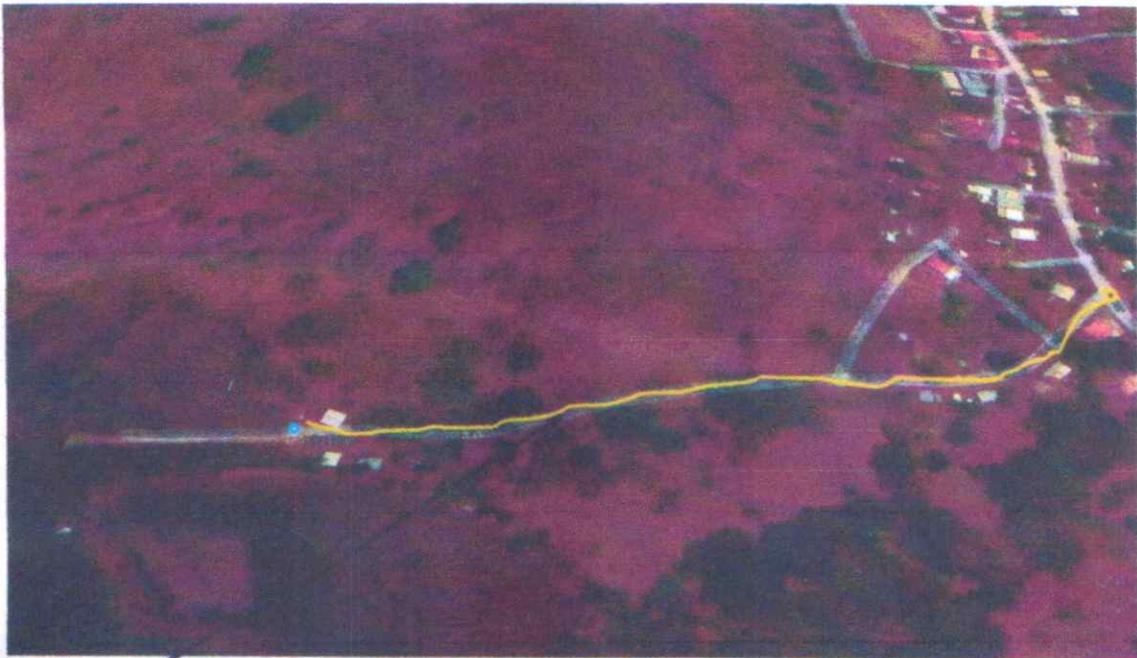

Pavimento / Coordenadas UTM 16P 456775.63 m E 1472656.12 m N



2) INFORME DE CONSTRUCCION

2.1. Periodo del informe:

Este informe se elabora con las actividades realizadas en el proyecto durante el 7 al 13 de noviembre del 2024.

2.2. El resumen del contrato de construcción:

CONCEPTO	CONTRATISTA
Nombre de contratista	Vasco Adalid Aguilar Alvarez
Fecha de Inicio	18 de octubre 2024
Fecha de Terminación	18 de enero del 2024
Monto contractual	Lps. 1,492,321.19
Modificaciones de plazo (indicar nuevas fechas de terminación)	NO SE HA MODIFICADO
Modificaciones en monto (indicar nuevo monto contractual)	NO SE HA MODIFICADO
Monto ejecutado	Lps. 1,415,010.73
Monto facturado	Lps. 1,108,232.15
% de avance físico programado	70%
% de avance físico Ejecutado	95%
Monto de avance financiero programado	Lps. 1,044624.83
Plazo contractual Original	90 dias
Plazo contractual modificado	No se ha modificado

2.3. Breve análisis del cumplimiento del programa de trabajo

Durante este período han caído tormentas muy fuertes lo cual afecta el avance de la obra pero esto no ha retrasado la ejecución de la obra .

2.4. Las actividades realizadas

Se han realizado las siguientes actividades durante este período:

Renglon			
	unidad	Cantidad	% de Avance
PRELIMINARES			
Limpieza de Terreno	M2	1739.88	100%



Excavacion de Material	M3	173.99	100%
Trazado y Maracado	ML	386.64	100%
SUBTOTAL			100%
RELLENO Y CONFORMACION			
Relleno y compactado con material selecto	M3	86.99	100%
SUBTOTAL			100%
CONCRETO CICLOPEO			
Concreto Ciclopeo e=20 cm proporcion 1:2:3	m3	347.98	94%
SUBTOTAL			94%
Obras Finales			
Limpieza Final	JRD	1.00	0%
SUBTOTAL			0%
TOTAL INVERSI			95%

2.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA

- 1 ingeniero residente
- 1 maestro de obra
- 3 albañiles
- 10 ayudantes
- 3 conductores
- 1 operador de retroexcavadora

2.6. Equipo y herramientas del contratista:

#	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Vehículo 4x4	1 unidad	Buen estado	ninguna
2	Plantas Generadoras	1 unidades	Buen estado	ninguna
3	Palas	12 unidades	Buen estado	ninguna
4	Piochas	2 unidades	Buen estado	ninguna
5	Barras	3 unidades	Buen estado	ninguna
6	Almárganas	3 unidades	Buen estado	ninguna
7	Serrucho	1 unidades	Buen estado	ninguna
8	Alicates	3 unidades	Buen estado	ninguna
9	Martillos	3 unidades	Buen estado	ninguna
10	Cubetas	8 unidades	Buen estado	ninguna
11	Puntas y cinceles	8 unidades	Buen estado	ninguna
12	Grifas	6 unidades	Buen estado	ninguna
13	Niveles	2 unidades	Buen estado	ninguna
14	Escuadras	3 unidades	Buen estado	ninguna
15	Sierras circulares	2 unidades	Buen estado	ninguna
16	taladros	1 unidades	Buen estado	ninguna
17	Motosierra	1 unidad	Buen estado	ninguna
18	Carretillas de mano	4 unidades	Buen estado	ninguna



19	Camión de 4 toneladas	1 unidad	Buen estado	ninguna
20	Volqueta de 15 m3	2 unidades	Buen estado	ninguna
21	Retroexcavadora	1 unidad	Buen estdo	ninguna

2.7. Estado del tiempo

Lluvias fuertes han caído en este periodo de no ser por estas lluvias el proyecto estaría en un mejor porcentaje de avance.

2.8. Programa de trabajo

Se adjunta la copia en los anexos, del programa de trabajo.

3) INFORME DE LA SUPERVISION

3.1. Ente supervisor

Las instituciones responsables de la supervisión son Alcaldía municipal de Marcovia y SIT con las cuales se ha sostenido constante comunicación y se han sostenido varias reuniones de trabajo.

3.2. La supervisión realizó las siguientes actividades:

Durante este periodo se ha tenido comunicación vía teléfono, correo electrónico y de manera presencial con los supervisores, se ha tenido la supervisión de la ing. Osmany Aguilera representante de SIT, también se ha tenido la visita de técnicos municipales y del alcalde municipal y de parte de la comunidad hemos tenido el acompañamiento de le presidente de los pescadores Carlos Peña para verificar el avance de la obra realizaron las siguientes actividades:

- ▶ Verificación de las actividades de las obras ejecutadas.
- ▶ Se hizo un control fotográfico del proyecto para tener a futuro el álbum fotográfico conforme avanza el proyecto.
- ▶ Inspección de los materiales a usar por el contratista para corroborar la calidad

4) OBSERVACIONES

El volumen de relleno considerado en la obra es de solo 5 cm lo cual dejaría una base no acta par el pavimento por lo cual al alcadia ha aprobado un volumen extra el cual será definido por los niveles y estará entre 15 y 20 cm.

Se ha instalado una alcantarilla de 24 pulgadas para aliviar un paso de agua natural que podría dañar la obra en el futuro.

Se construyeron obras tipo vado para el pase de agua lluvia.



5) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La obra se ha construido siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo cual nos da como resultado una obra de calidad apta a las condiciones del sitio.



6) INFORME FOTOGRAFICO





VASCO ADALID AGUILAR ALVAREZ

Bo. San Pedro Sur, 2.5 cuadras al oeste de Pollos Campeón
Choluteca, Honduras, C.A. // RTN. 06011984059720
TEL. (+504) 3207-3016 // E-mail: vaaa2006@hotmail.es

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES:

000-001-04-00000358

POR L. 245,422.86

Recibí de: Alcaldía municipal de Maricavia RTN: 06079995201200

La suma neta de: Descientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintidos B/100

Por concepto de: Pago estimación #4 proy. Construcción de pavimento con concreto Uplapoo C-2002 Son por 36 canchales

CAI: 23207B-C80B4A-11A9E0-63BE03-0909E0-A4

6 de diciembre del 2024

Total por Honorarios: _____

Total de la Retención: _____

Total Neto Recibido: 245422.86

FIRMA



Fecha límite de Emisión 27/09/2025
Rango Autorizado: 000-001-04-00000351 al 000-001-04-00000400

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1963-000127 // SEP-2024 // 1COP. QUM.
CERTIFICADO SAR // 9231-23-10500-137

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



SEPA. ST. 19800. 100

Municipalidad de Marcovia, Choluteca

Comprobante de Pago

RTN: 06079995201200

No. Recibo: 163187

Fecha Recibo: 10/12/2024

Identidad: 0601198405972

Nombre: Vasco Adalid Aguilar Alvarez

Dirección: marcovia

Detalle: PAGO DE SOLVENCIA MUNICIPAL

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111101	Impuesto Personal	1.00	802.13
11111817	Tasa Ambiental	1.00	10.00
Total:			812.13

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
299290(Diciembre-2024).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Facturó: Kelvin
Cajero: EdithG

MARCOVIA

CHEQUE No. 00012705

Alcaldía Municipal de Marcovia, Barrio El Centro, Frente a Plaza Cívica,
Marcovia, Choluteca, Tels: 2722-2071, 2722-2072
Cuenta N°.: 11-501-001904-3

Marcovia 6 Diciembre 2024
Lugar y Fecha

Vasco Adalid Aguiar Alvarez
Páguese a la orden de

L. 245,422.86

Doscientos Cuarenta y cinco mil cuatrocientos veintidos con 86/100
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.



Francis Florio Aguiar
Firma(s)

0015010790011501001904300012705

CUENTA N°

DESCRIPCION AUXILIAR

DEBE

HABER

Pago por concepto estimación
4 menos deducción
20% anticipo contrato
construcción pavimento ciclope
E 20cm San Jose concha
Manovia

VOUCHER

TOTAL

245,422.86

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

N° 00012705

06011534054
