



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25559

L.: 1,415,425.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11271

Fecha de Emisión: 6/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CONSTRUCTORA ROMERO Y ASOCIADOS S.A.

Id/RTN: 05019019129794

La Cantidad en Letras: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Por pago de Segunda Estimación del Proyecto Construcción de Boulevard La Amistad, del 13 de febrero al 04 de marzo, 2025 según contrato No. 156 factura No. 000-001-01-00000559 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Boulevard Barrio El Centro y ceden	1,415,425.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,415,425.70
Monto Total:		1,415,425.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,415,425.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,415,425.70

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0501-9019-129794

0s+js/j9JmezATh86pbI37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AQpmKIWOnznwX/5UsQd7null1oHjsFecFGZj2/5Dmr+9wYu4vkA5ovbRkjKppu01Z/NYNTLzrMD

06/03/2025 01:56:32 p.m.



Constructora Romero & Asociados S.A.

Col. Altiplano, 25 Calle, 21-24 Ave., S.O., 3 mts. de Caseta Vigilancia, Cel.: 9441-2940
San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: constructora.romero@outlook.com

DIA	MES	ANO
5	Marzo	2025

R.T.N. 05019019129794

Cliente: Municipalidad de Santa Rita R.T.N.: 1808 - 9005 - 500560

Dirección: Santa Rita, Yoro No. Orden de Compra: _____ No. Constancia Registro de Exonerado _____ No. Registro de la SAG _____

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Descuentos / Rebajas Otorgadas	Total L.
1	Pago por Estimación Avance de Obra No. 2 de Proyecto "Boulevard La Amistad" de Santa Rita.	1,415,425.70		1,415,425.70

CAI: 2CB44A-DA3D34-3F1DE0-63BE03-0909DC-88
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000600

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2026

Fecha de Recepción Doc.: 27-01-2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000559

Contado



Crédito



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Impto .S.V. 15% L.

Impto .S.V. 18% L.

TOTALA PAGAR L.

1,415,425.70

Impreisa Tel. 2503-2022 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-23-10500-116 * Enero 2025

Importe Valor en Letras: Un millon cuatrocientos quince mil cuatrocientos veinte y cinco Lempiras con 70/100



PROYECTO CONSTRUCCION BOULEVARD LA AMISTAD
LPuN-04-AMSR-0824 CONTRATO N.156
SANTA RITA, YORO
PERIODO DE ESTIMACION DEL 13 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DEL AÑO 2025
ESTIMACION NO. 2



						Estimacion Anterior No.1		Estimación Actual No.2		
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	Cantidad	Valor	Cantidad a Estimar	Valor	%
1. BOULEVARD LA AMISTAD										
1	TRAZADO Y MARCADO	GLB	1.00	L415,800.00	L415,800.00	0.5	L 207,900.00	0.5	L 207,900.00	100%
2	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA (INCLUYE BOTADO)	M2	3,450.00	L111.54	L384,813.00	3450	L 384,813.00			100%
3	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE BOTADO)	M3	431.25	L349.80	L150,851.25	431.25	L 150,851.25			100%
4	EXCAVACION NO CLASIFICADA (INCLUYE SUBEXCAVACIONES)	M3	2,975.63	L150.59	L448,100.12					
5	CONFORMACION DE SUB RASANTE	M2	6,612.50	L45.27	L299,347.88					
6	RELLENO CON MATERIAL SELECTO	M3	1,653.13	L189.24	L312,838.32					
7	ESTABILIZACION DE SUB BASE	M3	1,322.50	L496.25	L656,290.63					
8	FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI Y MR600 15 CM	M3	991.87	L3,987.50	L3,955,081.63					
9	COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO	M2	6,612.50	L126.31	L835,224.88					
10	CORTE DE JUNTAS	ML	6,222.00	L38.20	L237,680.40					
11	SELLADO DE JUNTAS	ML	6,222.00	L35.18	L218,889.96					
12	BORDILLOS 15 X 15 CONCRETO 4000 PSI	ML	1,150.00	L249.89	L287,373.50					
13	ACERAS DE 12.5 CM CONCRETO 3500 PSI	M2	1,150.00	L554.76	L637,974.00					
14	PINTURA TRAFICO EN BORDILLOS	ML	2,300.00	L56.93	L130,939.00					
15	BORDILLOS 20 X 15 CONCRET 4000 PSI (MEDIANA)	ML	1,150.00	L261.03	L300,184.50					
16	SUMINISTRO DE PLANTAS, PALMERAS Y ARBUSTOS	GLB	1.00	L27,500.00	L27,500.00					
17	BOYAS EMPERNADAS AL PAVIMENTO	UND	200.00	L793.10	L158,620.00					
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 12" RD41	ML	667.00	L1,279.60	L853,493.20	400.2	L 512,095.92	266.80	L 341,397.28	100%
19	SUM. E INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA EN TUBO DE 12"	UND	61.00	L6,395.65	L390,134.65	4.88	L 31,210.77	56.12	L 358,923.88	100%
20	CONSTRUCCION DE POZOS CON ALTURA DE 1.50 - 2.50M	UND	8.00	L28,345.69	L226,765.52			5	L 141,728.45	62%
21	CONSTRUCCION DE POZOS CON ALTURA DE 2.50 - 3.50M	UND	6.00	L51,685.65	L310,113.90			3	L 155,056.95	50%
22	PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETO	UND	221.00	L1,934.63	L427,553.23					
SUBTOTAL BOULEVARD LA AMISTAD					L11,665,569.57					
2. CALLE ALTERNA										
23	TRAZADO Y MARCADO	GLB	1.00	L69,300.00	L69,300.00	0.5	L 34,650.00	0.5	L 34,650.00	100%
24	EXCAVACION COMUN (INCLUYE SUBEXCAVACIONES)	M3	720.00	L150.59	L108,424.80					
25	CONFORMACION DE SUB RASANTE	M2	1,600.00	L45.27	L72,432.00					
26	RELLENO CON MATERIAL SELECTO	M3	320.00	L189.24	L60,556.80					
27	SUB BASE ESTABILIZADA AL 4%	M3	400.00	L639.25	L255,700.00					
28	CONCRETO HIDRAULICO 4000 PSI Y MR600 15 CM	M3	240.00	L3,987.50	L957,000.00					
29	COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO	M2	1,600.00	L126.31	L202,096.00					
30	CORTE DE JUNTAS	ML	1,800.00	L38.20	L68,760.00					
31	SELLADO DE JUNTAS	ML	1,800.00	L35.18	L63,324.00					
32	BORDILLOS 15 X 15 CONCRETO 4000 PSI	ML	400.00	L249.89	L99,956.00					
33	ACERAS DE 12.5 CM CONCRETO 3500 PSI	M2	400.00	L554.76	L221,904.00					
34	PINTURA TRAFICO EN BORDILLOS	ML	400.00	L56.93	L22,772.00					
35	BOYAS EMPERNADAS AL PAVIMENTO	UND	60.00	L793.10	L47,586.00					
36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 12" RD41	ML	200.00	L1,279.60	L255,920.00	120	L 153,552.00	80.00	L 102,368.00	100%
37	SUM. E INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA EN TUBO DE 12"	UND	12.00	L6,395.65	L76,747.80	0.96	L 6,139.82	11.04	L 70,607.98	100%
38	CONSTRUCCION DE POZOS CON ALTURA DE 1.50 - 2.50M	UND	2.00	L28,345.69	L56,691.38			2.00	L 56,691.38	100%

39	CONSTRUCCION DE POZOS CON ALTURA DE 2.50 - 3.50M	UND	2.00	L51,685.65	L103,371.30		2.00	L 103,371.30	100%
	SUBTOTAL CALLE ALTERNA				L2,742,542.08				
3.	PORTAL DE ACCESO A BOULEVARD								
40	EXCAVACION ZAPATA CORRIDA	M3	13.50	L115.19	L1,555.07				
41	RELLENO CON MATERIAL SELECTO	M3	16.50	L210.38	L3,471.27				
42	ZAPATA AISLADA 0.50X3.00X1.50M, #5@0.20 A/S DOBLE CAMA	UND	2.00	L18,442.46	L36,884.92				
43	SOLERAS INFERIORES E INTERMEDIA 0.50X0.20, 8#4 Y #3@0.20M	ML	6.00	L1,277.04	L7,662.24				
44	COLUMNAS DE 0.50 X 0.50 CON 8#5 Y#3@ 0.15M	ML	42.50	L2,959.69	L125,786.83				
45	VIGA SUPERIOR DE 0.50 X 0.50, 8#6 Y #3@ 0.15M	ML	19.84	L2,969.59	L58,916.67				
46	PARED DE BLOQUE DE 6" FUNDIDA CON VARILLAS #3@20, 2 VAR 1/4@	M2	35.92	L1,076.28	L38,659.98				
47	ENCHAPE DE PIEDRA TIPO FAST SET EN PORTAL	M2	25.92	L1,611.50	L41,770.08				
48	SOBRERREPELLO (MOLDURA)10X10CM 2#2 Y #2@20 CONCRETO 3000PSI	ML	38.79	L268.46	L10,413.56				
49	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES	M2	148.42	L183.66	L27,258.82				
50	TALLADO DE COLUMNAS	ML	42.50	L276.52	L11,752.10				
51	PINTURA PORTAL 1 MANO SELLADOR Y 2 MANOS PINTURA EXCELLO	M2	148.42	L159.30	L23,643.31				
52	PINTURA DE LETRAS	GLB	1.00	L4,042.50	L4,042.50				
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA ILUMINAR LETRAS	UND	4.00	L5,555.00	L22,220.00				
	SUBTOTAL PORTAL DE ACCESO A BOULEVARD				L414,037.35				
4.	CONSTRUCCION DE PLAZA DE LAS BANDERAS								
54	CONSTRUCCION Y FUNDICION DE LOSA DE CIMENTACION E=15CM	M2	28.50	L1,027.37	L29,280.05				
55	ESCALINATA 3 PASOS E=CM, ARMADO #3 @15 A/S	ML	17.80	L1,027.37	L18,287.19				
56	PARED DE BLOQUE DE 6" FUNDIDA CON VARILLAS #3@20, 2 VAR 1/4@	M2	9.50	L1,076.28	L10,224.66				
57	FIRME DE ONCRETO E=10CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	7.10	L668.46	L4,746.07				
58	ASTA DE TUBO HG DE 3CON PEDESTAL PARA 6 BANDERAS	UND	6.00	L18,017.89	L108,107.34				
59	BANDERAS DE 2M X 1M PAISES CENTRAMERICANOS 1 ESCUDO DE MUNI	UND	6.00	L1,650.00	L9,900.00				
60	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES	GLB	1.00	L6,553.98	L6,553.98				
	SUBTOTAL CONSTRUCCION DE PLAZA DE LAS BANDERAS				L187,099.29				
A	COSTO DE OBRA (1+2+3+4)				L15,009,248.29				
B	ADMINISTRACION DELEGADA (3%)	Global	3.00%		L450,277.45				
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO				L15,459,525.74				
	Estimacion					L 1,481,212.76		L 1,572,695.22	
	ANTICIPO DEL 10%				L1,545,952.57				
	Deducion de anticipo				L154,595.25			L 157,269.52	
	TOTAL A ESTIMAR					L 1,326,617.51		L 1,415,425.70	

ING. JESUS RIGOBERTO ROMERO
CONSTRUCTORA ROMERO & ASOCIADOS

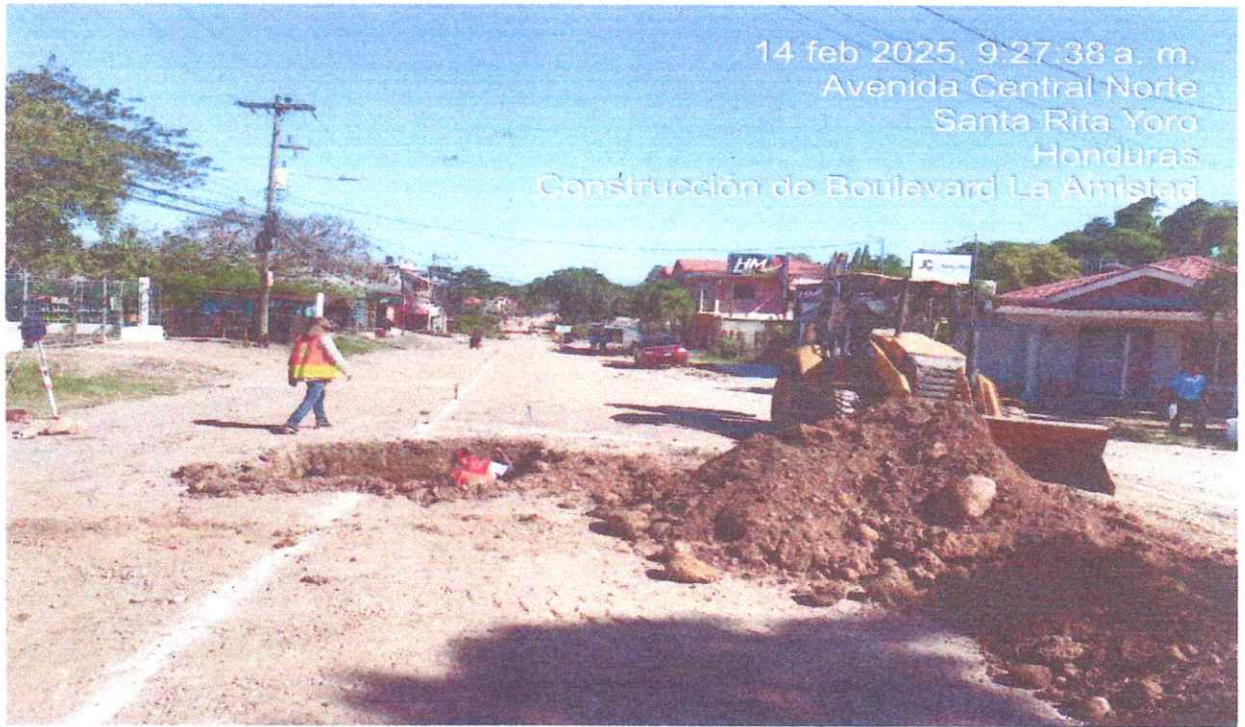




14 feb 2025, 9:22:07 a.m.
Avenida Central Norte
Santa Rita Yoro,
Honduras
Construcción de Boulevard La Amistad

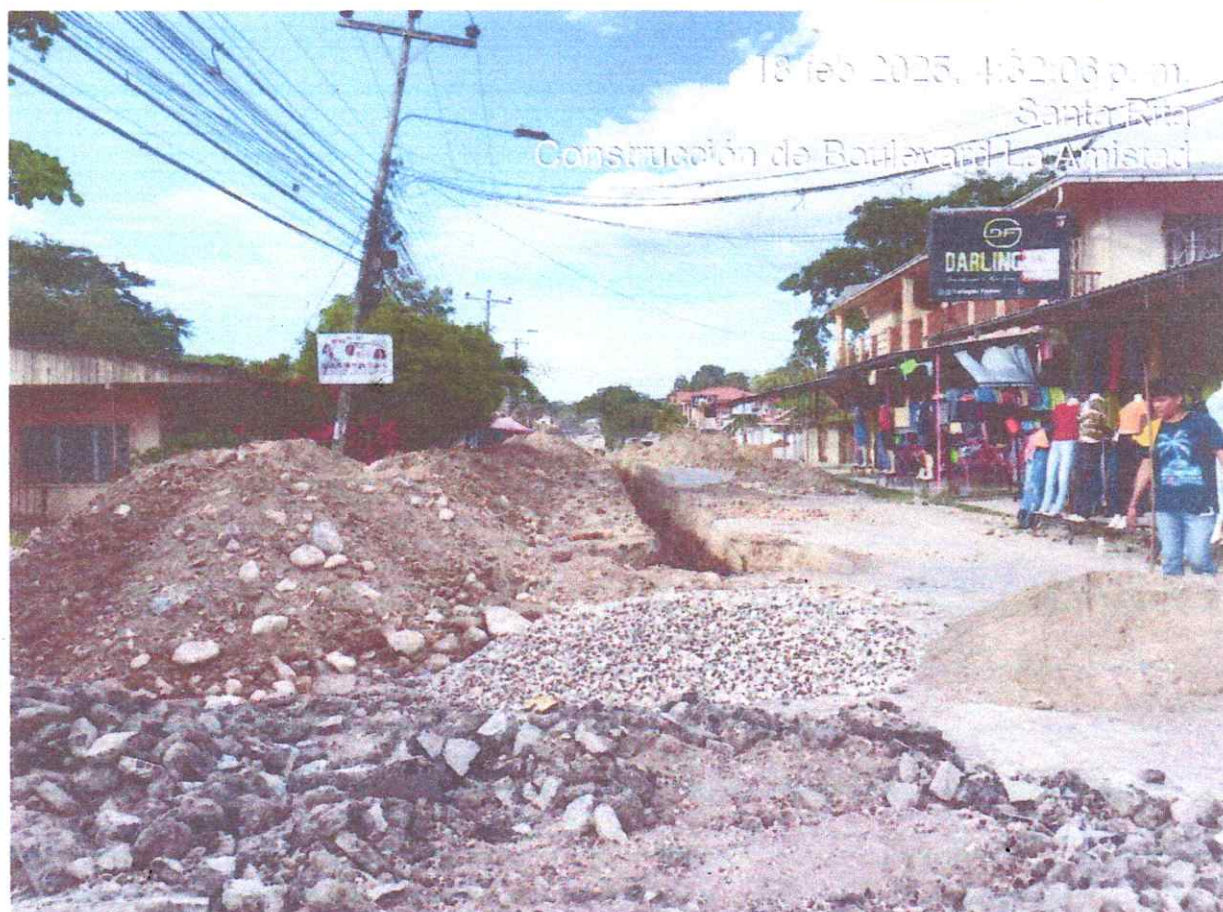


14 feb 2025, 9:26:12 a.m.
Avenida Central Norte
Santa Rita Yoro
Honduras
Construcción de Boulevard La Amistad



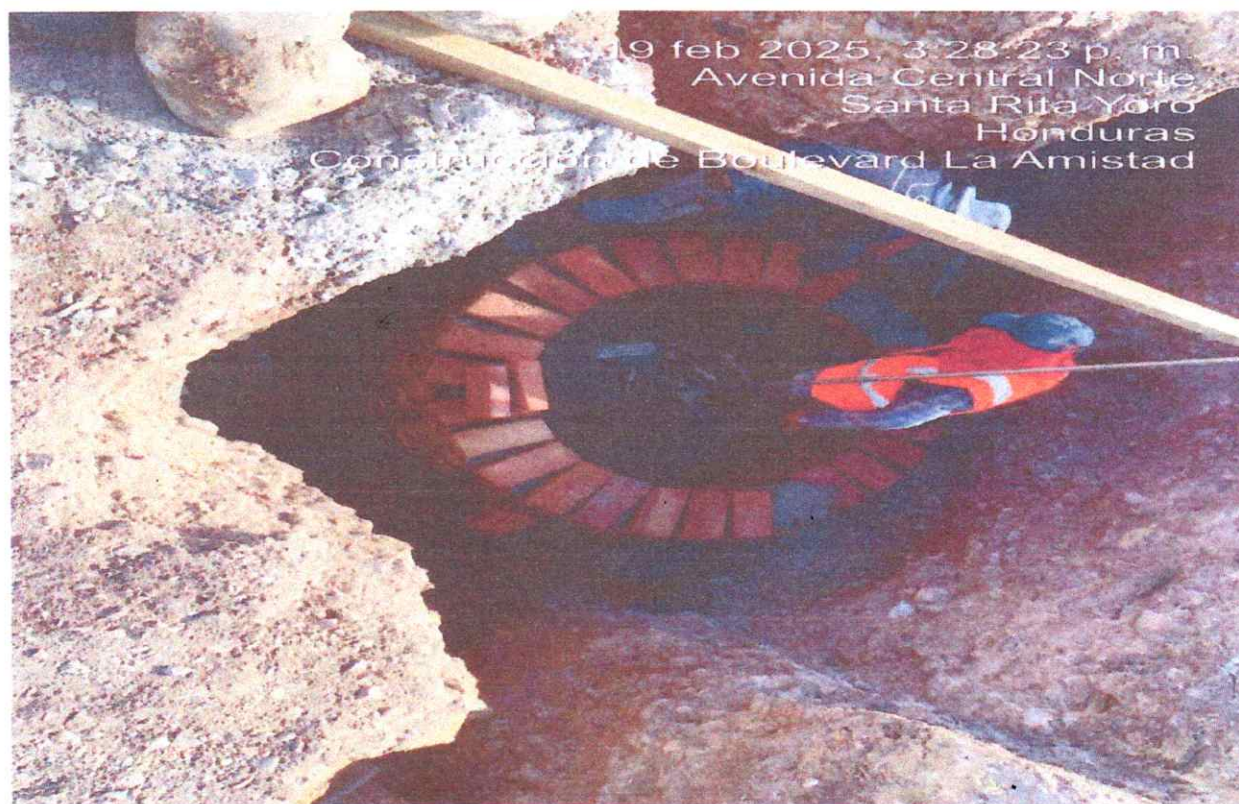








19 feb 2025, 3:28:26 p. m.
Avenida Central Norte
Santa Rita Yoro
Honduras
Construcción de Boulevard La Amistad



19 feb 2025, 3:28:23 p. m.
Avenida Central Norte
Santa Rita Yoro
Honduras
Construcción de Boulevard La Amistad

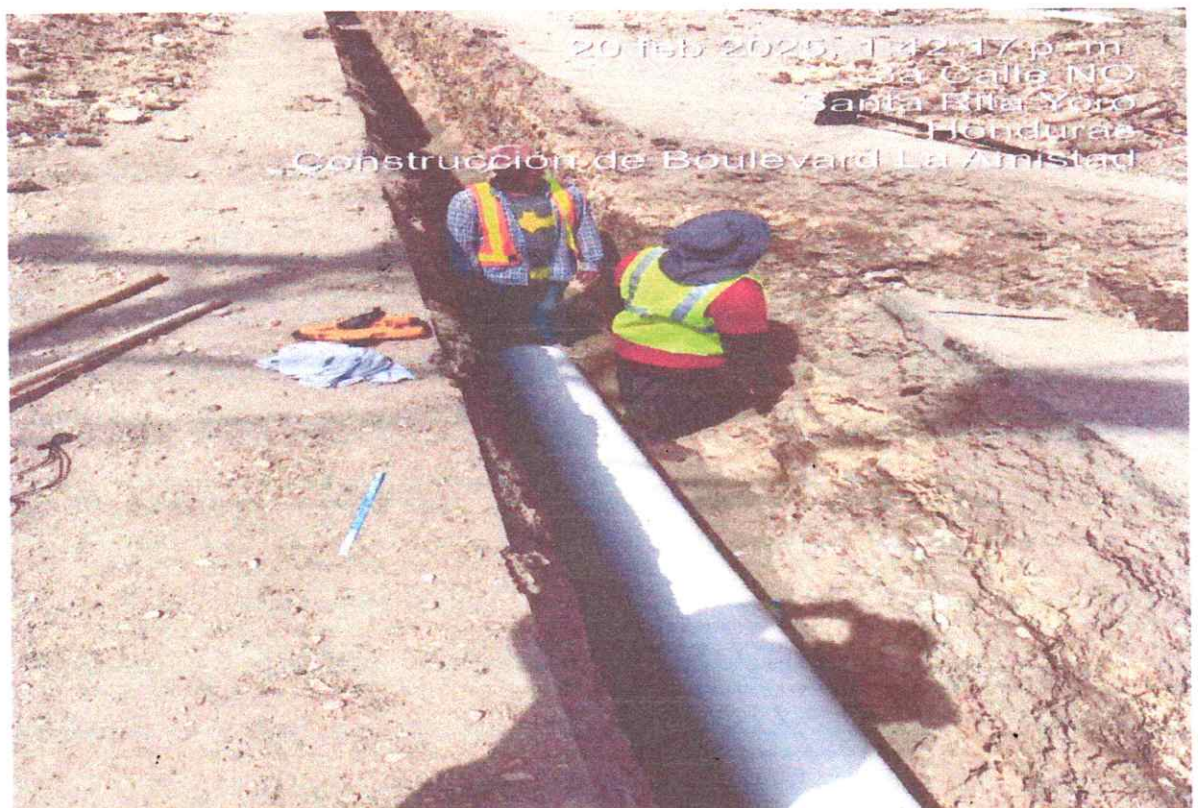


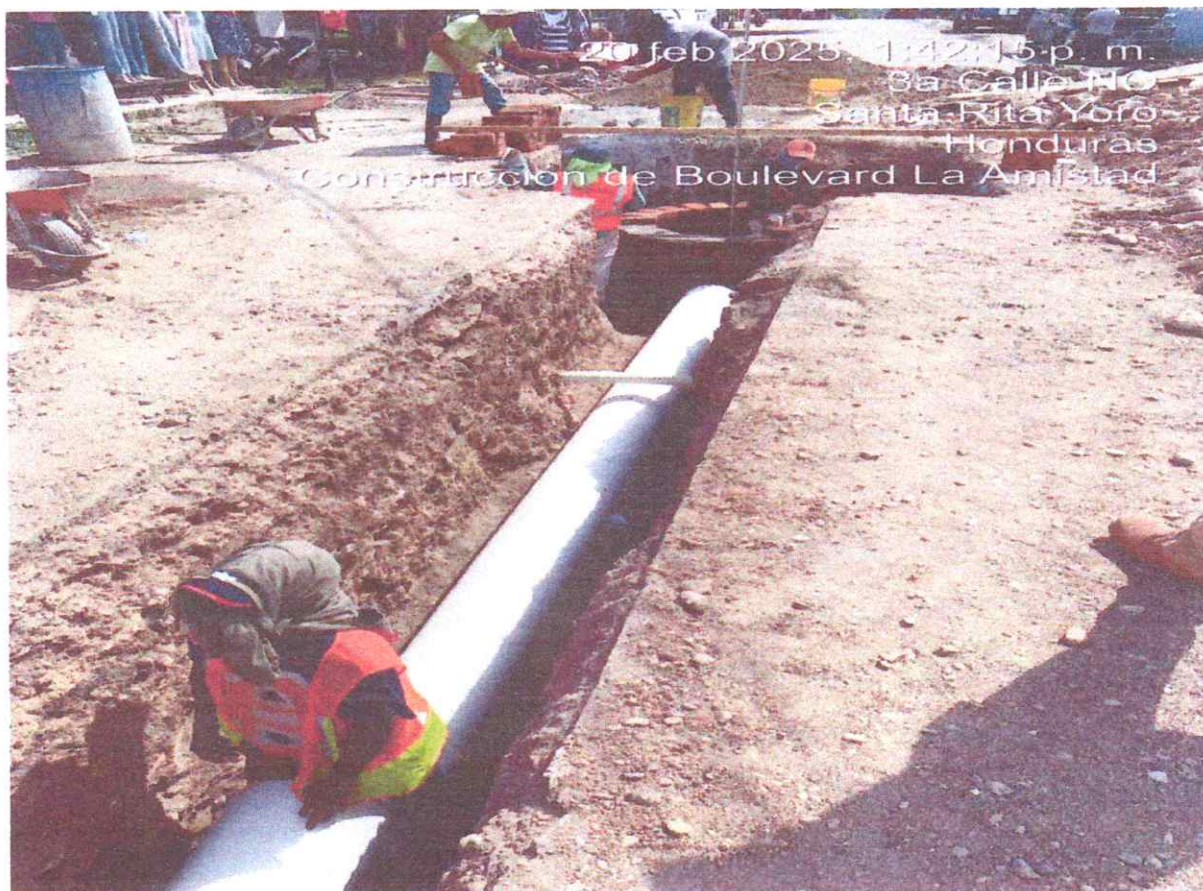


20 feb 2025, 9:25:07 a. m.
Avenida Central Norte
Santa Rita Yoro
Honduras
Construcción de Boulevard La Amistad



20 feb 2025, 9:27:04 a. m.
Avenida Central Norte
Santa Rita Yoro
Honduras
Construcción de Boulevard La Amistad











25 feb 2025. 0:45:46 p. m.
Avenida Central Norte
Santa Rita Yoro
Honduras
Construcción de Boulevard La Amistad



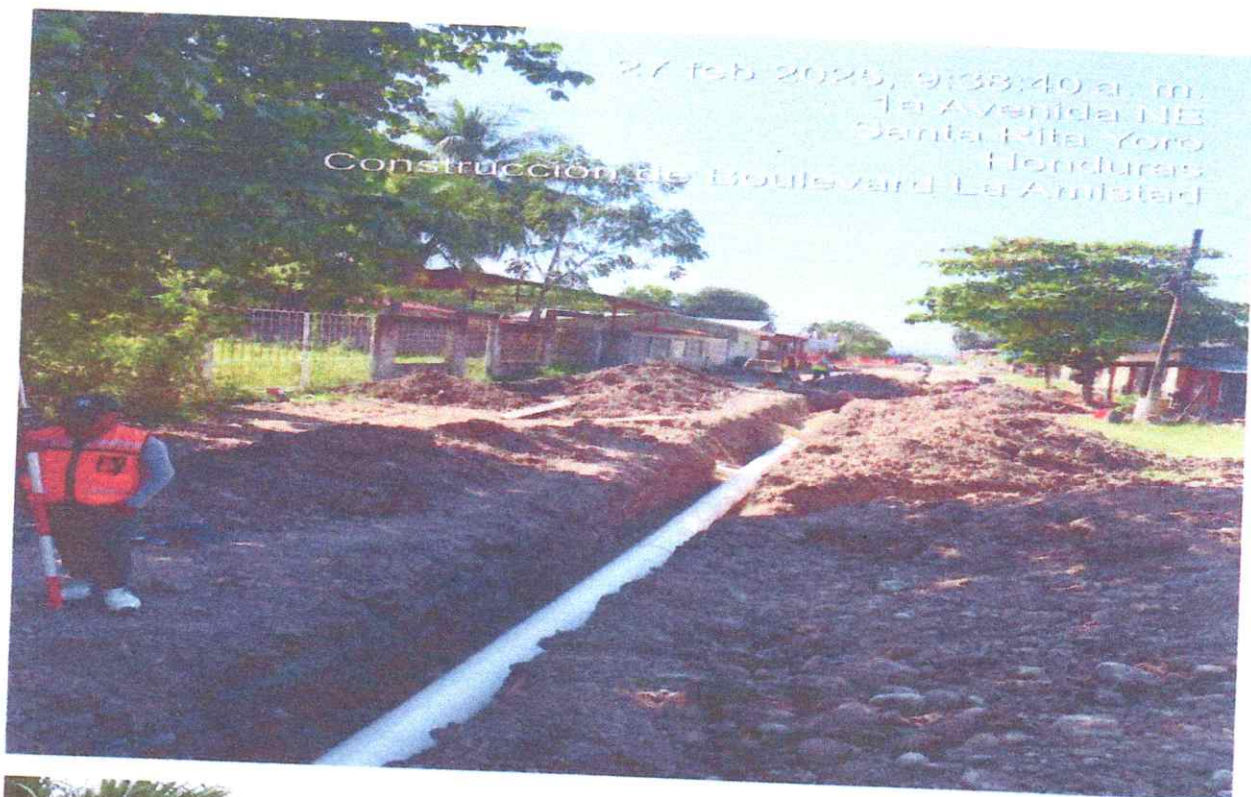
26 feb 2025. 2:41:38 p. m.
1a Avenida NE
Santa Rita Yoro
Honduras
Construcción de Boulevard La Amistad

27 feb 2025, 7:37:51 a. m.
1a Avenida NE
Santa Rita Yoro
Honduras
Construcción de Boulevard La Amistad



27 feb 2025, 7:37:47 a. m.
1a Avenida NE
Santa Rita Yoro
Honduras
Construcción de Boulevard La Amistad







3 mar 2025, 8:11:33 a. m.
3a Calle NE
Santa Rita Yoro
Honduras
Construccion de Boulevard La Amistad





Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO
2022 – 2026
Teléfono: 2667-6163



Santa Rita, Yoro, 05 de marzo del 2025

INFORME DE SUPERVISION DE SUPERVISION DE PROYECTO

MUNICIPIO: Santa Rita, Yoro

DENOMINACION: Construcción Boulevard LA AMISTAD Y VILLA ALTERNA INCLUYENDO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

A continuación, se presenta un informe de avance de obra en la construcción del BOULEVARD LA AMISTAD realizado del 13 de febrero al 5 de marzo del 2024

Se continuo con la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de conexiones domiciliarias en la calle de la esquina de Sesmargo hasta la aproximación de la escuela Dionisio de Herrera la cual se concluyó con la construcción de pozos de inspeccion respectivos, colocación de la línea central y cajas para servicio domiciliario la cual tambien fue aterrado y compactado por capas y eliminando el material sobrante, el cual fue retirado por volquetas de la empresa.

La calle alterna de la calle ocho tambien se concluyó la instalación de tubería RCD 41 y con su respectivas " Y " para conexiones domiciliarias y atendiendo la tubería de aguas servidas las cuales fueron habilitadas y tambien se construyeron los respectivos pozos de inspeccion los cuales fueron repellados y acabados y ya han sido aterrados y compactados con capas y realizadas las limpiezas respectivas con el material sobrante el cual fue evacuado por medio de volquetas al sitio escogido para la ubicación del material retirado.

En la calle del barrio Buenos Aires tambien se realizó y concluyo la instalación de la tubería para aguas negras y la construcción de 2 pozos un cabecero y el de conexión en la esquina de la calle ocho dejando la mecha respectiva para la conexión de la calle conocida como calle del Tigre y la instalación de conexión domiciliaria con sus respectivas cajas, la cual se aterro y compacto siguiendo el proceso respectivo y la limpieza de la misma con el material sobrante movido con



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2022 – 2026

Teléfono: 2667-6163



la volqueta asignada, todas las cajas se le construyo su respectiva tapadera realizando su respectivo curado para su colocación, tambien se repellaron los pozos contruidos con su tapadera de concreto y corona respectiva, esperando las que la alcaldía mandara a construir con su respectiva denominación y año de construcción. Se ha contado con la colaboración de Aguas de Santa Rita para la ubicación de tuberías de agua potable y que no sean dañadas las mismas cuando se realiza la excavación y no dañarlas.

Tambien se continuo con la culminación del trazado y marcado restante para continuar con la excavación para colocación de tubería de aguas negras desde la pollera a encontrarse con la ya culminada.

Recalcando que se ha planificado para los próximos días el trabajo de subrasante, subbase y base para colocación del concreto hidráulico en la calle alterna para tener un avance más en la construcción de este proyecto.

Tambien se presenta un historial fotográfico desde el 14 de febrero a la fecha actual de presentación de este informe de avance de obra.

Tambien se ha tenido la colaboración de las dependencias de la Unidad de medio Ambiente (UMA) y de la Unidad de Justicia Municipal, en los momentos que se ha requerido de su colaboración.

La empresa Constructora Romero, tambien ha empleado una retro excavadora mas para continuar con mayor avance en la colocación del sistema de alcantarillado sanitario.

Actualmente se cuenta con el siguiente equipo de trabajo:

2 retro excavadoras

2 bailarinas

2 volquetas

3 compactadoras manuales

Herramientas menores



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO
2022 – 2026
Teléfono: 2667-6163



Además, cuenta con el siguiente personal:

- 1 Ing Residente
- 2 fontaneros
- 9 ayudantes
- 1 auxiliar de proyecto
- 1 cuadrilla completa de topografía
- 2 operadores de retro
- 2 operadores de volqueta
- 1 vigilante de bodega

Se ha visto el avance de obra de manera eficiente y siempre con algún inconveniente con operadores de vehículos y mototaxis, pero todo ha sido superado satisfactoriamente.


Ing. Jorge Membreño
Supervisor del Proyecto





Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO
2022 – 2026
Teléfono: 2667-6163



ANEXOS



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Teléfonos: 2667-6167 • 2667-6163



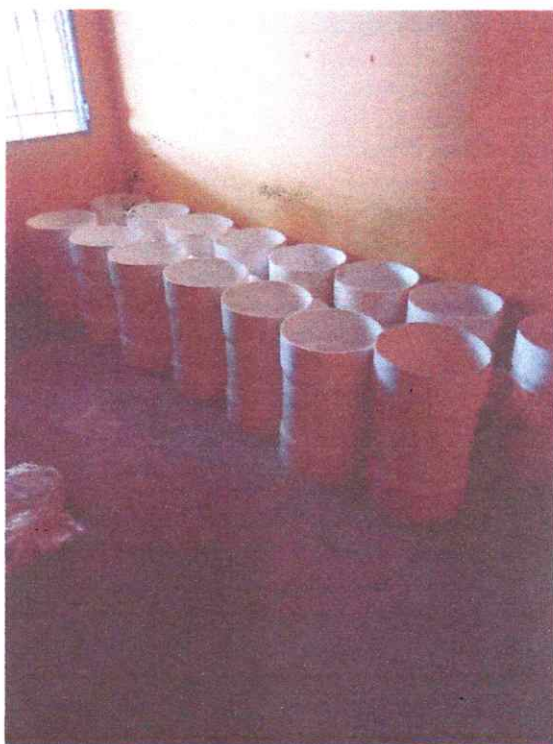
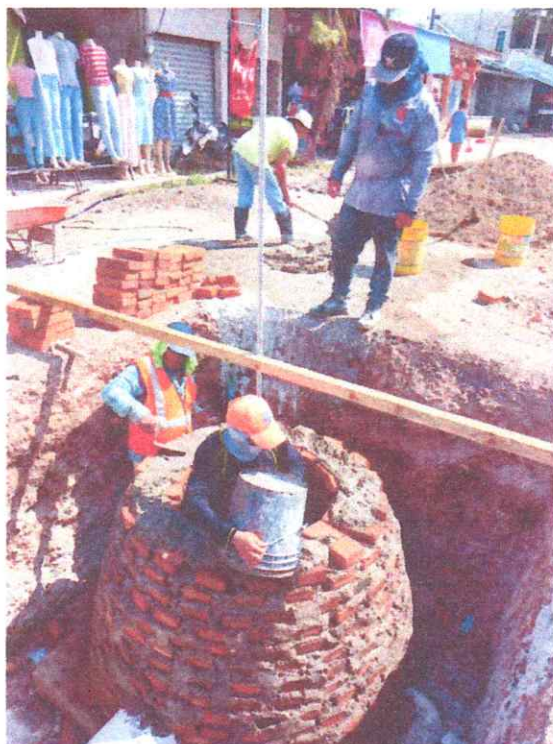


Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Teléfonos: 2667-6167 • 2667-6163





Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Telefonos: 2667-6167 • 2667-6163





Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Telefonos: 2667-6167 • 2667-6163





Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Teléfonos: 2667-6167 • 2667-6163





Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Telefonos: 2667-6167 • 2667-6163



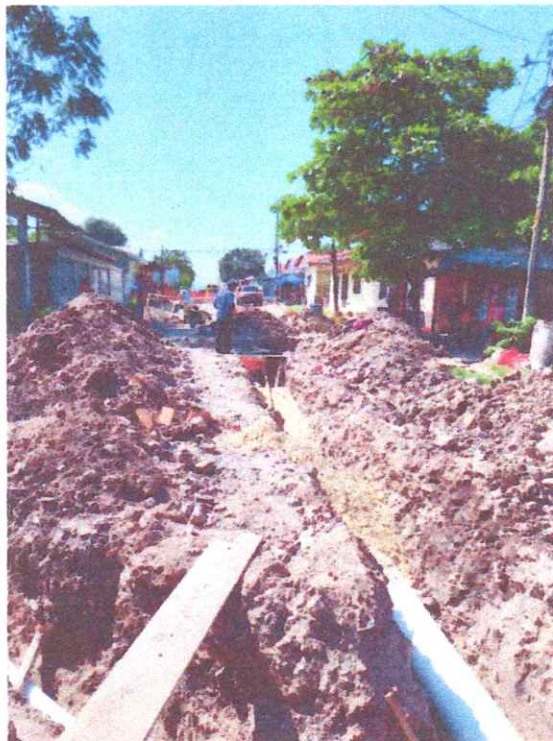


Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Teléfonos: 2667-6167 • 2667-6163



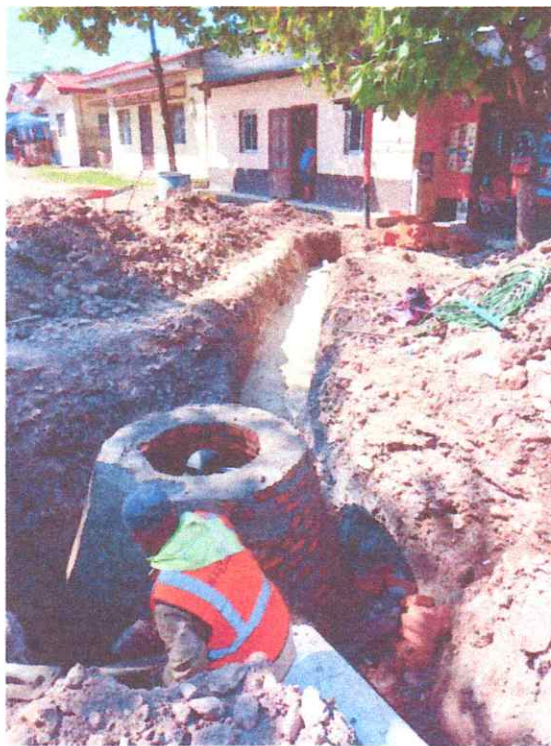


Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Teléfonos: 2667-6167 • 2667-6163





Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Telefonos: 2667-6167 • 2667-6163





Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2022 - 2026

Telefonos: 2667-6167 • 2667-6163



Tueves 13 de febrero 2025

Hoja


Nº 000014

Este día se continuo con la
marcación de las cajas de registro y sus arconetidas.

Tambien se movilizó la excavadora Sany y volqueta
de 12 m³ para acarreo de material selecto en predio
ubicado a 2.3 km del proyecto y se trajeron 4 viajes
de material entre las 10:30 am y 04:00 pm


Ing. Rigoberto Romero
Responsable Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Residente


Ing. Jorge Membreno
Supervisor




Viernes 14 de febrero 2025


Este día se recibió plano catastral por parte del ingeniero
Jorge Membreno, con el cual se hizo la revisión de las
cajas de registro ubicadas en base a límites de propiedad.
Se inicio la excavacion de pozo con profundidad de 2.70
metros controlando el nivel con topografía

Además se hizo el corte y marcado de la carpeta de
asfalto por fuera de donde sera el boulevard pero pasara
la tubería de aguas residuales, se cortaron 90 ml con
cortadora propia.


Ing. Rigoberto Romero
Responsable Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Residente


Ing. Jorge Membreno
Supervisor



Bitácora Nº 043427

Sábado 15 de febrero 2025

Hoja

Nº 000015

Este día se removió con la retro la carpeta de asfalto por donde pasara la tubería y donde se hara un pozo

Se marcaron las acometidas de agua residual con ayuda de topografía, además se hizo el corte y retiro del asfalto


Ing. Roberto Romero
Responsable proyecto


Ing. Omar Alvarez
Residente


Ing. Jorge Montenegro
Supervisor

Lunes 17 de febrero 2025

Este día se dio inicio a la excavación con retro excavadora por donde pasara la tubería de 12 pulgadas se reparo tubería de 2 pulgadas por parte de ASRY, la cual se derio con la retro.


Se busco con pico y pala tubería de 3 pulgadas para enter dañarla con la maquinaria

Se excavo pozo donde esta el asfalto

Se dio control de niveles con la cuadrilla de topografía.


Ing. Roberto Romero
Responsable Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Residente



Ing. Jorge Montenegro
Supervisor

Bitácora Nº 043427


Martes 18 de febrero 2025

Hoja N° 000016

Este día se continuo con la excavación de la linea de tuberia dando nivel con la topografía la retro excavadora presento problemas de encendido de 10:00 am hasta las 10:40 am



Ing. Rigoberto Romero
Responsable Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Residente



Ing. Jorge Membreño
Supervisor

Miércoles 19 de febrero 2025

Este día se dio inicio a la construcción de la base de dos pozos se utilizo retro excavadora para ocureo de materiales ubicados en bodega se recibio una mezcladora de 1 bolsa Con ayuda de topografía se conformo el primer tramo de tuberia de 12 pulgadas.


Ing. Rigoberto Romero
Responsable Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Residente


Ing. Jorge Membreño
Supervisor

Bilacora N° 043427

Jueves 20 de febrero 2025

Hoja

Nº 000017


Este día se hizo dos pozos a

nivel de casquete y uno de ellos


ya pulido, también se instaló 4 tubos de 12" y un tubo de 4" para conexión domiciliaria.

Se cubrió con material selecto y se compactó manualmente un tramo de 2 tubos de 12" con una conexión domiciliaria


Ing. Rigoberto Romero
Responsable Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Residente


INGENIERO CIVIL
30-11-23
13-03-24
C.I.C.H. Nº 9931-1855


Ing. Jorge Membreño
Supervisor

Viernes 21 de febrero 2025


Este día se excavaron con pico y pala acanietados domiciliares debido a la dificultad por tuberías de agua potable a ambos lados

Se hizo instalación de 4 tubos de 12" y dos acanietados con tubo de 4"

Se repello y pulio un pozo, además se hicieron dos cajas de registro domiciliares


Se continuó con la excavación con la maquinaria para tramo de tubería dando nivel con topografía

Este día hubo problemas climáticos con lluvia parcial en horario de 10:00 am hasta las 03:00 pm


Ing. Rigoberto Romero
Responsable Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Residente


INGENIERO CIVIL
30-11-23
13-03-24
C.I.C.H. Nº 9931-1855


Ing. Jorge Membreño
Supervisor

Bitácora Nº 043427

Sabado 22 de febrero 2025

Este día se continuo con repellido

Hoja


Nº 000018

de cajas de registro y se hizo otra

Se abrio un tramo de tuberia de 12" con material selecto
y luego se coloco material del sitio


Ing. Roberto Romero
Responsable Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Residente



Ing. Jorge Mendieta
Supervisor

Lunes 24 de febrero 2025


Este día Se continuo con los Trabajos de Atendido
de Tuberia y Instalacion

El día estuvo lluvioso.

Se realizo marcado de Holes, linea de Tuberia
y cajas de registro con ayudo de Topografia


Ing. Roberto Romero
Responsable Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Residente


Ing. Jorge Mendieta
Supervisor

Marzo 25 febrero 2025

Hoja

Nº 000019

Este día el clima fue lluvioso

Se continuó con los Trabajos de excavación e
instalación de tuberías

hoy se hubo otra retroexcavadora.

- hubo reunión con el Ing. Mumbiano para definir
ruta de Tuberías de 12" en calle al Terna
debido a canal existente.

Se concluye que debido al canal que cruza
en la calle al Terna el primer Tranco quedará
en espera de la continuación para conectar con
el boulevard.

Ing. Rigoberto Romero
Responsable Proyecto

Ing. Omar Alvarez
Ing. Residente




Ing. Jorge Mumbiano
Ing. Supervisor

Miércoles 26 de febrero 2025

Hoja

Nº 100020

- Este día se inicia excavaciones en la calle alterna
- Se continuó con la construcción de holes y
Cajas de registro e instalación de Tuberia
- Se recibió una Valgato para acarreo de material.


Ing. Gilberto Romero
Responsable Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Ing. Residente



Ing. Jorge Mamberto
Ing. Supervisor

Jueves 27 febrero 2025.

- Este día se continuó con los trabajos de instalación de Tubería, pozos y Cajas de registro.
- Con los maquinarios se trabajó en excavación y acarreo de material
- Se encontró con 2 Tuberías de aguas grises, la cual se consultó con la unidad ambiental con el señor Jonathan Osorio Ochoa quien autorizó colocar tapas en los Tuberías


Ing. Gilberto Romero
Responsable del Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Ing. Residente


Ing. Jorge Mamberto
Ing. Supervisor

Bitácora Nº 043427

Viernes 29 de Febrero 2025

Hoja

Nº 000021

Este día estuvo lluvioso por la mañana.

- Se continuó con labores de instalación y armado de Taberos
- Construcción de hobs y cajas domiciliarias.

Por lo demás sin novedades.

Ing. Rigoberto Romero
Responsable Proyecto



Ing. Omar Álvarez
Residente



Ing. Jorge Muñiz
Supervisor

Sábado 01 de Marzo 2025

Este día se continuó con actividades de instalación y armado de Taberos y se recibió pedido de casquitos para hobs. Con estas actividades se cerró el día de hoy.

Ing. Romero
Responsable Proyecto

Ing. Omar Álvarez
Residente



Ing. Jorge Muñiz
Supervisor

Lunes 03 de Marzo 2025


Hoja

Nº 000022

- Este día se hizo afondo de
Taberos

Se elabore Los Tegadinos poro Copys de registro.


Ing. Rogoberto Renteria
Responsable Proyecto


Ing. Omar Alvarez
Residente




Ing. Jorge Martinez
Supervisor

