



MUNICIPALIDAD DE TAULABÉ

Calle Principal de Taulabé, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2784-5815

Cuenta No. 11-605-000169-0

CHEQUE No. 00023425

TAULABÉ, 23 DE FEBRERO DE 2025

Lugar y Fecha

SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R. L.

496,455.36

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 100/100

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.



Firma (s)



10160507910016050001690000023425

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FIN-FUN	FTE-FIN	ORG-FIN	FTE-ESP
Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque sin Valor Comercial								
N.º DE CUENTA	DESCRIPCIÓN					DEBE	HABER	
15 01 020 000 001 47210 11-011-01	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público					522,584.59	0.00	
	Retención por Garantías 5%					0.00	26,129.23	
	Total Afiliación a Bancos						496,455.36	

Pago por estimación No. 1, por contrato de Construcción de Pavimento con concreto Ciclópeo, con una Longitud de 230 Metros, ancho de 4.70 metros y un espesor de 0.20 metros y con bordillos de 15x15cm, en la Comunidad de Terrero Blanco en el Municipio de Taulabé, Comayagua.

CHEQUE No. 00023425





MUNICIPALIDAD DE TAULABÉ

Calle Principal de Taulabé, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel. (224) 2784 5815

Cuenta N.º: 11-605-000189-0

CHEQUE No. 00023425

TAILABÉ 21 DE ENERO DEL 2025

Lugar y Fecha

SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R. L.

*****496 455 36

Páguese a la orden de

**** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.



[Handwritten signature]

⑆01605079⑆00⑆16050001690⑆00023425

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FBI-FIN	FTE-FIN	ORG-FIN	FTE-ESP
----------	--------------	----------	-----------	------	---------	---------	---------	---------


N.º DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
15 01 020 000 001 47210 11-011-01	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	522 584 59	0.00
	Retención por Garantías 5%	0 00	26 129 23
	Total Afectación a Bancos		496 455 36

Pago por estimación No. 1, por contrato de Construcción de Pavimento con concreto Ciclópeo, con una Longitud de 230 Metros, ancho de 4.70 metros y un espesor de 0.20 metros y con bordillos de 15x15cm, en la Comunidad de Terrero Blanco en el Municipio de Taulabé, Comayagua.



CHEQUE No. 00023425

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SINPAD

SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE R.L.

1/2 Cuadra al este de Clínica Familiar, local Contiguo a Hotel Casa Vieja, B° Torondon, Comayagua

Cel.: 9588-5409 / 8932-1165 / Tel.: 2772-2266 / Correo: sdcpadilla2014@gmail.com

CAI: 24227E-FE8AE3-8A52E0-63BE03-0903AA-CE

RTN: 03019014630743

FACTURA N°

000-001-01-00002253

Cliente: Alcaldía Municipal de Taulabé

RTN: 03219001034319

Tel.: _____

Dirección: Taulabé, Comayagua

DIA MES AÑO

23 01 25

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Pago por Estimación No. 1, por Contrato de Construcción de Pavimento con Concreto Cidópeo, con una longitud de 230 Metros, ancho de 4.70 metros y un espesor de 0.20 metros y con bordillos de 15x15 cm, en la Comunidad de Terrero Blanco en el Municipio de Taulabé Comayagua			496,455.36

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

TOTAL L.

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAC:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10-10-2025

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 496,455.36

Cant. en Letras: Cuatrocientos noventa y

seis mil cuatrocientos cincuenta

Firma

Municipalidad de Taulabe, Comayagua

ORDEN DE PAGO

No. 42674



FECHA: 23 DE ENERO DEL 2025

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. DE R.

Cheque No.

Valor L.

*****522,584.59

La suma de:

**** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 36/100 ****

Pago por estimación No.1, por contrato de Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo, con una Longitud De 230 Metros, ancho de 4.7 metros y un espesor de 0.20 metros y con bordillos de 15x15cm, en la Comunidad de Terrero Blanco en el Municipio de Taulabé Comayagua.

Presupuesto	Valor L.	Descripcion	Debe	Haber
15-000 000 001 47210 11-011-01	522,584.59	Construcciones y Mejoras de Bienes en	522,584.59	0.00
		Retención por Garantías 5%	0.00	26,129.23
TOTAL L.			522,584.59	26,129.23
***** ULTIMA LINEA *****			TOTAL L.	496,455.36

Oficina Solicitante:

Firma y Sello Alcalde Municipal

Realizado por:

23/01/25 MARIA.C

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Cks: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

Firma Interesado

0301198001371
Identidad

No. de Solvencia



Municipalidad de Taulabe, Comayagua



RECIBO NO. 42674

POR L. 496,455.36



Recibí de la Municipalidad de Taulabe, Comayagua la Cantidad de :


L. 496,455.36 **** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

POR CONCEPTO DE:

Pago por estimación No.1, por contrato de Construcción de Pavimento con Concreto Ciclópeo, con una Longitud De 230 Metros, ancho de 4.7 metros y un espesor de 0.20 metros y con bordillos de 15x15cm, en la Comunidad de Terrero Blanco en el Municipio de Taulabé Comayagua.

Fecha : 23 De Enero Del 2025




SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA

Identidad No. 301198001771

MUNICIPALIDAD DE TAULABE



CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COCLOPEO CARRETERA QUE CONDUCE
A LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO, CELEBRANDO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE TAULABE E SERVICIOS DE DISEÑO Y CONTRUCCION
PADILLA S. de R. L.



Republica de Honduras C.A.
Alcaldía, Municipal de Taulabé, Comayagua
Tel. 2784-5076, Telfax Tercerías: 2784-5815



CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COCLOPEO CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO, CELEBRANDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TAULABE E SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. de R. L.

Nosotros, **DENIS OMAR MEMBREÑO GALINDO**, actuando en mi condición como Alcalde Municipal, mayor de edad, casado y vecino de este Termino Municipal, con DNI, No. 0318-1970-00292 actuando en condición de Alcalde Municipal de Taulabé, Departamento de Comayagua, nombrado para tal cargo mediante acta especial, 25 de Enero de 2022 y autorizada por la ley para esta clase de actos quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra parte, la empresa Hondureña **SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. de R. L.** con R.T.N, No. 03019014630743, su propietario el señor **David Omar Padilla Tercero**, mayor de edad, Hondureño, Ingeniero Civil, Casado, que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato temporal de Construcción de obra pública determinada, mismo que se registrará por lo estipulado en el presente contrato; en la Ley de Contratación del Estado; y La Ley de Jurisdicción De Lo Contencioso Administrativo. **PRIMERA: DEL OBJETO:** SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES OBRAS QUE SE COMPRENDEN EN ESTE CONTRATO, Construcción De Pavimento Con Concreto Ciclópeo, Con Una Longitud De 230 Metros, Ancho De 4.70 Metros Y Un Espesor De 0.20 Metros y Con Bordillos de 15x15 cm, En la Comunidad de Terrero Blanco, en Municipio de Taulabé Comayagua, según se detalla en los requerimientos generales de la obra. El contratista tendrá en su cargo los trabajos de construcción según se detalla en todas actividades del mismo. Se deberán ejecutarse de acuerdo las especificaciones técnicas Proyecto, que son presentadas por la Unidad Técnica Municipal (de igual o superior calidad). **SEGUNDA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo de este contrato es de un periodo de **SESENTA (60) días Calendario**, contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. **TERCERA: MONTO Y FORMA DE PAGO:** El monto del presente asciende a la suma de **UN MILLÓN OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 59/100, (L. 1,008,733.59)** esto comprende la Mano De Obra, Equipos, Maquinas, Herramientas, Materiales de Construcción, Dirección Y Administración y en fin, todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, En ley de contratación del estado en el (art. 105) estipula que el porcentaje de anticipo máximo que se entregara a **EL CONTRATISTA** que es de un 20% del valor total del contrato, Pero se ha Estipulado que **EL CONTRATISTA** renuncia a dicho anticipo que se otorga al empezar la obra. Hemos convenido que todos los pagos se realizarán a través de la tesorería Municipal para cuyo trámite de pagos **EL CONTRATISTA** presentara al supervisor de la municipalidad (Ingeniero encargado), la solicitud de pago mediante estimación. La municipalidad pagará a **EL CONTRATISTA** por ejecución, bajo la modalidad de estimación de obra ejecutada o realizada, la cual el ingeniero municipal verificara dichos porcentaje de estimación que presente el Contratista de la obra, el pago se hará en efectivo mediante varios desembolsos y de acuerdo a la disponibilidad financiera actual de la Municipalidad y sin recargo por concepto de interés. **CUARTA: ORDEN DE INICIO:** Se considera como tal la fecha establecida en la notificación de la **ORDEN DE INICIO**, al contratista para el inicio de la obra. **QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** tanto **LA MUNICIPALIDAD**, como **EL CONTRATISTA**; se obligan al cumplimiento estricto de lo especificado en este contrato; - La mano de obra que utilice el Contratista; será bajo su responsabilidad; así como también el equipo o herramientas que utilice. - y se aclara que la **Alcaldía Municipal** no responde por el pago de los trabajadores; ni daños a terceros. **SEXTA: GARANTIAS:** Según la ley de



República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua
Tel. 2784-5076 Teléfono Telex: 2784-5815



contratación del estado de Honduras (LCE) Capítulo VIII Art. 100 y Art.104 respalda dicha garantías; EL CONTRATISTA, está en la obligación de presentar a favor de La Municipalidad de Taulabé las garantías siguientes: a) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**; Previo a firmar el contrato o días después (10 días hábiles) se obliga a rendir la garantía a favor de la MUNICIPALIDAD DE TAULABE equivalente al 15% del monto total del contrato, la cual consistirá en garantía (bancaria, fianza o Pagare de cumplimiento de contrato) emitida por una institución aseguradora constituida legalmente en el país, la municipalidad de Taulabé extenderá un pagare de cumplimiento de contrato, a espera que se entregue la garantía emitida por una institución aseguradora constituida legalmente. Esta garantía estará con Vigencia Hasta 3 Meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra, a partir de la fecha propuesta en la Acta (ORDEN DE INICIO) y deberá contener la condición que se expresa "Sera ejecutada a simple requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE TAULABE" la suma de L 1,008, 733.59 (15%) de este contrato es equivalente en lempiras a CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS (L 151, 310.03); b) **GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA**: Se establece una garantía de calidad de obra equivalente al 5% del monto del contrato, la cual será retenida para asegurar la calidad de obra una vez finalizado y firmada el ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA PUBLICA y se deducirá en igual porcentaje en el último pago, esta será equivalente en lempiras a CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 68/100 CENTAVOS (L 50, 436.68), con vigencia por un plazo de 12 (Doce) meses contando a partir de la fecha de finalización del proyecto o fecha de acta de recepción de obra pública. **SEPTIMA; DEDUCCIONES**: El contratista presentará una constancia de solvencia sujeta al régimen de pagos cuenta vigente extendida por la SAR; previo a la presentación de documentación del contrato, caso contrario de no ser presentada se deducirá el 12.5% de retención del monto total de contrato. **OCTAVA; DEL SUPERVISOR**: El supervisor es la persona identificada en el contrato y es el representante autorizado por la Municipalidad de Taulabé, nada que este contenido en los documentos del contrato deberá crear relación contractual alguna entre el supervisor y EL CONTRATISTA. **NOVENA; DE LA AUTORIDAD DEL SUPERVISOR**, El Supervisor tendrá la administración general del contrato de construcción, incluyendo la realización de las funciones más adelante descritas, el Supervisor será el representante de la Municipalidad Taulabé, en la construcción y hasta que se efectué el pago final. El Supervisor tendrá autoridad para actuar en nombre de la MUNICIPALIDAD DE TAULABE hasta donde estipula en contrato, a menos que se modifique dicha autoridad mediante escrito que será notificado a EL CONTRATISTA. El Supervisor consultara y asesora a la MUNICIPALIDAD DE TAULABE; y todas las instrucciones dadas a EL CONTRATISTA serán transmitidas por escrito a través del Supervisor. El supervisor en todo tiempo deberá tener acceso al trabajo, ya sea que este en preparación o en proceso, EL CONTRATISTA debe proporcionar facilidad para tal fin, de forma que el Supervisor pueda realizar sus funciones de acuerdo al contrato, el supervisor hará visitas diarias o constantes al lugar para determinar si el trabajo se está llevando a cabo de acuerdo al contrato, haciendo observaciones informara sobre el proceso del trabajo; y comunicara por escrito a la MUNICIPALIDAD DE TAULABE como propietario, de los defectos y deficiencias en el trabajo de EL CONTRATISTA. El Supervisor no será responsable por los medios, métodos y programas de seguridad relacionados con la obra. **DECIMA; DEL PLAZO DE EJECUCION**, EL CONTRATISTA deberá ejecutar y dirigir el trabajo haciendo uso de su capacidad y atención; será el único responsable de los medios, métodos, técnicas, secuencias y procedimiento de construcción y de las coordinaciones de todo el trabajo contenido en contrato, siendo el plazo de ejecución de este contrato de SESENTA días Calendario (60), a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por el supervisor. **DECIMO PRIMERA; DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**. – A menos que se indique específicamente de otra manera, EL CONTRATISTA deberá proporcionar y pagar toda la mano de obra, materiales de Construcción, equipo,




República de Honduras C.A.
Alcaldía, Municipal de Taulabé, Comayagua
Tel. 2784-5076, Teléfono Telex: 2784-5815



maquinaria, agua, servicios públicos necesarios para la debida ejecución y terminación del trabajo. EL CONTRATISTA en todo tiempo, no deberá ocupar en el trabajo ninguna persona no apta o alguien que no sea capacitado para la labor que se encomienda. EL CONTRATISTA garantiza a la Municipalidad de Taulabé y al Supervisor que todos los equipos de maquinaria suministrados de acuerdo a este contrato estarán en buen estado, a menos que se especifique de otra manera y que todo el trabajo será de buena calidad, libre de fallas y defectos y de conformidad al contrato. Todo trabajo que no esté en conformidad a esta norma puede considerarse defectuoso. De acuerdo a esta garantía, EL CONTRATISTA se le obliga por el periodo de Doce meses (12) después de la terminación y aceptación de los trabajos incluidos en el contrato, a hacer por cuenta las reparaciones y sustituciones que se requieran como consecuencia de la mano de obra deficiente o por materiales defectuosos. **DECIMA SEGUNDA; MODIFICACION AL CONTRATO:** El contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando se acuerde por los firmantes del mismo; previa una aprobación de la Unidad Técnica Municipal (Supervisión). **DECIMA TERCERA; CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO:** a) El mutuo acuerdo entre las partes; b) Incumplimiento de contrato; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debidos a insuficiente mano de obra, o uso inapropiado de equipo, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por La Unidad Técnica Municipal (Supervisión) y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato. d) Caso fortuito o Fuerza Mayor debiendo entenderse esta como todos los actos hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento; que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato, e) Resolución de contrato decretada por autoridad competente. **DECIMA CUARTA; RESOLUCION DE CONTROVERSIAS:** Cualquier controversia que surgiera de este contrato, será sometida en todo derecho administrativo, siendo la jurisdicción competente para conocer las cuestiones de que los mismo deriven, los Tribunales de lo Contencioso Administrativos que la Municipalidad designe. **DECIMA QUINTA:** Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y firman para constancia en el municipio de Taulabé a los 17 días del mes de enero de 2025; Construcción De Pavimento Con Concreto Ciclópeo, Con Una Longitud De 230 Metros, Ancho De 4.70 Metros Y Un Espesor De 0.20 Metros y Con Bordillos de 15x15 cm, En la Comunidad de Terrero Blanco, en Municipio de Taulabé Comayagua.



Sr. DENIS OMAR MEMBREÑO
DNI No. 0318-1970-00292
Alcalde Municipal de Taulabé



Sr. SERVICIOS DE DISEÑO Y
CONSTRUCCION PADILLA S. de R.L.
R.T.N. No. 03019014630743
Contratista



Republica de Honduras C.A

Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

ORDEN DE INICIO PROYECTO

UTM



PROYECTO: Construcción De Pavimento Con Concreto Ciclópeo, Con Una Longitud De 230 Metros, Ancho De 4.70 Metros Y Un Espesor De 0.20 Metros y Con Bordillos de 15x15 cm.

UBICACIÓN: En la Comunidad de Terrero Blanco, en Municipio de Taulabé Comayagua.

MUNICIPIO: TAULABÉ.

COSTO DE PROYECTO: L. 1,008,733.58 /

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA.

NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. de R. L.

FECHA DE INICIO: 18/01/2025

NUMERO DE CELULAR DE LA EMPRESA: +504 9445-8109

PLAZO DE EJECUCION: 60 Sesenta días calendario

CORREO DE LA EMPRESA: sdcpadilla2014@gmail.com

ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO

CONTRATO ORIGINAL			
ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.00	LIMPIEZA DE TERRENO.	M2	1081.00
2.00	EXCAVACION DE MATERIAL.	M3	108.10
3.00	TRAZADO Y MARCADO.	ML	230.00
4.00	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO.	M3	54.05
5.00	CONCRETO CICLOPEO E=20CM PROPORCION 1:2:3	M3	216.20
6.00	BORDILLO DE CONCRETO 3000 PSI 15X15CM, 1#3@30CM	ML	460.00
7.00	LIMPIEZA FINAL DE PROYECTO.	JRD	1.00

Las actividades anterior mente mencionadas son las que conforman esta orden de inicio de proyecto, en el Municipio de Taulabé, departamento de Comayagua, siendo las horas 1:30 p.m. a los 18 días del mes de Enero del 2025, en representación de la Municipalidad de Taulabé, el Señor alcalde Denis Membreño, y el Ingeniero Supervisor Joel Nolasco y en representación el CONTRATISTA ejecutor la empresa: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. de R. L. En este acto se hace formal la autorización del inicio del proyecto "Construcción De Pavimento Con Concreto Ciclópeo, Con Una Longitud De 230 Metros, Ancho De 4.70 Metros Y Un Espesor De 0.20 Metros y Con Bordillos de 15x15 cm, En la Comunidad de Terrero Blanco, en Municipio de Taulabé Comayagua", haciendo constatar que se han cumplido los requisitos necesarios para el inicio del mismo, sin objeción de alguna de las partes interesadas.

En fe, de lo anterior se firma la presente Acta.

En el municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua, 18 de enero de 2025.

Sr. DENIS OMAR MEMBREÑO
C.C. 0118-1970-00292
Alcalde Municipal de Taulabé

Sr. SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION
PADILLA S. de R. L.
R.T.N. No. 03019014630743
Contratista




UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Alcaldía de Taulabé.

PAGARE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Yo, SERVICIOS DE DISEÑO Y CONTRUCCION PADILLA S. de R. L. empresa hondureña constituida, en mi condición de gerente general, con R.T.N, No. 03019014630743, Ubicación en la empresa, ½ Cuadra Al Este De Clínica Familiar, Local Contiguo A Hotel Casa Vieja B" Torondon, Municipio de Comayagua; siendo su propietario el señor David Omar Padilla Tercero, mayor de edad, Hondureño, Ingeniero Civil, Casado, actuando en mi condición de CONTRATISTA DECLARO Y HAGO CONSTAR: Que; DEBO Y PAGARE, incondicionalmente a la ALCALDIA MUNICIPAL DE TAULABE; departamento de Comayagua, la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS (L 151, 310.03), para garantizar el cumplimiento del contrato y proyecto, la garantía de cumplimiento equivalente al 15% del monto total del contrato, ESTA GARANTIA SE RIGE POR LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO HONDURAS, CAPITULO VIII, ARTICULO #100 como amparo legal, en el contrato en su primera disposición habla sobre PRIMERA: DEL OBJETO: SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES OBRAS QUE SE COMPRENDEN EN ESTE CONTRATO, Construcción De Pavimento Con Concreto Ciclópeo, Con Una Longitud De 230 Metros, Ancho De 4.70 Metros Y Un Espesor De 0.20 Metros y Con Bordillos de 15x15 cm, En la Comunidad de Terrero Blanco, en Municipio de Taulabé Comayagua; nombre del proyecto y especificaciones principales, este PAGARE se libra SIN PROTESTO y los gastos y cualquier gasto que ocasioné el cobro extrajudicial a la ejecución de este Título será por cuenta del deudor, quien renuncia a toda diligencia, protesto, requerimiento judicial o extrajudicial cuando a ello hubiere lugar, ni excusas de ninguna clase; renunciando al fuero de mi domicilio para someterme a la competencia de juzgado o tribunal que destine el acreedor. Firmo el presente Pagare de Cumplimiento de contrato, en Taulabé, Comayagua 18 días del mes de Enero de 2025. Con Vigencia de este pagare de Cumplimiento de 3 meses a partir de la orden de inicio de proyecto.


Sr. DENIS OMAR MEMBREÑO
D.N. No. 0318-1970-00292
Alcalde Municipal de Taulabé


Sr. SERVICIOS DE DISEÑO Y
CONTRUCCION PADILLA S. de R. L.
R.T.N, No. 03019014630743
Contratista



República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé Comayagua.



UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Tel: 2784-5815

Correo: unidadtecnicamunicipalmt@gmail.com

INFORME DE SUPERVISION #1

18- 22 DE ENERO 2025

ING. JOEL NOLASCO SUPERVISOR.

Proyecto En Ejecución –Construcción De Pavimento Con Concreto Ciclópeo, Con Una Longitud De 230 Metros, Ancho De 4.70 Metros Y Un Espesor De 0.20 Metros y Con Bordillos de 15x15 cm, En la Comunidad de Terrero Blanco, en Municipio de Taulabé Comayagua.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION CONCRETO CICLOPEO.

La pavimentación de caminos en zonas rurales constituye un componente esencial para el desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades. Las zonas rurales enfrentan desafíos significativos relacionados con la conectividad, el acceso a servicios básicos, y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto:	
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO EN ALDEA TERRERO BLANCO, MUNICIPIO DE TAULABÉ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA"	
Municipalidad responsable:	Municipalidad de Taulabé
Monto:	Aporte SIT L 1,004,636.72
	Aporte Municipal L 4,096.87
	Monto Total L 1,008,733.59
Fuente de financiamiento:	Secretaria de Infraestructura y Transporte
Programa:	Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos
Ubicación:	Aldea Terreo Blanco, municipio de Taulabé
Georreferencia:	Inicio 14.68231373 -87.99135777
	Final 14.68260803 -87.99229071
Fecha estimada de inicio:	18/01/2025



República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabe Comayagua.



UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Tel: 2794-3813

Correo: unidadtecnicamunicipalmt@gmail.com

Fecha estimada de finalización:	18/03/2025
Duración:	60 días
Objetivo general:	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio mediante la construcción de obras de infraestructura.
Objetivos específicos:	Mejorar la red vial del municipio. Fortalecer las actividades económicas de la población. Disminuir las enfermedades respiratorias.
Descripción general del proyecto:	Construcción de pavimento con concreto ciclópeo, en pendiente pronunciada con una longitud de 230 metros, ancho de 4.70 metros y un espesor de 0.20 metros y Con Bordillos de 15x15 cm

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Buena	X	Albani	X
Con lluvia		Mala		Ayudantes	X
				Peón	X

RESPONDABLES:

Ejecutor: SERVICIOS DE DISEÑO Y
CONSTRUCCION PADILLA S. DE R. L.

Supervisor: ING. JOEL NOLASCO.



República de Honduras C.A.



Alcaldía Municipal de Taulabé Comayagua.

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Tel: 2784-5815

Correo: unidadtecnicamunicipalmt@gmail.com

CUADRO DE ACTIVIDADES DE PROYECTO

No.	Actividades realizadas	Unidad	Cantidad Ejecutada
1	Limpieza de Terreno	Metro Cuadrado	1081.00
2	Excavacion de material	Metro Cúbicos	108.10
3	trazado y marcado	Metro Lineales	230
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	Metro Cúbicos	54.05
	Concreto Ciclopeo e= 20cm Proporción 1:2:3	Metros Cúbicos	216.20
5	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 1#3@30cm	Metros Lineales	460.00
	Limpieza Final	JRD	1

PORCENTAJE DE AVANCE POR ACTIVIDAD DE PROYECTO

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA DE CONTATO	CANTIDAD OBRA EJECUTADA EN CAMPO	PORCENTAJE DE AVANCE
1.00	LIMPIEZA DE TERRENO.	M2	1081.00	1081.00	100.00%
2.00	EXCAVACION DE MATERIAL.	M3	108.10	108.10	100.00%
3.00	TRAZADO Y MARCADO.	ML	230.00	230.00	100.00%
4.00	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO.	M3	54.05	54.05	100.00%
5.00	CONCRETO CICLOPEO E=20CM PROPORCION 1:2:3	M3	216.20	115.00	53.19%
6.00	BORDILLO DE CONCRETO 3000 PSI 15X15CM, 1#3@30CM	ML	460.00	0.00	0.00%
7.00	LIMPIEZA FINAL DE PROYECTO.	JRD	1.00	0.00	0.00%

CONCLUSIONES:

- EL Proyecto se ejecuta de la mejor manera siguiendo las especificaciones técnicas de espesor y ancho de calle, también cumpliendo con la dosificación de concreto para alcanzar la mayor resistencia a la compresión del mismo.
- Se utiliza el mejor material de agregado ya sea fino o grueso, también se le esta añadiendo curador de concreto para hidratarlo y evitar problemas por falta agua y por altas temperaturas.



República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé Comayagua.

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Tel: 2784-5815

Correo: unidadtecnicamunicipalmt@gmail.com



ING. JOEL NOLASCO ESPINOZA
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL






República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabe Comayagua.

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Tel: 2784-5815

Correo: unidadtecnicamunicipalmt@gmail.com

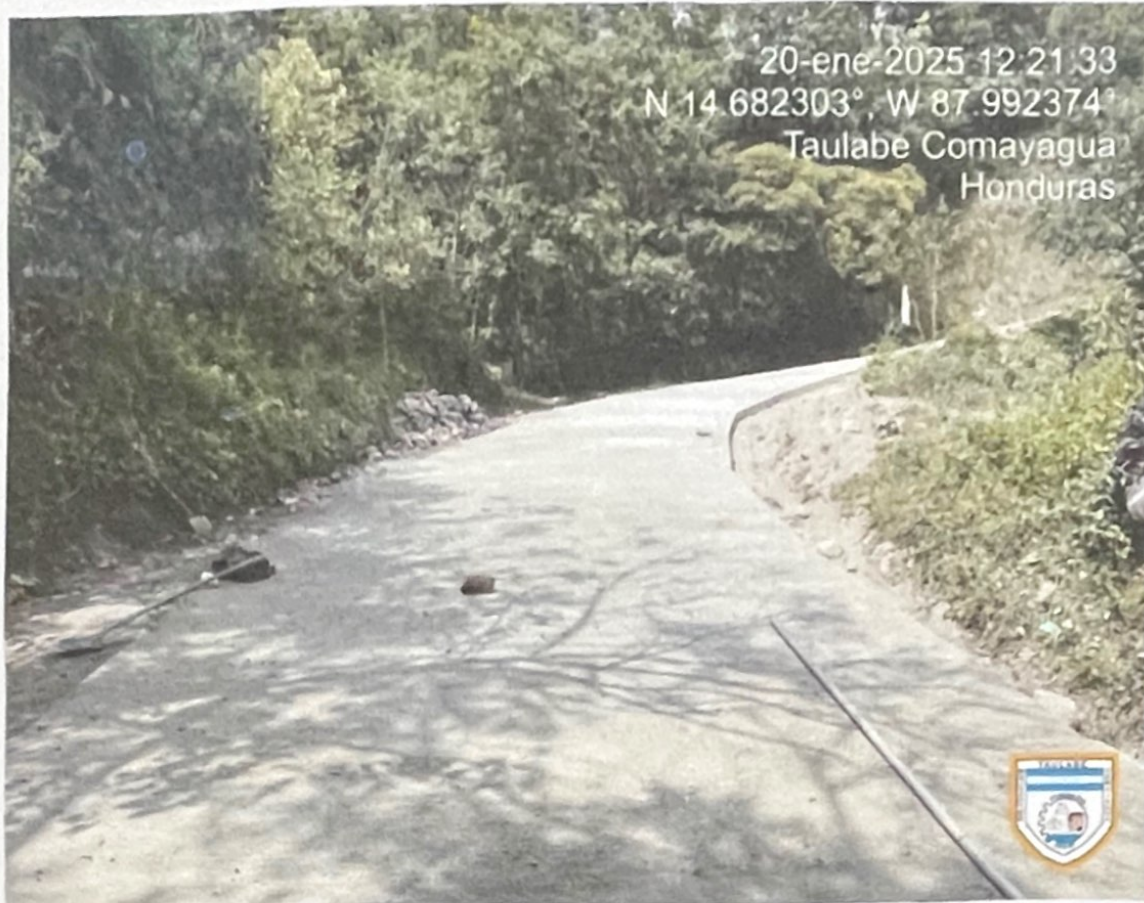



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.



Nombre: Estimación de avance de obra
Ubicación: En la Comunidad de Terrero Blanco, en Municipio de Taulabé Comayagua.
Proyecto: Construcción De Pavimento Ciclópeo, Con Una Longitud De 230 Metros, Ancho De 4.70 Metros Y Un Espesor De 0.20 Metros, Con Bordillos de 15x15 cm.

Estimación N°: 001
Fecha Inicio Proyecto: 18/1/2025
Elaboró: Ing. Joel Nolasco

Mes: ENERO
Fecha de Elaboración: 21/1/2025
Fecha de Aprobación: 22/1/2025

CONTRATO ORIGINAL						EJECUTADO						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO		PORCENTAJE
						CANT	PRECIO	CANT	PRECIO	CANT	PRECIO	
1.00	LIMPIEZA DE TERRENO.	M2	1081.00	L 10.40	L 11,242.40			1081.00	L 11,242.40	1081.00	L 11,242.40	100%
2.00	EXCAVACION DE MATERIAL.	M3	108.10	L 415.80	L 44,947.98			108.10	L 44,947.98	108.10	L 44,947.98	100%
3.00	TRAZADO Y MARCADO.	ML	230.00	L 28.53	L 6,561.90			230.00	L 6,561.90	230.00	L 6,561.90	100%
4.00	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO.	M3	54.05	L 894.94	L 48,371.51			54.05	L 48,371.51	54.05	L 48,371.51	100%
5.00	CONCRETO CICLOPEO E=20CM PROPORCION 1:2:3	M3	216.20	L 3,577.92	L 773,546.30			115.00	L 411,460.80	115.00	L 411,460.80	53%
6.00	BORDILLO DE CONCRETO 8000 PSI 15X15CM, 183@30CM	ML	460.00	L 268.95	L 123,717.00				-	0.00	-	0%
7.00	LIMPIEZA FINAL DE PROYECTO.	JRD	1.00	L 346.50	L 346.50				-	0.00	-	0%
Total Contrato					L 1,008,733.59	0	L		L 522,584.59	L 522,584.59		51.81%

SINPAD
S. DE R.L.
2018-11-21
Sr. J. L. Contrata
3919014630743

% DE ESTA ESTIMACION SEGÚN	51.80600623%
% DE ESTIMACION ANTERIOR	0.000000000%


DENIS OMAR MEMBREÑO
Alcalde Municipal de Taulabé
Comayagua

MONTO DE ESTA ESTIMACION	L 522,584.59
% TOTAL DE ESTA ESTIMACION	51.80600623%


ALCAIDIA MUNICIPAL
Sr. J. L. Contrata
3919014630743

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO


PLANO Y DETALLE

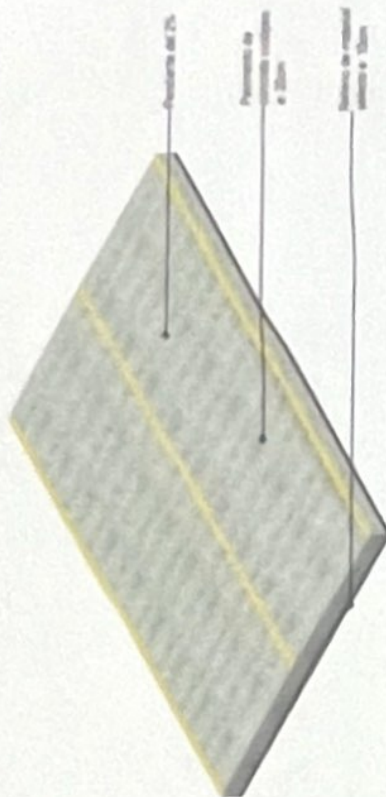


AXONOMÉTRICO HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO
ESCALA 1:40



CORTE B-B PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO
ESCALA 1:30

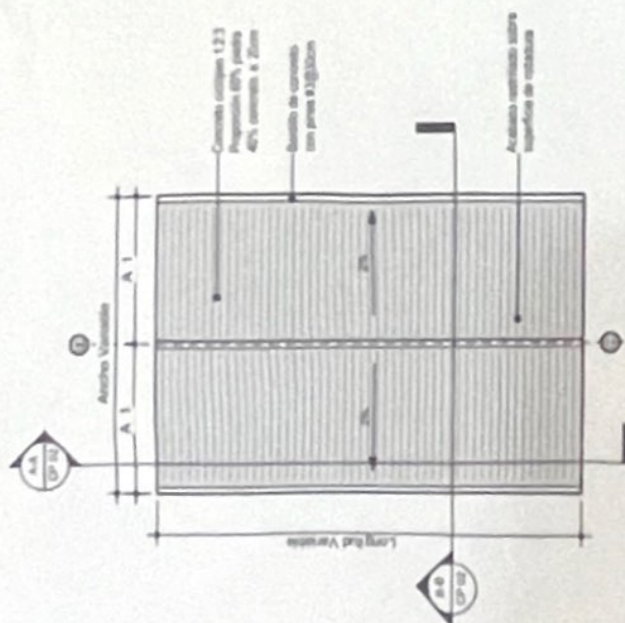

PLANTA HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO
ESCALA 1:50



CORTE A-A PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO
ESCALA 1:30



Camino Productivos

FORMATO DE COTIZACION



Republica de Honduras C.A

Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

Teléfono: 2784-5076; Telefax Tesorería 2784-5815



NÚMERO COTIZACION

001

FECHA

02/01/2025

VÁLIDO HASTA

6/2/2025

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre Empresa: Servicio de Diseño y Construcción Padilla
 Ubicación: Comayagua Col. San Carlos Contigua a clínica banco de amor
 Teléfono: 9445 8169 - 2772 2266 RTN De Empresa: 03019014630743
 E-mail: SDC padilla 2014@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIDARIO	TOTAL
ACTIVIDADES DE PROYECTO					
1	Limpieza de Terreno.	M2	1,081.00	L: 10.40	11,242.40
2	Excavacion Material Tipo II(Semi-Duro).	M3	108.10	L: 415.80	44,947.98
3	Trazado y Marcado de Proyecto	ML	230.00	L: 28.53	6,561.90
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	54.05	L: 914.94	48,371.51
5	Concreto Ciclopeo E= 20cm propoeccion 1:2:3	M3	216.20	L: 3377.92	733,546.30
6	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15X15cm, 1#3@30cm	ML	460.00	L: 268.95	123,712.00
7	Limpieza de Area Final	JRD	1.00	L: 346.50	346.50

SUB-TOTAL

ISV % 15%

TOTAL

L: 1,008,733.59

Departamento Solicitantes: Unidad Técnica Municipal

Proyecto: PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO, MUNICIPIO DE TAULABÉ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

Ubicación: Comunidad de los Terrero Blanco, Municipio de Taulabe, Comayagua.

Alcalde Municipal: Denis Omar Membreño

Términos y condiciones

- Esta cotización es válida por un período de [validez hasta 30 días] a partir de la fecha de emisión. Después de este período, los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Los precios indicados en esta cotización están expresados en [indicar moneda, e.g., Lempiras Hondureño] y no incluyen impuestos, a menos que se especifique lo contrario.
- Los productos o servicios ofrecidos en esta cotización están sujetos a las garantías especificadas en los documentos adjuntos o en el contrato final. Las garantías no aplican en caso de mal uso, negligencia o manipulación indebida por parte del cliente.

firma Del Contratista

FORMATO DE COTIZACION



Republica de Honduras C.A

Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

Teléfono: 2784-5076; Telefax Tesorería 2784-5815



NÚMERO COTIZACION

002

FECHA

02/01/2025

VALIDO HASTA

6/2/2025

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre Empresa: Constru M.A.R S. de R.L.
 Ubicación: Colonia Brisas de Altamira, Comayagua
 Teléfono: 9721-1827 RTN De Empresa: 03019075715151
 E-mail: Construmarchn@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ACTIVIDADES DE PROYECTO					
1	Limpeza de Terreno.	M2	1,081.00	74.20	L. 15,350.20
2	Excavacion Material Tipo II(Semi-Duro).	M3	108.10	437.75	L. 47,320.78
3	Trazado y Marcado de Proyecto	ML	230.00	36.41	L. 8,374.30
4	Re lleno y Compactado con Material Selecto	M3	54.05	975.63	L. 49,489.80
5	Concreto Ciclopeo E= 20cm propoeccion 1:2:3	M3	216.20	3,628.05	L. 784,384.41
6	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15X15cm, 1#3@30cm	ML	460.00	287.33	L. 132,171.80
7	Limpeza de Area Final	JRD	1.00	367.80	L. 367.80

SUB-TOTAL

ISV % 15%

TOTAL L. 1,037,459.09

Departamento Solicitantes: Unidad Tecnica Municipal

Proyecto: PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, MUNICIPIO DE TAULABÉ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

Ubicación: Comunidad de los Terrero Blanca, Municipio de Taulabé, Comayagua.

Alcalde Municipal: Denis Omar Membreño

Términos y condiciones

- Esta cotización es válida por un periodo de [validez hasta 30 días] a partir de la fecha de emisión. Después de este periodo, los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Los precios indicados en esta cotización están expresados en [indicar moneda, e.g., Lempiras Hondureño] y no incluyen impuestos, a menos que se especifique lo contrario.
- Los productos o servicios ofrecidos en esta cotización están sujetos a las garantías especificadas en los documentos adjuntos o en el contrato final. Las garantías no aplican en caso de mal uso, negligencia o manipulación indebida por parte del cliente.


 Firma Del Contratista

FORMATO DE COTIZACION



Republica de Honduras C.A

Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

Teléfono: 2784-5076; Telefax Tesorería 2784-5815



NÚMERO COTIZACION

003

FECHA

02/01/2025

VÁLIDO HASTA

6/2/2025

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre Empresa: Ingenieros Tecnicos de Honduras S. de R. L.
 Ubicación: Colonia Valladolid, Contiguo a Iglesia Evangelica Asambleica de Dios Comayagua
 Teléfono: 8766-2819 RTN De Empresa: 08019021255055
 E-mail: i.t.h.contratastas@gmail.com

ITM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIDARIO	TOTAL
ACTIVIDADES DE PROYECTO					
1	Limpieza de Terreno.	M2	1,081.00	11.20	12,107.20
2	Excavacion Material Tipo II(Semi-Duro).	M3	108.10	480.10	51,898.81
3	Trazado y Marcado de Proyecto	ML	230.00	42.80	9,729.00
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	54.05	920.30	49,742.22
5	Concreto Ciclopeo E= 20cm propoeccion 1:2:3	M3	216.20	3850.70	832,521.34
6	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15X15cm, 1#3@30cm	ML	460.00	315.20	144,992.00
7	Limpieza de Area Final	JRD	1.00	2580.60	2580.60

SUB-TOTAL

1,103,571.17

ISV % 15%

TOTAL

1,103,571.17

Departamento Solicitantes: Unidad Tecnica Municipal

Proyecto: PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, MUNICIPIO DE TAULABÉ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.




Ubicación: Comunidad de los Terrero Blanco, Municipio de Taulabe, Comayagua.

Alcalde Municipal: Denis Omar Membreño

Términos y condiciones

- Esta cotización es válida por un período de [validez hasta 30 dias] a partir de la fecha de emisión. Después de este período, los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Los precios indicados en esta cotización están expresados en [indicar moneda, e.g., Lempiras Hondureño] y no incluyen impuestos, a menos que se especifique lo contrario.
- Los productos o servicios ofrecidos en esta cotización están sujetos a las garantías especificadas en los documentos adjuntos o en el contrato final. Las garantías no aplican en caso de mal uso, negligencia o manipulación indebida por parte del cliente.

[Firma]
 INGENIEROS
 TECNICO DE MONITORIAS
 firma Del Construcción

		FICHA DE FORMULACIÓN DE PROYECTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN A CAMINOS PRODUCTIVOS			
MUNICIPIO: TALLABÉ		DEPARTAMENTO: COMAYAGUA		FECHA DE SOLICITUD: 14/10/2024	
MONTO SOLICITADO: L. 1,004,636.72		I. Aspectos Generales del Proyecto			
Nombre del Proyecto				Aldea Beneficiaria	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA TERRERO BLANCO, MUNICIPIO DE TALLABÉ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA				TERRERO BLANCO	
Dirección del Proyecto		Ubicación del Proyecto		Imagen Satelital del Terreno (Google Earth)	
00 DCA5		ALDEA TERRERO BLANCO			
Fecha proyectada de Finalización		Georreferencia de Inicio del Proyecto			
26 12 2024		14.66211377 -87.95133777			
Población Beneficiaria (Datos del INE)		Georreferencia de Final del Proyecto			
475		14.64200003 -87.95229071			
Empleos Directos		Empleos Indirectos			
10		15			
Tipología de Obras (marque con una "X" la casilla que corresponda)		Tipo de Producción en la Zona (marque con una "X" una o varias casillas)			
<input type="checkbox"/> Carreteras		<input type="checkbox"/> Cabañales		<input checked="" type="checkbox"/> X	
<input type="checkbox"/> Caminos		<input type="checkbox"/> Ganadería		<input checked="" type="checkbox"/> X	
<input type="checkbox"/> Montañas		<input type="checkbox"/> Agricultura de autoconsumo		<input checked="" type="checkbox"/> X	
<input type="checkbox"/> Puentes de paso (ríos, quebrones y vados)		<input type="checkbox"/> Agricultura extensiva (producción menor)		<input checked="" type="checkbox"/> X	
<input checked="" type="checkbox"/> X		<input type="checkbox"/> Agricultura intensiva (grandes cultivos)		<input type="checkbox"/> Horticultura y flores ornamentales	
<input type="checkbox"/> Otros		<input type="checkbox"/> Piscicultura		<input type="checkbox"/>	
II. Datos Generales de Supervisión					
Nombre de Alcaldesa Municipal		Nombre del Supervisor Técnico Municipal		Nombre del Supervisor(a) SIT	
LUIS OLMAR MEMBRERO GALINDO		RIVAN BRYRON JOEL NOGASCO ESPINOZA		JOSE FERNANDO CASTRO GUILLEN	
DNI del Alcaldesa		DNI del Supervisor Técnico Municipal		DNI del Supervisor(a) SIT	
0316-1970-00292		0321-2000-00040		0307-1995-00006	
Teléfono		Teléfono		Teléfono	
9635-3031		9635-2067		3108-1937	
Correo electrónico		Correo electrónico		Correo electrónico	
secretaria@tallabe.com		rivan.nogasco@gmail.com		fernando.castro@gmail.com	
III. Actividades y Presupuesto del Proyecto					
Descripción del Proyecto:				Metros Lineales	Ancho en metros
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO, EN PENDIENTE PRONUNCIADA CON UNA LONGITUD DE 230 METROS, ANCHO DE 4.70 METROS Y UN ESPESOR DE 0.20 METROS.				230	4.70
Diagrama de Actividades del Proyecto:					
No.	Actividades	Unidad	Cantidad	Preco Unitario	Valor (en números y en letras)
1	Limpieza de Terreno	M2	1,091.00	L. 10.40	L.11,342.40
2	Excavación de Material	M3	108.10	L. 415.80	L.44,947.80
3	Trasado y Marcado	ML	230.00	L. 28.53	L.6,561.90
4	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	54.05	L. 894.94	L.48,371.51

5	Concreto Ciclópeo e=20cm Proporción 1:2:3	M3	216.20	L	3,577.92	1,773,546.30
6	Bordillo de Concreto 3000 PSI 15x15 cm, 183@30cm	ML	460.00	L	268.95	1,123,717.00
7	Limpieza Final	JRD	1.00	L	346.50	1,346.50
TOTAL DEL PROYECTO:						1,1,008,733.50
						UN MILLON OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 59/100 CENTAVOS

4. Estimado Financiero del Proyecto

	Monto en Números	Monto en letras	Procedencia de Fondos
Monto Total (SIT)	1,1,004,636.72	UN MILLON CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS	Fondos Nacionales
Aporte Municipal	14,096.87	CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS	Fondos de Gobierno Local
Costo Total del Proyecto	1,1,008,733.59	UN MILLON OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 59/100 CENTAVOS	Fondos Nacionales

5. Registro Fotográfico

		
Georeferencia: 14.68231373 -87.99135777	Georeferencia: 14.68231373 -87.99135777	Georeferencia: 14.68231373 -87.99135777
Fotografía Actual	Fotografía Actual	Fotografía Actual

		
Georeferencia: 14.68231373 -87.99135777	Georeferencia: 14.68231373 -87.99135777	Georeferencia: 14.68231373 -87.99135777
Fotografía Actual	Fotografía Actual	Fotografía Actual


6. Firmas de Formulación del Proyecto


Firma y sello del Alcalde Municipal	Firma y sello del Supervisor Técnico Municipal	Firma y sello del Supervisor SIT
-------------------------------------	--	----------------------------------

CARTA PODER

Yo, **DAVID OMAR PADILLA TERCERO**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño, con domicilio en Comayagua, Departamento de Comayagua, con Tarjeta de Identidad No. **1213-1981-00086**. En mi condición de **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa mercantil **SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "SINPAD S. DE. R.L."** Como consta en Escritura de Constitución en Instrumento Público número 12 en fecha 24 de enero del 2014, ante los Oficios del Notario Público Gilberto Navas Izaguirre. Inscrita bajo asiento 382 tomo 127 del Registro de Comerciantes Sociales que lleva el Instituto de la Propiedad de Comayagua, departamento de Comayagua. Por medio de la presente CARTA PODER hago constar: **QUE OTORGO PODER AMPLIO Y SUFICIENTE** en cuanto en derecho sea necesario a **DAMARYS CRISTABEL LOPEZ DUBON**, quien es mayor de edad, casada, hondureña, Licenciada en Pedagogía, de este domicilio con Documento Nacional de Identidad **0301-1980-01771**; para que pueda comparecer ante las oficinas respectivas de la Alcaldía Municipal de Taulabe, y recibir cheques o pagos que se extiendan a favor de la empresa **"SINPAD S. DE. R.L."** Así como también la faculto para comparecer a esta alcaldía y todas sus dependencias y realizar trámites concernientes a **"SINPAD S. DE. R.L."** Por lo que le otorgo facultades para presentar documento, firmar documentos que fueren necesarios y recibir documentos que se extiendan a favor de **SINPAD S. DE. R.L.**

Para seguridad y constancia firmo la presente **CARTA PODER** en la Ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, a los 22 días del mes de enero del año 2025.


F) _____
DAVID OMAR PADILLA TERCER





VALOR LPS. 560.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad

Nº 7760654

Yo, **MARIANO LAGOS DONAIRE**, Abogado y Notario Público de este domicilio de Comayagua, Departamento de Comayagua, con su oficina profesional ubicadas en el barrio arriba atrás de Iglesia La Merced de esta ciudad, e inscrito con Número cero ocho cuatro cuatro 0844 del Colegio de Abogados de Honduras y ocho uno cuatro 814 de la Honorable Corte Suprema de Justicia, **CERTIFICO:** Que la firma original que antecede al pie del documento denominado: **CARTA PODER. A** favor de **DAMARYS CRISTABEL LOPEZ DUBON** con Documento Nacional de Identidad 0301-1980-01771. **ES AUTENTICA** por haber sido puesta en mi presencia de puño y letra por el señor **DAVID OMAR PADILLA TERCERO** con Documento Nacional de identificación 1213-1981-00086 en su condición de Gerente y Representante legal de la empresa **SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA "SINPAD S. DE R.L."** De todo esto y en conformidad al Artículos 25 del Código del Notariado.- DOY FE.

Comayagua, 22 de enero del 2025.

...ULTIMA LINEA...

MARIANO LAGOS DONAIRE
Exequátur No.814

1305566



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA, S. DE. R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **03019014630743**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

H
Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA, S. DE. R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **03019014630743**


Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 08/02/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
República de Honduras

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



Seguros
LAFISE

Nº. 01657

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



EMPRESA SEGUROS LAFISE S.A.

DATOS GENERALES

Afianzado: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE R.L.

Fianza: FI-1149588-60374-0

R.T.N.: 03019014630743

Identidad: AS-1149588

Dirección: COL. SAN CARLOS, FRENTE AL PORTÓN DE LA ESCUELA
DUPLEX, CONTIGUO A CLINICA BRAZO DE AMOR,
COMAYAGUA, COMAYAGUA.

Vigencia

151 Dias

Ciudad: Comayagua

Depto.: Comayagua

DESDE: 17/ene./2025

HASTA: 17/jun./2025

Teléfono: 27722266

Fax: 94458109

12:00 pm Al Mediodía

DESCRIPCIÓN DE LA FIANZA

Beneficiario: ALCALDÍA, MUNICIPAL DE TAULABÉ, COMAYAGUA

Recibo No.

6272440

Suma Afianzada

L

151,310.04

SEGUROS LAFISE HONDURAS, establecido y organizado de conformidad con las Leyes de la República de Honduras y con domicilio en esta ciudad, que en lo sucesivo se denominara "La Compañía", formalmente otorga Garantía Irrevocable de FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, por cuenta de SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE R.L., por el plazo de 151 Dias contados a partir del 17/01/2025 hasta el 17/06/2025, con suma afianzada de (L.151,310.04) CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 04 / 100 CENTAVOS, para garantizar que el Afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLÓPEO, CON UNA LONGITUD DE 230 METROS, ANCHO DE 4.70 METROS Y UN ESPESOR DE 0.20 METROS, CON BORDILLOS DE 15X15 CM, EN LA COMUNIDAD DE LOS TERRERO BLANCO, EN MUNICIPIO DE TAULABÉ COMAYAGUA.

La presente Fianza responderá al "Beneficiario" de aquellos actos perjudiciales imputables directamente a "El Afianzado" y que pudiera incurrir en el desarrollo de sus operaciones, dentro de la vigencia de la presente fianza, siempre que el reclamo sea presentado antes del vencimiento de la misma, caso contrario "La Compañía" quedará libre de toda responsabilidad. En consecuencia, nos comprometemos formal e irrevocablemente por los conceptos arriba mencionados a pagar según los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley de Seguros y Reaseguros vigente, una vez comprobado el incumplimiento de "El Afianzado", hasta por el monto de la Suma Afianzada.

Solo "El Beneficiario" podrá cobrar la indemnización que resulte de esta Garantía y no podrá cederla sin la aceptación de "La Compañía".

En caso que "La Compañía" efectúe un pago bajo esta Garantía quedará subrogada en todos los derechos, acciones, garantías y privilegios que "El Beneficiario" tenga contra "El Afianzado" y contra terceros.

"El Beneficiario" quedará privado de todo derecho o acción derivadas, directa o indirectamente de la presente Garantía en caso que el mismo "Beneficiario" o cualquier persona que obre en su nombre y con su autorización hiciere o utilizare en apoyo de la reclamación, declaraciones falsas o utilizare medios o documentos engañosos, falsos, adulterados o dolosos o se prestare el mismo "Afianzado" para actuar en contra de los intereses de "La Compañía" en cualquiera de las formas en este artículo relacionado.



FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



DATOS GENERALES

Afianzado: SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE R.L.

Fianza: FI-1149588-60374-0

R.T.N.: 03019014630743

Identidad: AS-1149588

Cualquier notificación que haya de hacerse a "La Compañía" con motivo de esta Garantía, deberá efectuarse por escrito.

Toda modificación o adición que haya de hacerse a esta Garantía debe constar en anexo y/o endoso debidamente firmado por "El Beneficiario", "El Afianzado" y "La Compañía".


Se fija como domicilio especial para todos los efectos de esta Garantía, la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuyas autoridades judiciales competentes se someten las partes contratantes y los Fiadores Fiduciarios para cualquier reclamo fundamentado en este documento.

En todo lo no previsto en esta Garantía, se aplicará todo lo prescrito en las Leyes de la República de Honduras en lo pertinente.

Forman parte de presente fianza las Condiciones Generales, las condiciones particulares, los endosos y/o anexos emitidos en esta fecha.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 17 Días del mes de enero del año 2025




FIRMA AUTORIZADA



MUNICIPALIDAD DE TAULABÉ

Calle Principal de Taulabé, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2784-5815

Cuenta N.º: 11-605-000169-0

CHEQUE No. 00023489

TAULABÉ, 28 DE ENERO DEL 2025

Lugar y Fecha

MARCO TULIO RODRIGUEZ VASQUEZ

*****325.052.71

Páguese a la orden de

**** TRESTIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS CON 71/100 ****

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)



001605079000160500016900000023489

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FIN-FUN	FTE-FIN	ORG-FIN	FTE-ESP
N.º DE CUENTA			DESCRIPCIÓN			DEBE	HABER	
11 03 004 000 001 47210 15-013-01			Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público			342,160.75	0.00	
			Retención por Garantías 5%			0.00	17,108.04	
			Total Afectación a Bancos				325,052.71	

Pago por estimación No. 1 en proyecto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), en Barrio Mery de Flores, del Municipio de Taulabé, Comayagua

CHEQUE No. 00023489



MARCO TULIO VASQUEZ RODRIGUEZ
9868-3487
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE TAULABÉ

Calle Principal de Taulabé, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2784-5815

Cuenta N.º: 11-505-000169-0

CHEQUE No. 00023489

TAULABÉ, 28 DE ENERO DEL 2025

Lugar y Fecha

MARCO TULIO RODRIGUEZ VASQUEZ

*****325,052.71

Páguese a la orden de

**** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS CON 71/100 ****

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.



Firma (s)

⑆0⑆605079⑆00⑆⑆605000⑆690⑆00023489

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FIN-FUN	FTE-FIN	ORG-FIN	FTE-ESP
N.º DE CUENTA		DESCRIPCIÓN			DEBE		HABER	
11 03 004 000 001 47210 15-013-01		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público			342,160.75		0.00	
		Retención por Garantías 5%			0.00		17,108.04	
		Total Afectación a Bancos					325,052.71	

Pago por estimación No. 1 en proyecto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), en Barrio Mary de Flores, del Municipio de Taulabé, Comayagua.

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional
Fecha de Emisión: 03/04/2017 RTN: 12121959000146

MARCO TULIO RODRIGUEZ VASQUEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestatista	<input type="checkbox"/>		

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FULLNAME

MARCO TULIO

APELLIDO / SURNAME

RODRIGUEZ VASQUEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

12-02-1959

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1212 1959 00014

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

12-02-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



MA

CHEQUE No. 00023489

AVIA ESTIMOLAZA
TESORERA

BALANCE

MARCO TULIO VASQUEZ
RODRIGUEZ

9868-3487



Municipalidad de Taulabe, Comayagua

ORDEN DE PAGO

No. **42745**

Cheque No.



FECHA: 28 DE ENERO DEL 2025

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MARCO TULIO RODRIGUEZ VASQUEZ

Valor L.

*****342,160.75

La suma de:

**** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS CON 71/100 ****

Pago por estimación No. 1 en proyecto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), en Barrio Mery de Flores, del Municipio de Taulabé.

Presupuesto	Valor L.	Descripcion	Debe	Haber
11 000 004 000 001 47210 15-013-01	342,160.75	Construcciones y Mejoras de Bienes en	342,160.75	0.00
		Retención por Garantías 5%	0.00	17,108.04
TOTAL L.			342,160.75	17,108.04
***** ULTIMA LINEA *****			TOTAL L.	325,052.71

Oficina Solicitante:

UTM

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Jefe de Presupuesto

Firma y Sello Tesorero(a) Mpal

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

Acta de Entrega: _____

Informe Ing/Rep/Ck: _____

RTN: _____ Fotos: _____

Solvencia: _____

Fecha: _____

Firma Interocebo

1212-1959-00614
Identidad

No. de Solvencia

Realizado por:

28/01/25 MARIA.C

Municipalidad de Taulabe, Comayagua



RECIBO NO. 42745

POR L. 325,052.71




Recibí de la Municipalidad de Taulabe, Comayagua la Cantidad de :

L. 325,052.71 **** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y DOS CON 71/100 ****

POR CONCEPTO DE:

Pago por estimación No. 1 en proyecto CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), en Barrio Mery de Flores, del Municipio de Taulabé.

Fecha : 28 De Enero Del 2025


MARCOTULIO VASQUEZ
RODRIGUEZ
MARCO TULIO RODRIGUEZ VASQUEZ
Identidad No. 121-9868-3487

MUNICIPALIDAD DE TAULABE



CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
(SEGUNDA ETAPA), CELEBRANDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE
TAULABE Y MARCO TULIO RODRIGUEZ.

MARCO TULIO RODRIGUEZ VASQUEZ

RTN: 12121959000146

El Circilar, Calle Principal a La Par de La Pulperia
Martha, Comayagua, Siguatepeque.

(504) 9868-3487

marcotuliorodriguez120259@gmail.com

CAI: 27D77D-8871BDIAECE0-63BE03-090989-13

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

No. 000-001-04-00000001



Lps.

325,052.71

DÍA

28

MES

Enero

AÑO

2025

Recibí de:

Municipalidad de Taulabe

RTN:

03219001034319

La suma de:

trescientos veinte y cinco mil, cincuenta y dos
Lempiras con 71/100

Por concepto de:

Pago de estimación #1 proyecto construcción sistema
de alcantarillado Sanitario 2da Etapa barrio Mary de los
taulabe

Fecha Límite de Emisión: 26/11/2025

Número Inicial y Final: 000-001-04-00000001 al

000-001-04-00000001

☐ Efectivo

☐ Transferencia

☐ Cheque

No

Total por honorarios L:

325,052.71

Retención I.S.R. / L:

Total Neto Recibido L:

325,052.71

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-24-10500-5, Tel 9976-3182

MARCO TULIO VASQUEZ
RODRIGUEZ
9868-3487

Firma



República de Honduras C.A
Alcaldía, Municipal de Taulabé, Comayagua
Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815



CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), CELEBRANDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TAULABE Y MARCO TULIO RODRIGUEZ.

Nosotros, **DENIS OMAR MEMBREÑO GALINDO**, actuando en mi condición como Alcalde Municipal, mayor de edad, casado y vecino de este Termino Municipal, con **DNI, No. 0318-1970-00292** actuando en condición de Alcalde Municipal de Taulabé, Departamento de Comayagua, nombrado para tal cargo mediante acta especial, 25 de Enero de 2022 y autorizada por la ley para esta clase de actos quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra el Contratista y propietario; **MARCO TULIO RODRIGUEZ VASQUEZ**, mayor de edad, Hondureño, casado, Residente de la ciudad de Siguatepeque, en mi condición de gerente general con **RTN, No. 12121959000146**, que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato temporal de Construcción de obra pública determinada, mismo que se regirá por lo estipulado en el presente contrato; en la Ley de Contratación del Estado; y La Ley de Jurisdicción De Lo Contencioso Administrativo.

PRIMERA: DEL OBJETO: SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES OBRAS QUE SE COMPRENDEN EN ESTE CONTRATO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), Barrio Mery de Flores, del Municipio de Taulabé Comayagua, según se detalla en los requerimientos generales de la obra. El contratista tendrá en su cargo los trabajos de construcción según se detalla en los planos y en todas actividades del mismo. Se deberán ejecutarse de acuerdo las especificaciones técnicas presentadas por la Unidad Técnica Municipal (de igual o superior calidad).

SEGUNDA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de este contrato es de un periodo de **NOVENTA (90) días Calendario**; contados a partir de la fecha establecida en la **Orden de Inicio**.

TERCERA: MONTO Y FORMA DE PAGO: El monto del presente asciende a la suma de **UN MILLÓN CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS (L.041,351.50)** esto comprende la mano de obra, Materiales de construcción, equipos, máquinas, herramientas, dirección y administración y en fin, todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. La municipalidad pagara a **EL CONTRATISTA** por la ejecución, bajo la modalidad de estimación de la obra ejecutada o realizada, la cual se hará en efectivo mediante Varios desembolso y de acuerdo a la disponibilidad financiera actual de la Municipalidad y sin recargo por concepto de interés: **CUARTA: ORDEN DE INICIO:** Se considera como tal la fecha establecida en la notificación de la **ORDEN DE INICIO**, al contratista para el inicio de la obra. **QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** tanto **LA MUNICIPALIDAD**, como **EL CONTRATISTA**; se obligan al cumplimiento estricto de lo especificado en este contrato; - La mano de obra que utilice el Contratista; será bajo su responsabilidad; así como también el equipo o herramientas que utilice, los materiales que se utilicen deberán ser de calidad supervisados por la unidad técnica municipal. - y se aclara que la **Alcaldía Municipal no responde por el pago de los trabajadores; ni daños a terceros.** **SEXTA: GARANTIAS:** Según la ley de contratación del estado de Honduras (LCE) **Capitulo VIII Art. 100 y Art.104** respalda dicha garantías; **EL CONTRATISTA**, está en la obligación de presentar a favor de La Municipalidad de Taulabé las garantías siguientes: a) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO;** Previo a firmar el contrato se obliga a rendir la



República de Honduras C.A
Alcaldía, Municipal de Taulabé, Comayagua
Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815



garantía a favor de la MUNICIPALIDAD DE TAULABE equivalente al 15% del monto total del contrato, la cual consistirá en una garantía de; **PAGARE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** esta será emitida por la municipalidad de Taulabé. Esta garantía estará con vigencia hasta 100 (CIEN) días después del plazo previsto para la ejecución de la obra, a partir de la (ORDEN DE INICIO) y deberá contener la condición que se expresa "Sera ejecutada a simple requerimiento a favor de la MUNICIPALIDAD DE TAULABE" la suma de (L 1,041,351.50) (15%) de este contrato es equivalente a CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 73/100 CENTAVOS (L 156,202.73); b) **GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA:** Se establece una garantía de calidad de obra equivalente al 5% del monto del contrato, la cual será retenida para asegurar la calidad de obra una vez finalizado y firmada el ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRA PUBLICA y se deducirá en igual porcentaje en el último pago, esta será de CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS (L 52,067.58), con vigencia por un plazo de 12 (Doce) meses contando a partir de la fecha de finalización del proyecto o fecha de acta de recepción de obra pública.

SEPTIMA; DEDUCCIONES: El contratista presentará una constancia de solvencia sujeta al régimen de pagos cuenta vigente extendida por la SAR; previo a la presentación de documentación del contrato, caso contrario de no ser presentada se deducirá el 12.5% de retención del monto total de contrato.

OCTAVA; DEL SUPERVISOR. El supervisor es la persona identificada en el contrato y es el representante autorizado por la Municipalidad de Taulabé, nada que este contenido en los documentos del contrato deberá crear relación contractual alguna entre el supervisor y EL CONTRATISTA.

NOVENA; DE LA AUTORIDAD DEL SUPERVISOR. El Supervisor tendrá la administración general del contrato de construcción, incluyendo la realización de las funciones más adelante descritas, el Supervisor será el representante de la Municipalidad Taulabé, en la construcción y hasta que se efectué el pago final. El Supervisor tendrá autoridad para actuar en nombre de la MUNICIPALIDAD DE TAULABE hasta donde estipula en contrato, a menos que se modifique dicha autoridad mediante escrito que será notificado a EL CONTRATISTA. El Supervisor consultara y asesorara a la MUNICIPALIDAD DE TAULABE; y todas las instrucciones dadas a EL CONTRATISTA serán transmitidas por escrito a través del Supervisor. El supervisor en todo tiempo deberá tener acceso al trabajo, ya sea que este en preparación o en proceso, EL CONTRATISTA debe proporcionar facilidad para tal fin, de forma que el Supervisor pueda realizar sus funciones de acuerdo al contrato, el supervisor hará visitas diarias o constantes al lugar para determinar si el trabajo se está llevando a cabo de acuerdo al contrato, haciendo observaciones informales sobre el proceso del trabajo; y comunicara por escrito a la MUNICIPALIDAD DE TAULABE como propietario de los defectos y deficiencias en el trabajo de EL CONTRATISTA. El Supervisor no será responsable por los medios, métodos y programas de seguridad relacionados con la obra.

DECIMA; DEL PLAZO DE EJECUCION. EL CONTRATISTA deberá ejecutar y dirigir el trabajo haciendo uso de su capacidad y atención, será el único responsable de los medios, métodos, técnicas, secuencias y procedimiento de construcción y de las coordinaciones de todo el trabajo contenido en contrato, siendo el plazo de ejecución de este contrato de NOVENTA días hábiles (90), a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio emitida por el supervisor.

DECIMO PRIMERA; DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. – A menos que se indique específicamente de otra manera, EL CONTRATISTA deberá proporcionar y pagar toda la mano de obra, materiales de construcción, equipo, maquinaria, agua, servicios públicos necesarios para la debida ejecución y terminación del trabajo. EL CONTRATISTA en todo tiempo, no deberá ocupar en el trabajo ninguna persona no apta o alguien que no sea capacitado para la labor que se encomienda. EL CONTRATISTA garantiza a la Municipalidad de Taulabé y al Supervisor que todos los equipos de maquinaria suministrados de acuerdo a este contrato estarán en buen estado, a menos que se especifique de otra manera y que todo el trabajo será de buena calidad, libre de fallas y defectos y de conformidad al contrato. Todo trabajo que no esté en conformidad a esta



República de Honduras C.A
Alcaldía, Municipal de Taulabé, Comayagua
Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815



norma puede considerarse defectuoso. De acuerdo a esta garantía, EL CONTRATISTA se le obliga por el periodo de Doce meses (12) después de la terminación y aceptación de los trabajos incluidos en el contrato, a hacer por cuenta las reparaciones y sustituciones que se requieran como consecuencia de la mano de obra deficiente o por materiales defectuosos. **DECIMA SEGUNDA; MODIFICACION AL CONTRATO:** El contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando se acuerde por los firmantes del mismo; previa una aprobación de la Unidad Técnica Municipal (Supervisión). **DECIMA TERCERA; CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO:** a) El mutuo acuerdo entre las partes; b) Incumplimiento de contrato; c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debidos a insuficiente mano de obra, o uso inapropiado de equipo, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por La Unidad Técnica Municipal (Supervisión) y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato. d) Caso fortuito o Fuerza Mayor debiendo entenderse esta como todos los actos hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento; que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato, e) Resolución de contrato decretada por autoridad competente. **DECIMA CUARTA; RESOLUCION DE CONTROVERSIAS:** Cualquier controversia que sugiere de este contrato, será sometida en todo derecho administrativo, siendo la jurisdicción competente para conocer las cuestiones de que los mismo deriven, los Tribunales de lo Contencioso Administrativos que la Municipalidad designe. **DECIMA QUINTA:** Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y firman para constancia en el municipio de Taulabé a los 17 días del mes de Enero de 2025; **CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (segunda etapa), Barrio Mery de Flores, del Municipio de Taulabé Comayagua.**



ST. DENIS OMAR MEMBREÑO
DNI No. 0318-1970-00292
Alcalde Municipal de Taulabé



Sr. MARCO TULIO VASQUEZ RODRIGUEZ
RTN, No. 9868-3487
Contratista



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.
Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.



ORDEN DE INICIO PROYECTO

UTM

PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA).

UBICACIÓN: Barrio Mery de Flores, del Municipio de Taulabé Comayagua.

COORDENADAS DE PROYECTO: Inicio: 16P 396537.47 1624831.67 mE Final: 16P 396870.92mE 16246544.01 mN

MUNICIPIO: TAULABE.

COSTO DE PROYECTO: L. 1,041,351.50

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARCO TULIO RODRIGUEZ.

FECHA DE INICIO: 18/01/2025.

NUMERO DE CELULAR DE LA CONTRATISTA: 9868-3487.

FECHA ESTIMADA FINAL: 18/04/2025

CORREO DE LA EMPRESA: marcotuliorodriguez120259@gmail.com

SUPERVISOR DE PROYECTO: Ing. Joel Nolasco

UBICACIÓN DE EMPRESA: BARRIO MARTHA, SIGUATEPEQUE.

PLAZO DE EJECUCION: 90 días calendario.

ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO

CONTRATO ORIGINAL			
ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Trazado y Marcado.	ML	590.00
2	Excavación Material Tipo II(Semi-Duro).	M3	952.09
3	Cama Arena Compac. E=10cm. Para Tubos en Alcantarillado.	M3	35.00
4	Suministro E Instalación de Tubería PVC 4" Drenaje.	ML	440.00
5	Suministro E Instalación de Tubería PVC 6" Drenaje.	ML	570.00
6	Suministro E Instalación de Tubería PVC 8" Drenaje.	ML	120.00
7	Acarreo De Material (Desperdicio) con Volqueta.	M3	130.00
8	Sum. E Inst. de Yee De PVC De 6"x4"	UND	30.00
9	Sum. E Inst. de Yee De PVC De 8"x4"	UND	25.00
10	Pozo Alcantarillado 1.5 m, no incluye. Acarr. Ni Excavación	UND	13.00
11	Cama Mat. Selecto Compac. E=40cm. Para Tubos en Alcantarillado.	M3	150.00
12	Tapadera Y Casquete-Pozo (Incl. Apoyo) (185kg/cm2)	UND	13.00
13	Caja de Registro 40x40x60 Cm.	UND	60.00
14	Relleno Comp. Con Material Del Sitio.	M3	500.00
15	Limpieza Final.	M2	364.00

Las actividades anterior mente mencionadas son las que conforman esta orden de inicio de proyecto, en el Municipio de Taulabe, departamento de Comayagua, A los 18 días del mes de enero del 2025, en representación de la Municipalidad de Taulabe, el Señor alcalde Denis Membreño, y el Ingeniero Supervisor Joel Nolasco y en representación el CONTRATISTA ejecutor la empresa; Marco Tulio Rodriguez. En este acto se hace formal la autorización del inicio del proyecto "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA).". haciendo constatar que se han cumplido los requisitos necesarios para el inicio del mismo, sin objeción de alguna de las partes interesadas.



Republica de Honduras C.A

Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.



En fe, de lo anterior se firma la presente Acta

En el municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua, de noviembre de 2025.



Sr. DENIS ENRIQUE MEMBREÑO
DNI No. 0343-1990-00292
Alcalde Municipal de Taulabé



Sr. MARCO TULIO RODRIGUEZ
R.T.N. 98683487
Contratista



República de Honduras C.A
Alcaldía, Municipal de Taulabé, Comayagua
Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
Alcaldía de Taulabé.

PAGARE DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Yo, MARCO TULIO RODRIGUEZ VASQUEZ, mayor de edad, Hondureño, casado, Residente de la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua en mi condición de gerente general, con RTN, No. 12121959000146, actuando en mi condición de CONTRATISTA DECLARO Y HAGO CONSTAR: Que; DEBO Y PAGARE, incondicionalmente a la ALCALDIA MUNICIPAL DE TAULABE; departamento de Comayagua, la cantidad de a CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 73/100 CENTAVOS (L 156,202.73), para garantizar el cumplimiento del contrato y proyecto, la garantía de cumplimiento equivalente al 15% del monto total del contrato, ESTA GARANTIA SE RIGE POR LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO HONDURAS, CAPITULO VIII, ARTICULO #100 como amparo legal, las activades a realizar son; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), Barrio Mery de Flores, del Municipio de Taulabé Comayagua; este PAGARE se libra SIN PROTESTO y los gastos y cualquier gasto que ocasioné el cobro extrajudicial a la ejecución de este Título será por cuenta del deudor, quien renuncia a toda diligencia, protesto, requerimiento judicial o extrajudicial cuando a ello hubiere lugar, ni excusas de ninguna clase; renunciando al fuero de mi domicilio para someterme a la competencia de juzgado o tribunal que destine el acreedor.

Firmo el presente Pagare de Cumplimiento de contrato, en Taulabé, Comayagua 18 días del mes de Enero de 2025. Con Vigencia de este pagare de Cumplimiento de 100 días calendario a partir de la orden de inicio.



Sr. DENIS OMAR MEMBREÑO
DNI No. 0318-1970-00292
Alcalde Municipal de Taulabé



Sr. MARCO TULIO VASQUEZ RODRIGUEZ
RTN, No. 12121959000146
Contratista



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.
Tel. 2784-5076, Telefax: Tesorería: 2784-5815.
RTN 0321-9001-034-319.



Nombre: Estimación de avance de obra
Ubicación: Ubicado en el Barrio Mery de Flores, del Municipio de Taulabé Comayagua
Proyecto: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA).

Estimación N°: 001
Fecha Inicio Proyecto: 18/1/2025
Elaboró: Ing. Joel Nolasco

Mes: ENERO
Fecha de Elaboración: 24/1/2025
Fecha de Aprobación: 27/1/2025

CONTRATO ORIGINAL						EJECUTADO						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		ACUMULADO		PORCENTAJE
						CANT	PRECIO	CANT	PRECIO	CANT	PRECIO	
1	Trazado y Marcado.	ML	590.00	L 20.00	L 11,800.00			295.00	L 5,900.00			50%
2	Excavacion Material Tipo II(Semi-Duro).	M3	952.09	L 350.00	L 333,231.50			476.05	L 166,615.75			50%
3	Cama Arena Compac. E=10cm. Para Tubos en Alcantarillado.	M3	35.00	L 600.00	L 21,000.00			12.25	L 7,350.00			35%
4	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 4" Drenaje.	ML	440.00	L 120.00	L 52,800.00			154.00	L 18,480.00			35%
5	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 6" Drenaje.	ML	570.00	L 200.00	L 114,000.00			199.50	L 39,900.00			35%
6	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 8" Drenaje.	ML	120.00	L 350.00	L 42,000.00			42.00	L 14,700.00			35%
7	Acarreo De Material (Desperdicio) con Volqueta.	M3	130.00	L 80.00	L 10,400.00			45.50	L 3,640.00			35%
8	Sum. EInst. de Yee De PVC De 6"x4"	UND	30.00	L 600.00	L 18,000.00			10.50	L 6,300.00			35%
9	Sum. EInst. de Yee De PVC De 8"x4"	UND	25.00	L 1,100.00	L 27,500.00			8.75	L 9,625.00			35%
10	Pozo Alcantarillado 1.5 m, no incluye. Acarr. Ni Excavacion	UND	13.00	L 13,000.00	L 169,000.00			4.55	L 59,150.00			35%
11	Cama Mat. Selecto Compac. E=40cm. Para Tubos en Alcantarillado.	M3	150.00	L 200.00	L 30,000.00			52.50	L 10,500.00			35%
12	Tapadera Y Casquete-Pozo(Incl. Apoyo)(185kg/cm2)	UND	13.00	L 2,500.00	L 32,500.00			0.00	L -			0%
13	Caja de Registro 40x40x60 Cm.	UND	60.00	L 1,500.00	L 90,000.00			0.00	L -			0%
14	Relleno Comp. Con Material Del Sitio.	M3	500.00	L 120.00	L 60,000.00			0.00	L -			0%
15	Limpieza Final.	M2	364.00	L 80.00	L 29,120.00			0.00	L -			0%
Total Contrato						L 1,041,351.50	0	L	L 342,160.75	L		32.8573733%

MARCO TULIO VASQUEZ RODRIGUEZ
Sr. MARCO TULIO VASQUEZ RODRIGUEZ
9868-3487

% DE ESTA ESTIMACION SEGUN	32.8573733%
% DE ESTIMACION ANTERIOR	0.000000000%



MONTO DE ESTA ESTIMACION	L 342,160.75
% DE ESTA ESTIMACION SEGUN CONTRATO	32.8573733%





República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Tel: 2784-5815

Correo: unidadtecnicamunicipalmt@gmail.com



INFORME DE SUPERVISION #1

18-28 DE ENERO 2025

ING. JOEL NOLASCO SUPERVISOR.

Proyecto Ejecutado – CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), Barrio Mery de Flores, del Municipio de Taulabé Comayagua.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA).

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

El objetivo de un proyecto de sistema de alcantarillado sanitario es diseñar, construir y operar una infraestructura eficiente para la recolección, transporte y disposición adecuada de las aguas residuales generadas por una comunidad o área específica. Esto incluye mitigar riesgos ambientales y de salud pública, promover el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Beneficios De Este Proyecto Para El Municipio Taulabe.

La implementación de un sistema de alcantarillado sanitario en una comunidad o barrios ofrece múltiples beneficios, abarcando aspectos de salud, medio ambiente, desarrollo social y económico. A continuación, se destacan los principales:

1. Beneficios para la salud pública.

- Reducción de enfermedades: Disminuye la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua, como diarreas, cólera y hepatitis.
- Control de plagas: Previene la proliferación de insectos y roedores que pueden ser vectores de enfermedades.
- Mejor calidad de vida: Un entorno más limpio y seguro contribuye al bienestar físico y mental de los habitantes.

2. Impacto ambiental positivo.

- Prevención de contaminación: Protege fuentes de agua (ríos, lagos, acuíferos) de la contaminación por aguas residuales.
- Conservación de ecosistemas: Evita daños a la flora y fauna locales debido a la descarga de residuos no tratados.

3. Desarrollo social y comunitario.

- Infraestructura moderna: Mejora la planificación urbana y el acceso a servicios básicos.
- Reducción de desigualdades: Beneficia especialmente a comunidades vulnerables, proporcionando condiciones de vida dignas.

INFORMACIÓN GENERAL



República de Honduras C.A.

Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Tel: 2784-5815

Correo: unidadtecnicamunicipalmt@gmail.com



Nombre del Proyecto:	
"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), BARRIO MERY DE FLORES, DEL MUNICIPIO DE TAULABÉ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA"	
Municipalidad responsable:	Municipalidad de Taulabé.
Monto:	Monto Total L. 1,041,351.50
Ubicación:	Barrio Mery de Flores, del Municipio de Taulabe.
Georreferencia:	Inicio 16P 396692.62mE 1624791.89 mN
	Final 16P 396871.6 mE 1624650.80mN
Fecha estimada de inicio:	18/01/2025
Fecha estimada de finalización:	18/04/2025
Duración:	90 días
Objetivo general:	Alcantarillado sanitario es garantizar la recolección, transporte y disposición adecuada de las aguas residuales generadas por la población, con el fin de proteger la salud pública, preservar el medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades.
Objetivos específicos:	<ul style="list-style-type: none">▪ Protección de la salud pública: Reducir la exposición de la población a aguas residuales y prevenir enfermedades transmitidas por el agua.▪ Conservación del medio ambiente: Minimizar el impacto de las aguas residuales en el suelo, agua y ecosistemas cercanos mediante un tratamiento adecuado.▪ Desarrollo sostenible: Proveer infraestructura moderna que respalde el crecimiento urbano y rural.
Descripción general del proyecto:	Construcción de colector principal con tubería de 8 pulgadas, instalación de tubería de 6 pulgadas, instalación de domiciliarias con sus cajas de registro, con sus pozos de inspección.



República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Tel: 2784-5815

Correo: unidadtecnicamunicipalmt@gmail.com

ACTIVIDADES QUE CONLLEVA EL PROYECTO.

CONTRATO ORIGINAL			
ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Trazado y Marcado.	ML	590.00
2	Excavación Material Tipo II(Semi-Duro).	M3	952.09
3	Cama Arena Compac. E=10cm. Para Tubos en Alcantarillado.	M3	35.00
4	Suministro E Instalación de Tubería PVC 4" Drenaje.	ML	440.00
5	Suministro E Instalación de Tubería PVC 6" Drenaje.	ML	570.00
6	Suministro E Instalación de Tubería PVC 8" Drenaje.	ML	120.00
7	Acarreo De Material (Desperdicio) con Volqueta.	M3	130.00
8	Sum. E Inst. de Yee De PVC De 6"x4"	UND	30.00
9	Sum. E Inst. de Yee De PVC De 8"x4"	UND	25.00
10	Pozo Alcantarillado 1.5 m, no incluye. Acarr. NI Excavación.	UND	13.00
11	Cama Mat. Selecto Compac. E=40cm. Para Tubos en Alcantarillado.	M3	150.00
12	Tapadera Y Casquete-Pozo (Incl. Apoyo)(185kg/cm2)	UND	13.00
13	Caja de Registro 40x40x60 Cm.	UND	60.00
14	Relleno Comp. Con Material Del Sitio.	M3	500.00
15	Limpieza Final.	M2	364.00

PORCENTAJE DE AVANCE EN PROYECTO

PERIODO ACTUAL			ACUMULADO		PORCENTAJE
CANT		PRECIO	CANT	PRECIO	
295.00	L	5,900.00			50%
476.05	L	166,615.75			50%
12.25	L	7,350.00			35%
154.00	L	18,480.00			35%
199.50	L	39,900.00			35%
42.00	L	14,700.00			35%
45.50	L	3,640.00			35%
10.50	L	6,300.00			35%
8.75	L	9,625.00			35%
4.55	L	59,150.00			35%
52.50	L	10,500.00			35%
0.00	L	-			0%
0.00	L	-			0%
0.00	L	-			0%
0.00	L	-			0%



República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Tel: 2784-5815

Correo: unidadtecnicamunicipalmt@gmail.com



CONCLUSIONES:

- La ejecución de esta obra se está realizando de la mejor manera, cumpliendo con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo de ninguna clase.
- Se mejoro el impacto de medio ambiente en la zona en la que se ya se suministró e instalo, ya que las aguas negras y residuales no son lanzadas al río o quebradas, sino que el sistema vino a mejorar en barrio.



ING. JOEL NOLASCO ESPINOZA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Tel: 2784-5815

Correo: unidadtecnicamunicipalmt@gmail.com





República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Tel: 2784-5815

Correo: unidadtecnicamunicipalmt@gmail.com



FORMATO DE COTIZACION



Republica de Honduras C.A

Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

Teléfono: 2784-5076; Telefax Tesorería 2784-5815



NÚMERO COTIZACION

007

FECHA

02/01/2025

VÁLIDO HASTA

02/02/2025

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre Empresa: Altiplano

Ubicación: Siogo, Taulabé

Teléfono: 999672891

RTN De Empresa: 05029016836490

E-mail:

ITM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIDATRIO	TOTAL
ACTIVIDADES DE PROYECTO					
1	Trazado y Marcado.	ML	590.00	20.00	11,800.00
2	Excavacion Material Tipo II(Semi-Duro).	M3	952.09	4.00	3,808.36
3	Cama Arena Compac. E=10cm. Para Tubos en Alcantarillado.	M3	35.00	600.00	21,000.00
4	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 4" Drenaje.	ML	440.00	130.00	57,200.00
5	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 6" Drenaje.	ML	570.00	200.00	114,000.00
6	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 8" Drenaje.	ML	120.00	400.00	48,000.00
7	Acarreo De Material (Desperdicio) con Volqueta.	M3	130.00	100.00	13,000.00
8	Sum. E Inst. de Yee De PVC De 6"x4"	UND	30.00	700.00	21,000.00
9	Sum. E Inst. de Yee De PVC De 8"x4"	UND	25.00	900.00	22,500.00
10	Pozo Alcantarillado 1.5M. No Incl. Acarr. Ni excavacion	UND	13.00	15,000.00	195,000.00
11	Cama Mat. Selecto Compac. E=40cm. Para Tubos en Alcantarillado.	M3	150.00	200.00	30,000.00
12	Tapadera Y Casquete-Pozo(Incl. Apoyo)(185kg/cm2)	UND	13.00	3,000.00	39,000.00
13	Caja de Registro 40x40x60 Cm.	UND	60.00	2,000.00	120,000.00
14	Relleno Comp. Con Material Del Sitio.	M3	500.00	100.00	50,000.00
15	Limpieza Final.	M2	364.00	100.00	36,400.00
				SUB-TOTAL	
				ISV % 15%	
				TOTAL	1,159,700.00

Departamento Solicitantes: Unidad Tecnica Municipal

Proyecto: Construccion de Sistema Alcantarillado Sanitario. (Segunda Etapa).

Ubicación: Colonia Mery de Flores, Municipio de Taulabe, Comayagua.

Alcalde Municipal: Denis Omar Membreño

Términos y condiciones

- Esta cotización es válida por un período de [validez hasta 30 dias] a partir de la fecha de emisión. Después de este periodo, los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Los precios indicados en esta cotización están expresados en [indicar moneda, e.g., Lempiras Hondureñas] e incluyen impuestos, a menos que se especifique lo contrario.
- Los productos o servicios ofrecidos en esta cotización están sujetos a las garantías especificadas en los documentos adjuntos o en el contrato final. Las garantías no aplican en caso de mal uso, negligencia o manipulación indebida por parte del cliente.



FORMATO DE COTIZACION



Republica de Honduras C.A

Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

Teléfono: 2784-5076; Telefax Tesorería 2784-5815



NÚMERO COTIZACION

008

FECHA

02/01/2025

VÁLIDO HASTA

02/02/2025

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre Empresa: Marcotulio Rodriguez Vasquez
 Ubicación: EL Cirreilar, Calle Principal, ala par Pulperia Martha Comayagua, Sigatope
 Teléfono: 9868 3487 RTN De Empresa: 12121959000146
 E-mail: marcotuliorodriguez120259@gmail.com

ITM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIDARIO	TOTAL
ACTIVIDADES DE PROYECTO					
1	Trazado y Marcado.	ML	590.00	20.00	11,800.00
2	Excavacion Material Tipo II(Semi-Duro).	M3	952.09	350.00	333,231.50
3	Cama Arena Compac. E=10cm. Para Tubos en Alcantarillado.	M3	35.00	600.00	21,000.00
4	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 4" Drenaje.	ML	440.00	120.00	52,800.00
5	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 6" Drenaje.	ML	570.00	200.00	114,000.00
6	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 8" Drenaje.	ML	120.00	350.00	42,000.00
7	Acarreo De Material (Desperdicio) con Volqueta.	M3	130.00	80.00	10,400.00
8	Sum. E Inst. de Yee De PVC De 6"x4"	UND	30.00	600.00	18,000.00
9	Sum. E Inst. de Yee De PVC De 8"x4"	UND	25.00	1,100.00	27,500.00
10	Pozo Alcantarillado 1.5M. No Incl. Acarr. Ni excavacion	UND	13.00	13,000.00	169,000.00
11	Cama Mat. Selecto Compac. E=40cm. Para Tubos en Alcantarillado.	M3	150.00	200.00	30,000.00
12	Tapadera Y Casquete-Pozo(Incl. Apoyo)(185kg/cm2)	UND	13.00	2,500.00	32,500.00
13	Caja de Registro 40x40x60 Cm.	UND	60.00	1,500.00	90,000.00
14	Relleno Comp. Con Material Del Sitio.	M3	500.00	120.00	60,000.00
15	Limpieza Final.	M2	364.00	80.00	29,120.00

SUB-TOTAL

ISV % 15%

TOTAL 1,041,351.50

Departamento Solicitantes: Unidad Tecnica Municipal

Proyecto: Construccion de Sistema Alcantarillado Sanitario. (Segunda Etapa).

Ubicación: Colonia Mery de Flores, Municipio de Taulabé, Comayagua.

Alcalde Municipal: Denis Omar Membreño

Términos y condiciones

- Esta cotización es válida por un período de [validez hasta 30 días] a partir de la fecha de emisión. Después de este periodo, los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Los precios indicados en esta cotización están expresados en [indicar moneda, e.g., Lempiras Hondureño] y no incluyen impuestos, a menos que se especifique lo contrario.
- Los productos o servicios ofrecidos en esta cotización están sujetos a las garantías especificadas en los documentos adjuntos o en el contrato final. Las garantías no aplican en caso de mal uso, negligencia o manipulación indebida por parte del cliente.

MARCOTULIO VASQUEZ
RODRIGUEZ
9868-3487



FORMATO DE COTIZACION



Republica de Honduras C.A

Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.

Teléfono: 2784-5076; Telefax Tesorería 2784-5815



NÚMERO COTIZACION

009

FECHA

02/01/2025

VÁLIDO HASTA

02/02/2025

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre Empresa: Servicios Multiples Ramirez
Ubicación: 1/2 cuadra hacia abajo de las oficinas del IHSS. Siguatepeque
Teléfono: 8807-2937 RTN De Empresa: 05051978003343
E-mail: anuardoblado4@gmail.com

ITM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNIDARIO	TOTAL
ACTIVIDADES DE PROYECTO					
1	Trazado y Marcado.	ML	590.00	L. 25.00	L. 14,750.00
2	Excavacion Material Tipo II(Semi-Duro).	M3	952.09	L. 400.00	L. 380,836.00
3	Cama Arena Compac. E=10cm. Para Tubos en Alcantarillado.	M3	35.00	L. 650.00	L. 21,000.00
4	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 4" Drenaje.	ML	440.00	L. 1,800.00	L. 79,200.00
5	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 6" Drenaje.	ML	570.00	L. 320.00	L. 182,400
6	Suministro E Instalacion de Tuberia PVC 8" Drenaje.	ML	120.00	L. 300.00	L. 36,000.00
7	Acarreo De Material (Desperdicio) con Volqueta.	M3	130.00	L. 100.00	L. 13,000.00
8	Sum. E Inst. de Yee De PVC De 6"x4"	UND	30.00	L. 800.00	L. 24,000.00
9	Sum. E Inst. de Yee De PVC De 8"x4"	UND	25.00	L. 1,300.00	L. 32,500.00
10	Pozo Alcantarillado 1.5M. No Incl. Acarr. Ni excavacion	UND	13.00	L. 16,000.00	L. 208,000.00
11	Alcantarillado.	M3	150.00	L. 300.00	L. 45,000.00
12	Tapadera Y Casquete-Pozo(Incl. Apoyo)(185kg/cm2)	UND	13.00	L. 2,300.00	L. 29,900.00
13	Caja de Registro 40x40x60 Cm.	UND	60.00	L. 1,130.00	L. 67,800.00
14	Relleno Comp. Con Material Del Sitio.	M3	500.00	L. 130.00	L. 65,000.00
15	Limpieza Final.	M2	364.00	L. 90.00	L. 32,760.00

SUB-TOTAL

ISV %

15%

TOTAL

L. 1,232,746.00

Departamento Solicitantes: Unidad Tecnica Municipal

Proyecto: Construccion de Sistema Alcantarillado Sanitario. (Segunda Etapa).

Ubicación: Colonia Mery de Flores, Municipio de Taulabé, Comayagua.

Alcalde Municipal: Denis Omar Membreño

Términos y condiciones

- Esta cotización es válida por un período de [validez hasta 30 dias] a partir de la fecha de emisión. Después de este período, los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Los precios indicados en esta cotización están expresados en [indicar moneda, e.g., Lempiras Hondureño] y no incluyen impuestos, a menos que se especifique lo contrario.
- Los productos o servicios ofrecidos en esta cotización están sujetos a las garantías especificadas en los documentos adjuntos o en el contrato final. Las garantías no aplican en caso de mal uso, negligencia o manipulación indebida por parte del cliente.

POLIZA DE FIANZA

Póliza No.: ZN-FC-112068-2025

Desde: 17/01/2025

A las 12
horas del
Mediodía.

Fecha de Emisión: 17/01/2025

Hasta: 27/07/2025

A las 12
horas del
Mediodía.

Afianzado: MARCO TULIO RODRIGUEZ VASQUEZ

Domicilio: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAULABE

Domicilio: TAULABE, COMAYAGUA

Suma Afianzada: L 156,202.73

FIANZA DE CUMPLIMIENTO
CONDICIONES GENERALES
CONTRATO GARANTIZADO

Garantía a favor de: "ALCALDIA MUNICIPAL DE TAULABE", para garantizarle que el afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, llevará a cabo el contrato "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), CELEBRANDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TAULABE Y MARCO TULIO RODRIGUEZ".
Garantía que asciende a la cantidad de: L 156,202.73 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 73/100).


CLÁUSULA ESPECIAL: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.

SEGUROS CREFISA, S.A., que en lo sucesivo se denominará la Compañía garantiza por la presente póliza, a favor del beneficiario (arriba mencionado), el cumplimiento por parte del afianzado (también arriba mencionado).

Las condiciones particulares que se agreguen a esta póliza, con el consentimiento de las partes contratantes se entiende que hacen parte del seguro otorgado según los términos de este documento.


Las Condiciones Generales adjuntas que se agregan a esta Fianza, con el consentimiento de las partes contratantes forman parte integrante de la presente Póliza

En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de:
TEGUICIGALPA, M.D.C 17 de Enero del 2025


Firma Autorizada




Afianzado
9868-3487



**Servicio de
Administración
de Rentas**
Gobierno de la República



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARCO TULIO RODRIGUEZ VASQUEZ**

con Registro Tributario Nacional: **12121959000146**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 20/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2026.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1
