

MEMORANDO ADUANAS-GNP-UCEP-29-2025.

PARA: **ABG. MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO**
Jefe del Departamento de Transparencia y Anticorrupción

DE: **ARQ. DANIA JULISSA PORTILLO DIAZ**
Jefa de la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

FECHA: 6 de marzo de 2025

ASUNTO: **RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN**



En atención a su **MEMORANDO-ADUANAS-DTA-059-2025** recibido en fecha 21 de febrero de 2025, referente a proporcionar información de la ejecución de proyectos del mes de febrero de 2025.

Se remite la siguiente documentación:

1. Informe de transparencia del proyecto denominado "Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas de Guasaule y La Fraternidad, perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras".
2. Informe de transparencia del proyecto denominado "Mejoramiento de la Infraestructura de las Aduanas El Florido, Agua Caliente, y El Poy, pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras".
3. Informe de transparencia del proyecto denominado "Construcción de tramos de muro perimetral para la Aduana El Amatillo, perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras"
4. Nota aclaratoria

Atentamente,

CC. Archivo
DP/KM

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS DE GUASAULE Y LA FRATERNIDAD, PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS”

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Administración Aduanera de Honduras/Gerencia Nacional de Proyectos.

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- Contrato de obra No. ADUANAS-GNAF-008-2024 para el “Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas de Guasaule y la Fraternidad, pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la Licitación Pública Nacional LPN-Aduanas-Obras-001-2024.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Aldea San Juan, Municipio del Triunfo, Departamento de Choluteca, Aduana de Guasaule, Frontera entre Honduras y Nicaragua y Aldea San Diego, Municipio de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca, Aduana de la Fraternidad Frontera entre Honduras y Nicaragua.

PROPÓSITO

El propósito del proyecto es mejorar la infraestructura física de la zona habitacional y muro perimetral de la Aduana de Guasaule y el mejoramiento de la infraestructura del edificio administrativo de la Aduana de la Fraternidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura de los edificios de apartamentos, que contempla la desinstalación puertas, ventanas, lamina de techos y cableado eléctrico en mal estado, demoliciones de paredes y sellado de boquetes, cimentación de paredes nuevas, elementos estructurales como vigas, columnas, cubierta de techo, pérgolas metálica, instalación de puertas y ventanas nuevas, repello

y pulido de paredes, instalación de balcones, instalación de parades de tabla yeso, cielo falso de PVC, piso de cerámica y porcelanato, instalaciones hidrosanitarias, nueva instalación eléctrica y mobiliario y equipo, en la parte exterior del edificio se estará realizando la construcción de un muro perimetral, nivelación de calles, instalación de adoquines, recuperación de áreas verdes y definición de áreas de estacionamiento.

- En la Aduana de la Fraternidad se realizará el cambio de canales de agua lluvia y la construcción de plumas metálicas tanto en el ingreso como en la salida de la Aduana.

ELABORACION DEL PROYECTO

ALCANCE

El proyecto de readecuación de los edificios de apartamentos de la Aduana de Guasaule tiene como propósito principal contar con instalaciones optimas y funcionales para todos los colaboradores.

Entre ellas involucra:

- La infraestructura física (puertas, ventanas, pisos).
- Pintura y acabados.
- Mobiliario.
- Instalaciones Hidrosanitarias.
- Instalaciones Eléctricas.
- Construcción de muro perimetral.
- Recuperación del área verde.
- Adoquinado en área de parqueos.
- Equipamiento de cocina y áreas sociales para los colaboradores.
- Conformación de terracería para estacionamiento de los vehículos

En la Aduana de la Fraternidad se realizará el cambio de canales de agua lluvia y la construcción de plumas metálicas tanto en el ingreso como en la salida de la Aduana.

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:
Aire: Ruidos debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de demolición.
Aire: Partículas de polvo generadas por actividades de demolición los cuales son de carácter temporal.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Gerente de Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniero Edís Alberto Corrales/ Constructora Corrales Ingenieros S. DE. R. L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la Institución, para la contratación de una empresa por medio de licitación pública para el desarrollo del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **14.776.271,12 millones de lempiras.**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Segundo Trimestre del 2024

ESTADO DEL PROYECTO


- En Ejecución de Infraestructura por el oferente **CONSTRUCTORA CORRALES INGENIEROS S. DE. R. L. DE C.V.**

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de **14.776.271,12 millones de lempiras.**

Las inversiones realizadas son las siguientes:

Desmontajes de techos, ventanas, puertas, canales de agua lluvia, demoliciones, construcción de cimentaciones para paredes y muro perimetral, construcción de soleras y castillos, instalación de puertas y ventanas nuevas, instalación de pérgolas, balcones, instalación de cielo falso de PVC y tabla yeso, instalación de piso de porcelanato y cerámica en baños y cocina, repello, pulido de paredes, pintura en paredes, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, mejoramiento de áreas verdes, construcción y nivelación de áreas de estacionamiento.



Instalación de nuevos canales de agua lluvia en el edificio administrativo de la Aduana de La Fraternidad e instalación de plumas metálicas tanto en salida como ingreso de la Aduana.

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 24 de febrero de 2025

PORCENTAJE DE AVANCE

- **76% (porcentaje validado al 28 de febrero de 2025)**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- Está en la fase de construcción por lo que no se ha hecho entrega de ningún producto en su totalidad.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.


- Actualmente se hizo una adenda al contrato por el valor de **L. 3,620,217.89**, por lo tanto, el valor de contrato actual es de **L. 18,396,491.42**.

VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

- El proyecto tubo una variación en el alcance debido a que se realizará la construcción de **482.50 metros lineales de muro de bloque**, así como también el resane del tanque se abastecimiento de agua potable para la Aduana de Guasaule. La duración del proyecto también sufrió una modificación en el tiempo de ejecución con una ampliación de 3 meses siendo la nueva fecha de finalización del contrato el **24 de mayo de 2025**.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS


- La construcción del muro perimetral surge de la necesidad de frenar a la invasión del predio por personas ajenas al mismo y así evitar que se sigan realizando distintas actividades distintas a las funciones de la Aduana. En el caso del tanque de agua potable, este tiene varios años sin mantenimiento, por lo tanto, se vio la necesidad de resanar las paredes en su totalidad y evitar que se siga deteriorando o presente fugas.

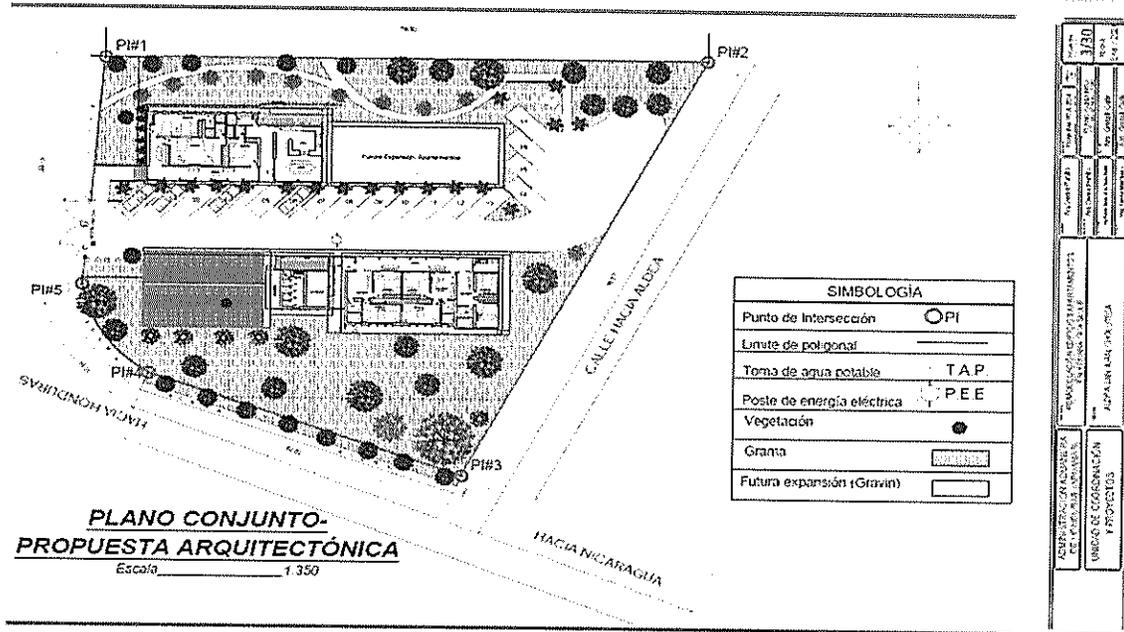


ANEXOS FOTOGRÁFICOS



Construcción de muro perimetral tramo de la adenda #1

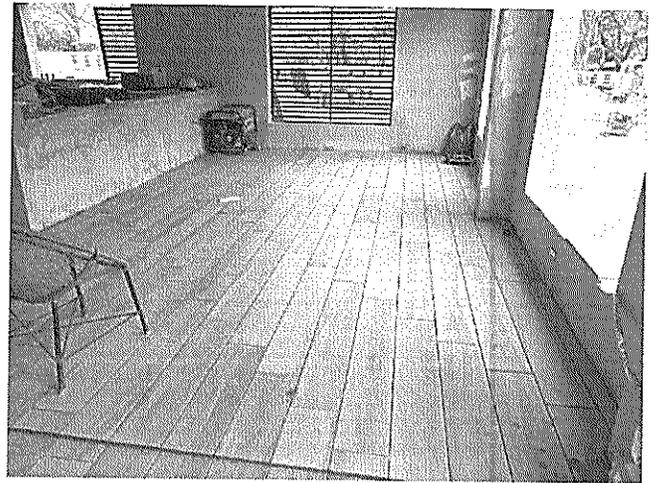

Instalación de piso tipo madera en corredores y cocina de apartamentos #1 y #2

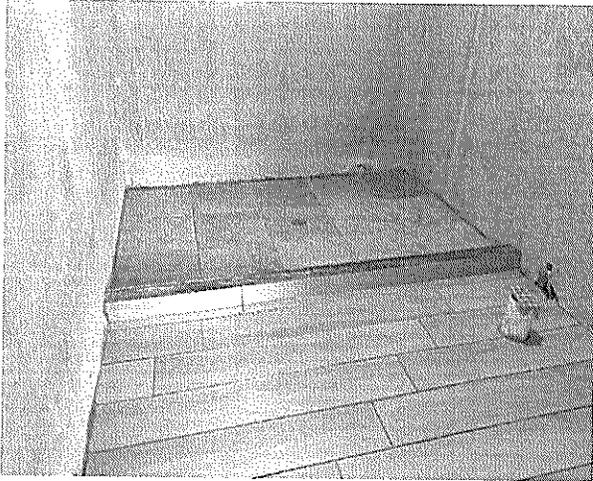

Instalación de cerámica de piso en baños




Fundición de soleras previo a la instalación de adoquines



Instalación de adoquines en área de estacionamientos



Pintura en área de techo exterior (pasillos)

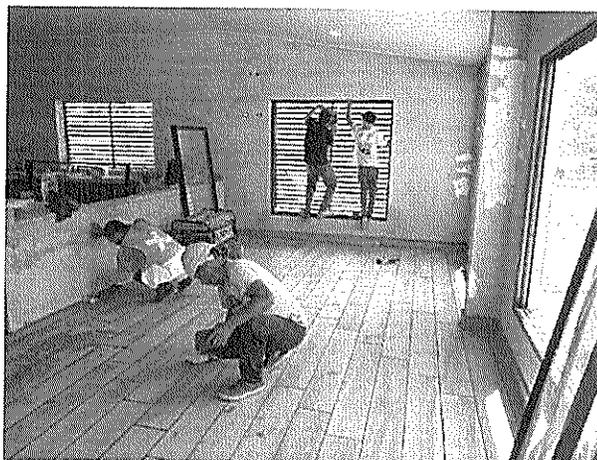

Instalación de ventanas edificio de apartamentos #1

A large, stylized handwritten signature or mark in black ink, located on the right side of the page.

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS"

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Administración Aduanera de Honduras/Gerencia Nacional de Proyectos.

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO


- CONTRATO DE OBRA NO. ADUANAS -GNAF-020-2024 PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS"

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- ADUANA EL FLORIDO
Aldea el Saltiron, Municipio de Ruinas de Copán, Departamento de Copán.
- ADUANA AGUA CALIENTE
Aldea Agua Caliente, Municipio de Santa Fe, Departamento de Ocotepeque.
- ADUANA EL POY
Aldea San Rafael, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque.

PROPÓSITO

El objetivo de las obras de mejoramiento de la infraestructura en las Aduanas El Florido, Agua Caliente y El Poy es optimizar las instalaciones y condiciones operativas.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Aduana Agua Caliente


El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del área de andenes, el edificio administrativo y una vivienda recuperada como propiedad de la Aduana. Esta obra contempla las siguientes actividades:

- Construcción de cuneta.
- Suministro e instalación de canales de aguas lluvias.
- Pintura general.
- Suministro e instalación de cielo falso.
- Pintura y señalización.
- Suministro e instalación de pluma electrónica.
- Cerco malla ciclón.

Aduana El Florido

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del área de andenes, el edificio administrativo y obras exteriores. Esta obra contempla las siguientes actividades:

- Readecuación de sanitarios en andén.
- Construcción de bodega.
- Suministro e instalación de estantería tipo rack.
- Pintura general.
- Suministro e instalación de puertas metálicas.
- Suministro e instalación de ventanas.
- Construcción de cerco de malla tipo reja.
- Pintura y señalización.
- Instalaciones eléctricas exteriores.
- Suministro de mobiliario (área administrativa y habitacional).



Aduana El Poy.

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del edificio administrativo y las obras exteriores. Esta obra contempla las siguientes actividades:

- Mejoramiento de instalaciones hidrosanitarias (losa sanitaria)
- Suministro e instalaciones de puertas metálicas.
- Mejoramiento del área de atención (mostrador de apoyo)
- Suministro e instalación de pluma metálica.
- Suministro e instalación de asta para bandera.
- Suministro de señalización (conos reflectivos 36").

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:

Aire:

Ruidos y partículas de polvo debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de instalación, demolición y materiales de construcción. Las cuales son de carácter temporal.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Gerente de Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniero Edis Alberto Corrales/ Constructora Corrales Ingenieros S. DE. R. L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la institución para la contratación de una empresa por medio de licitación pública para el desarrollo del proyecto.



PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es **Siete millones ochocientos noventa y un mil novecientos noventa 22/100. (L. 7,891,990.22)**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Cuarto Trimestre del 2024

ESTADO DEL PROYECTO

- **En Ejecución** de la Infraestructura por la CONSTRUCTORA CORRALES INGENIEROS S. DE. R. L. DE C.V.

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de **Siete millones ochocientos noventa y un mil novecientos noventa 22/100. (L. 7,891,990.22)**

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 26 abril de 2025

PORCENTAJE DE AVANCE

- **46.65 % (porcentaje validado al 03 de marzo de 2025)**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- El proyecto se encuentra en la fase de construcción, por lo tanto, no se ha hecho entrega de ningún producto en su totalidad.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

- No hay obras adicionales hasta la fecha.




VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO

- No hay variación en el alcance ni en la duración del proyecto


RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS

- No hay cambios.



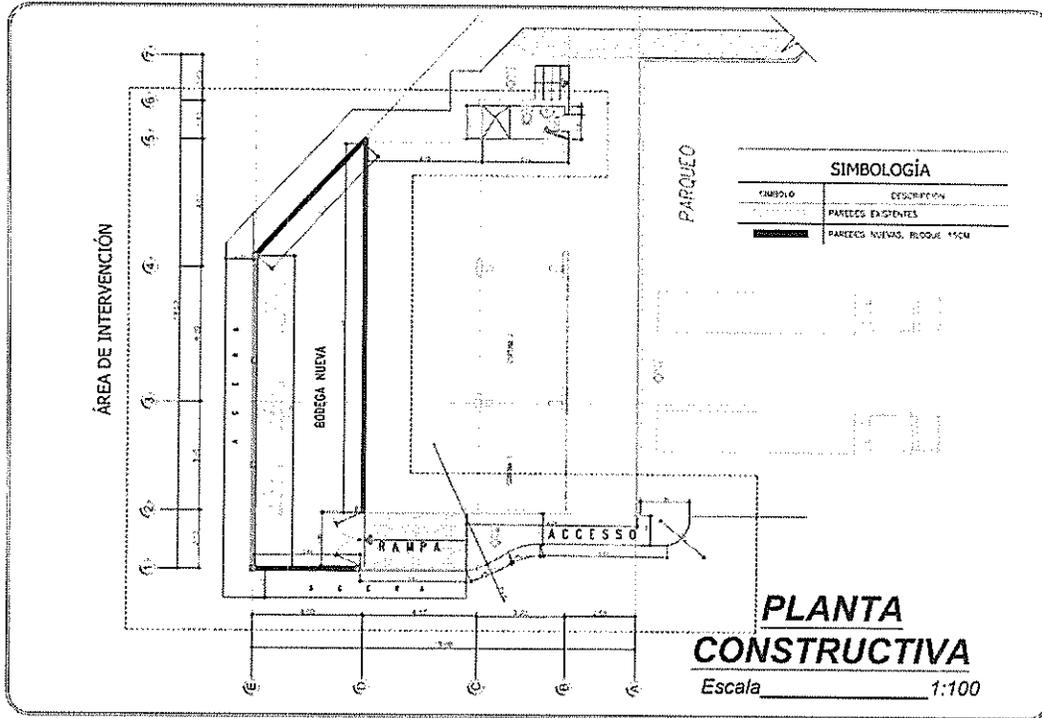


PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE LA BODEGA DE ALMACÉN DE LA ADUANA DE TEGUCIGALPA
FECHA	15/05/2018
PROYECTANTE	INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO
PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE LA BODEGA DE ALMACÉN DE LA ADUANA DE TEGUCIGALPA

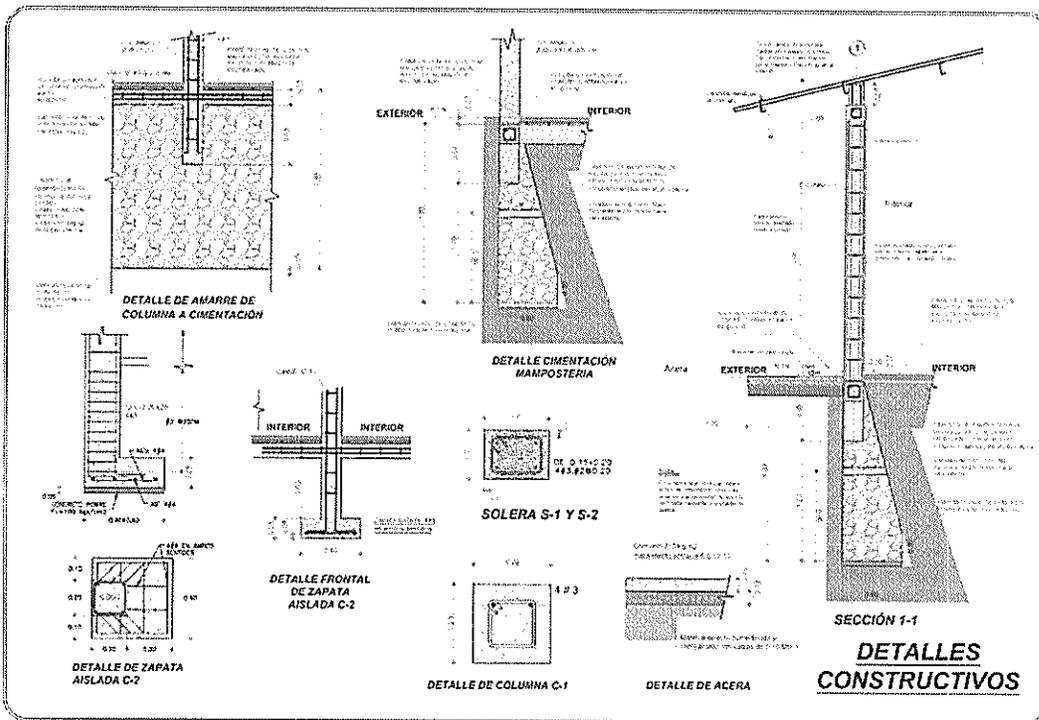

PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE LA BODEGA DE ALMACÉN DE LA ADUANA DE TEGUCIGALPA
FECHA	15/05/2018
PROYECTANTE	INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO
PROYECTO	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE LA BODEGA DE ALMACÉN DE LA ADUANA DE TEGUCIGALPA


"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"

Aduana El Poy

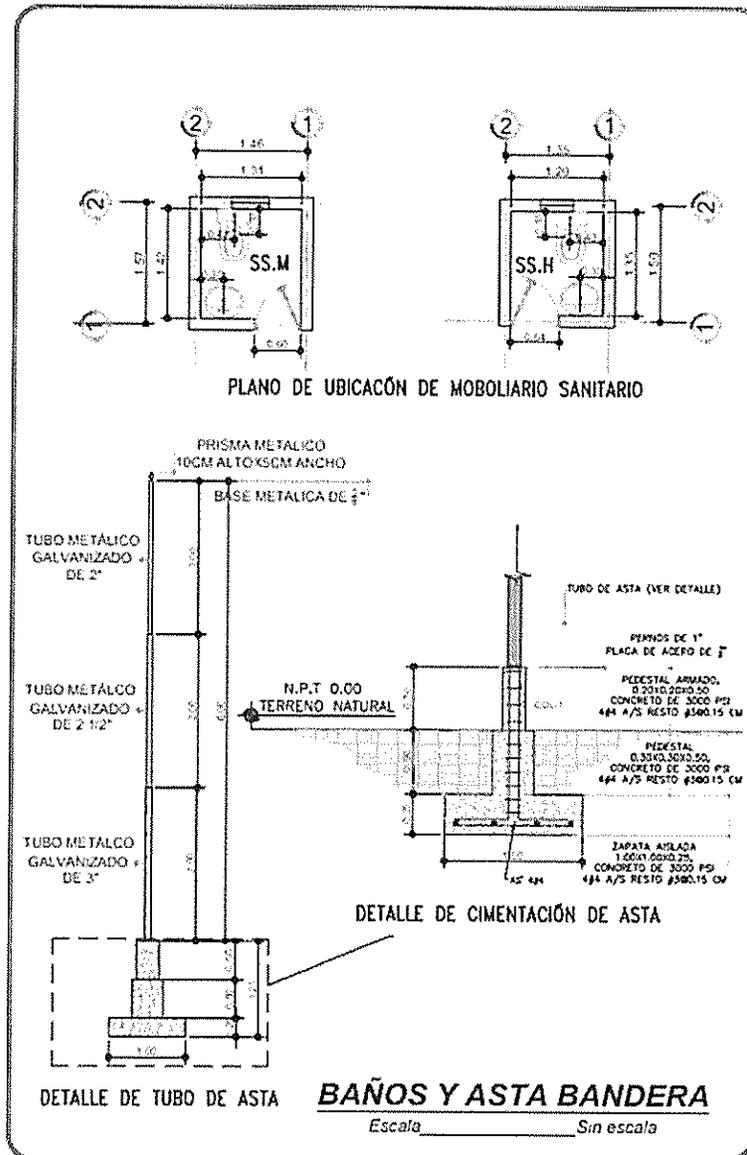

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	REGISTRO NACIONAL DE PROYECTOS	REGISTRO DE PROYECTOS	PROYECTO DE OBRAS	PROYECTO DE OBRAS	PROYECTO DE OBRAS
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTOS	SERVICIO DE OBRAS DE OBRAS	SERVICIO DE OBRAS DE OBRAS	SERVICIO DE OBRAS DE OBRAS	SERVICIO DE OBRAS DE OBRAS	SERVICIO DE OBRAS DE OBRAS

"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"

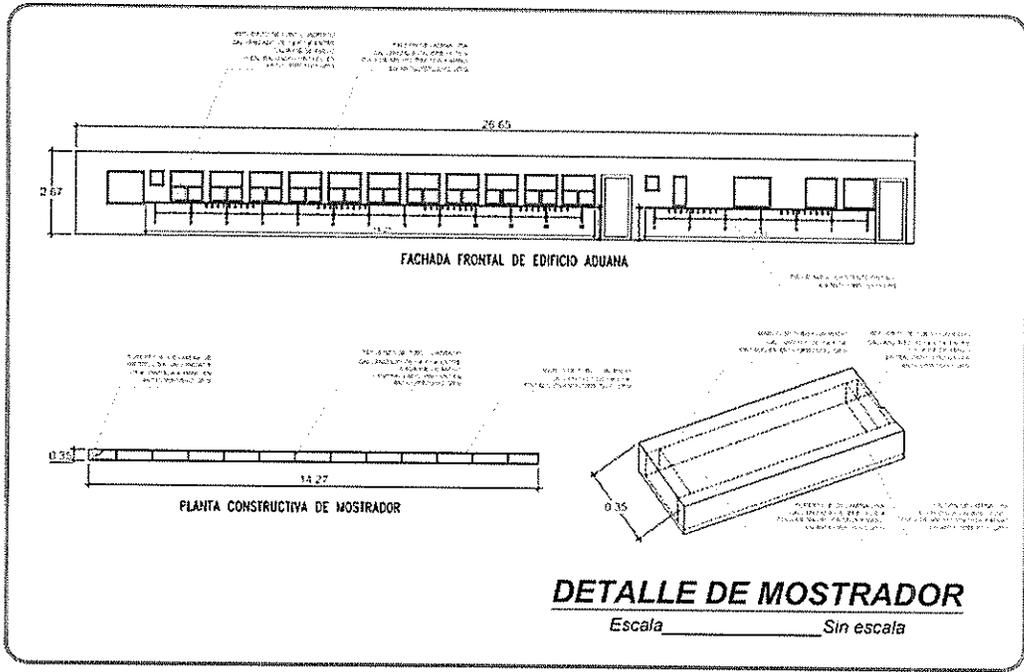


1.4.4	2/3
PROYECTO	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
FECHA	15/05/2018
PROYECTANTE	JEAS
PROYECTO	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
FECHA	15/05/2018
PROYECTANTE	JEAS
PROYECTO	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
FECHA	15/05/2018
PROYECTANTE	JEAS

"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Aduana Agua Caliente

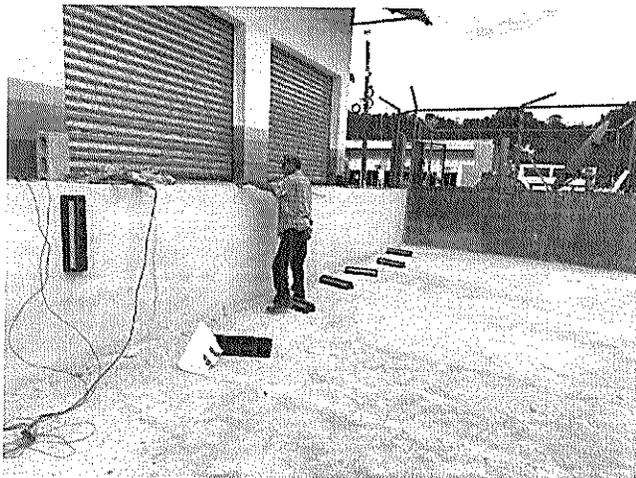


Instalación de topes de polietileno en Anden.



Inicio de reposición de canales metálicos de agua lluvia.



Pintura y limpieza de área de máquinas

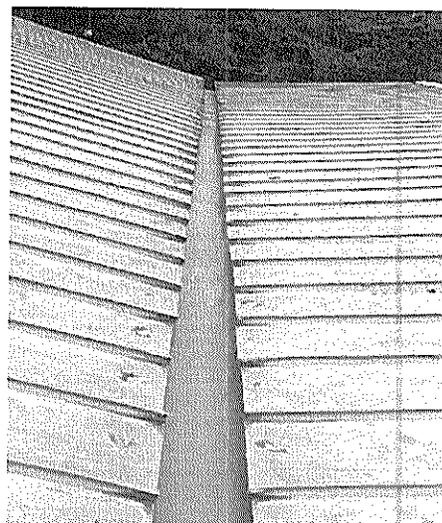

Instalación de canales de aguas lluvias



Pintura en restauración de vivienda (bodega)




Cielo falso de PVC en vivienda (bodega)

"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"


[aduanas Honduras](https://www.facebook.com/aduanas Honduras) [aduanas Honduras](https://www.instagram.com/aduanas Honduras) www.aduanas.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.


Aduana El Florido

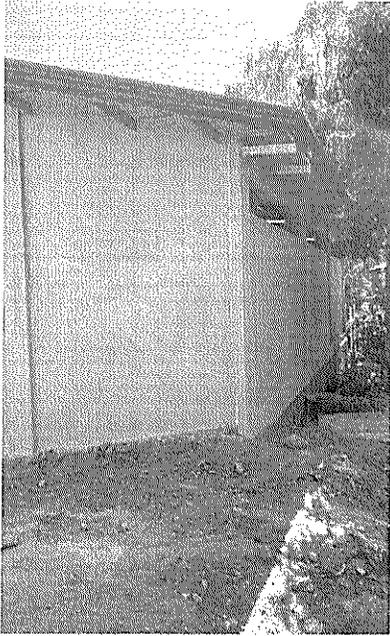


Pulido de paredes exteriores.

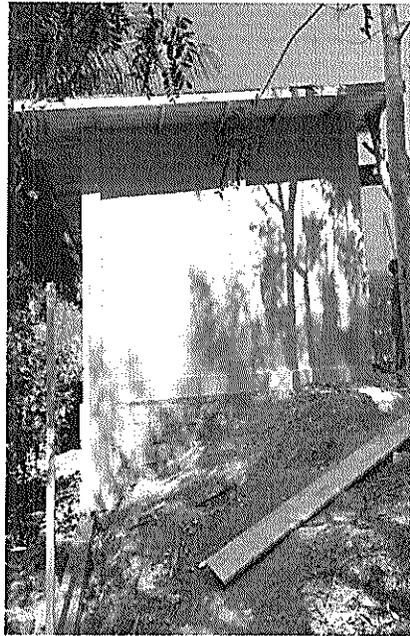

Pulido de paredes exteriores.

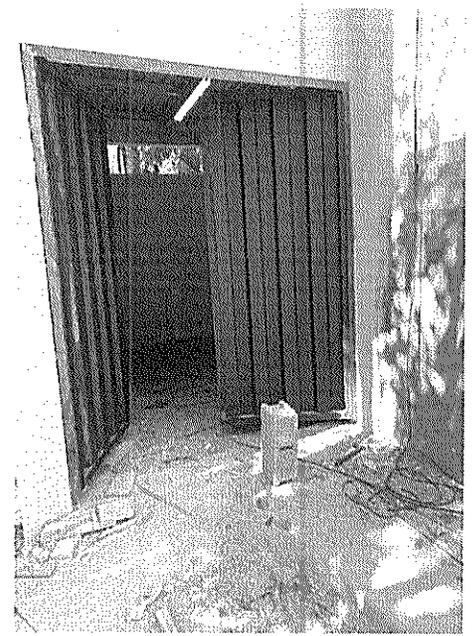


Portón de acceso a bodega.

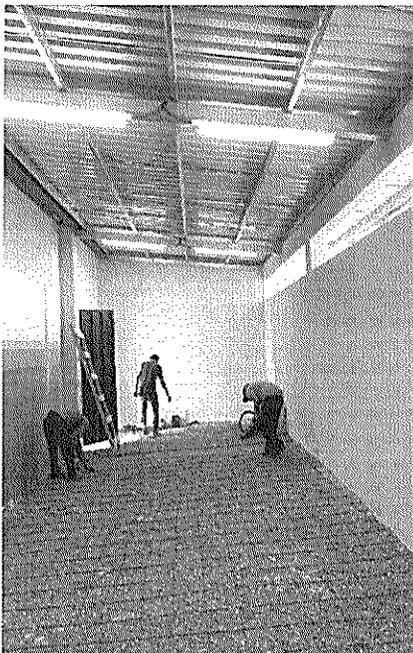

Preparación para fundición de firme de concreto en interior de bodega.



Instalación de lámparas en bodega.

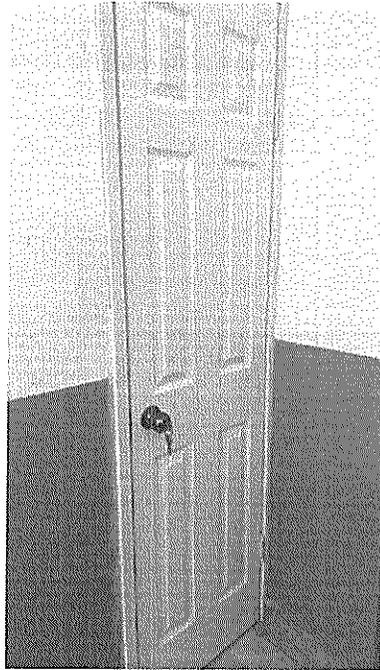

Instalación de puertas en sanitario de hombres y



Instalación de sanitarios de hombres y mujeres.



Instalación de sanitarios de hombres y mujeres.



Instalación de lavamanos de hombres y mujeres.

“CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE MURO PERIMETRAL PARA LA ADUANA EL AMATILLO, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS”

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Administración Aduanera de Honduras/Gerencia Nacional de Proyectos.

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- Contrato de obra No- ADUANAS-GNFA-019-2024 “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE MURO PERIMETRAL PARA LA ADUANA EL AMATILLO, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS” mediante Licitación Privada No LPR. ADUANAS – OBRAS – 001 – 2024.

UBICACIÓN DEL PROYECTO


- Aldea Goascorán, Municipio de Goascorán, Departamento de Valle. Frontera entre Honduras y El Salvador.

PROPÓSITO

El propósito principal es fortalecer la seguridad y control en las instalaciones aduaneras, mediante la construcción de varios tramos de muro perimetral que permita delimitar el perímetro de la Aduana.

Con la construcción de estos tramos de muro perimetral, se busca:

- Garantizar la protección de las instalaciones y del personal que opera en la Aduana.
- Eliminar accesos no autorizados y reducir riesgos de contrabando y otras actividades ilícitas.
- Mejorar la eficiencia operativa al establecer un control más efectivo de los flujos de mercancías y personas dentro del recinto aduanero.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la construcción de una estructura perimetral (Muros) de seguridad en puntos estratégicos de la Aduana, con el fin de reforzar el control de accesos y mejorar la seguridad dentro de la Aduana.

Esta infraestructura fue diseñada con materiales de alta resistencia, garantizando durabilidad y eficacia en la protección del perímetro, como ser cimientos de mampostería y bloque de concreto para paredes, además incluye sistemas de drenaje y obras adicionales para mejorar su funcionalidad.

ELABORACION DEL PROYECTO

ALCANCE

El proyecto tiene como objetivo la construcción de un muro perimetral para reforzar la seguridad en la Aduana El Amatillo, el cual desarrollará en tres tramos específicos (Tramos A, B y C), e involucra actividades de preparación del terreno, cimentación y obra civil, asegurando la estabilidad y durabilidad de la estructura.

Las actividades contempladas incluyen:

- Limpieza y preparación del terreno.
- Demolición de estructuras existentes.
- Construcción de cimentaciones reforzadas.
- Levantamiento de muros perimetrales de mampostería y bloque.
- Colocación de drenajes y estructuras de seguridad.

Las mejoras de la infraestructura física forman parte del cumplimiento de los objetivos propuestos para la modernización de las Aduanas que incluye, fortalecimiento, seguridad en la frontera y la mejora en la gestión del comercio.

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:

Emissiones de polvo: La manipulación de materiales pueden generar partículas en suspensión, afectando la calidad del aire.

Gestión de residuos: Los escombros de construcción y el mal manejo de materiales pueden contaminar cuerpos de agua cercanos.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Gerente de Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Lic. Víctor Manuel Turcios/ INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE R.L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la Institución, para la contratación de una empresa por medio de licitación privada para el desarrollo del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **1,192,038.53 millones de lempiras.**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Tercer Trimestre del 2024

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el oferente INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE R.L. DE C.V.

COSTO DE FINALIZACIÓN


- El costo de finalización es de **1,192,038.53 millones de lempiras.**

Las inversiones realizadas son las siguientes:

Descapote y limpieza del terreno, corte de árboles, excavación para cimentación, demolición de estructuras existentes, construcción de zapatas corridas y aisladas, construcción de soferas, construcción de castillos, paredes de bloque, muros de mampostería, instalación de drenajes de agua lluvia y limpieza general del sitio.

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 20 de abril del 2025



PORCENTAJE DE AVANCE

- **68% (porcentaje validado al 28 de febrero de 2025)**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- El proyecto se encuentra en la fase de construcción, por lo tanto, no se ha hecho entrega de ningún producto en su totalidad.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- No existe ninguna variación en el costo total del proyecto.


VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

- No existe ninguna variación en el alcance y la duración del proyecto.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS

- No existe ninguna razón de cambio a la fecha.

ESQUEMA

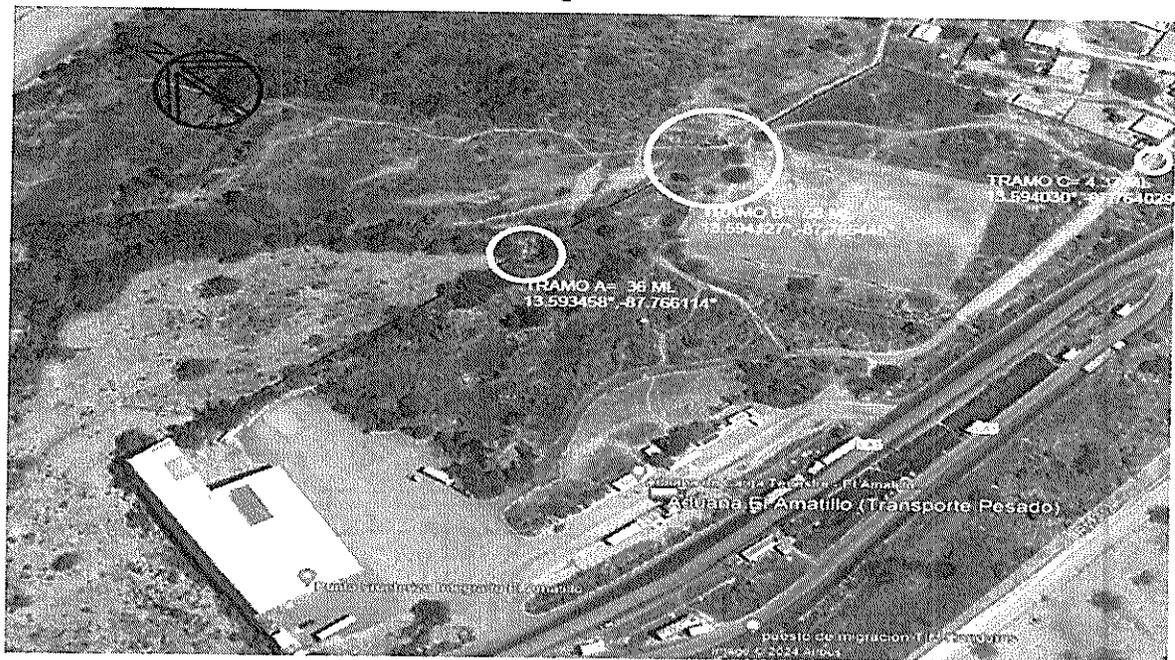


"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"


[aduanas.honduras](http://aduanas.honduras.gob.hn) www.aduanas.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

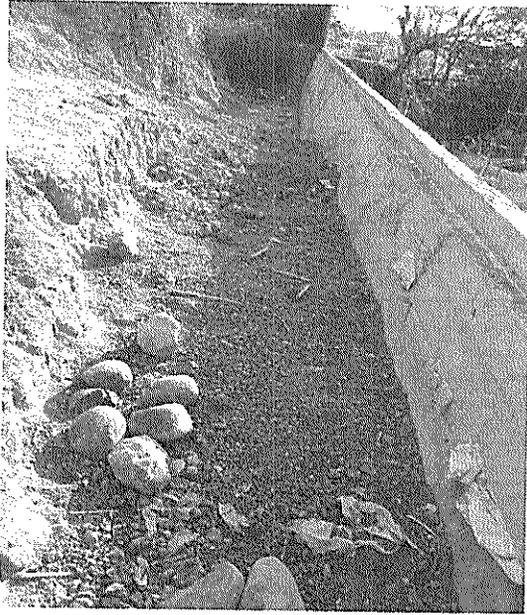


Muro de contención Tramo A

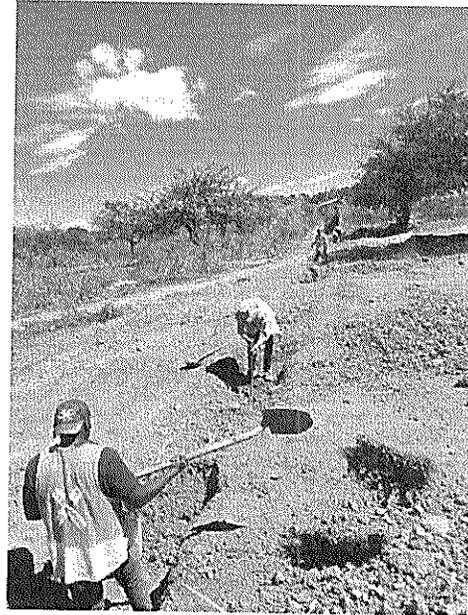


Excavación de cimentación Tramo B




Cimentación de mampostería Tramo B

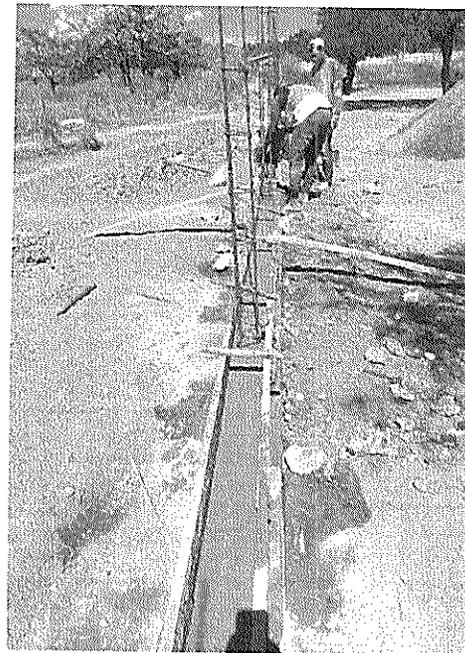

Fundición de solera Tramo B

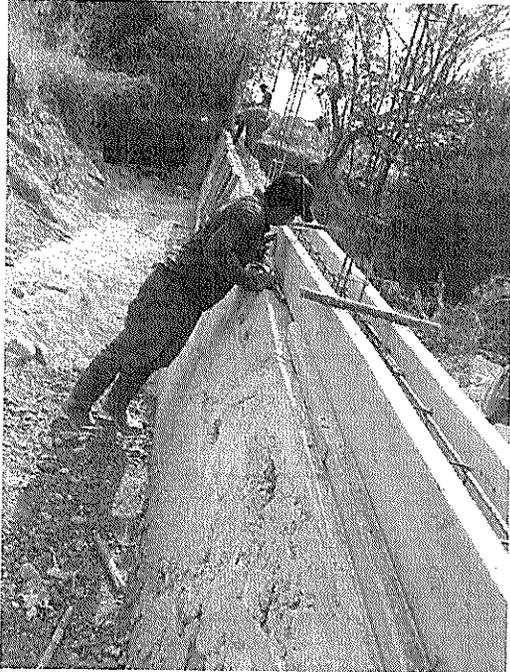

Armado de solera Tramo A

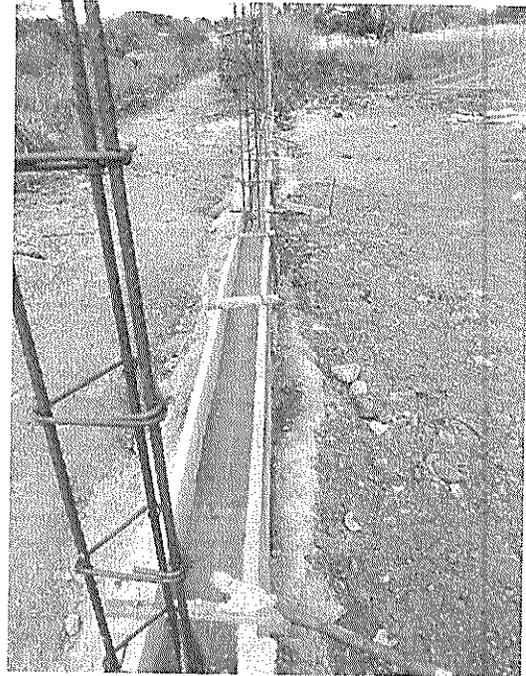

Armado de castillo tramo B



Construcción de paredes tramo B



Fundición de castillos tramo B



NOTA ACLARATORIA

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los lineamientos para la verificación de información pública en los portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada en el apartado Programas y proyectos instruye literalmente lo siguiente: **Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la institución obligada según la fase del proyecto**, estos detalles se encuentran a continuación:

- 1) Identificación del proyecto.
- 2) Elaboración del proyecto.
- 3) Ejecución del proyecto.
- 4) Finalización del proyecto.

Se adjunta la constancia de avances de los proyectos que comenzaron en los meses de agosto, noviembre de 2024 y enero de 2025.

A la vez se hace mención que dicha Unidad Administradora de Proyectos en esta institución es únicamente gestora de proyectos, la ejecución y manejo de fondos nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera. Al momento de la ejecución de los proyectos asignados a nuestra Unidad es de nuestra responsabilidad dar el visto bueno de las actividades realizadas para proceder con el procedimiento de pago según estimaciones realizadas

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los **seis (6) días del mes de marzo de 2025.**



Arq. Dania Jéllissa Portillo
Jefa de Unidad de Coordinación Externa y Proyectos.
