


MEMORANDO ADUANAS-GNP-UCEP-044-2025.

PARA: **ABG. MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO**
Jefe del Departamento de Transparencia y Anticorrupción

DE: **ARQ. DANIA JULISSA PORTILLO DIAZ**
Jefa de la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos

FECHA: 4 de abril de 2025

ASUNTO: **RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN**



En atención a su **MEMORANDO-ADUANAS-DTA-092-2025** recibido en fecha 21 de marzo de 2025, referente a proporcionar información de la ejecución de proyectos del mes de marzo de 2025.

Se remite la siguiente documentación:

1. Informe de transparencia del proyecto denominado "Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas de Guasaule y La Fraternidad, perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras".
2. Informe de transparencia del proyecto denominado "Mejoramiento de la Infraestructura de las Aduanas El Florido, Agua Caliente, y El Poy, pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras".
3. Informe de transparencia del proyecto denominado "Construcción de tramos de muro perimetral para la Aduana El Amatillo, perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras"
4. Nota aclaratoria

Atentamente,

CC. Archivo
DP/KM

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS DE GUASAULE Y LA FRATERNIDAD, PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS”

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Administración Aduanera de Honduras/Gerencia Nacional de Proyectos.

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- Contrato de obra No. ADUANAS-GNAF-008-2024 para el “Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas de Guasaule y la Fraternidad, pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras regido por la Licitación Pública Nacional LPN-Aduanas-Obras-001-2024.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Aldea San Juan, Municipio del Triunfo, Departamento de Choluteca, Aduana de Guasaule, Frontera entre Honduras y Nicaragua y Aldea San Diego, Municipio de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca, Aduana de la Fraternidad Frontera entre Honduras y Nicaragua.

PROPÓSITO

El propósito del proyecto es mejorar la infraestructura física de la zona habitacional y muro perimetral de la Aduana de Guasaule y el mejoramiento de la infraestructura del edificio administrativo de la Aduana de la Fraternidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura de los edificios de apartamentos, que contempla la desinstalación puertas, ventanas, lamina de techos y cableado eléctrico en mal estado, demoliciones de paredes y sellado de boquetes, cimentación de paredes nuevas, elementos estructurales como vigas, columnas, cubierta de techo, pérgolas metálica, instalación de puertas y ventanas nuevas, repello

- y pulido de paredes, instalación de balcones, instalación de parades de tabla yeso, cielo falso de PVC, piso de cerámica y porcelanato, instalaciones hidrosanitarias, nueva instalación eléctrica y mobiliario y equipo, en la parte exterior del edificio se estará realizando la construcción de un muro perimetral, nivelación de calles, instalación de adoquines, recuperación de áreas verdes y definición de áreas de estacionamiento.
- En la Aduana de la Fraternidad se realizará el cambio de canales de agua lluvia y la construcción de plumas metálicas tanto en el ingreso como en la salida de la Aduana.

ELABORACION DEL PROYECTO

ALCANCE

El proyecto de readecuación de los edificios de apartamentos de la Aduana de Guasaule tiene como propósito principal contar con instalaciones optimas y funcionales para todos los colaboradores.

Entre ellas involucra:

- La infraestructura física (puertas, ventanas, pisos).
- Pintura y acabados.
- Mobiliario.
- Instalaciones Hidrosanitarias.
- Instalaciones Eléctricas.
- Construcción de muro perimetral.
- Recuperación del área verde.
- Adoquinado en área de parqueos.
- Equipamiento de cocina y áreas sociales para los colaboradores.
- Conformación de terracería para estacionamiento de los vehículos

En la Aduana de la Fraternidad se realizará el cambio de canales de agua lluvia y la construcción de plumas metálicas tanto en el ingreso como en la salida de la Aduana.

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:
Aire: Ruidos debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de demolición.
Aire: Partículas de polvo generadas por actividades de demolición los cuales son de carácter temporal.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Gerente de Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniera Edis Corrales/ Constructora Corrales Ingenieros S. DE. R. L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la Institución, para la contratación de una empresa por medio de licitación pública para el desarrollo del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **14.776.271,12 millones de lempiras.**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Segundo Trimestre del 2024

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el oferente CONSTRUCTORA CORRALES INGENIEROS S. DE. R. L. DE C.V.

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de **14.776.271,12 millones de lempiras.**

Las inversiones realizadas son las siguientes:

Desmontajes de techos, ventanas, puertas, canales de agua lluvia, demoliciones, construcción de cimentaciones para paredes y muro perimetral, construcción de soleras y castillos, instalación de puertas y ventanas nuevas, instalación de pérgolas, balcones, instalación de cielo falso de PVC y tabla yeso, instalación de piso de porcelanato y cerámica en baños y cocina, repello, pulido de paredes, pintura en paredes, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, mejoramiento de áreas verdes, construcción y nivelación de áreas de estacionamiento.

Instalación de nuevos canales de agua lluvia en el edificio administrativo de la Aduana de La Fraternidad e instalación de plumas metálicas tanto en salida como ingreso de la Aduana.

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 24 de febrero de 2025

PORCENTAJE DE AVANCE

- **80% (porcentaje validado al 31 de marzo de 2025)**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- Está en la fase de construcción por lo que no se ha hecho entrega de ningún producto en su totalidad.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.


- Actualmente se hizo una adenda al contrato por el valor de **L. 3,620,217.89**, por lo tanto, el valor de contrato actual es de **L. 18,396,491.42**.

VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

- El proyecto tubo una variación en el alcance debido a que se realizará la construcción de **482.50 metros lineales de muro de bloque**, así como también el resane del tanque se abastecimiento de agua potable para la Aduana de Guasaule. La duración del proyecto también sufrió una modificación en el tiempo de ejecución con una ampliación de 3 meses siendo la nueva fecha de finalización del contrato el **24 de mayo de 2025**.

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS


- La construcción del muro perimetral surge de la necesidad de frenar a la invasión del predio por personas ajenas al mismo y así evitar que se sigan realizando distintas actividades distintas a las funciones de la Aduana. En el caso del tanque de agua potable, este tiene varios años sin mantenimiento, por lo tanto, se vio la necesidad de resanar las paredes en su totalidad y evitar que se siga deteriorando o presente fugas.

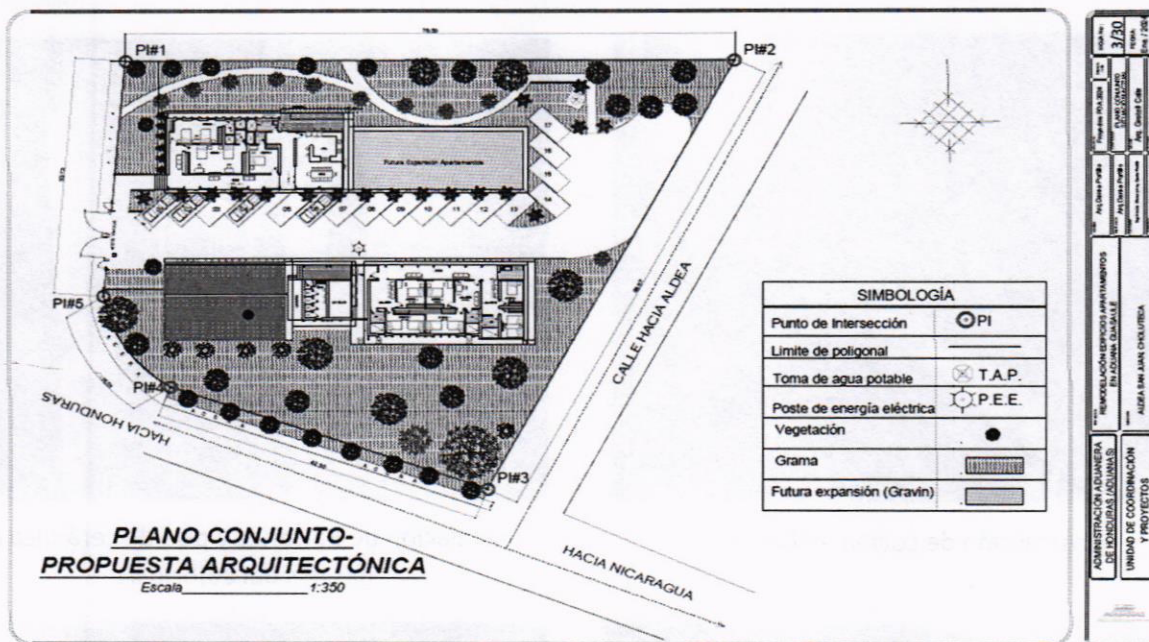


ANEXOS FOTOGRÁFICOS




Muro perimetral – Aduana Guasaule

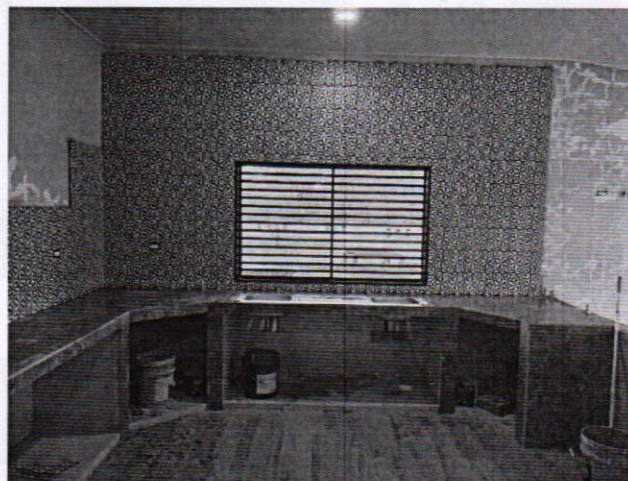

Construcción de área de cocina edificios #1

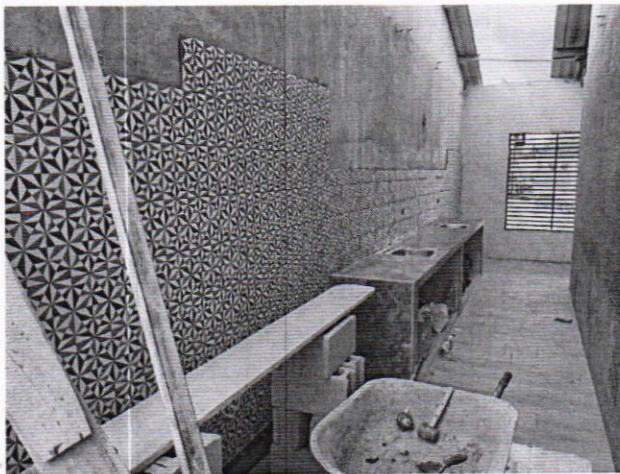


Construcción de cocina edificio #2

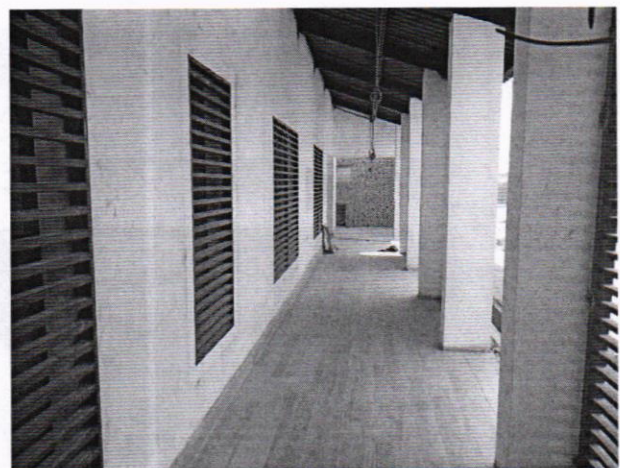


Instalación de Balcones y piso de cerámica en pasillos del edificio #1




Adoquinado de estacionamiento

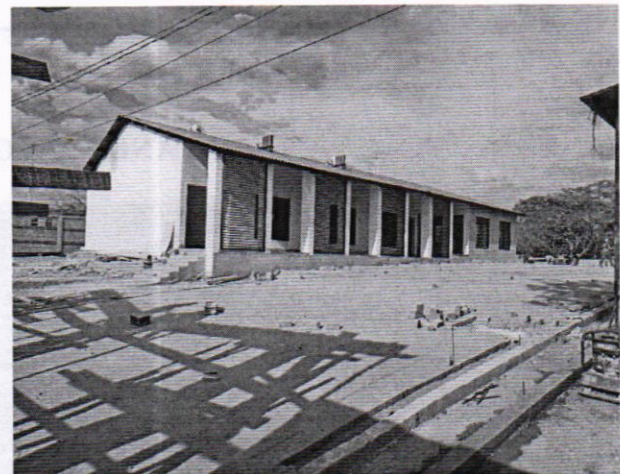

Pintura base en edificio #1

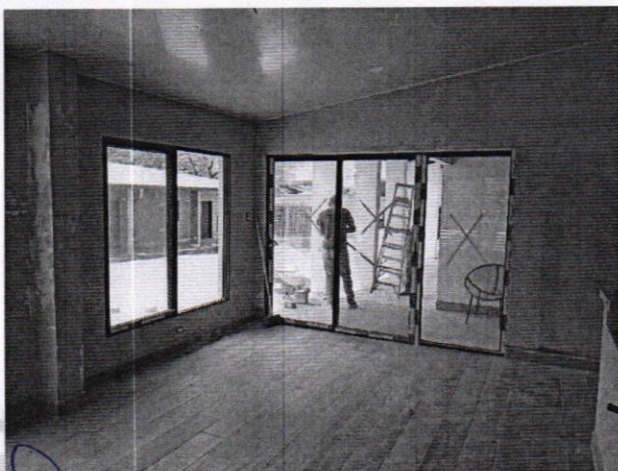

Instalación de puertas y ventanas

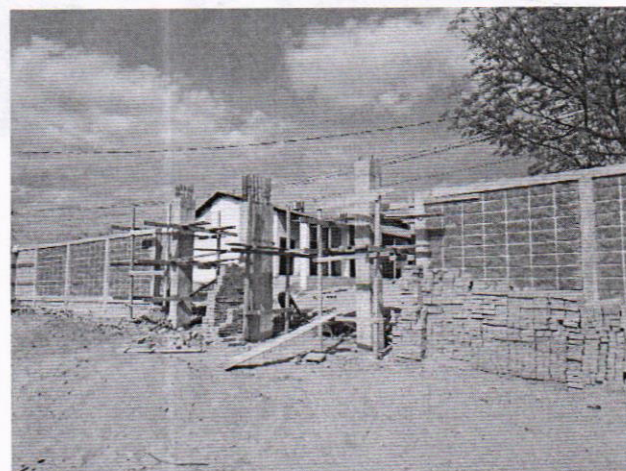

Construcción de pórtico principal

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS"

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Administración Aduanera de Honduras/Gerencia Nacional de Proyectos.

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- CONTRATO DE OBRA NO. ADUANAS -GNAF-020-2024 PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ADUANAS EL FLORIDO, AGUA CALIENTE Y EL POY, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS"

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- ADUANA EL FLORIDO
Aldea el Saltiron, Municipio de Ruinas de Copán, Departamento de Copán.
- ADUANA AGUA CALIENTE
Aldea Agua Caliente, Municipio de Santa Fe, Departamento de Ocotepeque.
- ADUANA EL POY
Aldea San Rafael, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque.

PROPÓSITO

El objetivo de las obras de mejoramiento de la infraestructura en las Aduanas El Florido, Agua Caliente y El Poy es optimizar las instalaciones y condiciones operativas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Aduana Agua Caliente

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del área de andenes, el edificio administrativo y una vivienda recuperada como propiedad de la Aduana. Esta obra contempla las siguientes actividades:

- Construcción de cuneta.
- Suministro e instalación de canales de aguas lluvias.
- Pintura general.
- Suministro e instalación de cielo falso.
- Pintura y señalización.
- Suministro e instalación de pluma electrónica.
- Cerco malla ciclón.

Aduana El Florido

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del área de andenes, el edificio administrativo y obras exteriores. Esta obra contempla las siguientes actividades:

- Readecuación de sanitarios en andén.
- Construcción de bodega.
- Suministro e instalación de estantería tipo rack.
- Pintura general.
- Suministro e instalación de puertas metálicas.
- Suministro e instalación de ventanas.
- Construcción de cerco de malla tipo reja.
- Pintura y señalización.
- Instalaciones eléctricas exteriores.
- Suministro de mobiliario (área administrativa y habitacional).

Aduana El Poy.

El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura del edificio administrativo y las obras exteriores. Esta obra contempla las siguientes actividades:

- Mejoramiento de instalaciones hidrosanitarias (losa sanitaria)
- Suministro e instalaciones de puertas metálicas.
- Mejoramiento del área de atención (mostrador de apoyo)
- Suministro e instalación de pluma metálica.
- Suministro e instalación de asta para bandera.
- Suministro de señalización (conos reflectivos 36").

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:

Aire:

Ruidos y partículas de polvo debido al uso de herramientas que se utilizan para las actividades de instalación, demolición y materiales de construcción. Las cuales son de carácter temporal.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Gerente de Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Ingeniero Edis Alberto Corrales/ Constructora Corrales Ingenieros S. DE. R. L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la institución para la contratación de una empresa por medio de licitación pública para el desarrollo del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es **Siete millones ochocientos noventa y un mil novecientos noventa 22/100. (L. 7,891,990.22)**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Cuarto Trimestre del 2024

ESTADO DEL PROYECTO

- **En Ejecución** de la Infraestructura por la CONSTRUCTORA CORRALES INGENIEROS S. DE. R. L. DE C.V.

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de **Siete millones ochocientos noventa y un mil novecientos noventa 22/100. (L. 7,891,990.22)**

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 26 abril de 2025

PORCENTAJE DE AVANCE

- **71.75 % (porcentaje validado al 29 marzo de 2025)**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- El proyecto se encuentra en la fase de construcción, por lo tanto, no se ha hecho entrega de ningún producto en su totalidad.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

- No hay obras adicionales hasta la fecha.

VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO


- No hay variación en el alcance ni en la duración del proyecto

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS


- No hay cambios.

ESQUEMA


Aduana Agua Caliente

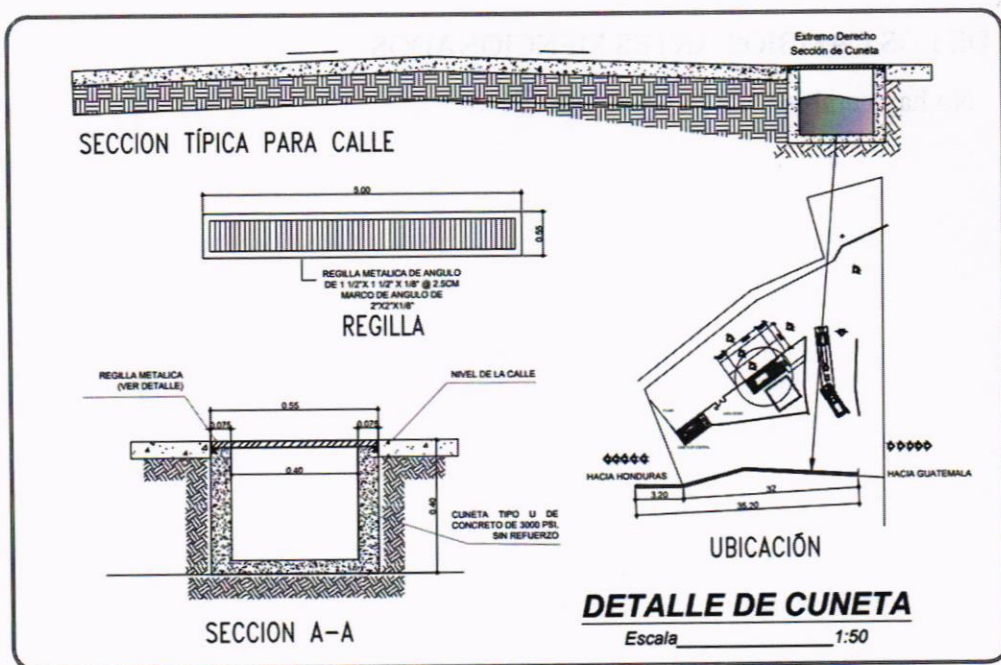


Hoja No.	17
Proyecto	MEJORAS EN ADUANA AGUA CALIENTE
Unidad de Coordinación	ADUANA AGUA CALIENTE
Proyecto	MEJORAS EN ADUANA AGUA CALIENTE
Unidad de Coordinación	ADUANA AGUA CALIENTE
Proyecto	MEJORAS EN ADUANA AGUA CALIENTE
Unidad de Coordinación	ADUANA AGUA CALIENTE

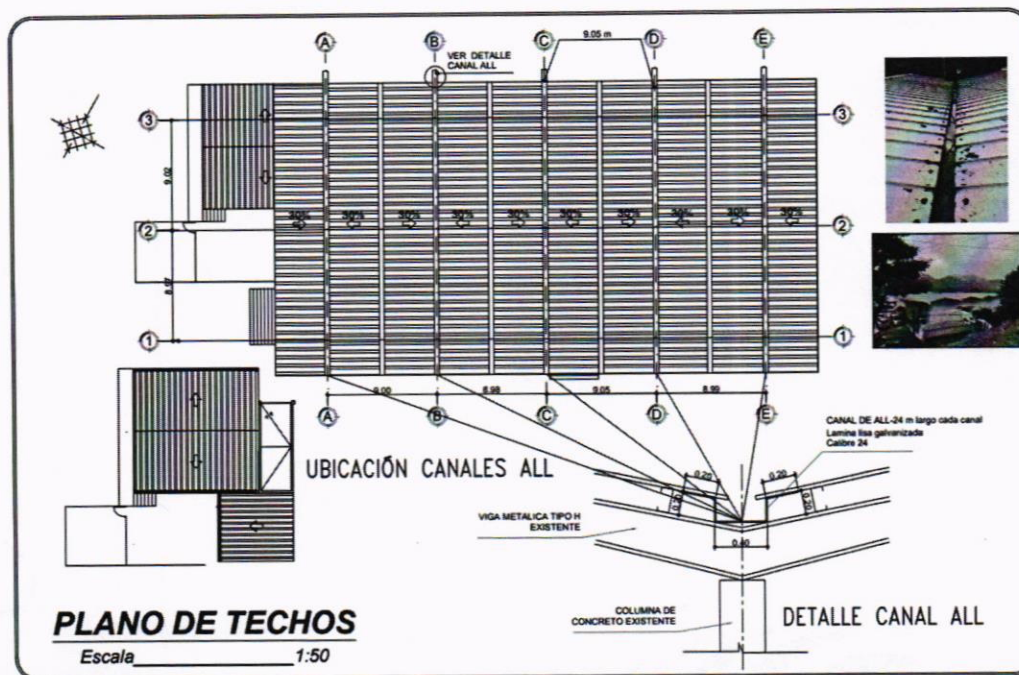


Hoja No.	17
Proyecto	MEJORAS EN ADUANA AGUA CALIENTE
Unidad de Coordinación	ADUANA AGUA CALIENTE
Proyecto	MEJORAS EN ADUANA AGUA CALIENTE
Unidad de Coordinación	ADUANA AGUA CALIENTE
Proyecto	MEJORAS EN ADUANA AGUA CALIENTE
Unidad de Coordinación	ADUANA AGUA CALIENTE

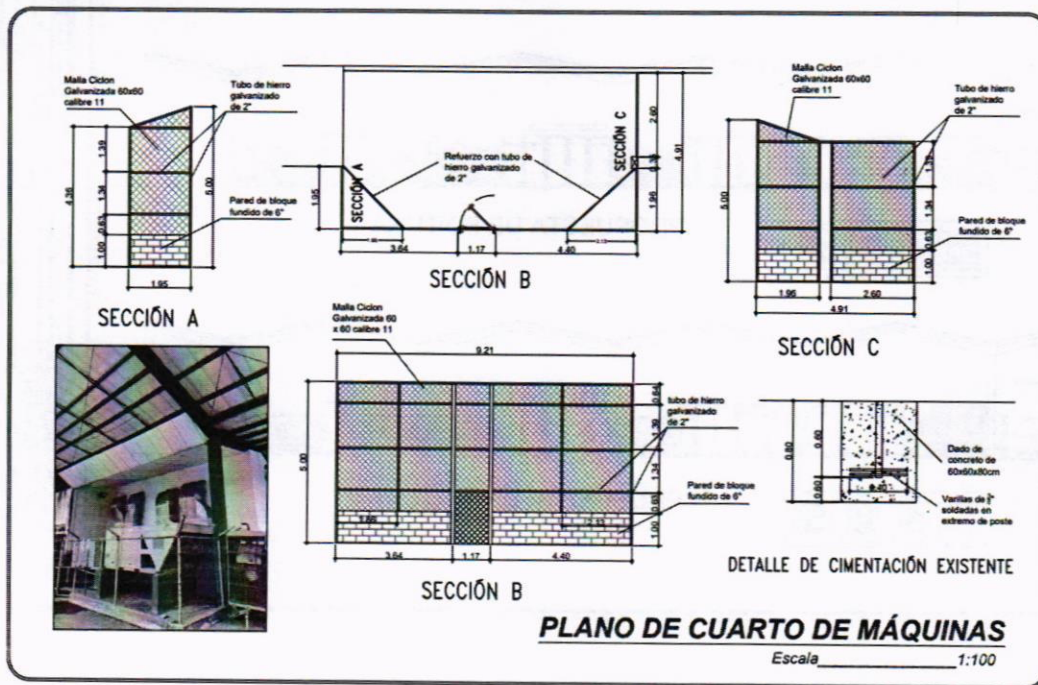


Hoja No.	3/7
Proyecto	MEJORAS EN ADUANA AGUA CALIENTE
Arquitecto	Ing. Daniel Pineda
Proyectista	Ing. Daniel Pineda
Revisor	Ing. Daniel Pineda
Fecha	15 de Mayo de 2014
Escala	1:100
Administración Aduanera de Honduras (Aduanas)	UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTOS
Manejo de Documentos	COORDINADOR
Manejo de Datos	COORDINADOR

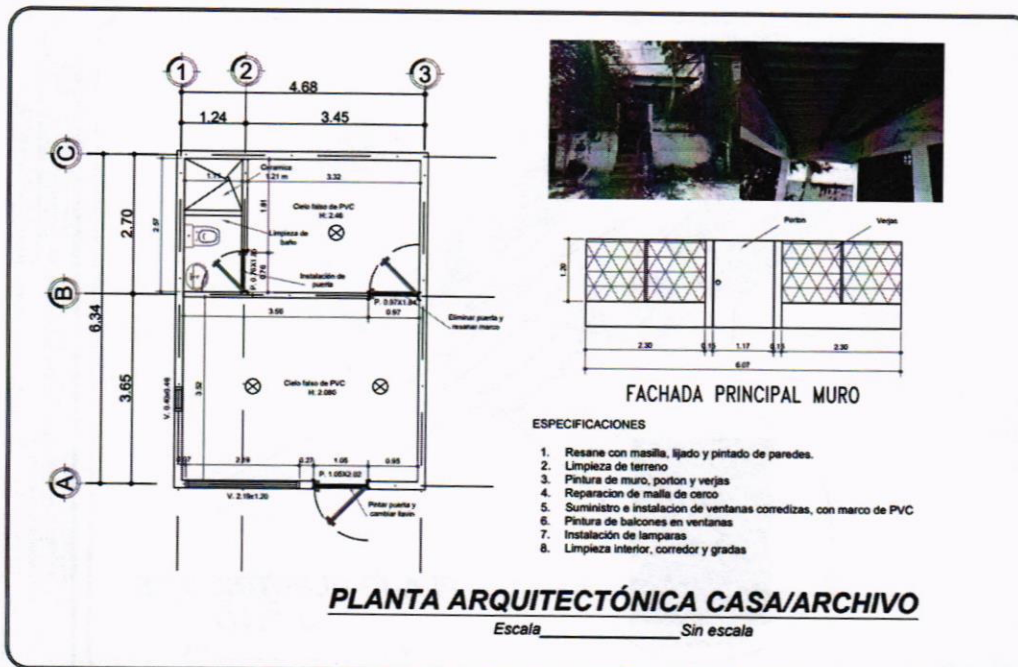


Hoja No.	4/7
Proyecto	MEJORAS EN ADUANA AGUA CALIENTE
Arquitecto	Ing. Daniel Pineda
Proyectista	Ing. Daniel Pineda
Revisor	Ing. Daniel Pineda
Fecha	15 de Mayo de 2014
Escala	1:100
Administración Aduanera de Honduras (Aduanas)	UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTOS
Manejo de Documentos	COORDINADOR
Manejo de Datos	COORDINADOR

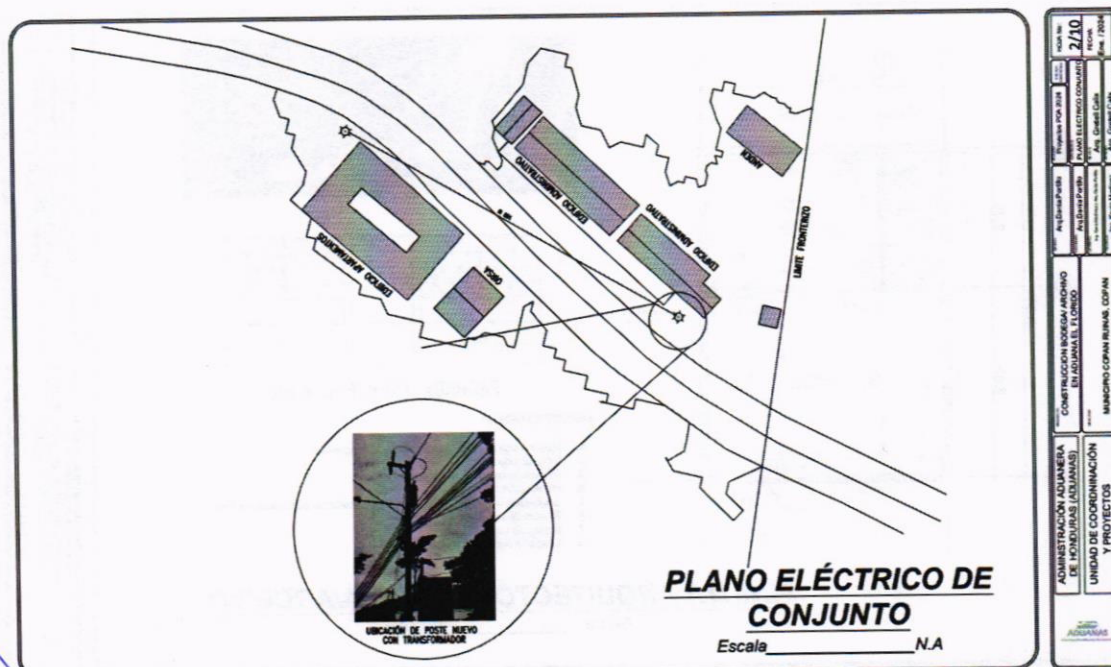


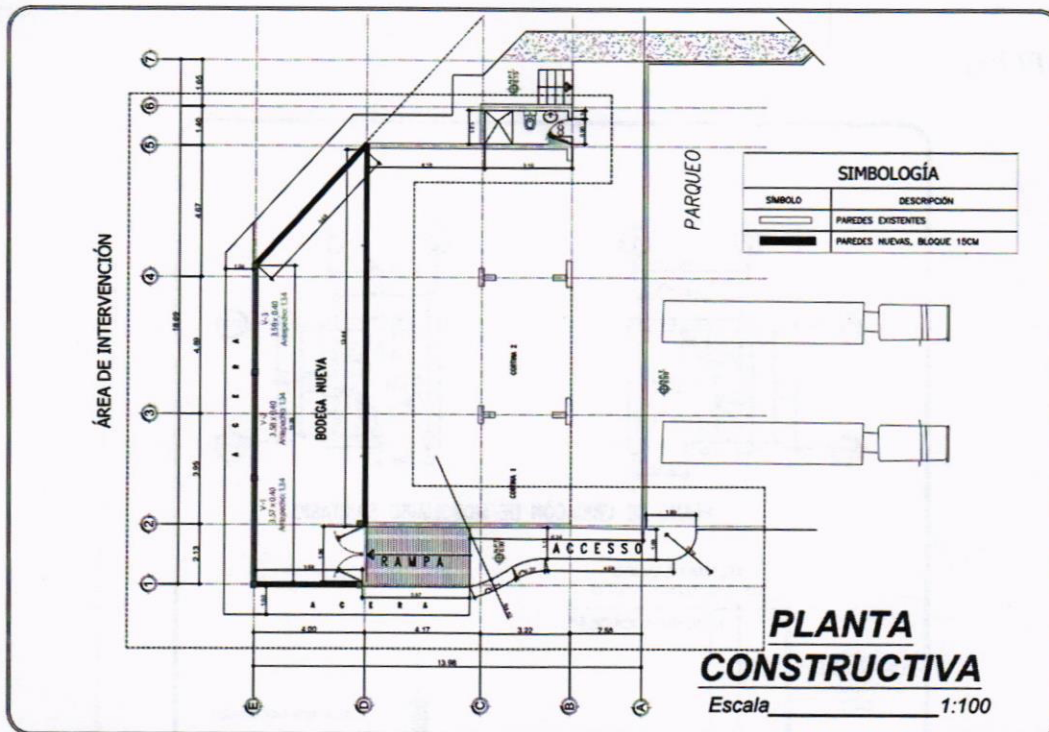


PROYECTO	MEJORA EN AGUA EL LITORAL
FECHA	15/05/2024
PROYECTISTA	ING. CARLOS GARCÍA
PROYECTO	MUNICIPIO COPAN RUINAS COPAN

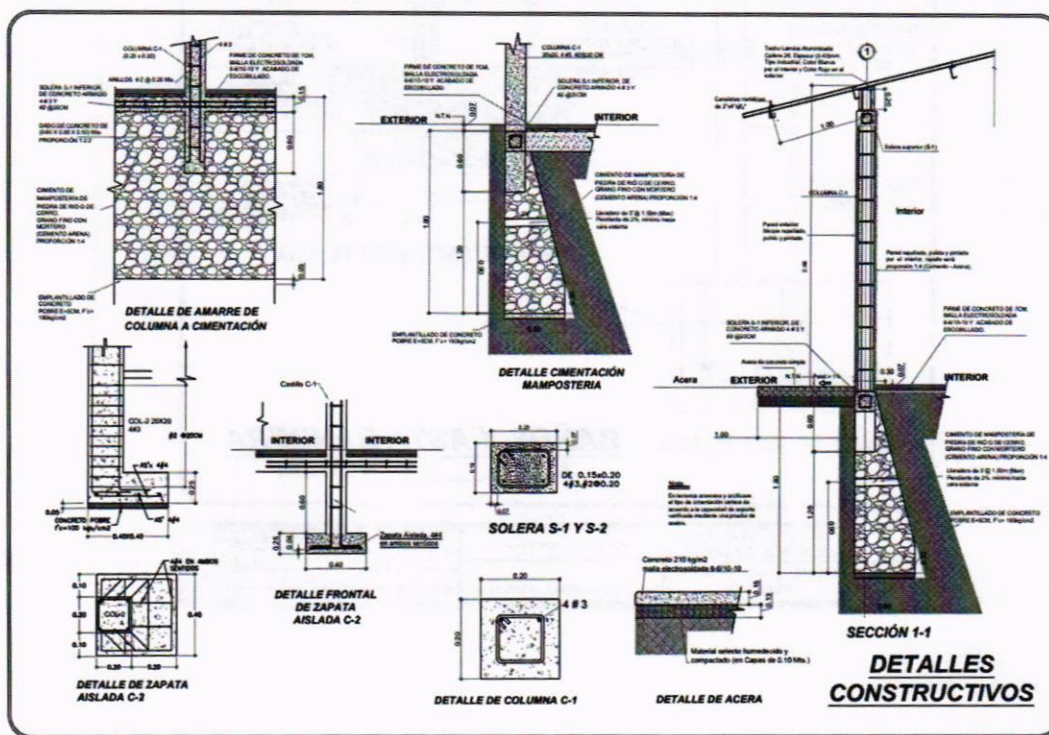

PROYECTO	MEJORA EN AGUA EL LITORAL
FECHA	15/05/2024
PROYECTISTA	ING. CARLOS GARCÍA
PROYECTO	MUNICIPIO COPAN RUINAS COPAN

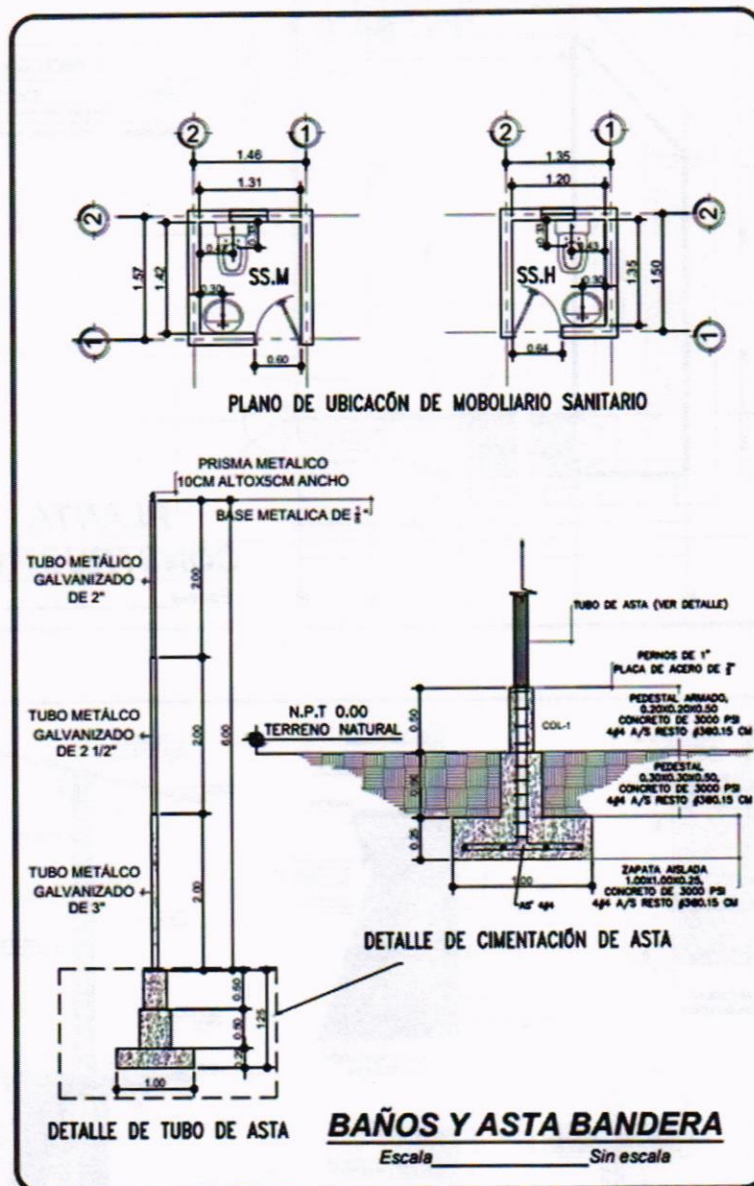

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS)	MEJORAS EN ADUANA EL POY	Arg. Diseño: [blank]	Proyecto: PDA 2008	Hoja No: 1/3
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y PROYECTOS	MUNICIPIO OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE	Arg. Diseño: [blank]	PLANO: BAÑOS Y ASTA B.	FECHA: Ene. / 2024
		Arg. Diseño: [blank]	Arg. Gráfica: [blank]	

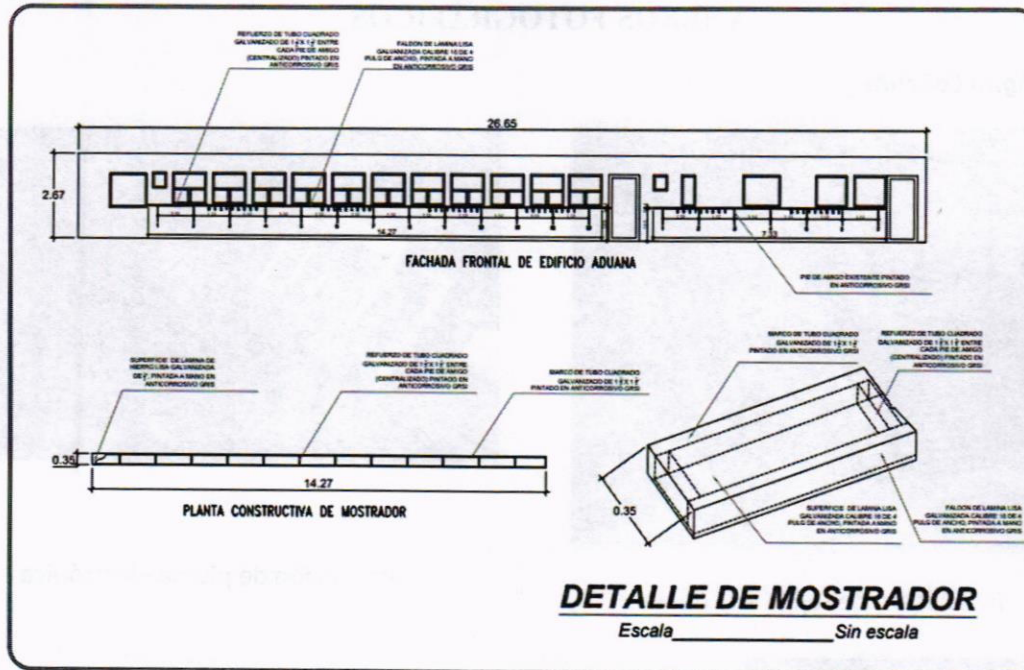[illegible]

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Aduana Agua Caliente



Instalación de rejilla en cuneta




Instalación de pluma electrónica



Instalación de cielo falso PVC



Cuarto de maquinas finalizado con su cielo falso

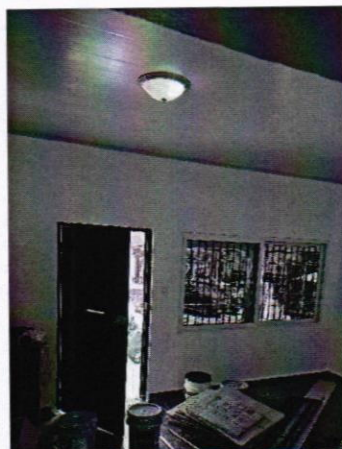

Instalación de puertas y ventanas (bodega)



Pintura en anden

"La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras"

@aduanashonduras    www.aduanas.gob.hn

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Aduana El Florido, cerco de malla instalado.


Aduana El Florido



Pintura en paredes de bodega y andén.



Instalación de portón metálico en bodega.

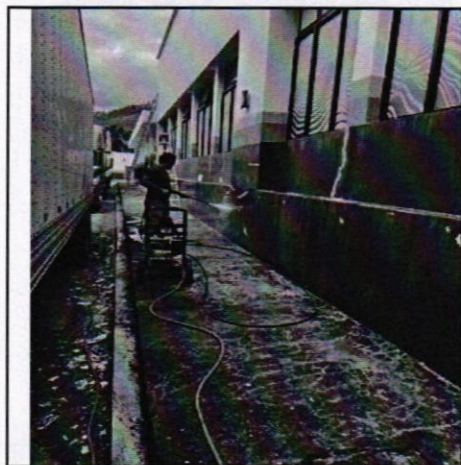

Lavado de paredes previo a pintura edificio administrativo



Pintura en edificio administrativo



Instalación de puertas en
sanitario de hombres y



Instalación de sanitarios de
hombres y mujeres.



Instalación de sanitarios de
hombres y mujeres.



Instalación de lavamanos de
hombres y mujeres.

“CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE MURO PERIMETRAL PARA LA ADUANA EL AMATILLO, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS”

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROPIETARIO DEL PROYECTO

- Administración Aduanera de Honduras/Gerencia Nacional de Proyectos.

SECTOR Y SUB-SECTOR

- Gobierno

NOMBRE DEL PROYECTO

- Contrato de obra No- ADUANAS-GNFA-019-2024 “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE MURO PERIMETRAL PARA LA ADUANA EL AMATILLO, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS” mediante Licitación Privada No LPR. ADUANAS – OBRAS – 001 – 2024.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

- Aldea Goascorán, Municipio de Goascorán, Departamento de Valle. Frontera entre Honduras y El Salvador.

PROPÓSITO

El propósito principal es fortalecer la seguridad y control en las instalaciones aduaneras, mediante la construcción de varios tramos de muro perimetral que permita delimitar el perímetro de la Aduana.

Con la construcción de estos tramos de muro perimetral, se busca:

- Garantizar la protección de las instalaciones y del personal que opera en la Aduana.
- Eliminar accesos no autorizados y reducir riesgos de contrabando y otras actividades ilícitas.
- Mejorar la eficiencia operativa al establecer un control más efectivo de los flujos de mercancías y personas dentro del recinto aduanero.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la construcción de una estructura perimetral (Muros) de seguridad en puntos estratégicos de la Aduana, con el fin de reforzar el control de accesos y mejorar la seguridad dentro de la Aduana.

Esta infraestructura fue diseñada con materiales de alta resistencia, garantizando durabilidad y eficacia en la protección del perímetro, como ser cimientos de mampostería y bloque de concreto para paredes, además incluye sistemas de drenaje y obras adicionales para mejorar su funcionalidad.

ELABORACION DEL PROYECTO

ALCANCE

El proyecto tiene como objetivo la construcción de un muro perimetral para reforzar la seguridad en la Aduana El Amatillo, el cual desarrollará en tres tramos específicos (Tramos A, B y C), e involucra actividades de preparación del terreno, cimentación y obra civil, asegurando la estabilidad y durabilidad de la estructura.

Las actividades contempladas incluyen:

- Limpieza y preparación del terreno.
- Demolición de estructuras existentes.
- Construcción de cimentaciones reforzadas.
- Levantamiento de muros perimetrales de mampostería y bloque.
- Colocación de drenajes y estructuras de seguridad.

Las mejoras de la infraestructura física forman parte del cumplimiento de los objetivos propuestos para la modernización de las Aduanas que incluye, fortalecimiento, seguridad en la frontera y la mejora en la gestión del comercio.

IMPACTO AMBIENTAL

- Tipo de impacto ambiental negativos:

Emisiones de polvo: La manipulación de materiales pueden generar partículas en suspensión, afectando la calidad del aire.

Gestión de residuos: Los escombros de construcción y el mal manejo de materiales pueden contaminar cuerpos de agua cercanos.

IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS

- No implica ningún Impacto

DETALLE DE LOS CONTACTOS

- Gerente de Proyectos / Administración Aduanera de Honduras.
- Lic. Víctor Manuel Turcios/ INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE R.L. DE C.V.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

- Fondos propios de la Institución, para la contratación de una empresa por medio de licitación privada para el desarrollo del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

- El monto para la ejecución del proyecto es de **1,192,038.53 millones de lempiras.**

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

- Tercer Trimestre del 2024

ESTADO DEL PROYECTO

- En Ejecución de Infraestructura por el oferente INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE R.L. DE C.V.

COSTO DE FINALIZACIÓN

- El costo de finalización es de **1,192,038.53 millones de lempiras.**

Las inversiones realizadas son las siguientes:

Descapote y limpieza del terreno, corte de árboles, excavación para cimentación, demolición de estructuras existentes, construcción de zapatas corridas y aisladas, construcción de soleras, construcción de castillos, paredes de bloque, muros de mampostería, instalación de drenajes de agua lluvia y limpieza general del sitio.

FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO

- 20 de abril del 2025

PORCENTAJE DE AVANCE

- **100% (porcentaje validado al 31 de marzo de 2025)**

EJECUCION DEL PROYECTO

RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL

- El proyecto ya fue finalizado en su totalidad.

VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO.

- Se realizó una orden de cambio al contrato donde se realizó la disminución de las obras que se iban a ejecutar en el tramo C del muro perimetral y dicho monto fue utilizado para la realización del terreno del área del tramo A.

Monto del contrato original: **1,192,038.53** millones de lempiras.

Costo de disminución de obra tramo C: **24,769.15** Lempiras.

Costo de aumento de actividad en relleno: **24,568.70** Lempiras.


Valor final de contrato: **1,191,838.08** millones de Lempiras.

VARIACIÓN EN EL ALCANCE Y DURACIÓN DEL PROYECTO.

- El proyecto tubo una variación en el alcance de este dado que no se realizó la construcción del tramo C, el cual estaba estipulado en este contrato, esta actividad fue sustituida por la actividad de relleno de material en el tramo A. La duración del proyecto no sufrió ninguna modificación por lo que la fecha de entrega se mantenía para el 20 de abril de 2025

RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS

- Surge la necesidad de dejar habilitado el tramo C temporalmente para el paso de vehículo livianos y peatones, posteriormente se realizará la delimitación total del muro, con lo que respecta al relleno del tramo A, este era necesario para conformar de manera uniforme el terreno de la Aduana, en ese sector.

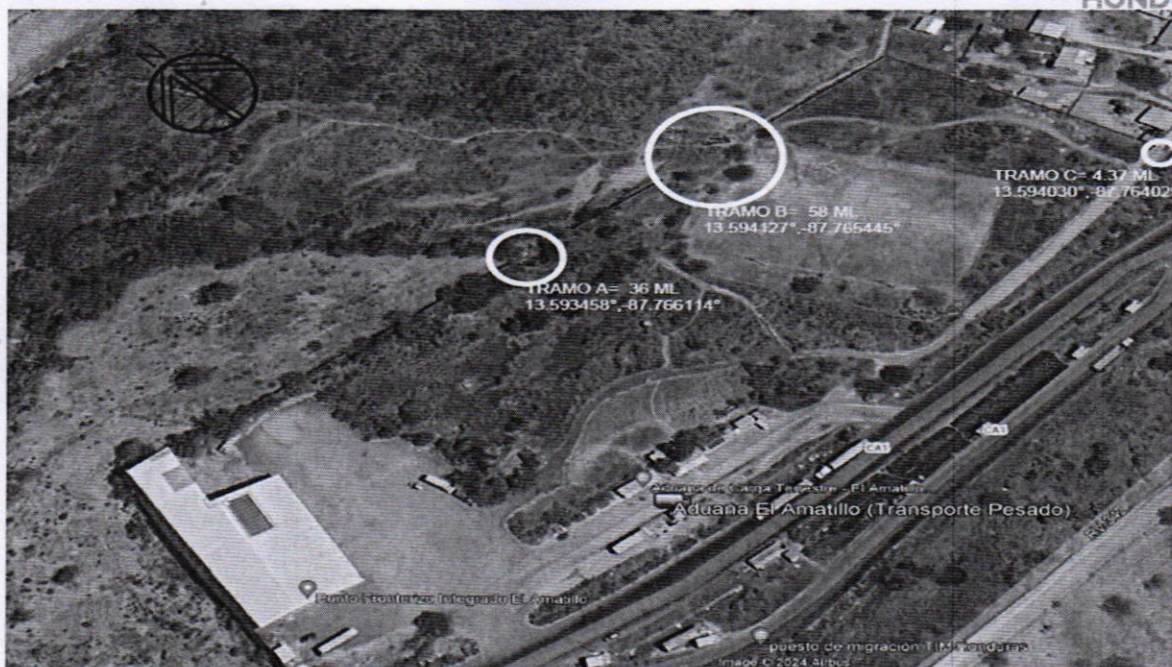

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



Construcción del muro perimetral del TRAMO B



Construcción de tramo del muro perimetral del TRAMO A.



Actividad de relleno y compactado en el Tramo A

NOTA ACLARATORIA

La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los lineamientos para la verificación de información pública en los portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada en el apartado Programas y proyectos instruye literalmente lo siguiente: **Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la institución obligada según la fase del proyecto**, estos detalles se encuentran a continuación:

- 1) Identificación del proyecto.
- 2) Elaboración del proyecto.
- 3) Ejecución del proyecto.
- 4) Finalización del proyecto.

Se adjunta la constancia de avances de los proyectos que comenzaron en los meses de agosto, noviembre de 2024 y enero de 2025.

A la vez se hace mención que dicha Unidad Administradora de Proyectos en esta institución es únicamente gestora de proyectos, la ejecución y manejo de fondos nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera. Al momento de la ejecución de los proyectos asignados a nuestra Unidad es de nuestra responsabilidad dar el visto bueno de las actividades realizadas para proceder con el procedimiento de pago según estimaciones realizadas

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los **cuatro (4) días del mes de abril de 2025.**



Arq. **Daniela Portillo**
Jefa de Unidad de Coordinación Externa y Proyectos.
