



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-31 DE MAYO DE 2017

Encargado de ejecución del proyecto.	Municipalidad de Tomalá, Lempira
Sector/Subsector	Infraestructura Social
Nombre del Proyecto	Ampliación y reparación del centro de salud, Tomalá.
Ubicación del Proyecto	Barrio El centro, Tomalá Lempira, frente al Parque central y Edificio municipal.
Propósito	El propósito principal es crear una edificación con los estándares de la secretaria de salud, estas instalaciones deben de cumplir con estándares mínimos de áreas y espacios para poder brindar a la población una calidad en el servicio de salud, además que el personal cuente con los espacios necesarios para poder brindar la atención a la población.
Descripción del proyecto.	<p>En vista de las condiciones en las que se encontraba el edificio del centro de salud, se vio la necesidad de hacer una remodelación completa de toda la instalación. Se realizarán las siguientes actividades.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Se construirá muro perimetral.✓ Se construirán los módulos de promoción y Tuberculosis.✓ Se reemplazarán todas las ventanas, puertas, portones y balcones.✓ Se reemplazará piso existente en mal estado.✓ Se reemplazará techo por losa aligerada con tubo estructural y lamina aluminizada, para la colocación de esta losa se reforzará la primera planta con 24 columnas de concreto reforzado.✓ Se cambiará el repello, pulido y pintura de toda la edificación.✓ Se cambiará el sistema eléctrico de toda la edificación.✓ Se cambiarán todos los accesorios hidrosanitarios.✓ Se construirá techo en los módulos nuevos.✓ Se construirá un quiosco y una bodega



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-31 DE MAYO DE 2017

- ✓ Compra de mobiliarios médicos: dos camillas para examen médico, gradas para cama, 3 bancos giratorios, balanza para peso de recién nacidos, una refrigeradora para la conservación de biológicos.

Avances del proyecto en el mes de mayo.	<p>En el periodo del mes de mayo de 2017 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Se ha repellido la parte frontal en el exterior de la edificación, además de haber iniciado el repello en la parte interior.✓ Se fundieron las vigas V-1 en la que se colocaron los pines a cada 60cm para la colocación del tubo estructural para la fundición de la Losa.✓ Se han demolido las paredes interiores que estaban consideraras cambiar.✓ Se sellaron los boquetes de las puertas a eliminar.✓ Se inició la colocación de tubo 4"x4" chapa 11 para la estructura de la losa.
Impacto Ambiental	No se tiene un impacto ambiental en este proyecto, más que los residuos sólidos provenientes de demoliciones, los cuales son llevados a lugares de disposición final.
Impacto del terreno y asentamiento.	NO APLICA
Detalles del encargado del proyecto	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118




MUNICIPALIDAD DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-31 DE MAYO DE 2017

	EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento	<ul style="list-style-type: none">✓ Embajada del Japón en Honduras.✓ Municipalidad de Tomalá.
Porcentaje de avance del proyecto.	58%
Fecha de finalización estimada	Agosto de 2017


Memoria Fotográfica del Proyecto

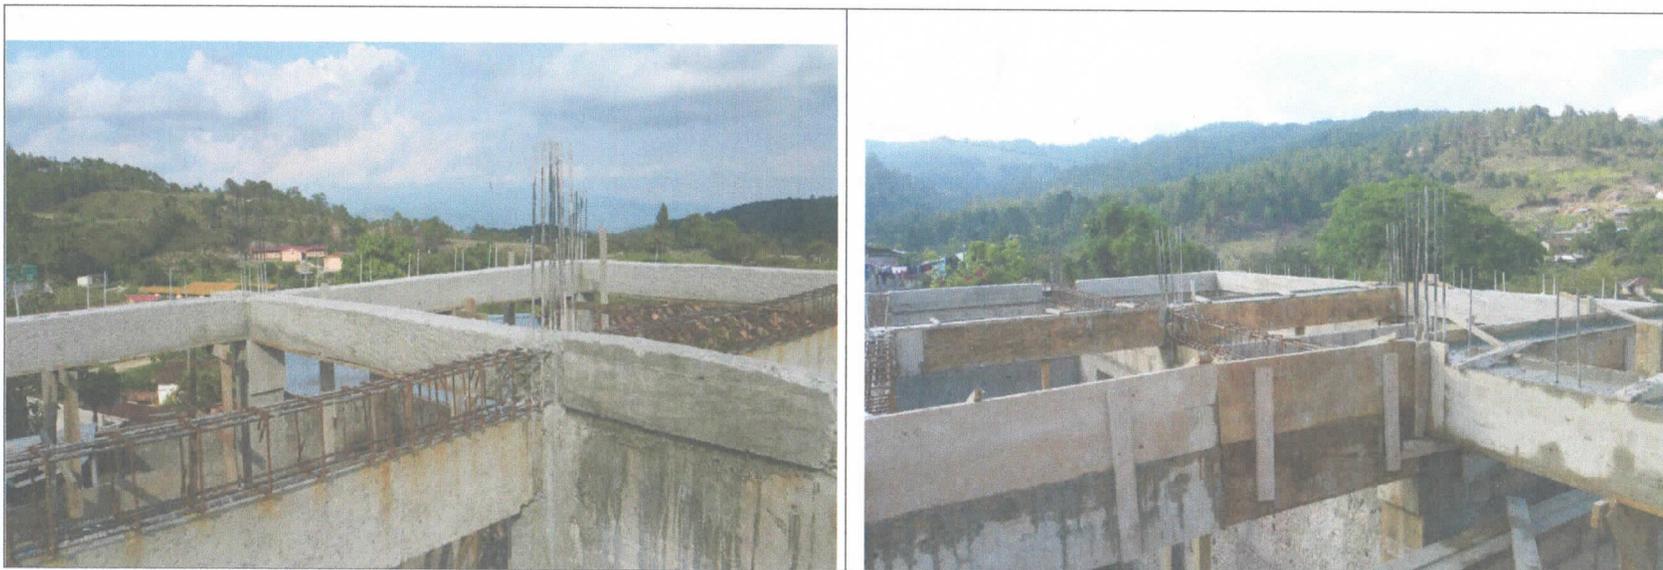



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-31 DE MAYO DE 2017

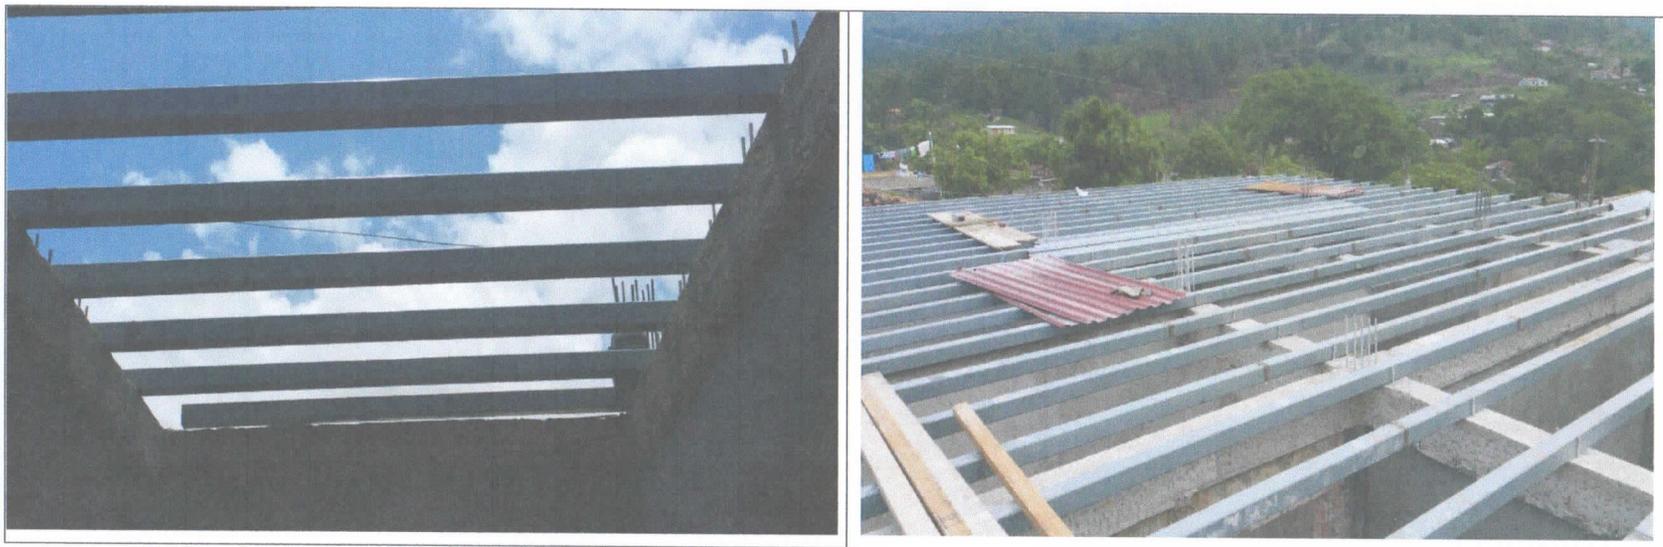


Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
TOMALA, LEMPIRA

