



MUNICIPALIDAD DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.  
[municipalidadtomalaoficial@yahoo.es](mailto:municipalidadtomalaoficial@yahoo.es)

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PERIODO: 1-30 DE ABRIL DE 2017

<b>Encargado de ejecución del proyecto.</b>	<b>Municipalidad de Tomalá, Lempira</b>
<b>Sector/Subsector</b>	Infraestructura Social
<b>Nombre del Proyecto</b>	Ampliación y reparación del centro de salud, Tomalá.
<b>Ubicación del Proyecto</b>	Barrio El centro, Tomalá Lempira, frente al Parque central y Edificio municipal.
<b>Propósito</b>	El propósito principal es crear una edificación con los estándares de la secretaria de salud, estas instalaciones deben de cumplir con estándares mínimos de áreas y espacios para poder brindar a la población una calidad en el servicio de salud, además que el personal cuente con los espacios necesarios para poder brindar la atención a la población.
<b>Descripción del proyecto.</b>	<p>En vista de las condiciones en las que se encontraba el edificio del centro de salud, se vio la necesidad de hacer una remodelación completa de toda la instalación. Se realizarán las siguientes actividades.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Se construirá muro perimetral.</li><li>✓ Se construirán los módulos de promoción y Tuberculosis.</li><li>✓ Se reemplazarán todas las ventanas, puertas, portones y balcones.</li><li>✓ Se reemplazará piso existente en mal estado.</li><li>✓ Se reemplazará techo por losa aligerada con tubo estructural y lamina aluminizada, para la colocación de esta losa se reforzará la primera planta con 24 columnas de concreto reforzado.</li><li>✓ Se cambiará el repello, pulido y pintura de toda la edificación.</li><li>✓ Se cambiará el sistema eléctrico de toda la edificación.</li><li>✓ Se cambiarán todos los accesorios hidrosanitarios.</li><li>✓ Se construirá techo en los módulos nuevos.</li><li>✓ Se construirá un quiosco y una bodega</li></ul>



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

[municipalidadtomalaoficial@yahoo.es](mailto:municipalidadtomalaoficial@yahoo.es)

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PERIODO: 1-30 DE ABRIL DE 2017

- ✓ Compra de mobiliarios médicos: dos camillas para examen médico, gradas para cama, 3 bancos giratorios, balanza para peso de recién nacidos, una refrigeradora para la conservación de biológicos.

<b>Avances del proyecto.</b>	<p>En el periodo del mes de abril de 2017 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Se han fundido las 24 columnas de refuerzo de la primera planta.</li><li>✓ Se ha colocado la armadura de las vigas de refuerzo.</li><li>✓ Se está trabajando en el encofrado de las vigas y ya se han fundido en un 30 %</li><li>✓ Se han cambiado las paredes internas de adobe por paredes de bloque.</li><li>✓ Se está iniciando la actividad de repello.</li></ul>
<b>Impacto Ambiental</b>	No se tiene un impacto ambiental en este proyecto, más que los residuos sólidos provenientes de demoliciones, los cuales son llevados a lugares de disposición final.
<b>Impacto del terreno y asentamiento.</b>	NO APLICA
<b>Detalles del encargado del proyecto</b>	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
<b>Fuentes de financiamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Embajada del Japón en Honduras.</li><li>✓ Municipalidad de Tomalá.</li></ul>
<b>Porcentaje de avance del proyecto.</b>	50%




MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.  
[municipalidadtomalaoficial@yahoo.es](mailto:municipalidadtomalaoficial@yahoo.es)

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PERIODO: 1-30 DE ABRIL DE 2017

Fecha de finalización estimada

Agosto de 2017

Memoria Fotográfica del Proyecto

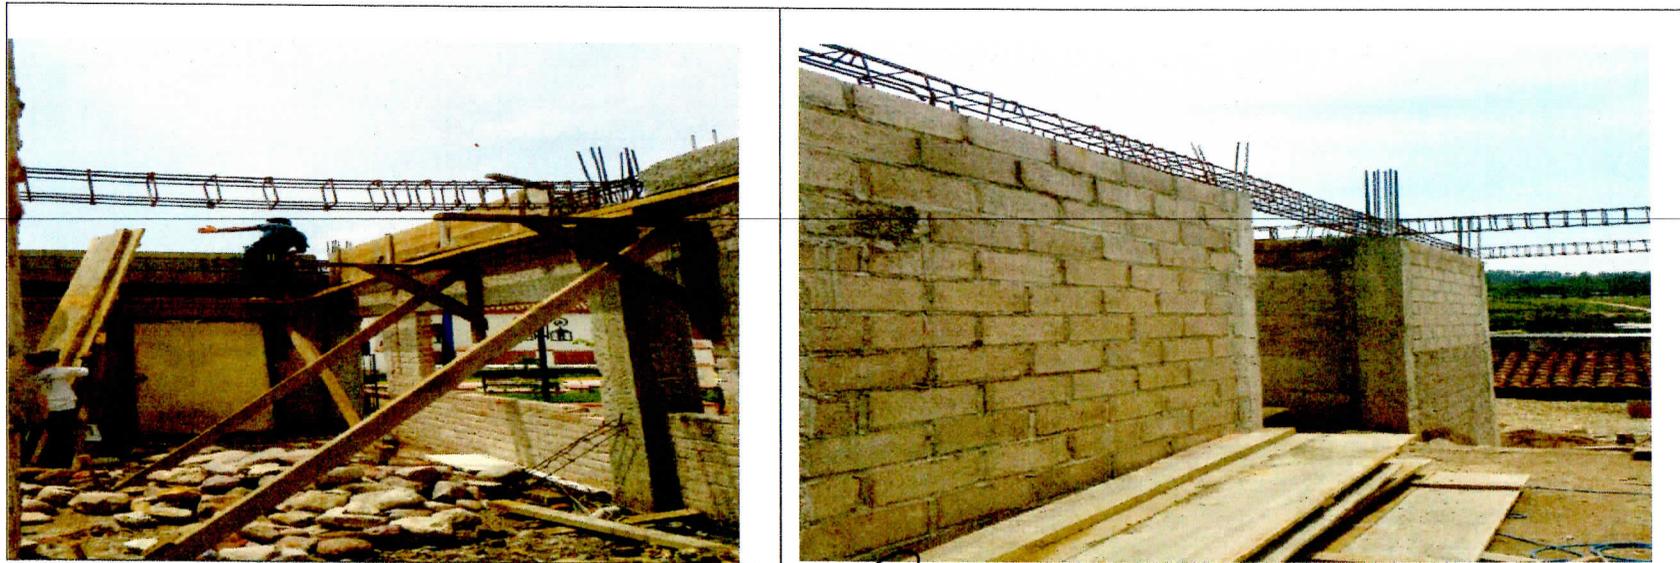

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

