

MEMORANDO

UI-327-2017

Para: **ABOG. INGRID VANESSA MOLINA**
Transparencia

De: **ING. HELIODORO CARRILLO**
Director Unidad de Ingeniería

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 03 de julio 2017



Se adjunta la información de los proyectos ejecutados hasta el mes junio por esta unidad de acuerdo al formato establecido. Se incluyen los siguientes proyectos:

1. Desmontaje y Construcción de Cubierta de Techo e Instalaciones Eléctricas en Galera Muelle de Cabotaje.
2. Construcción de Dolphin Central del Muelle 1-a (Melaza) de Puerto Cortes.
3. Construcción de Cerco Perimetral del Terreno Propiedad de la ENP en el Puerto de San Lorenzo 1 era Etapa.
4. Obras de Terracería y Drenaje en Predio Contiguo a la Zona Libre para Habilitación de Pre Puerto de Contenedores ENP de Puerto Cortes.
5. Reconstrucción y Reparación de Cerco Perimetral Sector la Puntilla, ENP, Puerto Cortes.
6. Rehabilitación Edificio Administrativo No.2.

Cc: Archivo

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO 1 era ETAPA"

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	En el recinto Portuario de San Lorenzo, Departamento de Valle, Honduras.
Propósito	Aumentar el área de seguridad del puerto de acuerdo al crecimiento del mismo.
Descripción del Proyecto	Construcción de cerco perimetral con malla ciclón con su cimentación.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener las condiciones de infraestructura en óptimas condiciones de acuerdo a los requerimientos de la CNPP y UPP.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 3,070,237.310
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	05 agosto del 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay hasta el momento.

Elaborado por Ing. Olga Najjar


 Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos


 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica


CERCO PERIMETRAL DE SAN LORENZO

ANTES



DESPUES



PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "OBRAS DE TERRACERIA Y DRENAJE EN PREDIO CONTIGUO A LA ZONA LIBRE PARA HABILITACION DE PRE PUERTO DE CONTENEDORES ENP DE PUERTO CORTES"

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	En el sector de Zona Libre contiguo a las Instalaciones del Complejo Deportivo.
Propósito	Mejorar el congestionamiento vial que se produce diariamente dentro de Puerto Cortes.
Descripción del Proyecto	Corte, acarreo, relleno y compactación con material granular.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener un área de espera que contribuya al descongestionamiento vial dentro del Puerto.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 3,652,677.07
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	17 agosto 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO



Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay hasta el momento.

Elaborado por Ing. Olga Najar


 Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos


 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica



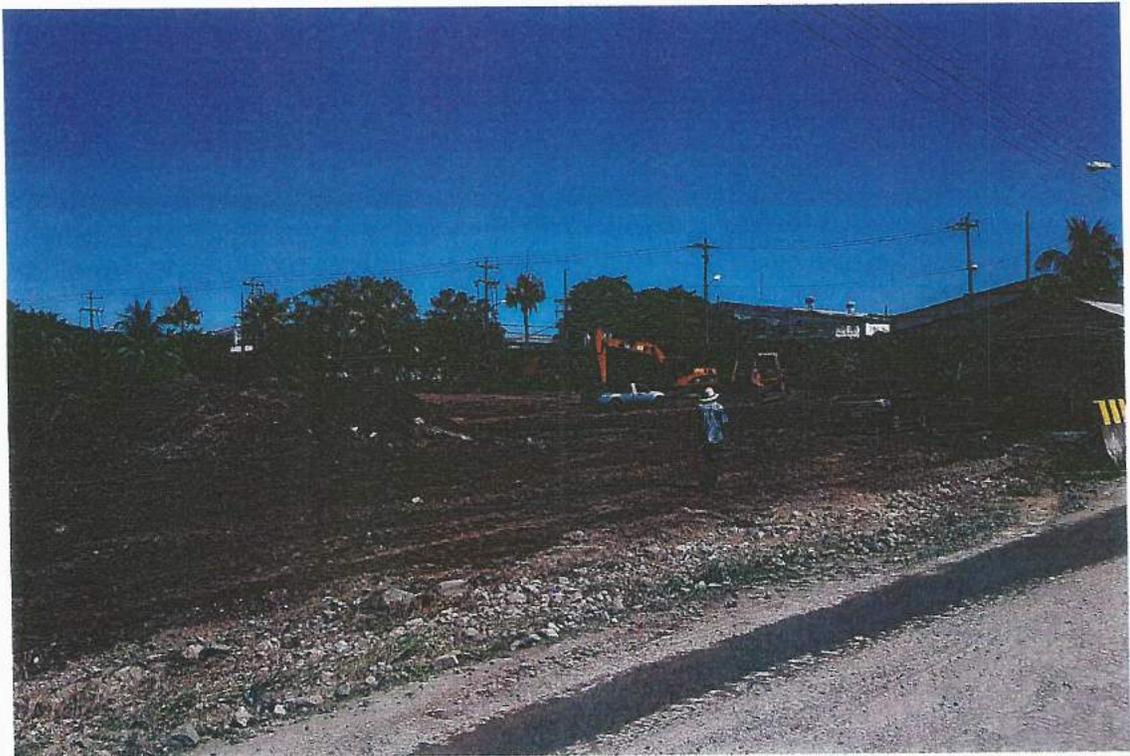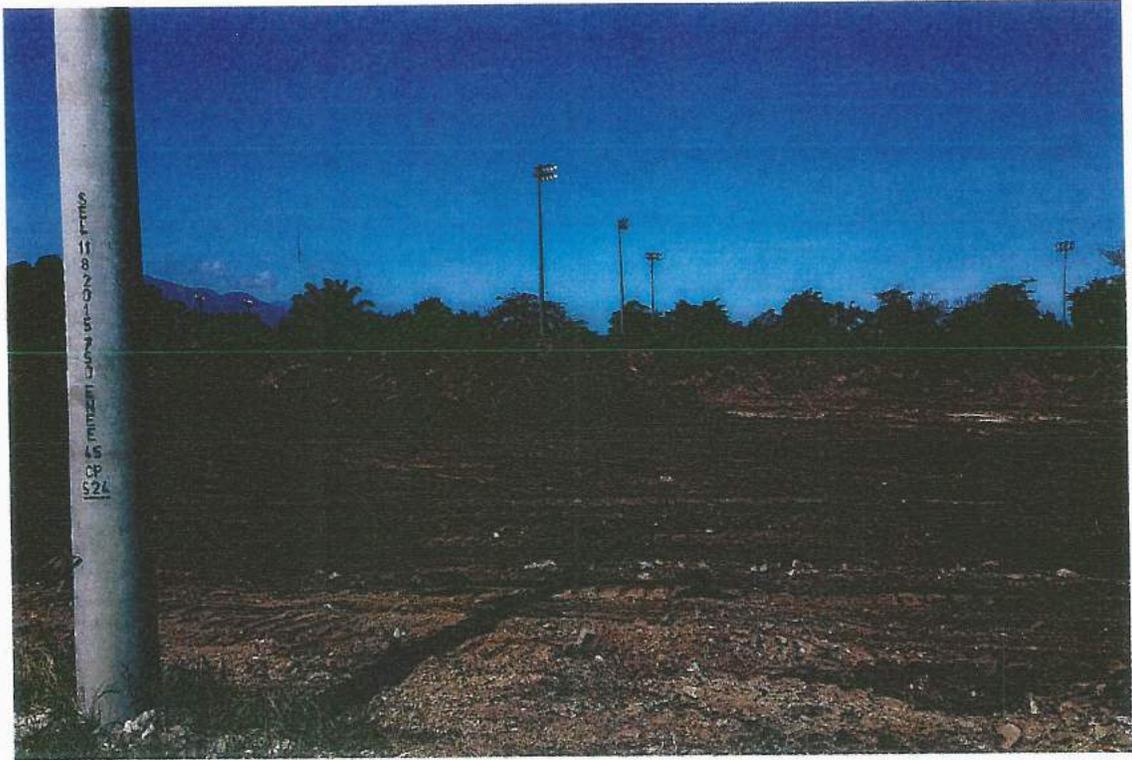

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "RECONSTRUCCION Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL SECTOR LA PUNTILLA, ENP, PUERTO CORTES"

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	En el sector de La Puntilla, ENP, Puerto Cortes.
Propósito	Mejorar la seguridad del Puerto.
Descripción del Proyecto	Construcción del cerco de malla ciclón con sus refuerzos.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener las condiciones de infraestructura en óptimas condiciones de acuerdo a los requerimientos de la CNPP y UPP.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 945,713.35
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	28 de Febrero del 2017
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentre en ejecución.

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento.
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay hasta el momento.

Elaborado por Ing. Olga Najar


Ing. Oscar Delgado
Jefe de Depto. de Proyectos


Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
Jefe División Técnica



CERCO PERIMETRAL EN EL SECTOR DE LA PUNTILLA EN PUERTO CORTES



PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TECHO E INSTALACIONES ELECTRICAS EN GALERA MUELLE DE CABOTAJE"

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	El proyecto se encuentra ubicado frente al Muelle de Cabotaje, dentro del Recinto Portuario.
Propósito	Mejorar la cubierta de techo de la bodega ubicada en el Muelle de Cabotaje.
Descripción del Proyecto	Consiste en el desmontaje, suministro e instalación de la estructura metálica, lamina de aluzinc e instalaciones eléctricas.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener una cubierta de techo en buenas condiciones de operación.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L.2,273,049.80
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	13 agosto 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay hasta el momento.




Elaborado por Ing. Olga Najjar


Ing. Oscar Delgado
Jefe de Depto. de Proyectos



Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
Jefe División Técnica





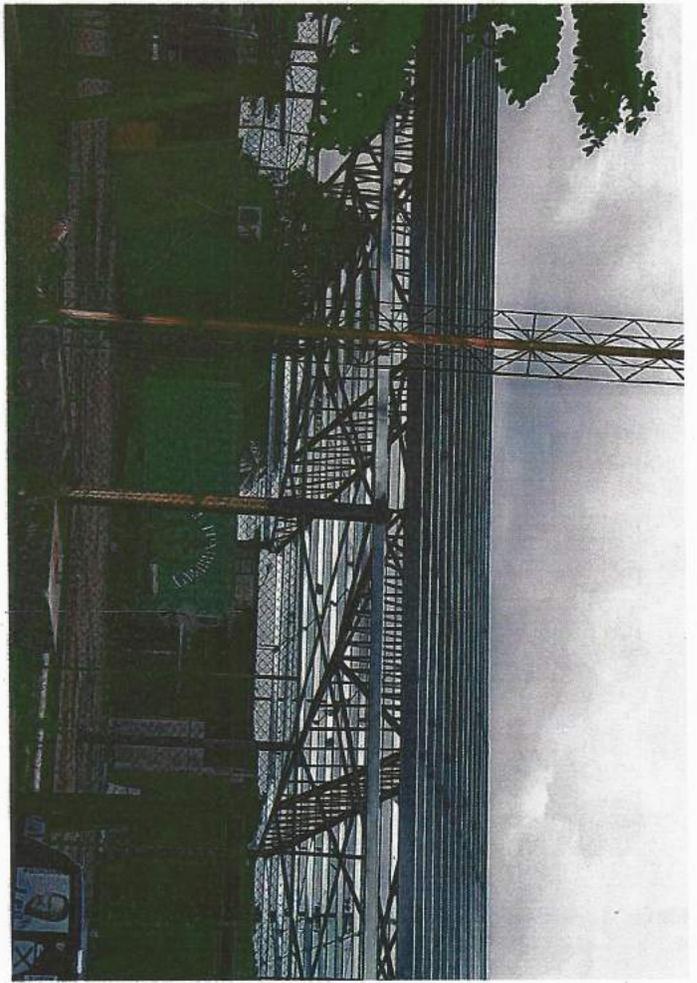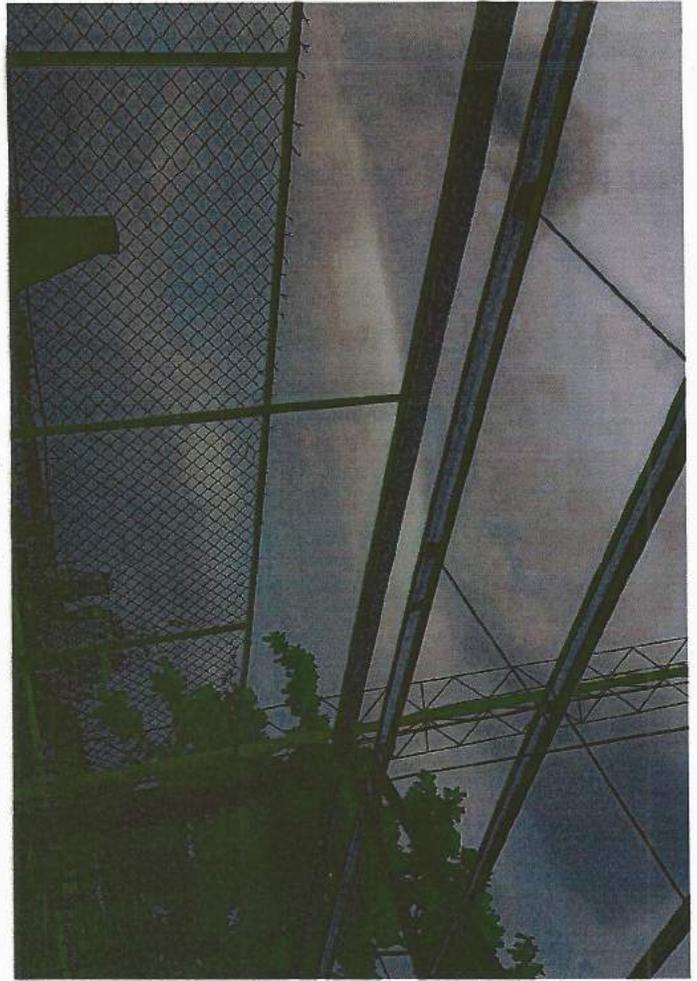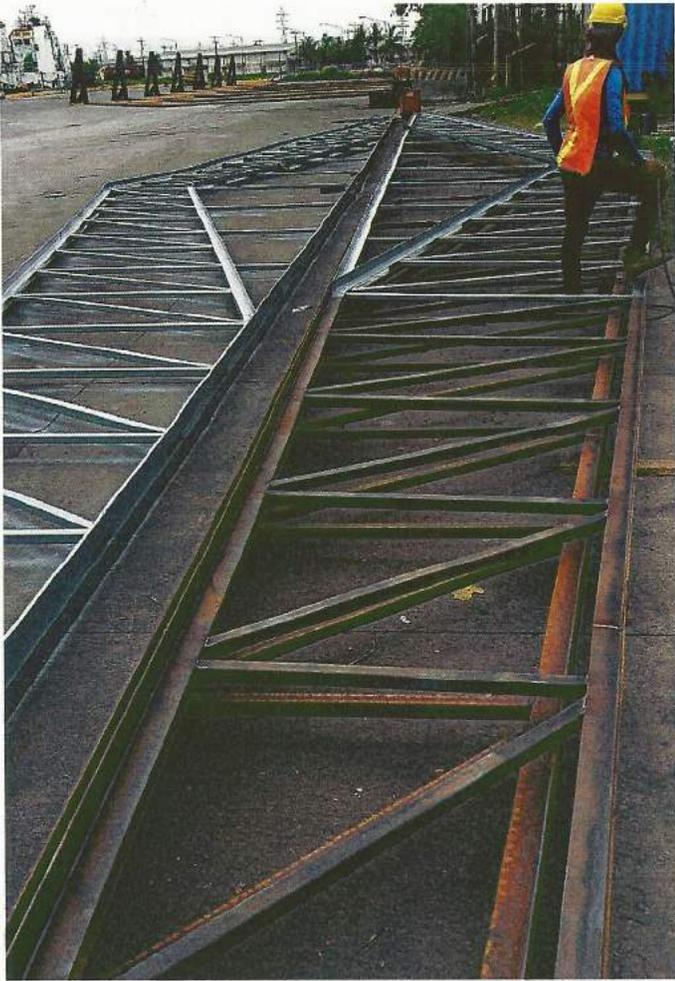



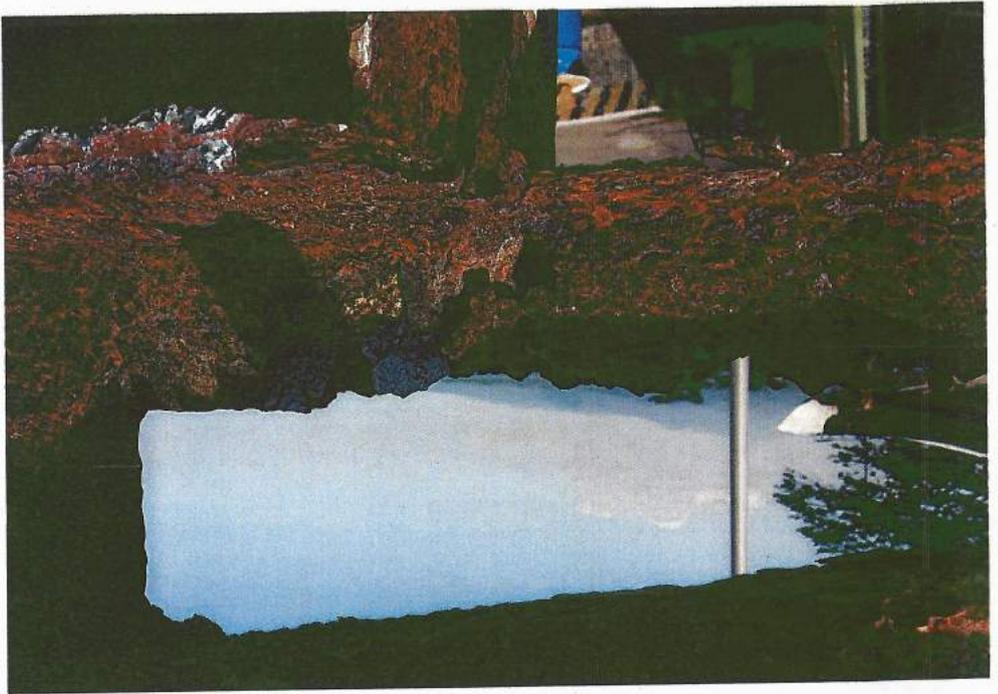

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "REHABILITACION EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2"

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	En las Instalaciones de la ENP, Puerto Cortes, Cortes.
Propósito	Maximizar, optimizar y aumentar la vida útil de las instalaciones de la ENP.
Descripción del Proyecto	Acondicionamiento de nuevas oficinas con estándares de calidad para óptimas condiciones de trabajo.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Obtener un área de oficinas en óptimas condiciones de operación.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com


Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 1,779,550.76
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	13 junio 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	L. 177,955.08 a más por necesidades que han surgido en el proyecto durante su ejecución para poder finalizar la obra.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se amplió 135 días.
Razones de los cambios antes mencionados.	Se realizó una ampliación de tiempo debido a la falta de disponibilidad de espacio para trasladar el personal que ocupa el edificio.

Elaborado por Ing. Olga Najjar


 Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos


 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica




NAVEGAMOS POR
UN MEJOR PAIS




GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

“REHABILITACION EDIFICIO ADMINISTRATIVO”

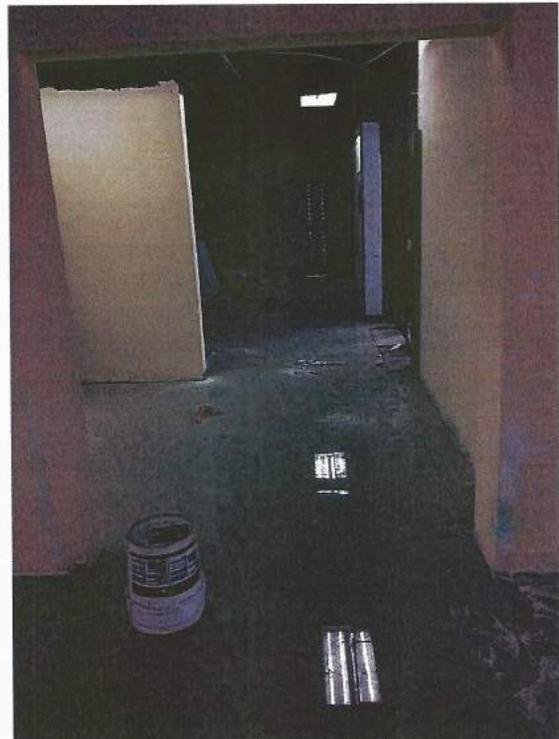



NAVEGAMOS POR
UN MEJOR PAÍS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★³ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA






NAVEGAMOS POR
UN MEJOR PAIS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA

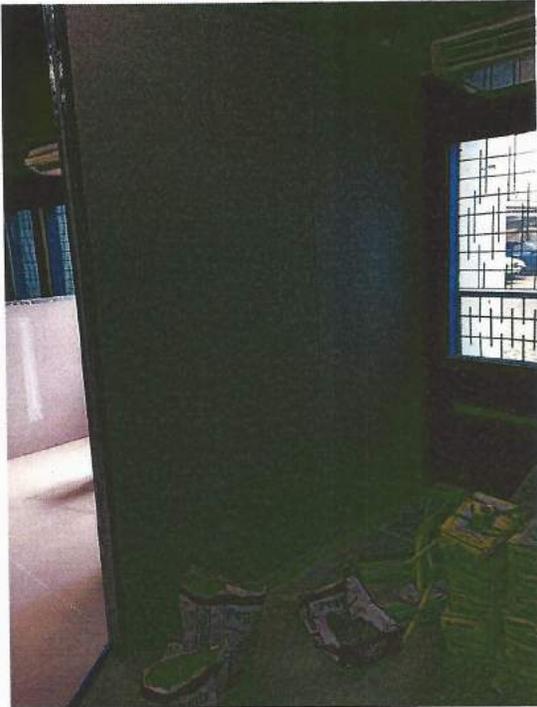

PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE DOLPHIN CENTRAL DEL MUELLE 1-A (MELAZA) DE PUERTO CORTES"

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	El proyecto se encuentra ubicado en el Sector Oeste del Predio portuario de Puerto Cortes, Cortes.
Propósito	Obtener el Dolphin Central del Muelle 1-A en óptimas condiciones de operación y brindar seguridad de atraque y estadía a los buques que transportan derivados de petróleo y productos químicos y melaza
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en la demolición y construcción de un nuevo Dolphin de Atraque Central. Por encontrarse el existente en mal estado.

2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO


Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Lograr la operatividad optima del Muelle 1-A
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com

Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L.46,595,182.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	17 noviembre 2016
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Fecha de Finalización (Proyectado)	El proyecto se encuentra en ejecución.

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento.
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay hasta el momento.

Elaborado por Ing. Olga Najjar


 Ing. Oscar Delgado
 Jefe de Depto. de Proyectos


 Ing. Heliodoro Miguel Carrillo
 Jefe División Técnica

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS CABEZAL SUPERESTRUCTURA





EXTRACCIÓN Y RETIRO DE PILOTES





MOVILIZACION





INSTALACIONES PROVISIONALES

