



Registro Nacional de las Personas

TEGUCIGALPA M.D.C. 07 DE AGOSTO DEL 2017

INGENIERO EDWIN EDUARDO RICO
JEFE DEPTO. TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
SU OFICINA

En atención de su solicitud contenida en nota de fecha 25 de Julio del 2017, Por medio de la presente hago entrega de la información solicitada del mes de Junio y Julio del año en curso de los proyectos de construcción de los Registros Civiles Municipales de:

Cabañas, La Paz

Opatoro, La Paz

Chinacla, La Paz

Gualaco, Olancho.

Este Departamento queda en disposición de atender cualquier solicitud que se requiera.

Atentamente,

por: 
Ingeniero Oscar Olancho Hernández
Jefe del Dpto. de Obras Físicas



Cc: Archivo

PD. La firma puesta por corresponde a la Arquitecta Viana Romero, Subjefe del Dpto. de Obras Físicas, en virtud que el Ing. Hernández se encuentra momentáneamente fuera de la ciudad.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

Administración General: 2221-5519
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517



REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

No.	PROPIETARIO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Gualaco, = Olancho	La contruccion de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales y seguras y asi dar una mejor atención al ciudadano; con areas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
2	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Cabañas, La Paz	La contruccion de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales y seguras y asi dar una mejor atención al ciudadano; con areas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
3	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Opatoro, La Paz	La contruccion de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales y seguras y asi dar una mejor atención al ciudadano; con areas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal

4	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Chinacla, La Paz	La contruccion de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales y seguras y asi dar una mejor atención al ciudadano; con areas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal
---	-----------------------------------	---	-------------------------------	--	--

Ingeniero: Oscar Rolando Hernández
Jefe Depto. Obras Físicas



Arquitecta: Viana Romero
Sub. Jefa Depto. Obras Físicas





REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

	PROPIETARIO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COSTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE INICIO	ESTADO ACTUAL	COSTO FINALIZACIÓN
1	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Gualaco, Olancho	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales, seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP / Alcaldía Municipal	L.861,403.69	14/02/2017	3 meses	03/07/2017	40% de Ejecución	L. 861,403.69
2	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Cabañas, La Paz	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales, seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP / Alcaldía Municipal	L.808,400.00	14/02/2017	3 meses	19/07/2017	60% de Ejecución	L. 808,400.00

3	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Opatoro, La Paz	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales, seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP / Alcaldía Municipal	L.802,431.28	14/02/2017	3 meses	10/07/2017	30% de Ejecución	L. 802,431.28
4	Registro Nacional de las Personas	Construcción del Registro Civil Municipal	Municipio de Chinacla, La Paz	La construcción de oficina del RCM, cumpliendo con las necesidades del usuario ofreciendo instalaciones modernas, funcionales, seguras y así dar una mejor atención al ciudadano; con áreas adecuadas para la custodia de los libros registrales	El proyecto consiste en construir el edificio del Registro Civil Municipal, cuenta con área de espera, área de atención al cliente, área de registrador, área de archivos y medio baño para el público y el personal	RNP / Alcaldía Municipal	L.699,096.00	14/02/2017	3 meses	Pendiente	Adjudicado	L. 699,096.00




 Ing. Oscar Rolando Hernández

 Jefe Depto. de Obras Físicas



 PO:

 Arquitecto

 Sub. Jefa Depto. Obras Físicas




REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS


ACTIVIDADES DE PROYECTOS

			FINANCIACIÓN							IMPREVISTO EN CONSTRUCCIÓN			
N.	PROYECTOS	MONTO DEL CONTRATO	ALCALDÍA	RNP	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	% AVANCE OBRA	INFORME DE SUPERVISIONES	MOTIVO DE AUMENTO EN COSTOS	DURACIÓN DEL PROYECTO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	Restauración RCM San Pedro Sula, Cortés	L. 900,732.88	No Aplica	L. 900,732.88	RNP	RNP	Pendiente	0%	N/A	N / A	2 MESES	L. 900,732.88	Pendiente de nombrar comisión evaluadora
2	Remodelación RCM Nacaome, Valle	L. 859,080.60	No Aplica	L. 859,080.60	Alcaldía de Nacaome, Valle	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N/A	N / A	3 MESES	L. 859,080.60	Proceso firma de Convenio
3	Construcción RCM Aramecina, Valle	L. 802,481.72	No Aplica	L. 802,481.72	Alcaldía de Aramecina, Valle	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N/A	N / A	3 MESES	L. 802,481.72	Proceso firma de Convenio
4	Remodelación RCM San Fco. De Coray, Valle	L. 450,644.42	No Aplica	L. 450,644.42	Alcaldía de San Fco. De Coray, Valle	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N/A	N / A	3 MESES	L. 450,644.42	Proceso firma de Convenio

5	Construcción RCM Guayape, Olancho	L. 844,647.54	No Aplica	L. 844,647.54	Alcaldía de Guayape, Olancho	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 844,647.54	Proceso firma de Convenio
6	Construcción RCM Puerto Cortés, Cortés	L. 829,163.78	L.200,000.00 ENP	L. 629,163.78	Alcaldía de Puerto Cortés, Cortés	RNP / Alcaldía / ENP	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 629,163.78	Proceso firma de Convenio
7	Remodelación RCM Santa Cruz, Lempira	L. 99,071.23	No Aplica	L. 99,071.23	Alcaldía de Santa Cruz, Lempira	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 99,071.23	Proceso firma de Convenio
8	Remodelación RCM Concepción, Ocotepeque	L. 72,294.70	No Aplica	L. 72,294.70	Alcaldía de Concepción, Ocotepeque	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 72,294.70	Proceso firma de Convenio
9	Remodelación RCM Goascorán, Valle	L. 80,917.28	No Aplica	L. 80,917.28	Alcaldía de Goascorán, Valle	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 80,917.28	Proceso firma de Convenio
10	Construcción del RCM La Paz, La Paz	L. 1176,708.48	No Aplica	L. 1176,708.48	Alcaldía de La Paz, La Paz	RNP / Alcaldía	Pendiente	0%	N / A	N / A	3 MESES	L. 1176,708.48	Proceso firma de Convenio


Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe Depto. de Obras Públicas



Arquitecta: María Román
Sub. Jefa Depto. de Obras Públicas

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS


EJECUCIÓN DEL PROYECTO

			FINANCIACIÓN							IMPREVISTO EN CONSTRUCCI			
No.	PROYECTOS	MONTO DEL CONTRATO	ALCALDÍA	RNP	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	% AVANCE OBRA	INFORME DE SUPERVISIO	AUMENTO DE COSTOS %	DURACIÓN DEL PROYECTO	COSTO TOTAL	OBSERVACIONES
1	Construccion de RCM De Gualaco, Olancho	L. 861,403.69	L. 361,403.69	L. 500,000.00	Alcaldia, Gualaco, Olancho.	RNP / Alacaldia Municipal	Arq. Flavio Ribera	40%	1	7.67%	3 MESES	L. 861,403.69	El incremento de la obra será financiada por parte de la Alcaldía Municipal de Gualaco
2	Construcción del RCM de Cabañas, La Paz	L. 808,400.00	L. 408,400.00	L. 400,000.00	Alcaldia, Cabañas, La Paz	RNP / Alacaldia Municipal	Consuldi y Asociados S.A	60%	1	0%	3 MESES	L. 808,400.00	El incremento de la obra será financiada por parte de la Alcaldía Municipal de Cabañas
3	Construcción del RCM de Opatoro, La Paz	L. 802,431.28	L. 401,215.64	L. 401,215.54	Alcaldia, Opatoro, La Paz	RNP / Alacaldia Municipal	MK & P, Consultec Group.	30%	1	33.74%	3 MESES	L. 802,431.28	El incremento de la obra será financiada por la Alcaldía Municipal de Opatoro y el RNP

4	Construcción del RCM de Chinacla, La Paz	L. 700,000.00	L. 100,000.00	L. 600,000.00	Alcaldia, Chinacla, La Paz	RNP / Alcaldia Municipal	Adjudicación	Adjudicado	0	0%	3 MESES	L. 700,000.00	Proceso de transferencia por parte del RNP para el anticipo de obra
---	--	---------------	---------------	---------------	----------------------------	--------------------------	--------------	------------	---	----	---------	---------------	---


Ing. Oscar Rolando Hernández
Jefe Depto. de Obras Físicas




Arquitecta: Yiana Romero
Sub. Jefa Depto. de Obras Físicas



INFORME DE VIAJE

Para: Abogado Miguel Villeda Villela
Director

De: Viana Patricia Romero Márquez
Subjefe Obras Físicas

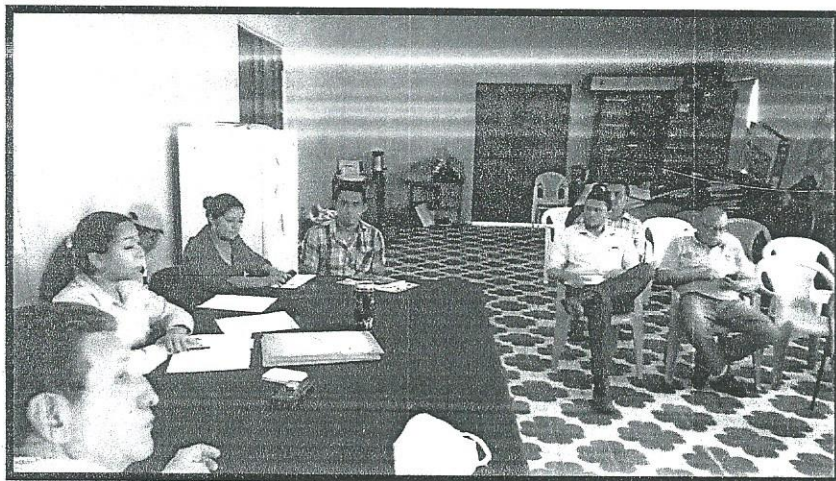
Asunto: Gira realizada el 03 de julio del 2017, al Municipio de Opatoro, La Paz, representando a la institución en el acto de orden de inicio de la construcción del Registro Civil Municipal en compañía del Señor Subdirector Administrativo el Lic. Carlos Romero. Motorista designado Hermes Molina Maldonado.

Se realizó la visita donde nos reunimos con la señora Alcaldesa Lic. Dunia Patricia Martínez y su grupo de trabajo; en el acto de apertura de ofertas en el cual concursaron tres empresas para la construcción del Registro Civil Municipal de dicho municipio entre ellas:

1. Asociación de constructores y supervisores de Honduras (ACOS-H)
2. CONSULTEC MK&P Consulting Group
3. Constructora y supervisora Díaz y Asociados (CONSULDI Y ASOCIADOS).

La adjudicación del proyecto fue a la empresa CONSULTEC MK&P Consulting Group con el Ing. Gustavo Martínez, como ofertante de menor precio. La obra se iniciará el día lunes 10 de Julio del año en curso.


Anexos:



Comisión evaluadora de ofertas, y ofertantes

Bulmar
04 JUL 2017

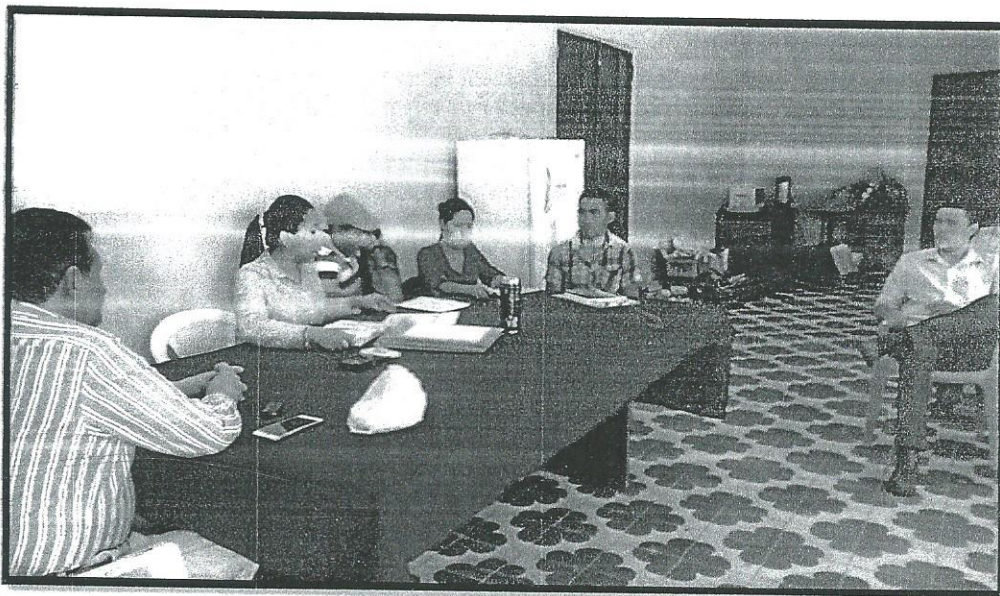1:07 PM



Comisión evaluadora de ofertas y personal del RNP

Tegucigalpa M.D.C., 04 de julio del 2017

Atentamente,


Viana Patricia Romero Marquez
Subjefe Obras Físicas



INFORME DE VIAJE

Para: **TDM Carlos Humberto Romero Andrade**
Sub Director Administrativo

De: **Arq. Viana Patricia Romero Márquez**
Subjefe Obras Físicas

Arq. Henry Samuel Coello Escobar
Asistente de Obras Físicas

Asunto: Gira realizada del 18 al 19 de julio del 2017, al municipio de Cabañas y al municipio de Opatoro Departamento de La Paz. Motorista designado Hermes Molina Maldonado.

Cabañas, La Paz: Se realizó la inspección de campo con el objetivo de revisar el avance de obra previo al pago de la estimación. Realizamos el levantamiento de paredes, medición de cajas de registro, verificación de cajas de tomas e interruptores, tubería de agua potable y residual en baños. El proyecto se encuentra en un 52% de ejecución de obra y cuenta con el material necesario para continuar con la ejecución.

Revisamos la bitácora; es un instrumento que cuenta las actividades diarias realizadas con sus debidas especificaciones, en la misma dejamos documentada la visita de supervisión. Revisamos detalladamente la primera estimación de obra en donde lo comparamos con el avance de obra ejecutado hasta el momento y se procedió a la firma del mismo en representación de la aprobación por parte del RNP, adjuntada al informe. La Ing. Fanny Galeano de la alcaldía municipal nos proporcionó copias la documentación previo a la construcción del RCM.

Opatoro, La Paz: Realizamos la supervisión en donde ya se culminó la actividad demolición del edificio antiguo existente en el terreno del RNP.

Se estaba realizando la actividad de trazado y marcado, demolición de firme para la ubicación de dados de concreto y solera inferior, en el plantel estaban armados los castillos, cuentan con cemento, arena, grava y varillas en la bodega.

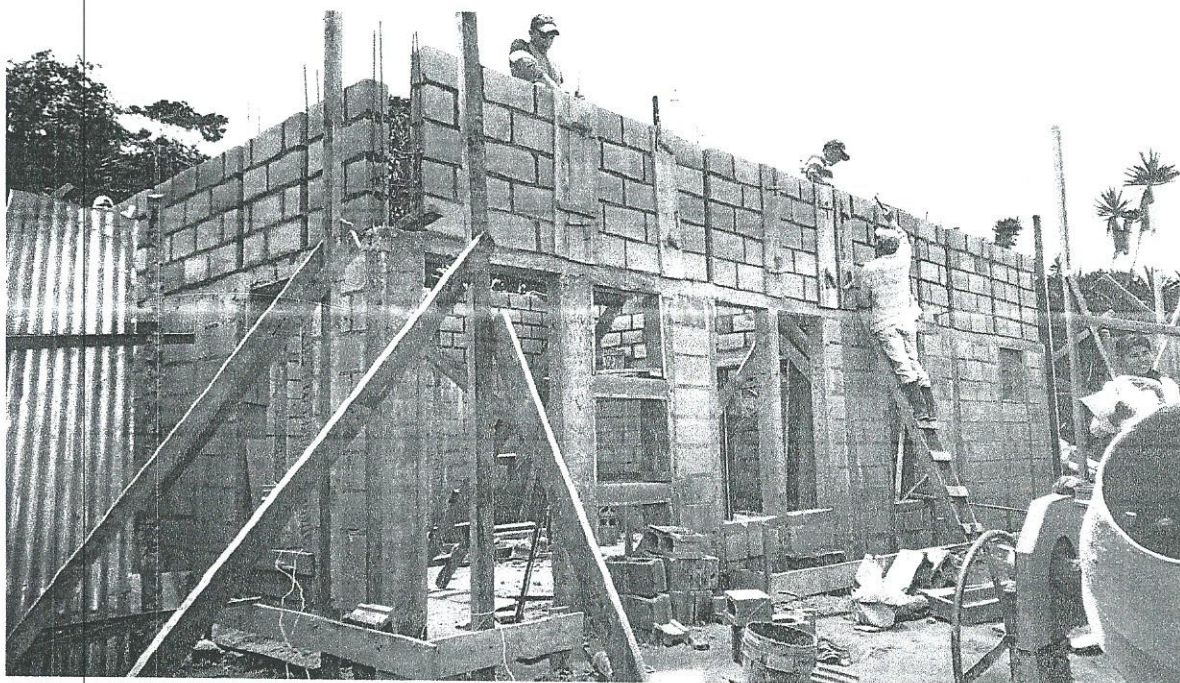
Observando detenidamente el firme existente en ausencia de las paredes, observamos que podría ser necesario la nivelación de este con concreto, el cual no está previsto en el presupuesto elaborado y entregado a la alcaldía, esto ocasionaría un costo adicional en el presupuesto aprobado de este proyecto; en la próxima visita se verificara si es necesario y cuanto seria el costo de esta actividad.

Wilmer López coordinador de proyectos de la alcaldía municipal nos proporcionó copias de la documentación previo a la construcción del RCM.



*R/ 454
20/07/20
2:15*

ANEXOS:

MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ



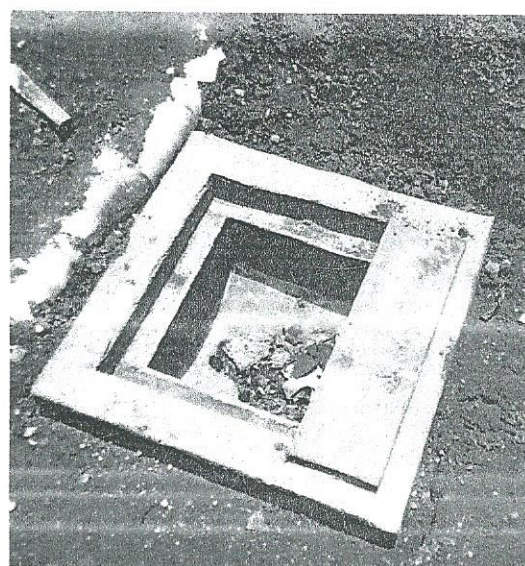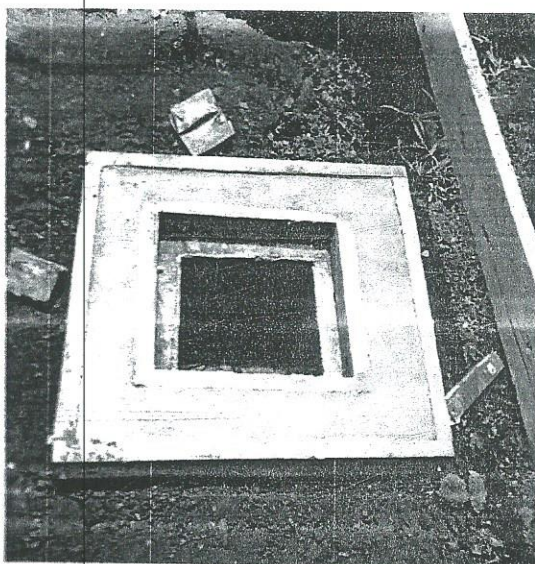Levantamiento de Paredes, Solera Intermedia, castillos, columnas y jambas fundidas




Cajas de Registro de aguas negras



Medición para aprobación de estimación de obra



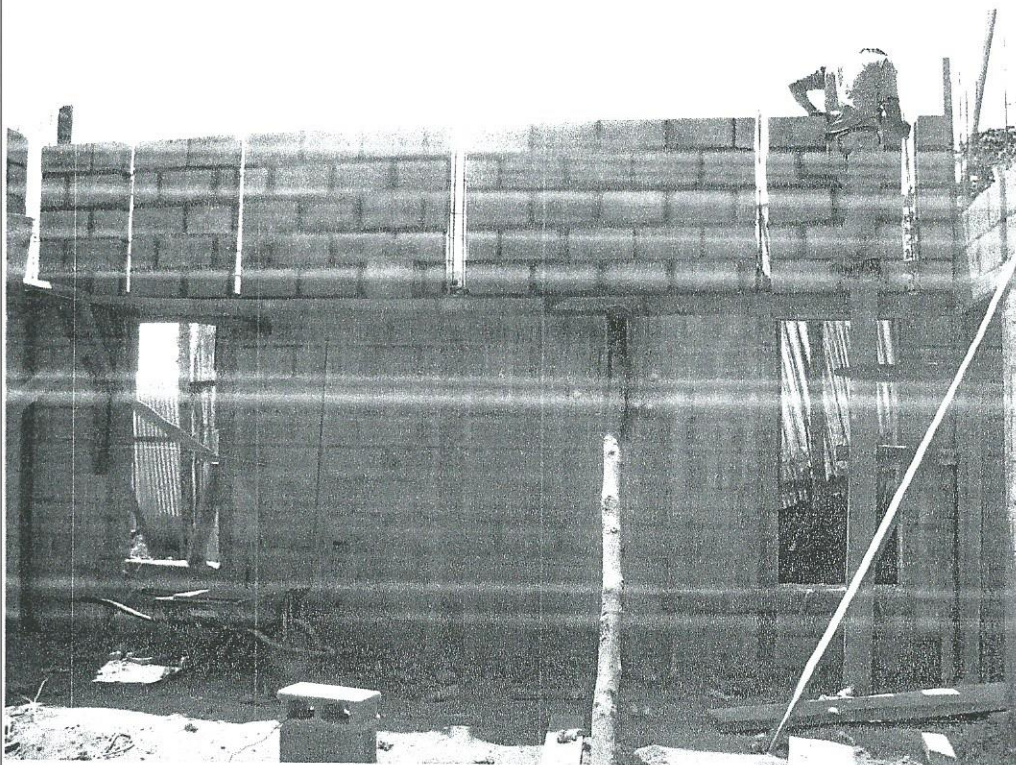Comprobación de ubicación de tomacorriente, según planos





Levamiento de pared sobre la solera intermedia



Supervisores de Obra RNP y Contratista

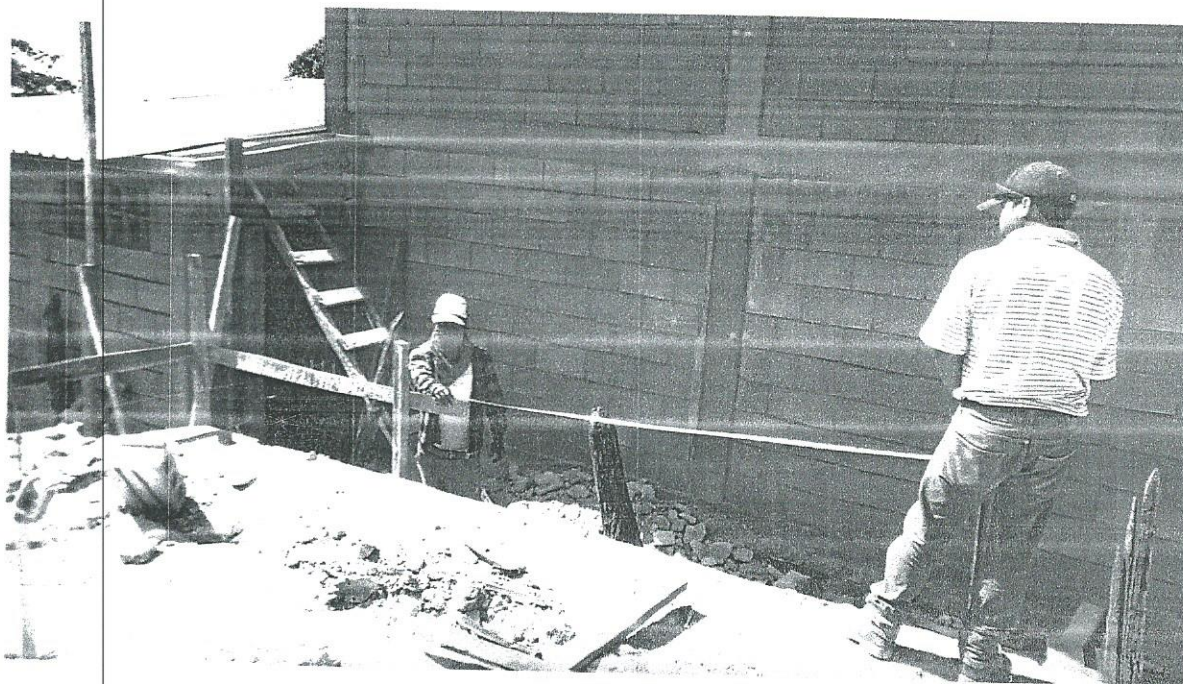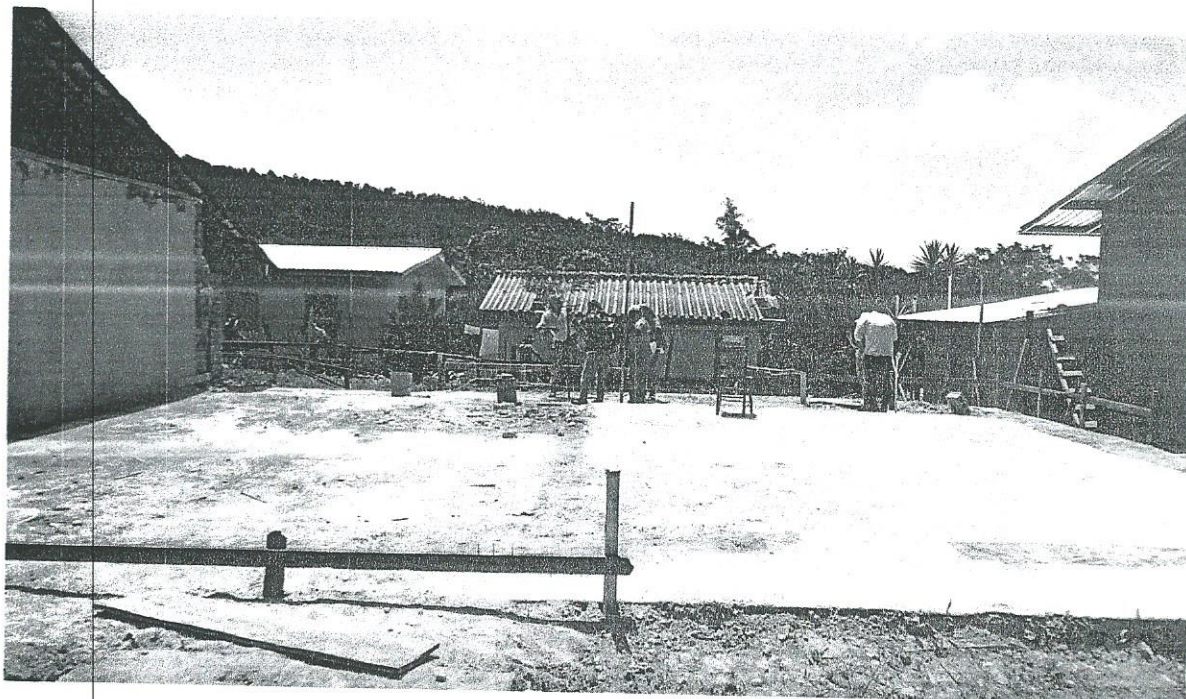MUNICIPIO DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ




Trazado y marcado de Ejes según planos



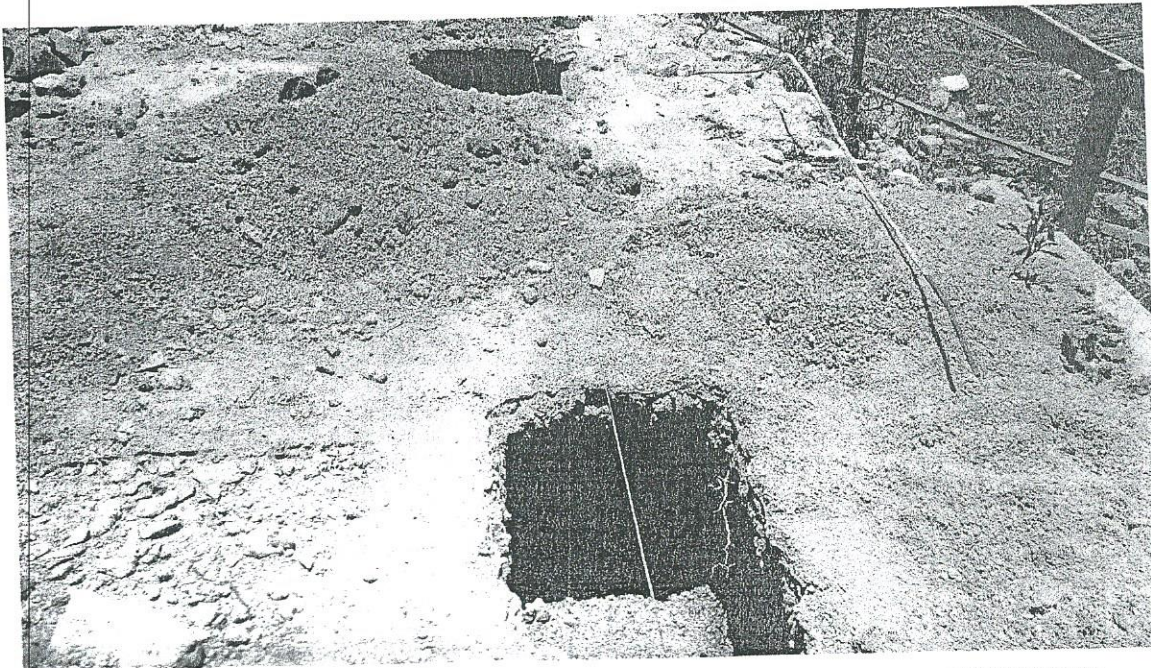Marcado de dados de concreto y solera inferior





Demolición de firme para ubicación de dados de concreto y solera inferior

Tegucigalpa M.D.C., 20 de julio del 2017

Atentamente,

Viana Patricia Romero Márquez
Subjefe Obras Físicas

Henry Samuel Coello Escobar
Asistente de Obras Físicas



GOBIERNO DE HONDURAS





















República de Honduras
Departamento de La Paz
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Teléfono: 2757-9456 E-mail: alcaldiaecabanass@hotmail.com



ESTIMACION

ESTIMACION AUTORIZADA NO.1													
Ejecutor Proyecto	CONSULDI Y ASOCIADOS S.A			Monto del proyecto		L 808,519.62		Total de Estimacion		L 229,818.58			
CONSTRUCCION DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL LPR-CABAÑAS-RNP 2017				Departamento		La Paz		19 JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2017					
MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ				Periodo									
Estimac.	No.1	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		TOTAL EJECUTADO			
No.		Unidad	Cantidad	Precio	Total	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	AVAN	
1	Preliminares												
1.1	Baño Provisional Portatil	mes	3.00	L350.00	L1,050.00	0.00	L 0.00	1.00	L 350.00	1.00	L 350.00	33	
1.2	Conexión Provisional de Energía eléctrica	GlB	1.00	L420.00	L420.00	0.00	L 0.00	1.00	L 420.00	1.00	L 420.00	100	
1.3	Cerco Perimetral Provisional	GlB	1.00	L10,000.00	L10,000.00	0.00	L 0.00	1.00	L 10,000.00	1.00	L 10,000.00	100	
1.4	Bodega de Almacenamiento	m2	25.00	L120.00	L3,000.00	0.00	L 0.00	25.00	L 3,000.00	25.00	L 3,000.00	100	
1.5	Limpieza General del Proyecto	GlB	1.00	L500.00	L500.00	0.00	L 0.00	1.00	L 500.00	1.00	L 500.00	100	
1.6	Trazado y Marcado del Terreno	m2	135.74	L13.00	L1,764.62	0.00	L 0.00	135.74	L 1,764.62	135.74	L 1,764.62	100	
Sub Total					L16,734.62		L 0.00		L 16,034.62		L 16,034.62	95	
2	Excavación												
2.1	Excavación de Elemento Estructural, Suelo tipo 1	m3	34.55	L125.00	L4,318.75	0.00	L 0.00	34.55	L 4,318.75	34.55	L 4,318.75	100	
Sub Total					L4,318.75		L 0.00		L 4,318.75		L 4,318.75	100	
3	Cimentación												
3.1	Muro de Mampostería	m3	14.95	L1,400.00	L20,930.00	0.00	L 0.00	0.00	L 0.00	0.00	L 0.00		
3.2	Sobre Cimiento, Bloque de 8" Reforzado	m2	31.07	L650.00	L20,195.50	0.00	L 0.00	31.07	L 20,195.50	31.07	L 20,195.50	100	
3.3	Zapata Corrida de 0.60mts x 0.20mts	ml	45.70	L670.00	L30,619.00	0.00	L 0.00	45.70	L 30,619.00	45.70	L 30,619.00	100	
3.4	Relleno y Compactado Con material Selecto	m3	21.78	L200.00	L4,356.00	0.00	L 0.00	0.00	L 0.00	0.00	L 0.00		
Sub Total					L76,100.50		L 0.00		L 50,814.50		L 50,814.50	6	
4	Estructura												
4.1	Solera Inferior	ml	45.70	L300.00	L13,710.00	0.00	L 0.00	45.70	L 13,710.00	45.70	L 13,710.00	100	
4.2	Solera Intermedia	ml	45.70	L500.00	L22,850.00	0.00	L 0.00	45.70	L 22,850.00	45.70	L 22,850.00	100	
4.3	Solera de Cierre de Corona	ml	45.70	L555.00	L25,363.50	0.00	L 0.00	0.00	L 0.00	0.00	L 0.00		
4.4	Bomba	ml	13.44	L175.00	L2,352.00	0.00	L 0.00	13.44	L 2,352.00	13.44	L 2,352.00	100	
4.5	Castillo Tipo 15x15cm ref, 4#3;#2@15cm, Fc=280Kg/cm2	ml	32.50	L270.00	L8,775.00	0.00	L 0.00	32.50	L 8,775.00	32.50	L 8,775.00	100	
FIRMA:  													
FIRMA:  													
FIRMA:  													
FIRMA:  													
FIRMA:  													
FIRMA:  													
FIRMA:  													
FIRMA:  													
FIRMA:  													
FIRMA:  													




GOBIERNO DE HONDURAS



República de Honduras
Departamento de La Paz
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Teléfono: 2757-9456 E-mail: alcaldiadecabanass@hotmail.com



Ejecutor		ESTIMACION AUTORIZADA NO.1									
Proyecto		Monto del proyecto		Departamento		Período		Total de Estimación		L. 229,818.58	
Estimac.		No.1		PRESUPUESTO		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		TOTAL EJECUTADO	
No.		Unidad		Cantidad		Precio		Total		CANTIDAD	
1		Preliminares		CANTIDAD		TOTAL		CANTIDAD		TOTAL	
4.6		Castillo Tipo 10x15cm, ref, 2#3;#2@15cm, Pc=280Kg/cm2		ml		63.00		L167.00		L10,521.00	
4.7		Castillo Tipo 25x15cm, ref, 4#3;#2@15cm, Pc=280Kg/cm2		ml		3.50		L350.00		L1,225.00	
4.8		Castillo Tipo 28x15cm, ref, 4#3;#2@15cm, Pc=280Kg/cm2		ml		7.00		L507.00		L3,549.00	
4.9		Castillo Tipo 46x15cm, ref, 6#3;#2@15cm, Pc=280Kg/cm2		ml		3.50		L510.00		L1,785.00	
4.1		Castillo Tipo 30x15cm, ref, 4#4;#2@15cm, Pc=280Kg/cm2		ml		10.50		L600.00		L6,300.00	
4.11		Castillo Tipo 54x15cm, ref, 6#3;#2@15cm, Pc=280Kg/cm2		ml		3.50		L595.00		L2,082.50	
		Sub Total						L98,513.00		L 0.00	
5		Paredes								L 69,256.73	
5.1		Pared de Tabla Yeso, Trata a dos Caras		m2		25.58		L500.00		L12,790.00	
5.2		Pared de Bloque de 6"		m2		153.89		L600.00		L92,334.00	
		Sub Total						L105,124.00		L 0.00	
6		Losas y Pisos								L 48,013.68	
6.1		Losas de Entrepiso e=0.07mts		m2		61.02		L580.00		L35,391.60	
6.2		Losas Estructural e=0.15mts		m2		5.00		L1,138.00		L5,690.00	
		Sub Total						L41,081.60		L 0.00	
7		Acabados								L 0.00	
7.1		Repello		m2		298.58		L130.00		L38,815.40	
7.2		Pulido		m2		298.58		L63.85		L19,064.33	
7.3		Tallado de Mochetas		ml		56.40		L72.00		L4,060.80	
7.4		Pegado de Cerámica de bajo Trafico		m2		61.02		L450.00		L27,459.00	
		Sócalo o Moldura		ml		57.92		L150.00		L8,688.00	
		Sub Total						L98,087.53		L 0.00	

CONSULTA Y ASOCIADOS S.R.L.
2017-12-31-07-15
FIRMA: [Firma]
CONTRATISTA
NOMBRE: CONSULTA Y ASOCIADOS S.R.L.
FECHA: 13 JULIO DEL 2017

SUPERVISOR DE PROYECTOS: En virtud doy fe que las cantidades de obra de la presente Estimación corresponden a las actividades ejecutadas de forma correcta.

FIRMA: [Firma]
INGENIERO CIVIL
26-01-17
SUP.PROYECTOS
NOMBRE: Tanny Galeano
FECHA: 26-01-17

FIRMA: [Firma]
ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE: [Nombre]
FECHA: [Fecha]

FIRMA: [Firma]
RNP
NOMBRE: Arg. V.
FECHA: 13/07/17





GOBIERNO DE HONDURAS



República de Honduras
Departamento de La Paz
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Teléfono: 2757-9456 E-mail: alcaldiadecabanass@hotmail.com



ESTIMACION AUTORIZADA NO.1												
Ejecutor	CONSULDI Y ASOCIADOS S.A				Monto del proyecto		L. 808,519.62		Total de Estimacion		L. 229,818.58	
Proyecto	CONSTRUCCION DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL LPR-CABAÑAS-RNP 2017 MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ				Departamento		La Paz					
19 JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2017												
Estimac.	No.1	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		TOTAL EJECUTADO		
No.		Unidad	Cantidad	Precio	Total	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
8	Cubierta o Techo											
8.1	Techo de Lámina de aluzinc cal.26, sobre canaleta de 2"x4", Estructura met. Pintada con anticorrosivo	m2	78.54	L580.00	L45,553.20	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
8.2	Estructura de Techo: Tijera con Canaleta de 2x6" Pintada con anticorrosivo	ml	9.00	L5,400.00	L48,600.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
8.3	Aislante Térmico	m2	51.67	L195.00	L10,075.65	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
8.4	Cumbrera de Aluzinc Cal. 26	ml	10.00	L195.00	L1,950.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
Sub Total					L106,178.85		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00	
9	Cielo Falso											
9.1	Cielo Falso de Fibra Mineral con Paneles de 2"x4"	m2	56.87	L255.00	L14,501.85	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
Sub Total					L14,501.85		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00	
10	Puertas											
10.1	P-1, 1.00x2.10m, Metálica 2.10x1.00m, incluye herrajes acceso principal	und	1.00	L3,800.00	L3,800.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
10.2	P-1, 1.00x2.10m, Metálica 2.10x1.00m, incluye accesorios	und	2.00	L4,200.00	L8,400.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
10.3	P-2, Puerta termo formada (baño) de 2.10x0.80, incluye accesorio	und	2.00	L1,600.00	L3,200.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
10.4	Balconería	U	9.00	L1,000.00	L9,000.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
10.5	Suministro en Instalación de archivos	U	3.00	L4,500.00	L13,500.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
Sub Total					L37,900.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00	
11	Ventanas											
11.1	V1, Ventana de Celocia 0.70x1.6m	und	5.00	L1,200.00	L6,000.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
11.2	V2, Ventana de Celocia 0.70x0.60m	und	7.00	L1,150.00	L8,050.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	
Sub Total					L14,050.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00	

FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
CONTRATORISTA		SUP.PROYECTOS		ALCALDE MUNICIPAL		RNP	
NOMBRE: CONSULDI		NOMBRE: Tanny GARCIA		NOMBRE:		NOMBRE:	
FECHA: 13 JULIO DEL 2017		FECHA:		FECHA:		FECHA: 13/07/17	

SUPERVISOR DE PROYECTOS: En virtud doy fe que las cantidades de obra de la presente Estimacion corresponden a las actividades ejecutadas de forma correcta.

INGENIERO CIVIL
30-01-17
C.I.C.H., No. 7455

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERMISOS DE OBRAS FISICAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
HONDURAS



GOBIERNO DE HONDURAS



República de Honduras
Departamento de La Paz
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Teléfono: 2757-9456 E-mail: alcaldiadecabanas@hotmail.com



ESTIMACION AUTORIZADA NO.1


Ejecutor	CONSULDI Y ASOCIADOS S.A		Monto del proyecto		L. 808,519.62		Total de Estimacion		L. 229,818.58			
Proyecto	CONSTRUCCION DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL LPR-CABAÑAS-RNP 2017		Departamento		La Paz		19 JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2017					
MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ			Periodo									
Estimac.	No.1	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		TOTAL EJECUTADO		
No.		Unidad	Cantidad	Precio	Total	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	AVANCE
12	Instalaciones Hidrosanitarias											
12.1	Suministro en Instalación de Tuberia de 4" SDR 41, Aterrada	ml	21.28	L55.00	L1,170.40	0.00	L. 0.00	14.04	L. 772.46	14.04	L. 772.46	66
12.2	Suministro en Instalación de Tuberia de 2" SDR 26, Aterrada	ml	8.34	L30.00	L250.20	0.00	L. 0.00	8.34	L. 250.20	8.34	L. 250.20	100
12.3	Suministro en Instalación de Tuberia de 1/2" SDR 13.5, Aterrada	ml	38.78	L12.00	L465.36	0.00	L. 0.00	38.78	L. 465.36	38.78	L. 465.36	100
12.4	Suministro en Instalación de Tuberia de 2" SDR 26, en Pared	ml	2.00	L40.00	L80.00	0.00	L. 0.00	2.00	L. 80.00	2.00	L. 80.00	100
12.5	Suministro en Instalación de Tuberia de 1/2" SDR 13.5, en Pared	ml	6.80	L12.00	L81.60	0.00	L. 0.00	6.80	L. 81.60	6.80	L. 81.60	100
12.6	Suministro en Instalación de Ventilás de 2" SDR 26	ml	5.00	L150.00	L750.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
12.7	Canal Captador de Aguas Lluvia 3"	ml	20.40	L250.00	L5,100.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
12.8	Bajantes de Agua Lluvias 3"	ml	18.00	L138.00	L2,484.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
12.9	Suministro e Instalaciones de Lavamanos	und	2.00	L1,900.00	L3,800.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
12.1	Suministro e Instalaciones de Inodoro	und	2.00	L3,450.00	L6,900.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
12.11	Suministro e Instalaciones de Tanque de Almacenamiento	Glb	1.00	L10,000.00	L10,000.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
12.12	Caja de Inspección de Aguas Negras 0.60x0.60 mts	und	4.00	L1,390.00	L5,560.00	0.00	L. 0.00	4.00	L. 5,560.00	4.00	L. 5,560.00	100
12.13	Caja de Registro de Agua Potable 0.55mts x 0.40mts	und	1.00	L1,200.00	L1,200.00	0.00	L. 0.00	1.00	L. 1,200.00	1.00	L. 1,200.00	100
12.14	Pileta de Aseo 0.50mts x 0.50mts	und	1.00	L2,800.00	L2,800.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
12.15	Valvula de Registro o Medidor de Agua Potable	Glb	1.00	L2,500.00	L2,500.00	0.00	L. 0.00	1.00	L. 2,500.00	1.00	L. 2,500.00	100
Sub Total					L43,141.56		L. 0.00		L. 10,909.62		L. 10,909.62	25
13	Instalaciones Eléctricas											
13.1	Suministro e Instalaciones Lámpara Fluorescente 60w	und	5.00	L850.00	L4,250.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
13.2	Suministro e Instalaciones Iluminación Incandescente 110v, 60w	und	2.00	L750.00	L1,500.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
13.3	Suministro e Instalaciones de Interruptor Sencillo 110v, 15amp	und	3.00	L190.00	L570.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
13.4	Suministro e Instalaciones de Interruptor Doble 110v, 15amp	und	1.00	L200.00	L200.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
13.5	Suministro e Instalaciones de Tomacorrientes Dobles 120v, 15amp	und	9.00	L350.00	L3,150.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0
SUPERVISOR DE PROYECTOS : En virtud doy fe que las cantidades de obra de la presente Estimación corresponden a las actividades ejecutadas de forma correcta.												
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		
CONTRATISTA		SUP. PROYECTOS		ALCALDE MUNICIPAL		RNP		RNP		RNP		
NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		NOMBRE:		
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:		



GOBIERNO DE HONDURAS



República de Honduras
Departamento de La Paz
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Teléfono: 2757-9456 E-mail: alcaldiadecabanah@hotmail.com

ESTIMACION AUTORIZADA NO.1

Ejecutor	CONSULDI Y ASOCIADOS S.A.				Monto del proyecto	L. 808,519.62		Total de Estimacion	L. 229,818.58		
Proyecto	CONSTRUCCION DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL LPR-CABAÑAS-RNP 2017 MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE LA PAZ				Departamento	La Paz		19 JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2017			
Estimac.	No.1	PRESUPUESTO				ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		TOTAL EJECUTADO	
No.		Unidad	Cantidad	Precio	Total	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
12	Instalaciones Hidrosanitarias										
13.6	Suministro e Instalaciones Salida de Aire Acondicionado	und	1.00	L250.00	L250.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
13.7	Suministro e Instalaciones Salida Telefónica	und	1.00	L400.00	L400.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
13.8	Canalización de Salida Conexión Internet UTP	und	4.00	L500.00	L2,000.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
13.9	Suministro e Instalación de Contador	und	1.00	L1,200.00	L1,200.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
13.10	Centro de Carga de 6 Espacios	Gib	1.00	L1,800.00	L1,800.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
13.11	Salida de Aire Acometida	und	1.00	L650.00	L650.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
	Sub Total				L15,970.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
14	Pintura										
14.1	Pintura Acrilica Interiores	m2	195.85	L49.00	L9,596.65	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
14.2	Pintura Aceite Exteriores	m2	153.89	L50.00	L7,694.50	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
	Sub Total				L17,291.15		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
15	Exteriores										
15.1	Acera de Concreto	m2	21.84	L450.00	L9,828.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
	Sub Total				L9,828.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
16	Otros										
16.1	Escalera de Peldaño #5 @ 0.20mts	ml	3.00	L550.00	L1,650.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
16.2	Salida Eléctrica de Aire Acondicionado con Cable 2x10+1x12T THHN en PVC 1/2" CED.40, incluye seccionador Monofásico para interperie de 40A, 2P, 240v	m3	1.00	L850.00	L850.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00
	Sub Total				L2,500.00		L. 0.00		L. 0.00		L. 0.00
Costos del Proyecto											
Costos Directos del Proyecto					L701,321.41		L0.00		L199,347.90		L199,347.90
Costo Indirecto de Oficina 5%					L35,066.07				L. 9,967.40		L. 9,967.40
Costo Indirecto de Campo					L2,000.00				L. 568.49		L. 568.49
Utilidad 10%					L70,132.14				L. 19,934.79		L. 19,934.79
TOTAL					L808,519.62				L229,818.58		L229,818.58
ESTIMADO TOTAL DE ESTE PERIODO					L. 229,818.58						
MONTO A PAGAR PRIMERA ESTIMACION					L. 229,818.58						

FIRMA:	SUPERVISOR DE PROYECTOS: En virtud de que las cantidades de obra de la presente estimación corresponden a las actividades ejecutadas de forma correcta		FIRMA:	ALCALDE MUNICIPAL	
CONTRATISTA	SUP.PROYECTOS		NOMBRE:		FECHA:
NOMBRE:	NOMBRE: Fanyu		NOMBRE:		FECHA:
FECHA:	FECHA: 17 JUNIO DEL 2017		FECHA:		FECHA:

INFORME DE VIAJE

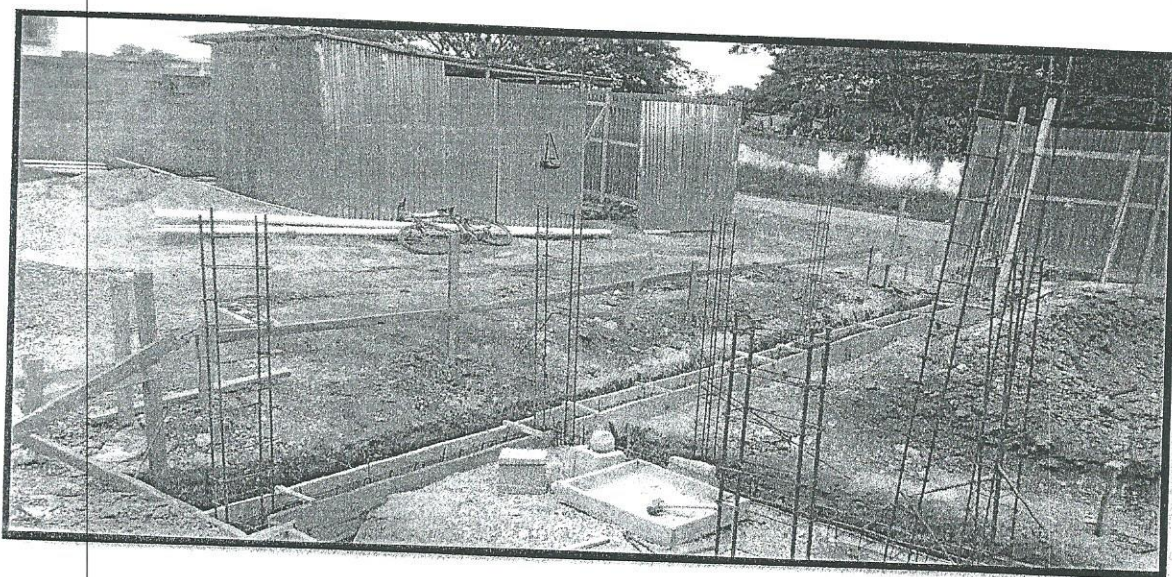
Para: **TDM Carlos Humberto Romero**
Sub-Director Administrativo

De: **Arq. Henry Samuel Coello Escobar**
Asistente Obras Físicas


Asunto: Gira realizada el 17 de julio del 2017, al Municipio de Gualaco, Departamento de Olancho, Motorista designado Hermes Molina Maldonado.

- Se realizó la visita a la construcción, el avance de obra se encuentra en fundición de solera inferior, se revisó si la profundidad de cimentación era la correcta, la fundición de zapata tiene las dimensiones requeridas, ubicación de castillos, sobre cimiento de bloque de 8", armado de solera inferior y jambas, cuenta con material suficiente para que la construcción continúe.
- se revisó detalladamente la bitácora (este es un instrumento que cuenta las actividades diarias realizadas con sus debidas especificaciones), de igual forma se documenta la visita realizada por parte de la supervisión.
- se revisó el informe de la primera Estimación comparando con el avance de obra, y se procedió a la firma de la misma, adjuntada al informe

Anexos:




R/ Escobar
21/07/2017
9:50.

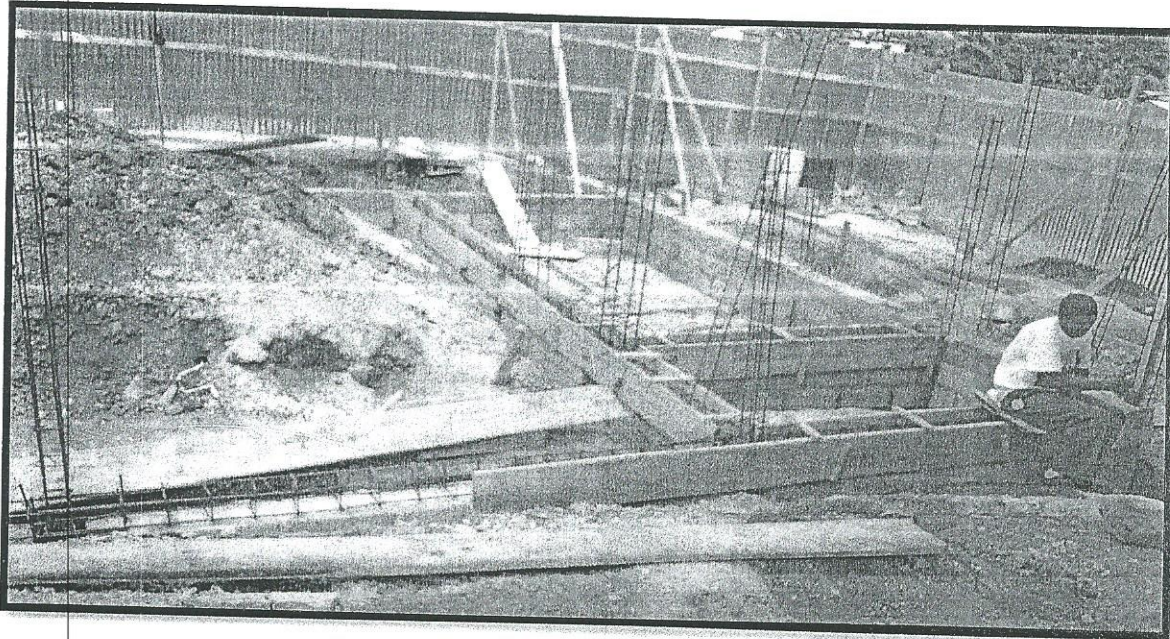


Encofrado de Solera Inferior



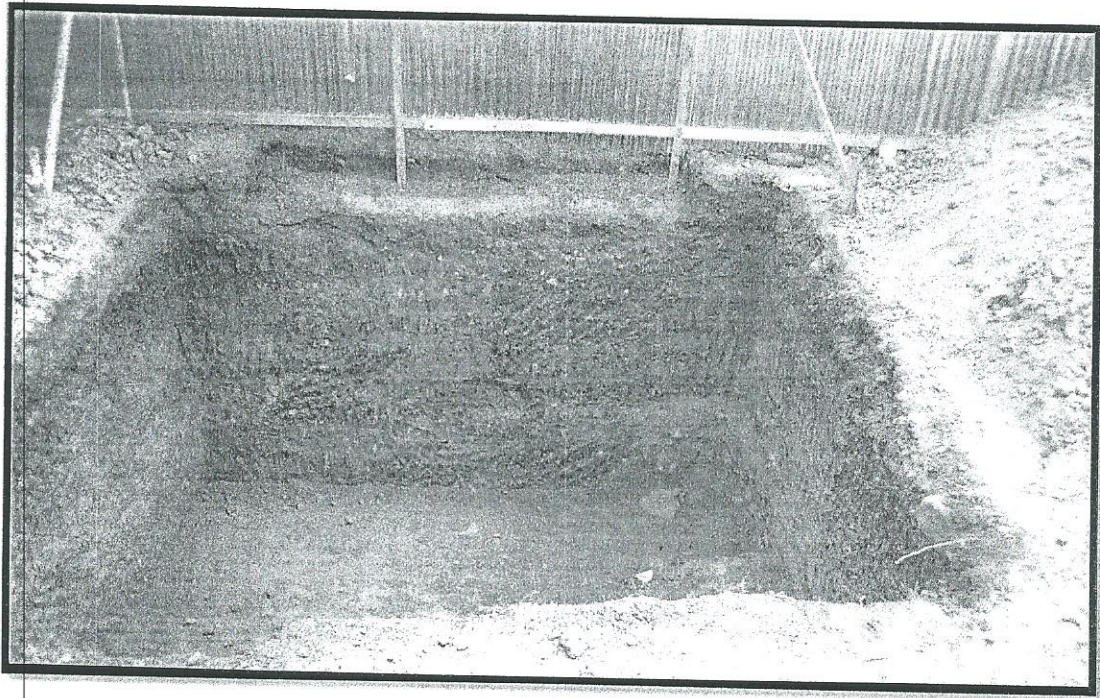Fundición de Solera Inferior



Excavación Fosa Séptica

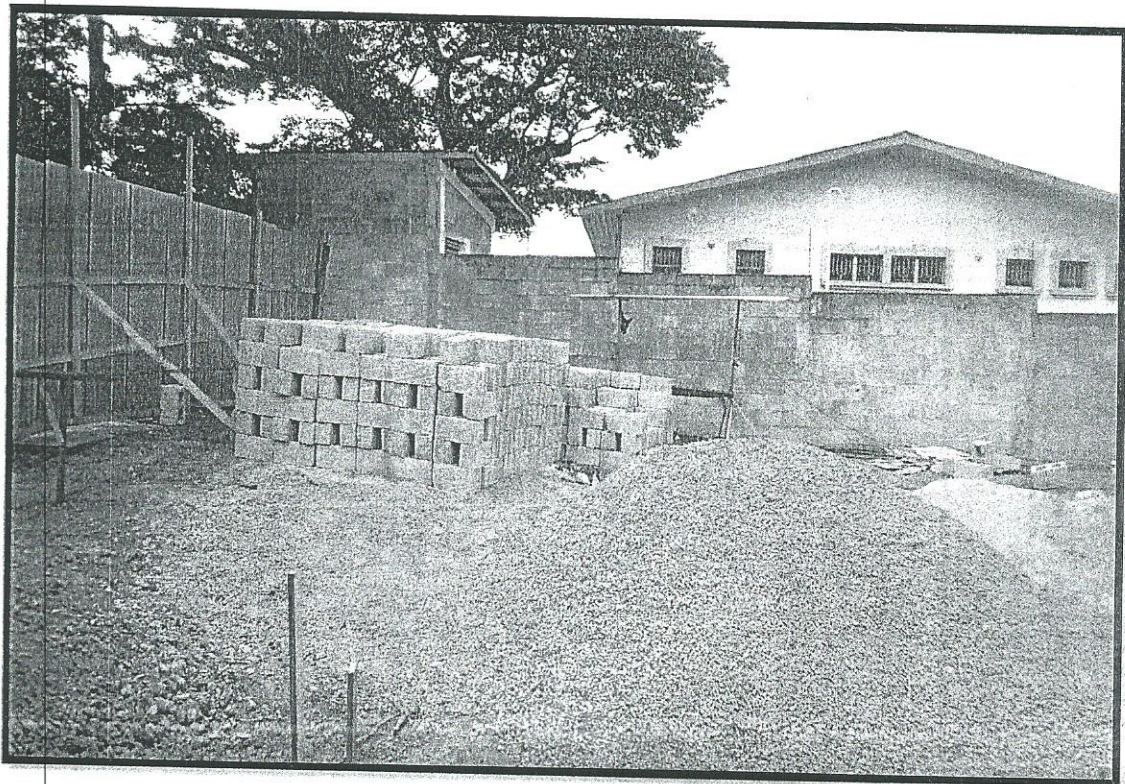

Materiales existentes

Tegucigalpa M.D.C., 21 de julio del 2017

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HSC', written over a horizontal line.

Henry Samuel Coello Escobar

Asistente de Obras Físicas



Gualaco, Olanchito, Honduras C. A.

ESTIMACIÓN No. 1

No.	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	CANT. TOTAL	PREC. UNIT.	PRECIO CONTRAT.	EJEC. ANTERIOR. CANT.	EJEC. ANTERIOR. MONT.	EJEC. ACTUAL CANT.	EJEC. ACTUAL MONTO	ACUMULADO CANT.	ACUMULADO MONTO	%
PRELIMINARES												
1	BAÑO PROVISIONAL PORTATIL	MES	3.00		31,449.32	0.00	-	3.00	31,449.32			
2	CONEXIÓN PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	GLO	1.00	10,483.11	4,205.72	0.00	-	1.00	4,205.72			
3	CERCO PERIMETRAL PROVISIONAL	GLO	1.00	4,205.72	20,775.22	0.00	-	1.00	20,775.22			
4	BODEGA DE ALMACENAMIENTO	M2	25.00	25.00	7,862.33	0.00	-	25.00	7,862.33			
5	LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO	GLO	1.00	3,291.11	3,291.11	0.00	-	0.00	-			
6	TRAZADO Y MARCADO DEL TERRENO	M2	168.75	36.60	6,176.23	0.00	-	168.75	6,176.23			
SUB TOTAL PRELIMINARES												
73,159.93												
EXCAVACION												
7	EXCAVACION DE ELEMENTO ESTRUCTURAL, SUELO TIPO I	M3	35.91	160.49	5,763.04	0.00	-	35.91	5,763.04			
SUB TOTAL EXCAVACION												
5,763.04												
CIMENTACION												
8	SOBRE CIMIENTO BLOQUE DE 8" REFORZADO	M2	32.20	688.76	22,178.20	0.00	-	32.20	22,178.20			
9	ZAPATA CORRIDA DE 0.60X0.20 MT	ML	45.70	483.08	22,076.94	0.00	-	45.70	22,076.94			
10	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	20.78	131.30	2,728.35	0.00	-	0.00	-			
SUB TOTAL CIMENTACION												
46,983.48												
ESTRUCTURA												
11	SOLERA INFERIOR 0.20X0.20 M. 4#3. #2@0.15 M	ML	45.70	344.51	15,744.31	0.00	-	11.43	3,936.08	11.43	3,936.08	25.00
12	SOLERA INTERMEDIA 0.10X0.15 M. 4#3. #2@0.15	ML	45.70	226.33	10,343.21	0.00	-	11.43	2,585.80	11.43	2,585.80	25.00
13	SOLERA DE CIERRE O CORONA	ML	45.70	247.29	11,301.36	0.00	-	11.43	2,825.34	11.43	2,825.34	25.00
14	JAMBA	ML	19.37	172.66	3,344.37	0.00	-	4.84	836.09	4.84	836.09	25.00
15	CASTILLO TIPO 1, 0.15X0.15 M. REF. 4#3. #2@0.15 M	ML	48.00	246.33	11,823.67	0.00	-	12.00	2,955.92	12.00	2,955.92	25.00
16	CASTILLO TIPO 2, 0.10X0.15 M. REF. 2#3. #2@0.15 M	ML	56.00	183.14	10,255.87	0.00	-	14.00	2,563.97	14.00	2,563.97	25.00
17	CASTILLO TIPO 3, 0.28X0.15 M. REF. 6#3. #2@0.15 M	ML	4.00	453.28	1,813.11	0.00	-	1.00	453.28	1.00	453.28	25.00
18	CASTILLO TIPO 4, 0.30X0.15 M. REF. 4#4. #2@0.15 M	ML	16.00	463.98	7,423.69	0.00	-	4.00	1,855.92	4.00	1,855.92	25.00
19	CASTILLO TIPO 5, 0.38X0.15 M. REF. 4#4. #2@0.15 M	ML	4.00	532.53	2,130.14	0.00	-	1.00	532.53	1.00	532.53	25.00
SUB TOTAL ESTRUCTURA												
74,179.74												
PAREDES												
20	PARED DE TABLA YESO, TRATA A DOS CARAS	M2	32.05	410.94	13,170.56	0.00	-	0.00	-	0.00	-	
21	PARED DE BLOQUE DE 6"	M2	184.20	371.67	68,480.71	0.00	-	30.70	11,410.12	30.70	11,410.12	16.67
SUB TOTAL PAREDES												
81,631.27												



MUNICIPALIDAD DE GUALACO

Gualaco, Olanchito, Honduras C. A.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO MUNICIPAL
PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALACO
UBICACIÓN: BARRIO EL KINDER, GUALACO, OLANCHO
PERIODO: DEL 4 DE JULIO AL 14 DE JULIO DEL 2017

ESTIMACIÓN No. 1

No.	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	CANT. TOTAL	PREC. UNIT.	PRECIO CONTRAT.	EJEC. ANTERIOR. MONT.	EJEC. ACTUAL MONTO	CANT.	ACUMULADO MONTO	%
LOSAS Y PISOS										
22	LOSA DE ENTRE PISO e=0.07 M	M2	66.75	L	404.89	L	27,026.28	0.00	L	0.00
23	LOSA ESTRUCTURAL. e=0.15 M	M2	5.00	L	1,308.07	L	6,540.36	0.00	L	0.00
SUB TOTAL LOSAS Y PISOS					L	33,566.65	L	0.00	L	0.00
ACABADOS										
24	REPELLO	M2	355.49	L	96.89	L	34,442.93	0.00	L	0.00
25	PULIDO	M2	355.49	L	61.36	L	21,812.19	0.00	L	0.00
26	TALLADO DE MOCHETAS	ML	39.60	L	54.99	L	2,177.49	0.00	L	0.00
27	PEGADO DE CERAMICA DE BAJO TRAFICO	M2	66.75	L	425.60	L	28,409.05	0.00	L	0.00
28	ZOCALO O MOLDURA	ML	108.80	L	74.53	L	8,108.69	0.00	L	0.00
SUB TOTAL ACABADOS					L	94,950.36	L	0.00	L	0.00
CUBIERTA O TECHOS										
29	TECHO DE LAMINA DE ALUZNIC CAL 26 SOBRE CANALETA DE 2"x4"	M2	82.00	L	560.18	L	45,934.93	0.00	L	0.00
30	ESTRUCTURA METALICA PINTADA ANTICORROSIVO CON ANTICORROSIVO	ML	10.85	L	608.02	L	6,597.02	0.00	L	0.00
31	ASLANTE TERMICO	M2	82.00	L	104.83	L	8,596.15	0.00	L	0.00
32	CUMBRERA DE ALUZNIC CAL 26	ML	7.53	L	262.08	L	1,973.45	0.00	L	0.00
SUB TOTAL CUBIERTA O TECHOS					L	63,101.54	L	0.00	L	0.00
CIELO FALSO										
33	CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL CON PANELES 4'X2'	M2	66.75	L	366.91	L	24,491.16	0.00	L	0.00
SUB TOTAL CIELO FALSO					L	24,491.16	L	0.00	L	0.00
PUERTAS										
34	P-1. 1.00X2.10 M. METALICA 2.10X1.00 M. INCLUYE HERRAJES	UNI	1.00	L	4,157.50	L	4,157.50	0.00	L	0.00
35	P-2. PUERTA TERMO FORMADA (BAÑO) DE 0.80X2.10 M, CUBIERTA CON PINTURA ESMALTADA	UNI	2.00	L	2,918.19	L	5,836.37	0.00	L	0.00
36	P-3. PUERTA TERMO FORMADA DE 1.00X2.10 M, CUBIERTA CON PINTURA ESMALTADA	UNI	2.00	L	2,918.19	L	5,836.37	0.00	L	0.00
37	BALCONERIA	M2	5.00	L	490.41	L	2,452.07	0.00	L	0.00
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVOS	UNI	3.00	L	2,620.78	L	7,862.33	0.00	L	0.00
SUB TOTAL PUERTAS					L	26,144.65	L	0.00	L	0.00



MUNICIPALIDAD DE GUALACO

Gualaco, Olanchó; Honduras C. A.

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO MUNICIPAL

PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALACO

UBICACIÓN: BARRIO EL KINDER, GUALACO, OLANCHO

PERIODO: DEL 4 DE JULIO AL 14 DE JULIO DEL 2017

ESTIMACIÓN No. 1

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	Unidad	CANT. TOTAL	PREC. UNIT.	PRECIO CONTRAT.	EJEC. ANTERIOR.		EJECT. ACTUAL		ACUMULADO		
						CANT.	MONTO.	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	%
VENTANAS												
39	V-1. VENTANAS DE CELOSIA 0.80X1.60 M	UNI	2.00	L 1.610.21	L 3.220.41	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
40	V-2. VENTANAS DE CELOSIA 0.70X0.40 M	UNI	4.00	L 1.048.31	L 4.193.24	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
41	V-3. VENTANAS DE CELOSIA 0.70X0.60 M	UNI	2.00	L 1.153.14	L 2.306.28	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
SUB TOTAL VENTANAS					L 9,719.94		L -		L -		L -	0.00
INSTALACIONES HIDROSANITARIOS												
42	SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" SDR-41 ATERRADA	ML	17.24	L 126.74	L 2,185.08	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
43	SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" SDR-26 ATERRADA	ML	6.80	L 63.95	L 434.84	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
44	SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" SDR-13.5 ATERRAD	ML	29.50	L 43.45	L 1,281.66	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
45	SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" SDR-26 EN PARED	ML	3.00	L 63.95	L 191.84	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
46	SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" SDR-13.5 EN PARED	ML	3.40	L 43.45	L 147.72	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
47	SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2" SDR-26 VENTILAS	ML	6.20	L 63.95	L 396.47	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
48	CANAL CAPTOR DE AGUAS LLUVIAS 3"	ML	13.00	L 314.49	L 4,088.41	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
49	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	20.00	L 96.90	L 1,937.97	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
50	SUMINSITRO E INSTALACION DE LAVAMANOS	UNI	2.00	L 2,709.22	L 5,418.44	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
51	SUMINSITRO E INSTALACION DE INODORO	UNI	2.00	L 2,971.60	L 5,943.20	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
52	SUMINSITRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	GLO	1.00	L 5,241.55	L 5,241.55	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
53	CAJA DE INSPECCION DE AGUAS NEGRAS 0.60X0.60 M	UNI	1.00	L 1,535.03	L 1,535.03	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
54	CAJA DE REGISTRO DE AGUA POTABLE 0.55X0.40 M	UNI	1.00	L 1,325.37	L 1,325.37	0.00	L -	1.00	L 1,325.37	1.00	L 1,325.37	100.00
55	PILETA DE ASEO 0.50X0.50 M	UNI	1.00	L 2,096.62	L 2,096.62	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
56	FOSA SEPTICA	GLO	1.00	L 33,672.70	L 33,672.70	0.00	L -	0.20	L 6,734.54	0.20	L 6,734.54	20.00
57	VALVULA DE REGISTRO O MEDIDOR DE AGUA POTABLE	GLO	1.00	L 1,048.31	L 1,048.31	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
SUB TOTAL INSTALACIONES IDROSANITARIAS					L 66,945.22		L -		L 8,059.91		L 8,059.91	12.04
INSTALACIONES ELECTRICAS												
58	SUMINSITRO E INSTALACION LAMPARA FLUORESCENTE 60W	UNI	5.00	L 1,335.84	L 6,679.22	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
59	SUMINSITRO E INSTALACION ILUMINACION INCANDESCENTE 100V, 60 W	UNI	2.00	L 711.60	L 1,423.20	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
60	SUMINSITRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO 110 V, 15 A	UNI	3.00	L 499.72	L 1,499.16	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
61	SUMINSITRO E INSTALACION INTERRUPTOR DOBLE 110 V, 15 AMP	UNI	1.00	L 667.45	L 667.45	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
62	SUMINSITRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE 120V, 15 AMP	UNI	9.00	L 632.85	L 5,695.69	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
63	SUMINSITRO E INSTALACION SALIDA AIRE ACONDICIONADO	UNI	1.00	L 245.78	L 245.78	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
64	SUMINSITRO E INSTALACION SALIDA TELEFONICA	UNI	1.00	L 1,048.31	L 1,048.31	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
65	SUMINSITRO E INSTALACION CONEXIÓN INTERNET UTP	UNI	4.00	L 1,572.47	L 6,289.86	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
66	SUMINSITRO E INSTALACION DE CONTADOR	UNI	1.00	L 2,644.26	L 2,644.26	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
67	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	GLO	1.00	L 1,804.79	L 1,804.79	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
68	SALIDA DE AIRE ACOMETIDA	UNI	1.00	L 1,571.42	L 1,571.42	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
SUB TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					L 29,569.14		L -		L -		L -	0.00
PINTURA												
69	PINTURA ACRILICA INTERIORES	M2	235.38	L 86.70	L 20,406.29	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
70	PINTURA ACEITE EXTERIORES	M2	184.20	L 97.18	L 17,900.22	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00
SUB TOTAL PINTURA					L 38,306.52		L -		L -		L -	0.00



MUNICIPALIDAD DE GUALACO

Gualaco, Olanchito, Honduras C. A.


PROYECTO: CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO MUNICIPAL
PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALACO
UBICACION: BARRIO EL KINDER, GUALACO, OLANCHITO
PERIODO: DEL 4 DE JULIO AL 14 DE JULIO DEL 2017

ESTIMACIÓN No. 1

No.	DESCRIPCION ACTIVIDADES	Unidad	CANT.		PREC.	PRECIO	EJEC. ANTERIOR.	EJECT. ACTUAL	CANT.	ACUMULADO	
			TOTAL	UNIT.		CONTRAT.	CANT.	MONT.	CANT.	MONT.	%
71	EXTERIORES										
	ACERAS DE CONCRETO	M2	23.40	L	384.29	8,992.46	0.00	-	0.00	-	0.00
						8,992.46		-		-	0.00
	SUB TOTAL EXTERIORES										
72	OTROS										
	ESCALERA DE PELDAÑO #500 20 M	ML	3.40	L	157.25	534.64	0.00	-	0.00	-	0.00
73	SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO CON CABLE 2X10+1X12 THHN EN PVC 1/2" CED 40. INCLUYE SECCIONADOR MONOFASICO PARA INTENSIDAD DE 40 A, 2P 240 V	UNI	1.00	L	3,565.95	3,565.95	0.00	-	0.00	-	0.00
74	RAMPA PARA DISCAPACITADOS	M2	18.00	L	384.29	6,917.28	0.00	-	0.00	-	0.00
						11,017.86		-		-	0.00
	SUB TOTAL OTROS										
						698,122.95		0.00		158,501.96	23.00
	SUB TOTAL CONTRATADO COSTO DIRECTO										
						698,122.95				158,501.96	23.00
	COSTO DIRECTO DE LA OBRA										
	ADMINISTRACION 5%	L	689,122.95	L	-	158,501.96	23.00%				
	CAMPO 10%	L	34,456.15	L	-	7,925.10	23.00%				
	UTILIDAD 10%	L	68,912.30	L	-	15,850.20	23.00%				
	COSTO TOTAL DE LA OBRA	L	68,912.30	L	-	15,850.20	23.00%				
		L	861,403.69	L	-	198,127.45	23.00%				
	DEDUCCION DEL 15% POR ANTICIPO	L	129,210.55	L	-	29,719.12	23.00%				
	RETENCION POR EL 5% POR CALIDAD DE OBRA	L	43,070.18	L	-	9,906.37	23.00%				
	RETENCION DEL 12.5% POR ISR	L	-	L	-	-	0.00%				
	SALDO NETO A PAGAR	L	689,122.95	L	-	158,501.96					

AROLAVI RIVERA
CONTRATISTA

ELABORACION: 14/07/2017



AROLAVI RIVERA
SUPERVISOR DE OBRAS
SUPERVISOR DE OBRAS

ROQUE ESCOBAR
ALCALDE MUNICIPAL DE GUALACO



Registro Nacional de las Personas

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Julio 2017.
OFICIO No. 018-2017-DOF/RNP.

TDM.
CARLOS HUMBERTO ROMERO ANDRADE
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
SU OFICINA.

Como es de su conocimiento, que los convenios de Construcción de registros civiles Municipales suscritos con las alcaldías de: Gualaco, Dpto. de Olancho, Cabañas, Opatoro y CHINACLA en el Dpto. de la Paz, ya hicieron sus correspondientes Cotizaciones y sus Adjudicaciones, tres de ellas ya iniciaron su construcción, (Gualaco, Opatoro y Cabañas).

Como dichos convenios se hicieron con montos estimados, debido a que en ese momento no se tenían diseños para determinar un presupuesto más real, por lo que los presupuestos elaborados por el Departamento de Obras Físicas de acuerdo a los diseños y cantidades de Obras variaron significativamente. Situación que nos obliga a introducir un Adendum a los convenios donde las municipalidades después de haber realizado su proceso de Cotización y Adjudicación se incrementaron en sus montos.

En el cuadro siguiente detallo la situación definitiva de cómo quedarán dichos convenios a los cuales se le realizarán los Adendum correspondientes, en los que las municipalidades de; Gualaco en el departamento de Olancho y Cabañas en el departamento de la Paz, Absorben el 100% del incremento, que son de: Lps 61,403.69 en Gualaco y Lps 8,400.00 en cabañas.

En el convenio con la Alcaldía de Opatoro hubo un incremento de Lps 202,431.28 en él que se negoció que cada institución absorberá el 50% de dicho incremento es decir Lps 101,215.64 cada uno. El cual solicito a usted sea sometido a Directorio para su aprobación.

CUADRO COMPARATIVO PARA MODIFICACION DE CONVENIOS

PROYECTOS RCM MUNICIPIOS	MONTO PRESUPUESTADO SEGÚN DISEÑO	MONTO DE CONVENIO	MONTO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION	DIFERENCIA ENTRE CONVENIO Y CONTRATO	CONVENIO MODIFICADO		OBSERVACIONES
					APORTACION DEFINITIVA ALCALDIAS	APORTACION DEFINITIVA RNP	
GUALACO, OLANCHO	880,136.41	800,000.00	861,403.69	61,403.69	361,403.69	500,000.00	Alcaldía absorbe el 100% de incremento
CABAÑAS, LA PAZ	816,006.52	800,000.00	808,400.00	8,400.00	408,400.00	400,000.00	Alcaldía absorbe el 100% de incremento
OPATORO, LA PAZ	828,957.55	600,000.00	802,431.28	202,431.28	401,215.64	401,215.64	Cada institución absorbe el 50 % de incremento

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

Administración General: 2221-5519
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517

Foras

27 JUL 2017 11:50 PM
27 JUL 2017 7:44 PM
27 JUL 2017 1:41 PM



Registro Nacional de las Personas

Sin otro particular, en espera de una pronta resolución para regularizar esta situación, me suscribo de usted con toda consideración.

Atentamente.


ING. OSCAR ROLANDO HERNÁNDEZ C.
JEFE DPTO. OBRAS FÍSICAS



Cc: Director RNP.
Cc: Sub Director Técnico RNP
Cc: Administrador General RNP
Cc: Archivo

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Edificio Villatoro, Boulevard Morazán

Dirección: 2221-5520
Sub-Dirección Técnica: 2221-5522
Sub-Dirección Administrativa: 2221-4436
Secretaría General: 2221-5512
Prensa y Protocolo: 2221-4427

Administración General: 2221-5519
Pagaduría: 2221-5515
Recursos Humanos: 2221-5516
Auditoría: 2221-5517
