



Tegucigalpa M.D.C. 25 de julio de 2017

OFICIO No. SDS-UCP-724-2017

Señor **Rafael Antonio Lanza** Oficial de Transparencia Secretaria de Seguridad

Ref. Contrato de préstamo No. 2745/BL-HO. "Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana" Información del Programa para portal de transparencia

Estimado Señor Lanza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del préstamo de la referencia, en relación al oficio SEDS-OTAIP-45-2017, por este medio adjunto se remite la información con el detalle de acuerdo a la solicitud realizada sobre el Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de junio 2017.

Agradezco de antemano su atención a la presente, sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente

Augusto Barón Jiménez

Coordinador General del Programa

Préstamo BID, No. 2745 BL/HN

Cc. Sub Comisionado Gerzon Velásquez/ Director General del Programa







DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LABORATORIOS DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES		монто
Costo Total Contrato Original:	L.	152,959,190.57
Costo Total Contrato con Enmiendas:	L.	174,375,750.04
Valor del Anticipo:	L.	30,591,838.11
Valor de pago anticipado por materiales en el sitio	L.	11,767,278.62
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L.	27,445,859.63
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L.	77,976,139.92
Deducción este periodo por anticipo:	L	5,489,171.93
Deducción acumulada a la fecha por anticipo:	L	9,693,467.71

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	15%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	70%
Avance Financiero General este periodo:	10.67%
Avance Financiero General Acumulado:	54.51%





DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA		монто
Costo Total Contrato Original:	L.	75,913,394.23
Costo Total Contrato con Enmiendas:	L.	76,329,987.28
Valor del Anticipo:	L.	15,182,678.85
Valor de pago anticipado por materiales en el sitio	L.	2,420,719.90
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L.	7,919,292.26
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L.	43,885,943.06

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	9.93%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	56.93%
Avance Financiero General este periodo:	11.7%
Avance Financiero General Acumulado:	58.4%



DATOS GENERALES CONTRATO CONSTRUCCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA		MONTO
Costo Total Contrato Original:	L.	43,382,862.62
Costo Total Contrato con Enmiendas:	L.	44,564,641.17
Valor del Anticipo:	L.	8,676,572.52
Valor del Trabajo Realizado este periodo:	L.	3,018,639.60
Valor Total del Trabajo Realizado a la Fecha:	L.	18,460,388.15

Proyecto General	
Avance Físico General Realizado este mes:	18%
Avance Físico General Acumulado a la Fecha:	87%
Avance Financiero General este periodo:	5.08%
Avance Financiero General Acumulado:	41.42%





COMPLEJO DE LABORATORIO DPI SPS



FACHADA FRONTAL LABORATORIO




FACHADA FRONTAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO





JEFATURA DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

FACHADA FRONTAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DORMITORIOS

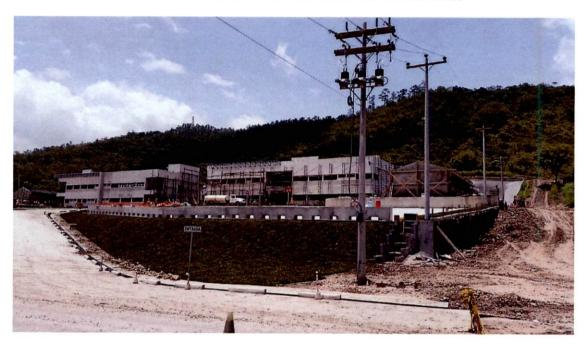




Préstamo No.2745/BL-HO
Programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Aldea El Ocotal, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: (504) 2229-0083





JEFATURA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

FACHADA FRONTAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

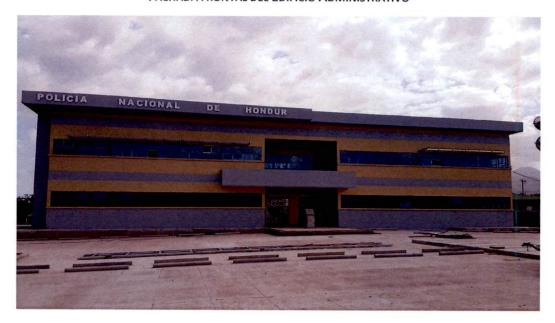

INTERIOR DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO



FACHADA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.
