


Ficha de Proyecto



Construccion de Hogar Materno Lepaera

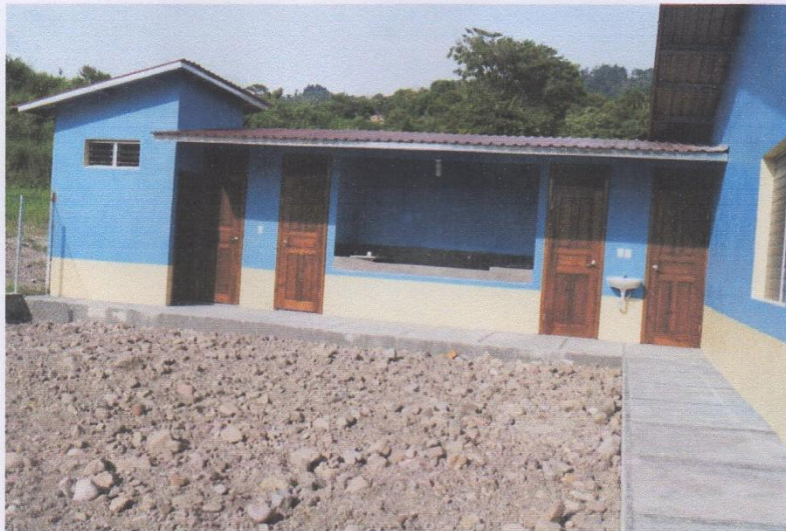

LEPAERA, LEMPIRA 2016.

Honduras Centro America

1. Ejecución del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Hogar Materno en Barrio Las delicias Lepaera

.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social(SALUD)

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Hogar Materno Infantil

4.- Ubicación del Proyecto.

El Proyecto se encuentra localizado en el Barrio Las Delicias del Municipio de Lepaera en el Dpto. de Lempira, específicamente donde hoy se ubica la Clínica Materno Infantil el Hogar Materno tiene las colindancias siguientes: **Al Norte** con los municipios de Atima y Naranjito en el Dpto. de Santa Bárbara, **al Sur:** colinda con los municipios de las Flores y Gracias en el Dpto. de Lempira, **al Este** con el Municipio de la Iguala, Lempira y Atima, Santa Bárbara, **al Oeste :** Con los Municipios de Santa Rosa, San José y San Juan de Opoa departamento de Copan.

5.- Propósito

Contar con el lugar adecuado en donde se albergan todas las mujeres embarazadas que están en espera de parto y que requieran pronta atención, brindando una eficiente asistencia médica hospitalaria inmediata en caso de requerirlo y con un ambiente de seguridad para los futuros pacientes.

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en darle seguimiento ya en su segunda etapa a la construcción de un Hogar Materno Infantil, que se ubica en un terreno que tiene las siguientes medidas: **18,590.96 MTRS** cuadrados y dicho proyecto tiene un área de **200 metros Mtrs.** Cuadrados. Realizándose las siguientes actividades:

Construcción de 45 mtrs lineales de cerca perimetral, con cimentación de piedra y bloque, construcción de solera de 45 metros de 6X3 metros, colocación de **19** tubos de HG, colocación de dos rollos de alambre ciclón, colocación de varilla de media sobre alambre ciclón.

Construcción de bodega de 2X2 metros cuadrados, de 3 metros de alto construida de bloque repellada y pulida, colocación de cerámica

Anteriormente se construyeron **8** Módulos que incluye (dormitorios, farmacia, sala de espera, comedor, corredor, área de lavandería, baños y corredor) con sus respectivas jardineras la cual presta un ambiente agradable y de mucha comodidad para los pacientes.

7. Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto.**
- **1. Se cuenta con un Hogar Materno prestando la atención necesaria requerida por los pacientes.**
- **2. Mejorada en un 85% la pronta atención y seguridad para las pacientes (mujeres embarazadas) de las comunidades del municipio.**
- **3.- Contar con un Diseño adecuado para el Hogar Materno.**

8. Impacto Ambiental.

Para la ejecución del proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la Unidad de Medio Ambiente se hicieron

las inspecciones correspondientes del terreno donde se construyó la obra, verificando que la construcción se ejecutara en una zona segura y en donde no se causa ningún daño.

Impacto en terreno y asentamientos.

La Construcción del Hogar Materno cuenta con el terreno legalmente escriturado, el cual es propiedad Municipal y está ubicado en un lugar que reúne las condiciones básicas como ser: Agua Potable, electrificación y de fácil acceso.

9. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara,
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se contó con un banco de Fuente de Financiamiento para la ejecución del proyecto describiéndolas a continuación: Secretaria de Salud, Plan en Honduras, FHIS, CEPROD, embajada de Japón y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada el financiador directo es la secretaria de Salud como principal financiador, con la contraparte municipalidad, (mano de obra calificada y materiales locales como ser: piedra, grava y arena). Realizándose estas

actividades con fondos propios y fondos provenientes de las transferencias.

Presupuesto del Proyecto.

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal y para el cual a su vez se firmó una carta acuerdo con Secretaria de Salud y la municipalidad.

Estado Actual del Proyecto.

En este momento la obra está finalizada, dándose el uso correspondiente donde se beneficia la población del municipio de Lepaera (Embarazadas)

10. Costo de finalización Financiera.

Costo Total: Lps.**1,390,567.50**

Ampliación: Lps.1,245,535.76

Transferencia Positiva: Lps. 446,000.00

Transferencia Negativa: 74,000.00

Vigente: Lps.1,394,760.30

Devengado: Lps. 1,390,567.50

Ejecutado: Lps.**1,390,567.50**

Fecha de finalización proyectada

18 de Julio de 2016

11. Ejecución Del Proyecto

12. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que esta segunda etapa del proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 1 mes en vista que las actividades a realizarse en el proyecto y para poder cumplir con los requisitos solicitados por la fuente de financiamiento como ser: **La Secretaria de Salud y la Municipalidad**. Anteriormente no se envió información de los costos, porque no se estaba esperando la conclusión del proyecto, aunque en estos momentos ya está culminado el proyecto en un **99.70%**

Por parte de la secretaria de Salud y la municipalidad se está supervisando el proyecto permanentemente, en vista que aunque ya se están usando las instalaciones quedan actividades inconclusas que es necesario darles continuidad, pero son actividades de menor costo pero que no dejan de ser importantes.

Es necesario dar a conocer que ya se le envió informe de proyecto ejecutado de la primera etapa y en este momento se envía el reporte de la segunda etapa.

13. Variación en el costo total del Proyecto.

Si como en todo proyecto hay variaciones, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia no es muy grande, en vista que se habían presupuestado en el aporte municipal ya vigente Lps. **1,394,760.3** y ya ejecutado hasta la fecha **L.1,390,567.50** quedando disponible **Lps.**

4,192.80pero en este caso se deben pagos pendientes de accesorios pequeños y mano de obra calificada, estos pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado.

Monto Solicitado:

Costo Total: Lps.**1,390,567.50**

Ampliación: Lps.1,245,535.76

Transferencia Positiva: Lps. 446,000.00

Transferencia Negativa: 74,000.00

Vigente: Lps.1,394,760.30

Devengado: Lps. 1,390,567.50

Ejecutado: Lps. **1,390,567.50**

Fecha de finalización proyectada

18 de Julio de 2016.

14. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Este proyecto no se pudo culminar en el año 2015 que fue cuando se inició pero como en todo proyecto siempre existen variaciones ya sea climáticas o de tipo financiero, en nuestro municipio lo que afecta grandemente es que los proyectos se ejecutan en la medida en que las transferencias se perciben, esto dificulta grandemente la ejecución de los proyectos, ya que la ferreterías locales con las que contamos no siempre tiene los materiales que necesitamos o no dan al crédito.En cuanto al clima si ha habido algunos contra tiempo pero en menor escala, por estas razones hubo variación en

cuanto a la duración del proyecto en vista que se tenía planificado para terminar en tres meses tiempo máximo la primer etapa y a esta segunda etapa se le dio un tiempo máximo de un mes pero se tardó su ejecución un tiempo más de lo debido,pero se tardó más de tres meses todas las actividades del proyecto, además de eso que no solo ese proyecto se estaba ejecutando, hay más proyectos llevándose a cabo al mismo tiempo y esto también es un atraso.


Al final se concluyó esta segunda etapa de una manera satisfactorio tanto para la municipalidad como para la fuente financiera Secretaria de Salud, ambas se portaron a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización de la obra en mención.

15. Razones de los cambios antes mencionados.

Solo hubo dos razones por las cuales no se concluyó el proyecto en el tiempo previsto:

- 1.- Lentitud en que llegan las transferencias a la Municipalidad que es uno de los cooperantes del proyecto.
- 2.- El Clima, que es un factor inevitable,pero que no afecto grandemente.
- 3.- Existen otros proyectos ejecutándose al mismo tiempo, lo que dificulta terminar en el tiempo previsto.

ANEXOS : FOTOS.




HOJA: 03

FECHA:
NOVIEMBRE 2015

DE: 6



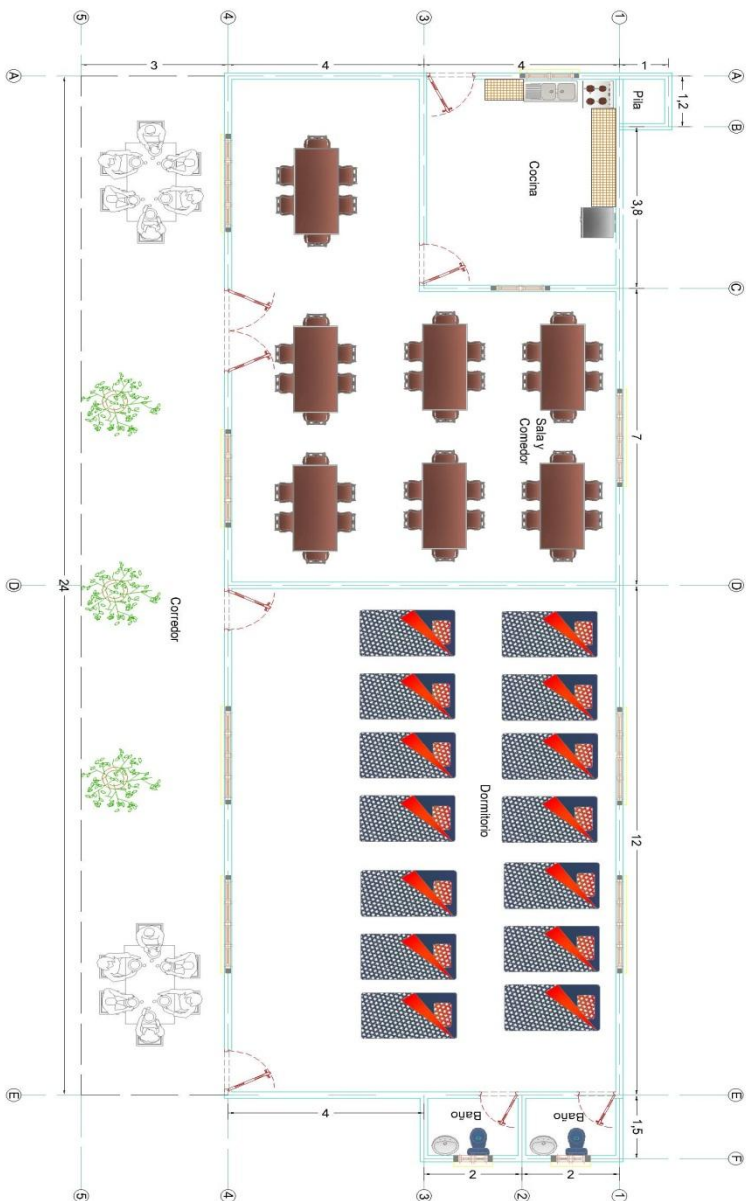

PROYECTO :

HOGAR MATERNO

CONTENIDO :

PLANTA ARQUITECTONICA

PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA

DISEÑO:
ROSLYN ELY REYES
LUGAR: LEPAERA, LEMPIRA

REVISÓ :
ING. MARIA ZONIA MURCIA
ESCALA:

FECHA:
NOVIEMBRE 2015

DE : 6

01





HOJA :

HOJA :
05
DE : 6











